

DIRECCION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO

MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
PRESENTE:

Se expide la presente cédula con base en las facultades otorgadas por los artículos 30 fracción XXXV de la Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 33, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas, Título III de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios De Zacatecas.

El siguiente Registro Único de Proveedores y Contratistas del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas; está verificado y cumple con los requisitos que marcan la normativa vigente.

Cédula de Contratista

No. Cédula	Nochistlán/03/2023
Razón Social	MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
Dirección	PILA AZUL 9 CENTRO
Teléfono	3467133482
Estado	ZACATECAS
Municipio	NOCHISTLAN DE MEJIA
RFC	ROFM850819917

La Vigencia de la presente cédula es hasta el 31 diciembre de 2023.

ATENTAMENTE
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,ZAC.




ING. ANA GABRIELA TACHIQUIN RAMIREZ



CONTRALORIA
MUNICIPAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2021 - 2024

0086



Municipio de Nochistlán de Mejía Zacatecas
Dirección de Desarrollo Económico y Social

ACTA DE ENTREGA DEL ÁREA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha: 02 de junio del 2023

En relación al contrato de obra pública, precios unitarios y tiempo determinado No. **NOCHIS/FONDOIII/2023/04**, Relativo de los trabajos: **PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELASCO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** se reunieron en el lugar de los trabajos, por parte del Municipio, el Arq. Diana Ivette Miranda Ledesma residente de obra, por parte de la empresa el C. Ma. Mercedes Rodríguez Fuentes, Para poner a disposición del contratista el área donde habrá de ejecutarse los trabajos del contrato, el cual estará bajo su resguardo durante todo el tiempo que dure la obra, para lo cual debería tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden y la seguridad del inmueble, mismo que terminados los trabajos deberá entregar como mínimo en las condiciones que lo recibe a reserva de las áreas que se intervendrán para el: **PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELASCO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presenta, firmando de conformidad, al calce de la hoja de la presente, a las 9:00 horas del día 02 de junio 2023 otorgando una copia a todos los presentes.

Por el municipio.

Diana Miranda

Arq. Diana Ivette Miranda Ledesma
RESIDENTE DE OBRA

Por la empresa

[Firma]
Ing. Luis David Ramírez Villegas
SUPERINTENDENTE DE OBRA





CONSTRUCCIONES "RAMIREZ"

PLANOS, AVALUOS, PERITAJES, MEDICION DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
PRESENTE

NOCHISTLÁN, ZAC. A 2 DE JUNIO DEL 2023

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO A USTED QUE EL DÍA 2 DE JUNIO DEL 2023 INICIE CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA **“PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELASCO”**. EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

Ma. Mercedes R.F.
MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES



0088

DIRECCIÓN: UNIDAD DE PLANEACIÓN

NO. DE OFICIO: 67

SECCION: 2

EXPEDIENTE: ADMVO. 2021-2024

ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA
PRESENTE.

Por este medio me dirijo a usted para designarlo como responsable de la supervisión de la siguiente **PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELASCO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** con número de contrato **NOCHIS/FONDOIII/2023/04,** de la cual se le hace responsable de la recopilación revisión de la documentación para conformación del expediente técnico que requiere la dependencia ejecutora Dirección de Desarrollo Económico y Social. Dicha información se debe de entregar al responsable del fondo correspondiente.

Documentación a entregar:

- Oficio de invitación.
- Oficio de adjudicación.
- Presupuesto contratado.
- Tarjeta de precios unitarios.
- Permisos de construcción
- Factibilidad de la obra
- Calendario de ejecución del contratista.
- Asignación de residente.
- Oficio de inicio de obra.
- Programa de obra.
- Catálogo de conceptos contratados.
- Revisión y entrega de generadores y estimaciones de obra con fotografías.
- Memoria fotográfica global impresa y digital.
- Bitácora convencional y reporte fotográfico.
- Reporte de visita semanal (día de corte los días viernes).
- Pruebas de laboratorio (pavimentaciones o estructuras con concreto).
- Revisión y análisis correcto de generadores y estimaciones de obra.
- Acta de entrega recepción.
- Fianzas o garantías de obra.
- Finiquito.
- Convenio de ampliación de metas. (oficio de aprobación, proyecto y presupuesto).

Sin más por el momento aprovecho para enviar un cordial saludo, quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración.

Unidad de Planeación
2021-2024
Nochistlan de Mejia, Zac.
UP
A T E N T A M E N T E.
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 02 DE JUNIO DE 2023
UNIDAD DE PLANEACIÓN

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

Recibí
02/06/2023
FAIS Diana Miranda
0089
EJERCICIO 2023



CONSTRUCCIONES "RAMIREZ"

PLANOS, AVALUOS, PERITAJES, MEDICION DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
PRESENTE

NOCHISTLÁN, ZAC. A 2 DE JUNIO DEL 2023


POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO A USTED QUE EL RESIDENTE DE LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELASCO ".EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS. SERA EL ING LUIS DAVID RAMIREZ VILLEGAS

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

Ma. Mercedes R.F.

MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES





BITACORA DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

ORGANISMO: MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

CONCEPTOS DE TRABAJO:

1. _ TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICOS EN TERRENO PLANO Y LOMERIO.
2. _ CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE "B" INCLUYE: MAQUINARIA Y OPERADOR.
3. _ ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEDO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B. PRIMER KILOMETRO, SOBRE CAMION DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA.
4. _ MEZCLADO TENIDDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE BSE COMPACTADA AL 100% UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO DE MATERIAL PETREO (50% MATERIAL DE BANCO-50% MATERIAL PETREO).
5. _ PAVIMENTO DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 AGREGADO DE 19 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 15 CM DE ESPEOSR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERAMIENTAS MENORES.
6. _ CUNETETA DE CONCRETOF'C= 150 KG/CM2 AGREGADO DE 19MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 10 CM DE ESPESOR. CIMBRA METALICA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Los reportes de la bitácora se estuvieron manejando semanalmente reportando el avance fisico por escrito.

Nota: 1 02/06/2023

Se comienza por hacer la inspección para programar el comienzo de la obra.



0091



Nota: 2 09/06/2023

En esta semana se comienza a hacer los trabajos preliminares, trazando los ejes de los tramos carreteros para delimitar el área de trabajo.

Se realiza el despalme del terreno y la limpieza del área.

Se comienzan a visualizar la topografía existente para poder trabajar en los niveles.

Nota: 3 16/06/2023

Lunes 12 de junio se empiezan hacer los trabajos de nivelación en el primer tramo del camino a rehabilitar.

Nota: 4 23/06/2023

Se coloca las primeras terracerías y se extiende el material para poder llegar al nivel en el segundo tramo carretero.

Nota: 5 30/06/2023

Se continúa con la extensión del material para llegar a la compactación ideal para preparar la base para recibir el concreto en el segundo tramo del camino.

Nota: 6 07/07/2023

Se continúan con los trabajos de preparación de la base y terraplenes en el primer tramo y se comienza con la colocación del concreto en el segundo tramo carretero.


Nota: 7 14/07/2023

Se terminan los trabajos de terraplenes y base con su correcta nivelación para recibir el concreto del primer tramo carretero. Y así ves se continúa con el concreto del segundo tramo carretero.

Nota: 8 21/07/2023

Se prosiguen los trabajos del concreto en el segundo tramo carretero. Trabajando solo unos días de la semana por las inclemencias del clima.

0092





CONSTRUCCIONES "RAMIREZ"

PLANOS, AVALUOS, PERITAJES, MEDICION DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL



Nota: 9 28/07/2023

Permanecen los trabajos de la extensión del concreto, en el segundo tramo carretero, al igual que la semana pasada solo se trabajaron 3 días de la semana por las lluvias.

Nota: 10 04/08/2023

Se mantienen los 3 días de trabajo en el segundo tramo carretero por la dificultad para bajar con el concreto al área de trabajo ya que el camino se encuentra muy mojado. Y se comienzan los trabajos del concreto en el primer tramo carretero.

Nota: 11 11/08/2023

Se terminan los trabajos del concreto en el segundo tramo y se continúa con el concreto del primer tramo.

Nota: 12 18/08/2023

Se hacen los términos del concreto de en el primer tramo y se preparan los preliminares para los trabajos del concreto.

Nota: 13 25/08/2023


Se comienzan las cunetas en el segundo tramo de carretera sin ningún inconveniente. Y se preparan los preliminares del primer tramo.

Nota: 14 01/09/2023

Se dan por terminados los trabajos de concreto en las cunetas al 100% en los dos tramos.

Dando por terminada la realización de los trabajos establecidos en el contrato.

Firmas de común acuerdo



0093

Diana Miranda

Arq. Diana Ivette Miranda Ledesma

Supervisor por el Municipio

Ma. Mercedes R.F.

Ma. Mercedes Rodríguez Fuentes

Contratista



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C02233 Del 13/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2023
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: A146 - Obra Pública : 404003 - PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELASCO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN.
GP Folio: 432

Beneficiario: MA MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404003-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$588,466.46		GP Folio: 432
0002	8260-511-404003-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$588,466.46	GP Folio: 432
0003	2113-000871	MA MERCEDES RODRIGUEZ	\$588,466.46		GP Folio: 432
0004	1112-08-153	FONDO III 2023 1214132352		\$588,466.46	GP Folio: 432
Sumas iguales =>			1,176,932.92	1,176,932.92	

0094
OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 23



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P06465 Del 13/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2023
Página | 01:07 p. m.
1

Concepto: A146 - Obra Pública : 404003 - PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELASCO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN.
GD Folio: 429

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-404003-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$588,466.46		GD Folio: 429
0002	8240-511-404003-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$588,466.46	GD Folio: 429
0003	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de	\$588,466.46		GD Folio: 429
0004	2113-000871	MA MERCEDES RODRIGUEZ		\$588,466.46	GD Folio: 429
Sumas iguales =>			<u>1,176,932.92</u>	<u>1,176,932.92</u>	





Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

13/07/2023 11:06

Cuenta/ CLABE Ordenante	1214132352
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
RFC o CURP del Ordenante	MNM850101AC3
Moneda	MXP
ID Tercero	89
Nombre del Beneficiario	MA MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
Cuenta/CLABE/Celular	012946001012626536
RFC Beneficiario	ROFM8508199I7
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$588,466.46
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/07/2023
Número de Referencia	01
Propósito de la Transferencia	PAGO DE FACTURA A146
Clave de Rastreo	8846APR2202307132402627400
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha Captura	13/07/2023 11:06:20 a. m.
Ejecutó	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha de Ejecución	13/07/2023 11:06:44 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0096

ORDEN DE PAGO 2023

12-jul

MUNICIPIO: 034 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: RAMO 33 . PROGRAMAS FEDERALES
 SUB-PROGRAMA : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 (RAMO, FONDO O PROGRAMA) (FONDO III 2023)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
 FIRMA DEL SOLICITANTE: [Firma]
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 12 de julio de 2023
 CUENTA BANCARIA ORIGEN : 1214132352 BANORTE

No.	CLAVE PRESUPUESTARIA								NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE.	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO						
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	511	FONDO III RAMO 33	404003	PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELASCO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6141	PAGO DE PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA.	NOCHIS/FOND OIII/2023/04	MA MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES.	A 146	05/07/2023	588,466.46	(QUINIENOS OCHENTA Y OCHO PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 46/100 MN)



AUTORIZA:

 L.C. ROCÍO ROQUE GOMEZ.
 AGADA DE TESORERIA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 FECHA : 12 DE JULIO DEL 2023

AUTORIZA:

 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
 DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 FECHA : 12 DE JULIO DEL 2023

AUTORIZA:

 C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 FECHA : 12 DE JULIO DEL 2023

AUTORIZA:

 SINDICATURA MUNICIPAL
 L.C. ROCÍO ROQUE GOMEZ.
 SINDICADO MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 FECHA : 12 DE JULIO DEL 2023

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL MUNICIPIO, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.

0097

Factura A 146

MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

RFC: ROFM850819917 Tipo de comprobante : 1 - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000501436905

Folio Fiscal: 8f686900-cc89-4fe1-8ae2-61484bd5fc30

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
 RFC: MNM850101AC3
 Uso CFDi: G01 - Adquisición de mercancías
 Domicilio: 99900 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP:99900
 Fecha y hora de emisión: 2023-07-05T13:00:43

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - PAGO	72121406 - PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA " PAVIMENTACION CAMINO A LA RINCONADA DE VELASCO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MAJIA, ZACATECAS" CON NUMERP DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/04	507,298.67	02 Sí objeto de impuesto 002 - IVA: 81167.79	507,298.67

SubTotal \$ 507,298.67
 +IVA 16% \$ 81,167.79
 =TOTAL \$ 588,466.46

CANTIDAD CON LETRA : QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 46/100 MXN
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
 FECHA TIMBRADO : 2023-07-05T13:02:43
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663

Sello Digital del CFDi

EDWp6cdqO/1qv9TXO481G9x0smvEv8PGhPpAV8IKkthSMV/KFQ1IDNB4MJTK+/PSaIEVV4KoVmsXIMAwJ7JKU25fSGpcZrakHkUuYS
 tBo2232N69XBx1gdbAN6A3BUp+hckyt8+k4s4wwGFHsU61Xo7ATRPYw2EbC+Njy2H1iLbu2lvtKIKKq6U1dOjfkFkwjHwZ3ktHH1Y+ctH
 Uaoam8Jp4kqrl21kR6KZH10N0nxYZVWek2p9ovkzlfTlw3GSyMPkD4Mjm2AeF1X9HM0imrBYm8780wk/B+tV2MvDly/QXy7KetMYlc
 DKJjIYWWHGRmCeFgpEBqBSKk+YZhw==

Sello Digital del SAT

c1s+k61Uq+1ddUuvWRkoa5p4GgE.60pA1r6MvU7rEFbFs6FKvLvymARzoTrAprAmTwL93psKbuHU/gO6exsaZo//wk5Yu5Y10HD7GG
 /f93/C7jvuadqnlxGx9jsXyupAs0a785aoPSEcA9YoYx3PP+1ckfleCwKSAWRerFz9KCaV9qXZMGsY+lrly4pMEbSFMW4Ly8KgFp/cRN
 bnEdtH/wl6d6g2reYy7y2WJBMZqmKZzQk51Y5hey9NwaHmR21aPMODzOUS4ORFxSy2vTH8M5cCvgZ33xhgmQJ9PNQHo1DhLH
 SN3ihTFQRdxV02AeMjpQGLaG66Z0YyJA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11.118f686900-cc89-4fe1-8ae2-61484bd5fc30/2023-07-05T13:02:43LSO1306189RSIEDWp6cdqO/1qv9TXO481G9x0smvEv8PGhPpAV8IKkthSMV/KFQ1IDNB4MJTK+/PSaIEVV4KoVmsXIMA
 wJ7JKU25fSGpcZrakHkUuYS/tBo2232N69XBx1gdbAN6A3BUp+hckyt8+k4s4wwGFHsU61Xo7ATRPYw2EbC+Njy2H1iLbu2lvtKIKKq6U1dOjfkFkwjHwZ3ktHH1Y+ctH
 Uaoam8Jp4kqrl21kR6KZH10N0nxYZVWek2p9ovkzlfTlw3GSyMPkD4Mjm2AeF1X9HM0imrBYm8780wk/B+tV2MvDly/QXy7KetMYlcDKJjIYWWHGRmCeFgpEBqBSKk+YZI
 w==100001000000509846663||



0098

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Diana Miranda
 Supervisor



RESUMEN DE ESTIMACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION CAMINO A RINGONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAGATECAS.
NO. DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOS/11/2023/04
UBICACIÓN: RINGONADA DE VELAZO
PERIODO: 02 DE JUNIO AL 04 DE SEPTIEMBRE
IMPORTE DE CONTRATO: \$1,076,001.05

HOJA	CLAVES DE CONCEPTOS CONTENIDOS	IMPORTE
1	1, 2, 3, 4, 5 Y 6	\$507,298.67

HISTORIAL	
MONTO DEL CONTRATO	\$1,076,001.05
ANTICIPO	\$0.00
DEDUCCIÓN 5 A E.M.	\$0.00
ESTIMADO A LA FECHA	\$588,466.46
TOTAL POR ESTIMAR	\$487,534.59

SUBTOTAL	\$	507,298.67
AMORTIZACION 30%	\$	-
SUBTOTAL	\$	507,298.67

IVA 16%	\$	81,167.79
TOTAL DE LA FACTURA	\$	588,466.46
DEDUCCION 5 A MILLAR	\$	-
IMPORTE A RECIBIR	\$	588,466.46



OPERA
FAISM
PERIODO 2023

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024

Diana Miranda
 SUPERVISOR
 ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA

Ma. Mercedes R.F.
 CONTRATISTA
 MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

0000

ESTIMACION



PLANO, DISEÑO, PERMISO, MEDICION DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL.

NÚMERO DE ESTIMACIÓN:	NOMBRE DE LA OBRA:	PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.
1	CONTRATO:	NOCHIS/FONDOIII/2023/04
	UBICACIÓN:	RINCONADA DE VELAZCO
	PERIODO:	02 DE JUNIO AL 04 DE SEPTIEMBRE
	IMPORTE:	\$1,076,001.05

CLAVE DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO	CONTRATO				ESTIMACION 1				POR ESTIMAR		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
1	TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICOS EN TERRENO PLANO Y LOMERIO.	M2	930.76	\$ 9.22	\$8,581.58	930.76	\$9.22	\$8,581.58	0.00	\$9.22	\$0.00	
2	CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE "B" INCLUYE: MAQUINARIA Y OPERADOR.	M3	261.02	\$ 154.93	\$40,439.83	261.02	\$154.93	\$40,439.83	0.00	\$154.93	\$0.00	
3	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEDO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B. PRIMER KILOMETRO, SOBRE CAMION DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA.	M3	261.02	\$ 64.01	\$16,707.89	261.02	\$64.01	\$16,707.89	0.00	\$64.01	\$0.00	
4	MEZCLADO TENIDDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE BSE COMPACTADA AL 100% UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO DE MATERIAL PETREO(50% MATERIAL DE BANCO-50% MATERIAL PETREO).	M3	223.43	\$ 558.61	\$124,810.23	223.43	\$558.61	\$124,810.23	0.00	\$558.61	\$0.00	
5	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 AGREGADO DE 19 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 15 CM DE ESPEOSR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENORES.	M2	930.96	\$ 680.50	\$633,518.28	465.48	\$680.50	\$316,759.14	465.48	\$680.50	\$316,759.14	
6	CUNETAS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 AGREGADO DE 19MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 10 CM DE ESPESOR. CIMBRA METALICA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	262	\$ 395.15	\$103,529.30	0.00	\$395.15	\$0.00	262.00	\$395.15	\$103,529.30	
		IMPORTE		\$927,587.11	\$507,298.67	IMPORTE		\$507,298.67	IMPORTE		\$420,288.44	
		IVA		\$148,413.94	\$81,167.79	IVA		\$81,167.79	IVA		\$67,246.15	
		TOTAL		\$1,076,001.05	\$588,466.46	TOTAL		\$588,466.46	TOTAL		\$487,534.59	

Diana Miranda
SUPERVISOR
ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA

Ma. Mercedes R.F.
CONTRATISTA
MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

OPERADO
FAISM (FIII)


DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

EXERCICIO 2023

0100

GENERADORES

NOMBRE DE LA OBRA:		CONTRATO:		MONTO CONTRATADO:	
NOCHIS/FOND0111/2023/04		NOCHIS/FOND0111/2023/04		1,075,001.05	
PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.		CONTRATISTA:		MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
FECHA DE CONTRATO : 02 DE JUNIO DE 2023		MUNICIPIO:		PROGRAMA	
FECHA DE INICIO: 02 DE JUNIO DE 2023		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		FONDO III	
PLAZO DE EJECUCION: 65 DIAS		EST. No.		1	
FECHA DE TERMINO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		HOJA:		02/06/23	
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		PERIODO DE:		A	
TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICOS EN TERRENO PLANO Y LOMERIO.		NOTAS :		1	
*TEMPO		DE:		04/09/23	

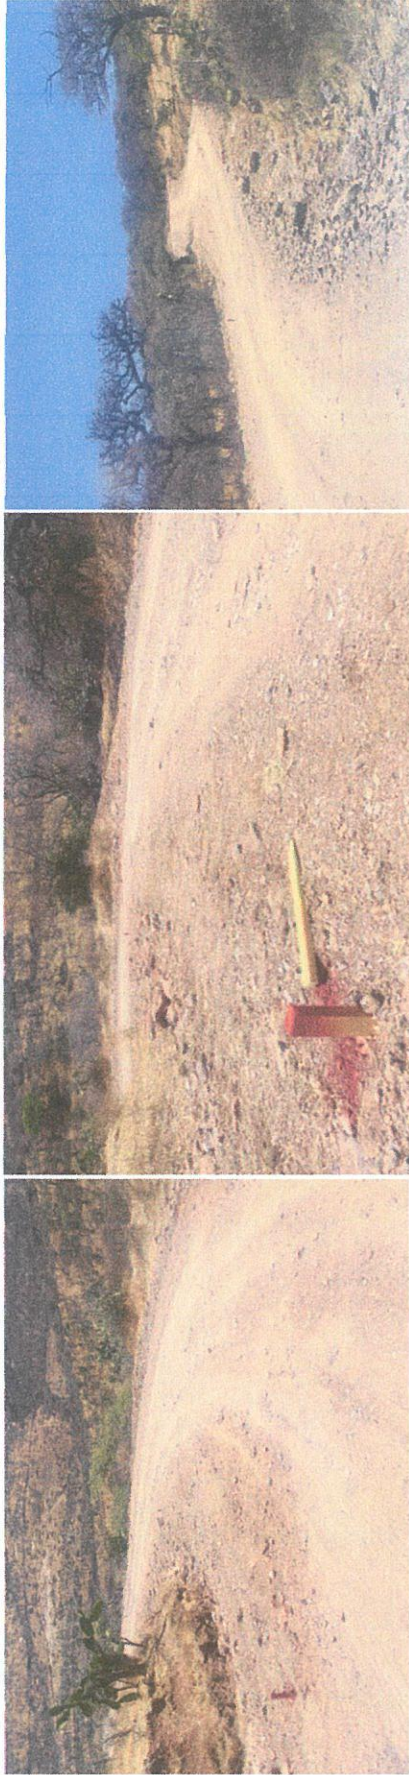

Diana Miranda
SUPERVISOR
ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA

Ma. Mercedes R.F.
CONTRATISTA
MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023



0106

GENERADORES

NOMBRE DE LA OBRA:		CONTRATO:		MUNICIPIO:		CONTRATISTA:	
NOCHIS/FONDOIII/2023/04		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		RINCONADA DE VELAZCO		MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
MONTO CONTRATADO:		PROGRAMA:		LOCALIDAD:		PROGRAMA	
\$ 1,076,001.05		FONDO III		RINCONADA DE VELAZCO		PROGRAMA	
PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.				EST. No.		HOJA:	
				1		2	
FECHA DE CONTRATO : 02 DE JUNIO DE 2023				PERIODO DE:		DE: 0	
FECHA DE INICIO: 02 DE JUNIO DE 2023				A		04/09/23	
PLAZO DE EJECUCION: 65 DIAS				NOTAS :			
FECHA DE TERMINO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023							

DESCRIPCION DE CONCEPTO: CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE "B" INCLUYE: MAQUINARIA Y OPERADOR.

*TIEMPO

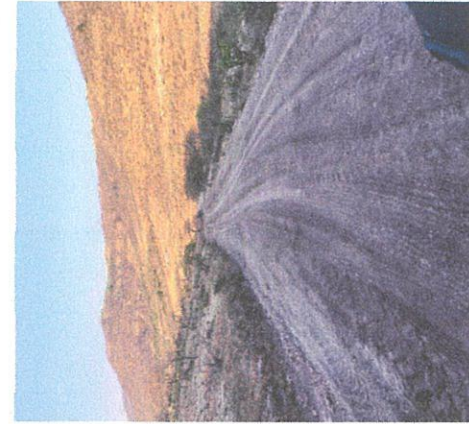

Diana Miranda
SUPERVISOR
ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA

Ma Mercedes P.F.
CONTRATISTA
MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0107


GENERADORES

NOMBRE DE LA OBRA:		CONTRATO:		MONTO CONTRATADO:	
PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.		NOCHIS/FONDOIII/2023/04		1,076,001.05	
CONTRATISTA: MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES MUNICIPALIDAD: LOCALIDAD: RINCONADA DE VELAZCO FONDO III NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. EST. No. HOJA: 3 DE: 6 1 PERIODO DE: A 02/06/23 04/08/23 NOTAS :					

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEDO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B. PRIMER KILOMETRO, SOBRE CAMION DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA.

*TEMPO

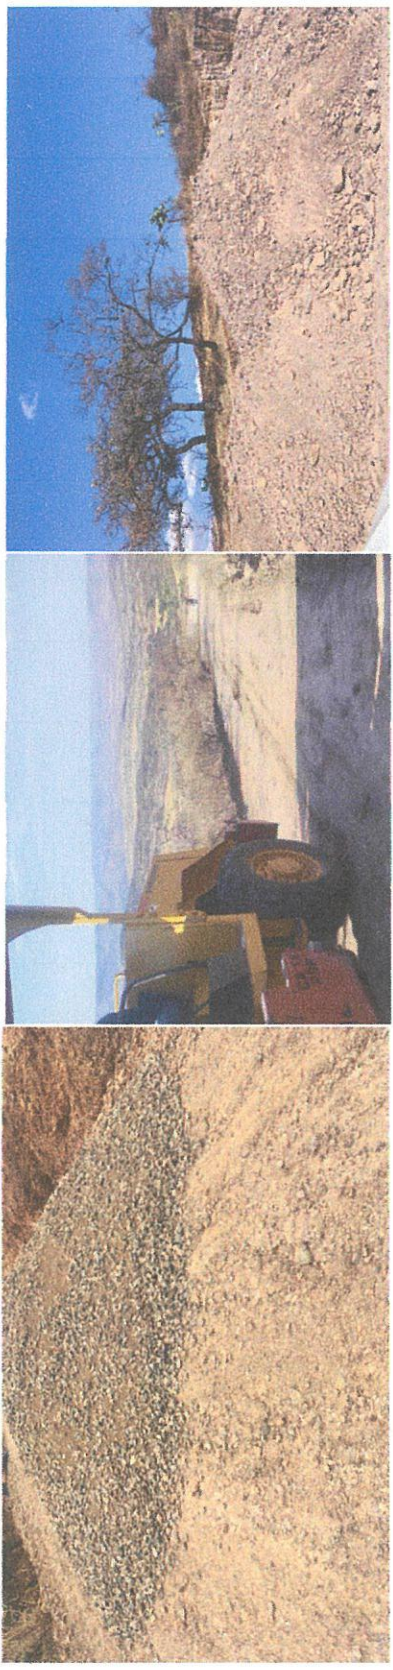


OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

Diana Miranda
SUPERVISOR
ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA


Ma. Mercedes R.F.
CONTRATISTA
MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

0108

GENERADORES

NOMBRE DE LA OBRA:		CONTRATO:		MONTO CONTRATADO:	
PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.		NOCHIS/FONDOIII/2023/04		\$ 1,076,001.05	
					
FECHA DE CONTRATO : 02 DE JUNIO DE 2023 FECHA DE INICIO: 02 DE JUNIO DE 2023 PLAZO DE EJECUCION: 65 DIAS FECHA DE TERMINO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
DESCRIPCION DE CONCEPTO:					
MEZCLADO TENIDDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE BSE COMPACTADA AL 100% UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO DE MATERIAL PETREO(50% MATERIAL DE BANCO-50% MATERIAL PETREO).					

*TIEMPO					
---------	--	--	--	--	--

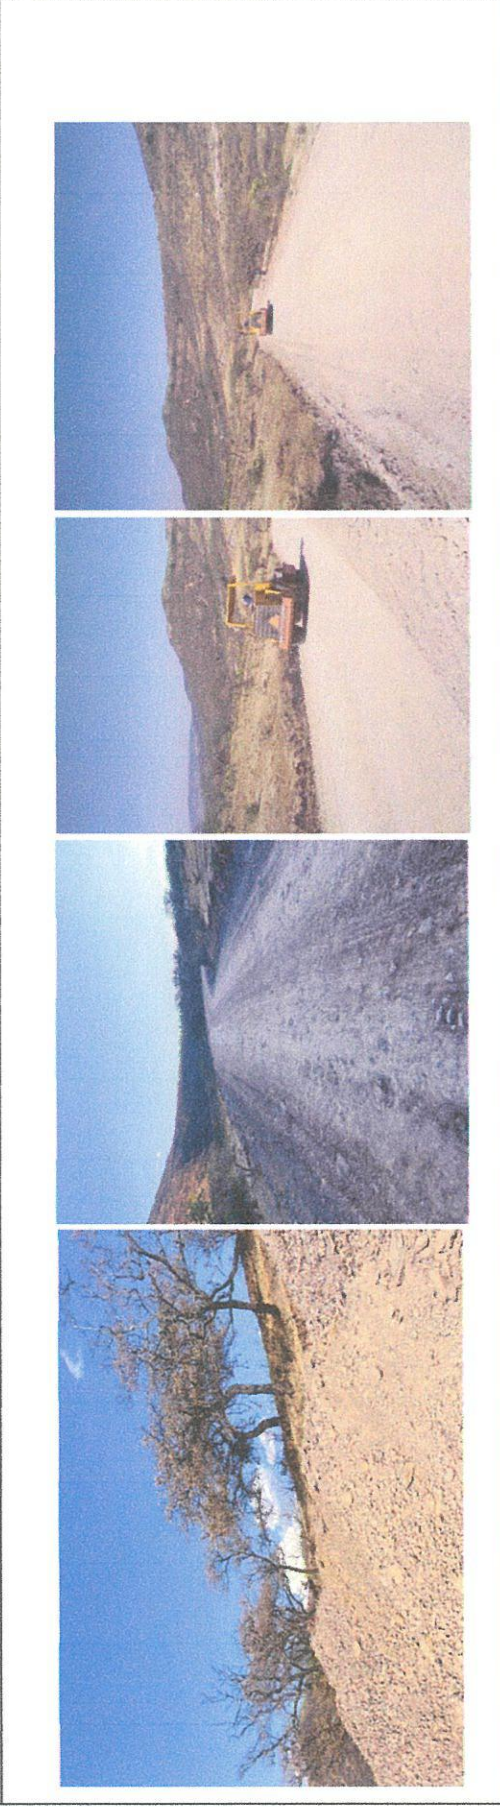


Diana Miranda
 SUPERVISOR
 ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA

Ma. Mercedes R.F.
 CONTRATISTA
 MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES


OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0109

GENERADORES

NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO:	MONTO CONTRATADO:	CONTRATISTA:
	NOCHIS/FONDOIII/2023/04	\$ 1,076,004.05	MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.			LOCALIDAD:
			RINCONADA DE VELAZO
			FONDO III
FECHA DE CONTRATO : 02 DE JUNIO DE 2023			EST. No.
FECHA DE INICIO: 02 DE JUNIO DE 2023			1
FECHA DE TERMINO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023			PERIODO DE:
			A
NOTAS :			

***TEMPO** PAVIMENTO DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 AGREGADO DE 19 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 15 CM DE ESPEOSR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERAMIENTAS MENORES.

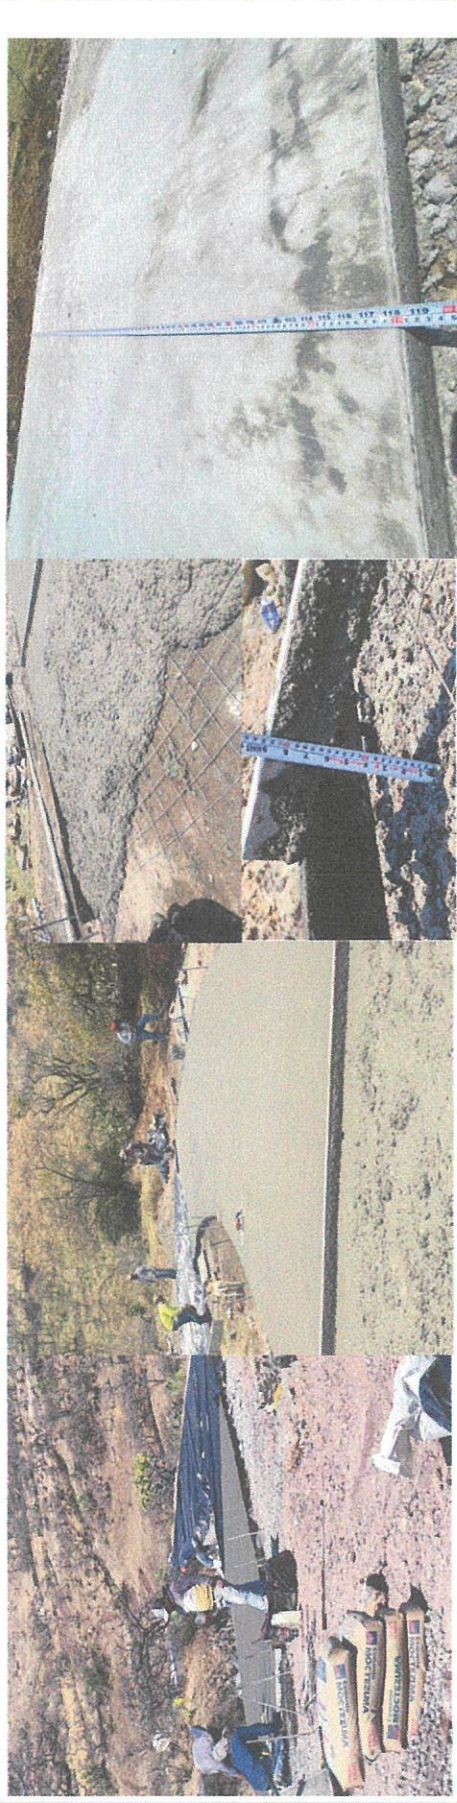

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

Diana Miranda
 SUPERVISOR
 ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA

Ma. Mercedes P.F.
 CONTRATISTA
 MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

0110



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C02653 Del 15/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
08:50 a. m.
Página | 1

Concepto: A147 - Obra Pública : 404003 - PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELASCO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN.
GP Folio: 526

Beneficiario: MA MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404003-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$487,534.59		GP Folio: 526
0002	8260-511-404003-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$487,534.59	GP Folio: 526
0003	2113-000871	MA MERCEDES RODRIGUEZ	\$487,534.59		GP Folio: 526
0004	1112-08-153	FONDO III 2023 1214132352		\$487,534.59	GP Folio: 526
Sumas iguales =>			975,069.18	975,069.18	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0111



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P07758 Del 15/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
08:49 a. m.
Página | 1

Concepto: A147 - Obra Pública : 404003 - PAVIMENTACIÓN CAMINO A RINCONADA DE VELASCO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN.
GD Folio: 520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-404003-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$487,534.59		GD Folio: 520
0002	8240-511-404003-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$487,534.59	GD Folio: 520
0003	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de	\$487,534.59		GD Folio: 520
0004	2113-000871	MA MERCEDES RODRIGUEZ		\$487,534.59	GD Folio: 520
Sumas iguales =>			<u>975,069.18</u>	<u>975,069.18</u>	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0112



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

15/09/2023 12:56


Cuenta/ CLABE Ordenante	1214132352
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
RFC o CURP del Ordenante	MNM850101AC3
Moneda	MXP
ID Tercero	89
Nombre del Beneficiario	MA MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
Cuenta/CLABE/Celular	012946001012626536
RFC Beneficiario	ROFM850819917
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$487,534.59
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/09/2023
Número de Referencia	01
Propósito de la Transferencia	PAGO DE FACTURA A147
Clave de Rastreo	8846APR2202309152527189664
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha Captura	15/09/2023 12:56:15 p. m.
Ejecutó	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha de Ejecución	15/09/2023 12:56:42 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



ORDEN DE PAGO 2023

15-sep

MUNICIPIO: 034 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: RAMO 33 . PROGRAMAS FEDERALES
 SUB-PROGRAMA : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 (RAMO, FONDO O PROGRAMA) (FONDO III 2023)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
 FIRMA DEL SOLICITANTE: _____
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 15 de septiembre de 2023
 CUENTA BANCARIA ORIGEN : 1214132352 BANORTE

No.	CLAVE PRESUPUESTARIA						OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE.	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA									
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	511	FONDO III RAMO 33	404003	PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELASCO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6141	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA.	NOCHIS/FOND OIII/2023/04	MA MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES.	A 147	04/09/2023	487,534.59	(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 59/100 MN)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 AUTORIZA:


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 AUTORIZA:

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024
 CARGO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 AUTORIZA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 AUTORIZA:

SINDICATURA MUNICIPAL
 LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ.
 SÍNDICO MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024
 CARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL
 ROGELIO ROQUE GOMEZ.
 AUTORIZA:

 FECHA : 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
 EJERCICIO 2023
 FAISN
 OPERATIVO
 0114

FECHA : 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA : 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA : 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.

Factura A 147

MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
RFC: ROFM850819917 Tipo de comprobante : I - Ingreso
No de serie del Certificado del CSD: 00001000000701763159
Folio Fiscal: cdfc3126-fd6d-47cc-8f6f-e752cbc9bd6f
Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS CP:99900
Fecha y hora de emisión: 2023-09-04T08:59:43
RFC: MNM850101AC3
Uso CFDI: I01 - Construcciones
Domicilio: 99900 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 5 columns: Cantidad, U Medida, Descripción, V Unitario Impuestos, Importe. Row 1: 1, E48 - PAGO, 72121406 - PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA " PAVIMENTACION CAMINO A LA RINCONADA DE VELASCO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MAJIA, ZACATECAS" CON NUMERO DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/04, 420,288.44 02 Sí objeto de impuesto 002 - IVA: 67246.15, 420,288.44

SubTotal \$ 420,288.44
+IVA 16% \$ 67,246.15
=TOTAL \$ 487,534.59

CANTIDAD CON LETRA : CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 59/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 03 - Transferencia electrónica de fondos
FECHA TIMBRADO : 2023-09-04T09:01:44
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663

Sello Digital del CFDI

khjklvOIGWGNEDkORgqbi9g2lrZASATW/+4w6FCb3SgKLRozZ6ZF9VYIQUHUYV5a/VZEoqBFzOO6sA4dfJx9jGj6QEsPW0XIBZm9GIAoig69mia116S+r62U45kwq3OBsgpqkJE4w2zimxHJL+QinvNeTBY+aVmhAmyR8bRWa3Db0/EWF597PUUsmnu+BJrEgC+w1G4jK0B4UC0GKG1k205OTghhU7QVRuBJ3uov5xOw6vC+ADL1dwX/aNDIRwxV0i2p4K+Q9VX5C++I4ZiFvWb2snpWy4dNG/mxrCJlptQ/oE2Eszh4dkM1s3hxxlWCnamUqbQCn73njvH/KpJ23g==

Sello Digital del SAT

ZBHIRan5AkPBNPweJ8FcoqgRB3VebL44SOODDHVc8Db1au5ix52yKB4ZosZKOZUcuB9gnqf0u4x7TQEAntDm9hqRZ5P+Inzly4jZviRdYqDK30HQKuN4LGNQOR3qgnKsbCzvAjb+0Yke+o6lyX2oDMgEv+Q2vqZabjYkKF3Hugi83JYf/eACunmcsBsrY/g05ilmnynniOmPj49IP3xJTmnuUdLodDFIs4TAvyl7NmzLLpNAHgwakzW9WaA1gl6ARLPQM8MDk/k6NfINGAGHQpApmbes8YTBnfaVHRJjH4+JOYLsyni h+gNQZbrzJSprTc1uFkmoUEUjzGOVA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT


lI1.1lcdfc3126-fd6d-47cc-8f6f-e752cbc9bd6f2023-09-04T09:01:44LSO1306189R5lkjklvOIGWGNEDkORgqbi9g2lrZASATW/+4w6FCb3SgKLRozZ6ZF9VYIQUHUYV5a/VZEoqBFzOO6sA4dfJx9jGj6QEsPW0XIBZm9GIAoig69mia116S+r62U45kwq3OBsgpqkJE4w2zimxHJL+QinvNeTBY+aVmhAmyR8bRWa3Db0/EWF597PUUsmnu+BJrEgC+w1G4jK0B4UC0GKG1k205OTghhU7QVRuBJ3uov5xOw6vC+ADL1dwX/aNDIRwxV0i2p4K+Q9VX5C++I4ZiFvWb2snpWy4dNG/mxrCJlptQ/oE2Eszh4dkM1s3hxxlWCnamUqbQCn73njvH/KpJ23g==100001000000509846663II



0115

Este documento es una representación impresa de un CFDI





RESUMEN DE ESTIMACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

NO. DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/04

UBICACIÓN: RINCONADA DE VELAZO

PERIODO: 02 DE JUNIO AL 04 DE SEPTIEMBRE

IMPORTE DE CONTRATO: \$1,076,001.05

HOJA	CLAVES DE CONCEPTOS CONTENIDOS	IMPORTE
1	1, 2, 3, 4, 5 Y 6	\$420,288.44

HISTORIAL	
MONTO DEL CONTRATO	\$1,076,001.05
ANTICIPO	\$0.00
(-) DEDUCCION 5 AL M.	\$0.00
ESTIMADO A LA FECHA	\$588,466.46
TOTAL POR ESTIMAR	\$487,534.59

SUBTOTAL	\$	420,288.44
AMORTIZACION 30%	\$	-
SUBTOTAL	\$	420,288.44

IVA 16%	\$	67,246.15
TOTAL DE LA FACTURA	\$	487,534.59
DEDUCCION 5 A MILLAR	\$	-
IMPORTE A RECIBIR	\$	487,534.59

OPENDIO
FAISM (III)
 EJERCICIO 2023

MANUEL JIMENEZ F.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. JOSÉ MANUEL JIMENEZ FUENTES

DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DIANA MIRANDA
 SUPERVISOR
 ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA

MERCEDES R. F.
 CONTRATISTA
 MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

ESTIMACION



NÚMERO DE ESTIMACIÓN:	1	NOMBRE DE LA OBRA:	PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.
CONTRATO:		UBICACIÓN:	NOCHISIFONDOIII/2023/04
PERIODO:		PERIODO:	RINCONADA DE VELAZO
IMPORTE:		IMPORTE:	02 DE JUNIO AL 04 DE SEPTIEMBRE
			\$1,076,001.05

CLAVE DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO	CONTRATO			ESTIMACION 2			POR ESTIMAR			
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICOS EN TERRENO PLANO Y LOMERIO.	M2	830.76	\$ 9.22	\$8,581.58	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2	CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE "B" INCLUYE: MAQUINARIA Y OPERADOR.	M3	281.02	\$ 154.93	\$40,439.83	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEDO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B. PRIMER KILOMETRO, SOBRE CAMION DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA.	M3	281.02	\$ 64.01	\$18,707.89	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
4	MEZCLADO TENIDDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE BSE COMPACTADA AL 100% UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO DE MATERIAL PETREO(50% MATERIAL DE BANCO-50% MATERIAL PETREO).	M3	223.43	\$ 558.61	\$124,810.23	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
5	PAVIMENTO DE CONCRETO FC = 250 KG/CM2 AGREGADO DE 19 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERAMIENTAS MENORES.	M2	930.96	\$ 680.50	\$633,518.28	465.48	\$680.50	\$316,759.14	0.00	\$680.50	\$0.00
5	CUNETTA DE CONCRETFC= 150 KG/CM2 AGREGADO DE 19MM CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 10 CM DE ESPESOR. CIMBRA METALICA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	262	\$ 995.15	\$103,529.30	262.00	\$995.15	\$103,529.30	0.00	\$995.15	\$0.00
				IMPORTE	\$937,587.11			IMPORTE	\$420,288.44		
				IVA	\$148,413.94			IVA	\$67,246.15		
				TOTAL	\$1,076,001.05			TOTAL	\$487,534.59		

Ma. Mercedes R.F.
 CONTRATISTA
 MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

Diana Miranda
 SUPERVISOR
 ARQ. DIANA WETTE MIRANDA LEDESMA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA


0117

OPERADO
 FAISM (FIII)

EJERCICIO 2023

GENERADORES

CONTRATISTA:	MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES		
MUNICIPIO:	LOCALIDAD:	PROGRAMA	
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	RINCONADA DE VELAZCO	FONDO III	
EST. No.	HOJA:	PERIODO DE:	DE:
2	02/06/2023	A	04/09/2023
NOTAS:			
CROQUIS			

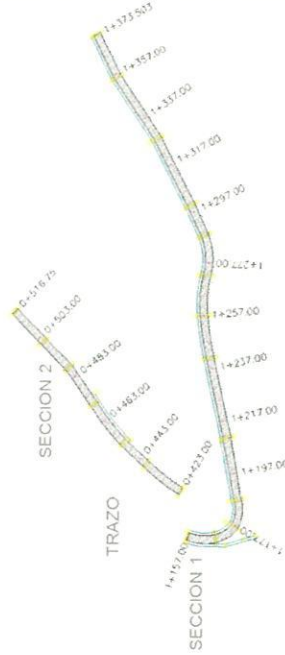


NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO:	MONTO CONTRATADO:	
PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	NOCHIS/FONDOIII/2023/04	1,076,001.05	S
DESCRIPCION DE CONCEPTO:			
PAVIMENTO DE CONCRETO P-C = 250 KG/CM2 AGREGADO DE 19 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 ROLLO DE 100 MTS.			
*TIEMPO	LOCALIZACION	TIPO	SECCION
	EJE	TRAMO	ALTO
	1	1-2	TRAZO
	2	2-3	TRAZO
			ANCHO
			LARGO
			TOTAL
			TOTAL
			324.81
			140.67
			465.48

DIANA MIRANDA
 SUPERVISOR
 ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA


MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
 CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

GENERADORES

NOMBRE DE LA OBRA:		CONTRATO:		MONTO CONTRATADO:		CONTRATISTA:	
NOCHIS/FONDOI/2023/04		NOCHIS/FONDOI/2023/04		\$ 1,076,001.05		MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.		 PLANES, ANÁLISIS, PERFILES, MEDICIÓN DE TIEMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA.		LOCALIDAD: RINCONADA DE VELAZCO PROGRAMA: FONDO III		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
FECHA DE CONTRATO: 02 DE JUNIO DE 2023		FECHA DE INICIO: 02 DE JUNIO DE 2023		PLAZO DE EJECUCION: 65 DÍAS		EST. No. 2	
FECHA DE TERMINO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		DESCRIPCION DE CONCEPTO:		PERIODO DE: A		DÍAS: 2	
		CUNETA DE CONCRETFC+ 150 KG/CM2 AGREGADO DE 10MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 10 CM DE ESPESOR. CIMBRA METALICA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		02/06/2023		04/09/2023	
NOTAS:							

*TIEMPO

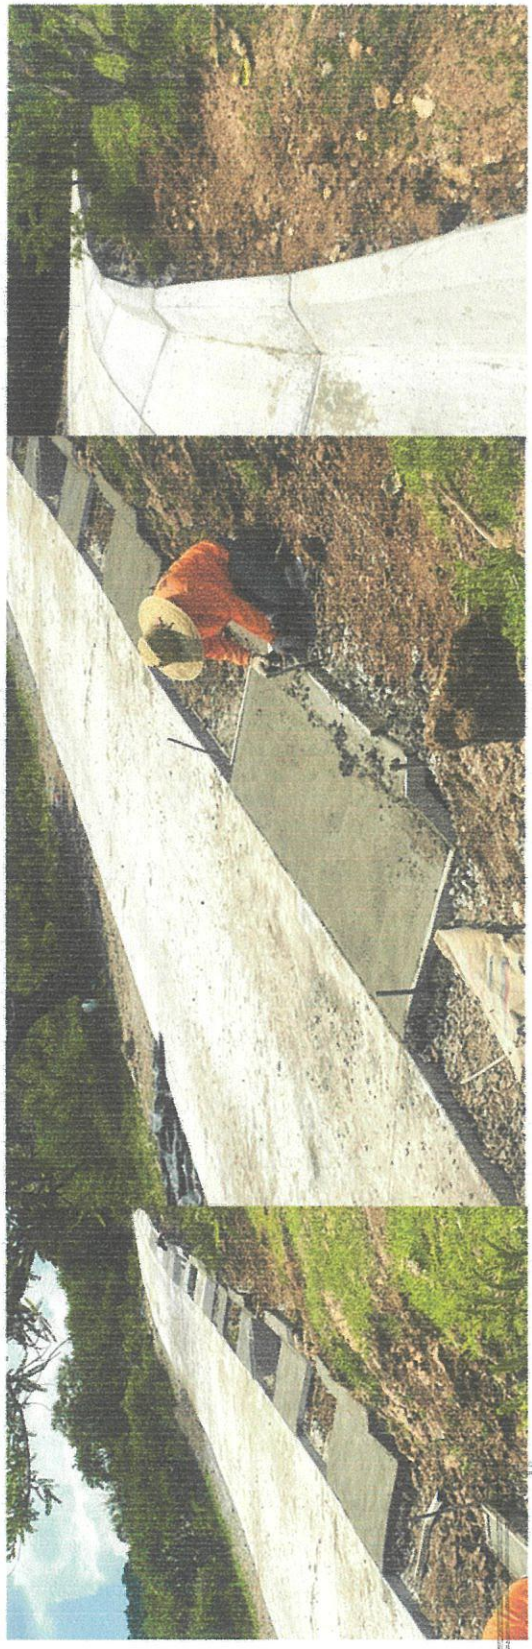

Diana Miranda
 SUPERVISOR
 ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA


M.C. Mercedes R.F.
 CONTRATISTA
 MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

0119

GENERADORES

NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO:	CONTRATADO:	PROGRAMA
	NOCHIS/FONDOI/2023/04	\$ 1,076,001.05	
PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	CONTRATISTA: MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES		
	MUNICIPIO: LOCALIDAD: RINCONADA DE VELAZCO		
	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		
FECHA DE CONTRATO : 02 DE JUNIO DE 2023	EST. No.	HOJA:	PERIODO DE:
PLAZO DE EJECUCION: 65 DIAS	2	02/06/2023	1 A
FECHA DE TERMINO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	NOTAS :		

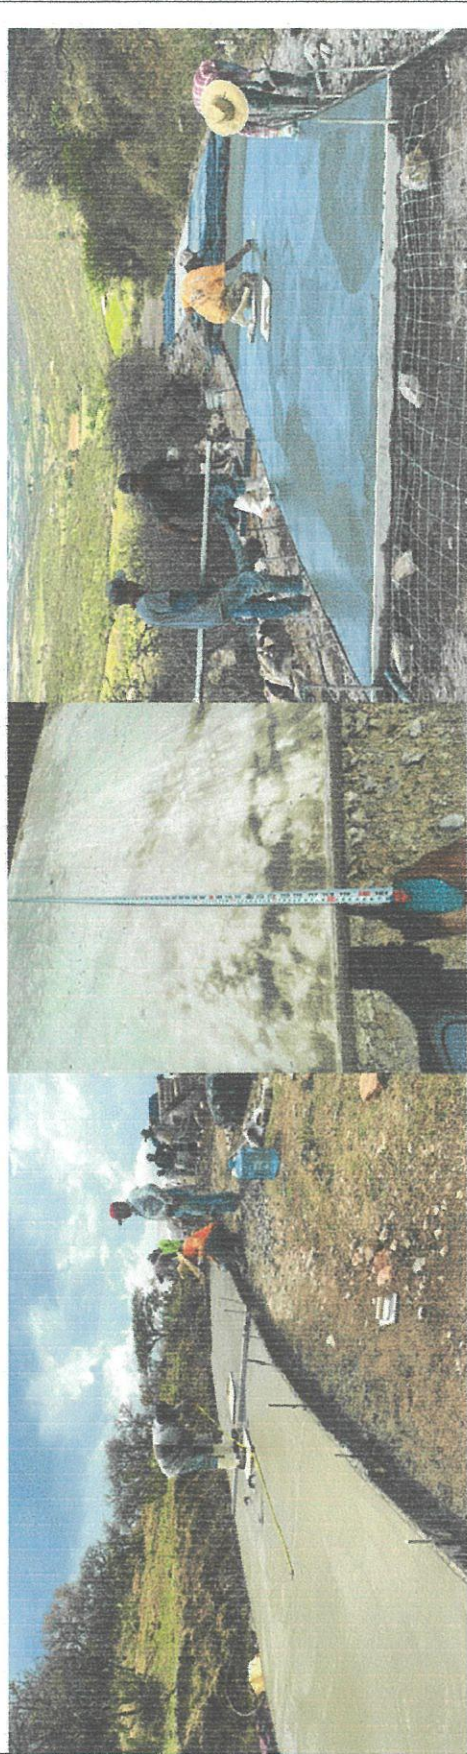

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 PAVIMENTO DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 AGREGADO DE 19 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERAMIENTAS MENORES.

Diana Miranda
 SUPERVISOR
 ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA

Ma. Mercedes R.F.
 CONTRATISTA
 MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

0121

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

ACUMULADO DE ESTIMACIONES



CONSTRUCCIONES RAMIREZ
PAVIMENTACION, REJILLAS, MEDICIONES DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE BARRIO

ACUMULADO DE ESTIMACIONES	NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.
	NO. DE CONTRATO: NOCHIS/FOND03III/2023/04
	UBICACION: RINCONADA DE VELAZO
	PERIODO: 02 DE JUNIO AL 04 DE SEPTIEMBRE
	IMPORTE DE CONTRATE: \$1,076,001.05

CLAVE DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO	CONTRATADO			ESTIMACION			POR ESTIMAR		
		CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICOS EN TERRENO PLANO Y LOMERIO.	930.76	\$9.22	\$8,581.58	930.76	\$9.22	\$8,581.58	0.00	\$9.22	0.00
2	CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE "B" INCLUYE: MAQUINARIA Y OPERADOR.	261.02	\$154.93	\$40,439.83	261.02	\$154.93	\$40,439.83	0.00	\$154.93	0.00
3	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEDO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B. PRIMER KILOMETRO, SOBRE CAMION DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA.	261.02	\$64.01	\$16,707.89	261.02	\$64.01	\$16,707.89	0.00	\$64.01	0.00
4	MEZCLADO TENIDDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE BSE COMPACTADA AL 100% UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO DE MATERIAL PETREO/50% MATERIAL DE BANCO-50% MATERIAL DE PETREO.	223.43	\$558.61	\$124,810.23	223.43	\$558.61	\$124,810.23	0.00	\$558.61	0.00
5	PAVIMENTO DE CONCRETO F'c = 250 KG/CM2 AGREGADO DE 19 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM DE ESPEOSR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 ROLL C DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTAS MENORES.	930.96	\$680.50	\$633,518.28	930.96	\$680.50	\$633,518.28	0.00	\$680.50	0.00
6	CUNETAS DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2 AGREGADO DE 19MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM, DE 10 CM DE ESPEOSR; CIMBRA METALICA MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTA.	262.00	\$395.15	\$103,529.30	262.00	\$395.15	\$103,529.30	0.00	\$395.15	0.00

IMPORTE	\$927,587.11
IVA	\$148,413.94
TOTAL	\$1,076,001.05

IMPORTE	\$927,587.11
IVA	\$148,413.94
TOTAL	\$1,076,001.05

IMPORTE	\$927,587.11
IVA	\$148,413.94
TOTAL	\$1,076,001.05

IMPORTE	\$927,587.11
IVA	\$148,413.94
TOTAL	\$1,076,001.05

Mg. Mercedes R.S.

CONTRATISTA
 MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

Diana Miranda

SUPERVISOR
 ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA

OPERADO

FAISM (FIII)

EJERCICIO 2023

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

0122

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Nº. REPORTE:	1
FECHA REPORTE:	02/06/2023

REAL PROGRAMADO	
% AVANCES FISICO	0
% AVANCES FINANCIERO	0

DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE:	PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE HOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.
UBICACION:	RINCONADA DE VELAZO NUEVA
TIPO DE OBRA:	CONTRATO
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO
Nº. CONTRATO:	NOCHISFONDIII/2023/04
EMPRESA:	CONTRUCCIONES RAMIREZ
MONTO CONTRATO:	\$1,076,001.05
FECHA CONTRATO:	02 DE JUNIO 2023
MONTO ANTICIPO:	S/A
FECHA PAGO ANTICIPO:	N/A
Nº. AMPL. DE CONTRATO:	N/A
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO TERM.
FECHAS PROGRAMADAS:	02-jun-23 04-sep-23
FECHAS REALES:	02-jun-23
FECHAS REPROGRAMADAS:	
OBSERVACIONES	

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ES DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO

PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO	
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
PRELIMINARES	\$9,694.58														6	6.38
TERRACERIA	\$57,147.72														24	25.53
TERRAPLENES Y BASE	\$ 124,810.23														28	27.66
CONCRETO	\$737,047.48														38	40.43
SUB-TOTAL	\$927,587.11															
TOTAL	\$1,076,001.05															

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:
ING. DIAGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

RESIDENTE DE SUPERVISION:
ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA

Diana Miranda

0123

CERRADO

FIRM (FIII)

EJERCICIO 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

% AVANCES FÍSICO	30	30
	FINANCIERO	0

REAL PROGRAMADO

No. REPORTE : 2	FECHA REPORTE : 06/09/2023
-----------------	----------------------------

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: PAVIMENTACIÓN CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

UBICACIÓN: RINCONADA DE VELAZO NUEVA

MODALIDAD EJEC.: CONTRATO

No. CONTRATO: NOCHISFONDOIII/2023/04

EMPRESA: CONTRUCCIONES RAMIREZ

MONTO CONTRATO: \$1,076,001.05

FECHA CONTRATO: 02 DE JUNIO 2023

MONTO ANTICIPO: S/A

FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 02-Jun-23 TERM: 04-sep-23

FECHAS PROGRAMADAS: 02-Jun-23

FECHAS REALES: 02-Jun-23

FECHAS REPROGRAMADAS:

OBSERVACIONES

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO. ESO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO CONCIDE LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO

PARTIDAS	IMPORTE\$	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO	
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
PRELIMINARES	\$8,661.69	█													24	25.53
TERRAGERIA	\$57,147.72	█													12	12.77
TERRAPLENES Y BASE	\$ 124,810.23	█													9	9.57
CONCRETO	\$737,047.99	█													24	25.53
SUB-TOTAL	\$927,587.11															
16% I.V.A.	\$146,413.94															
TOTAL	\$1,076,001.05															

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA


RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA
Diana Miranda

OPERADO



SM (FIII)

EJERCICIO 2023

0127



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
INFORME FOTOGRÁFICO

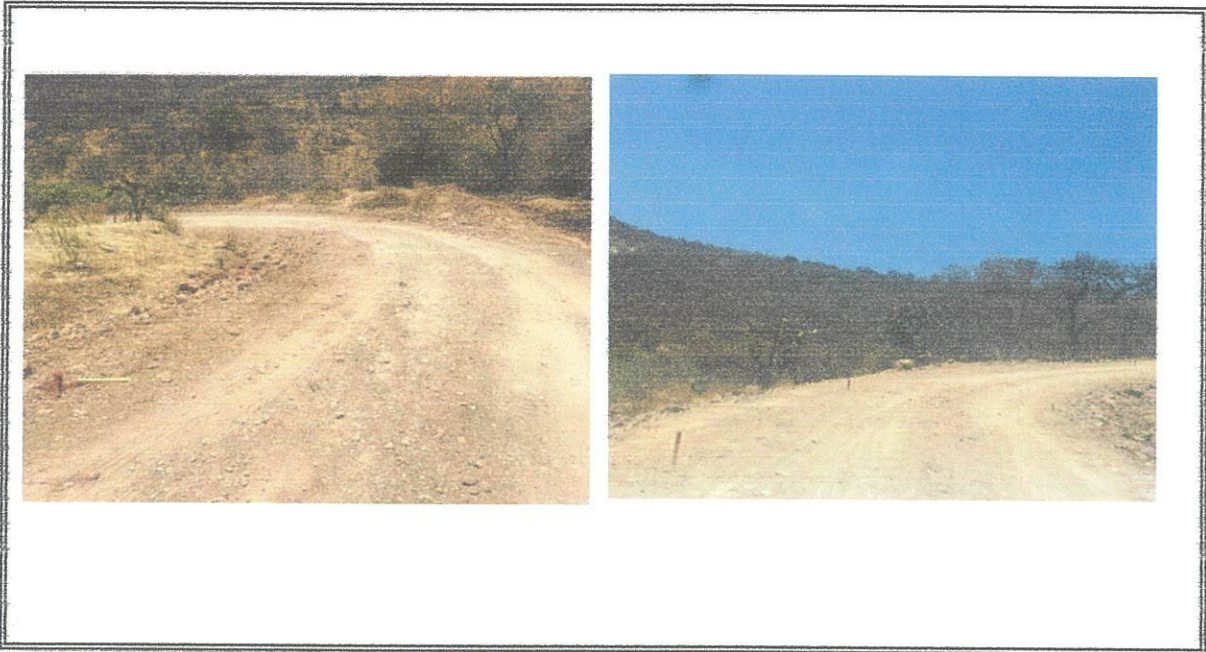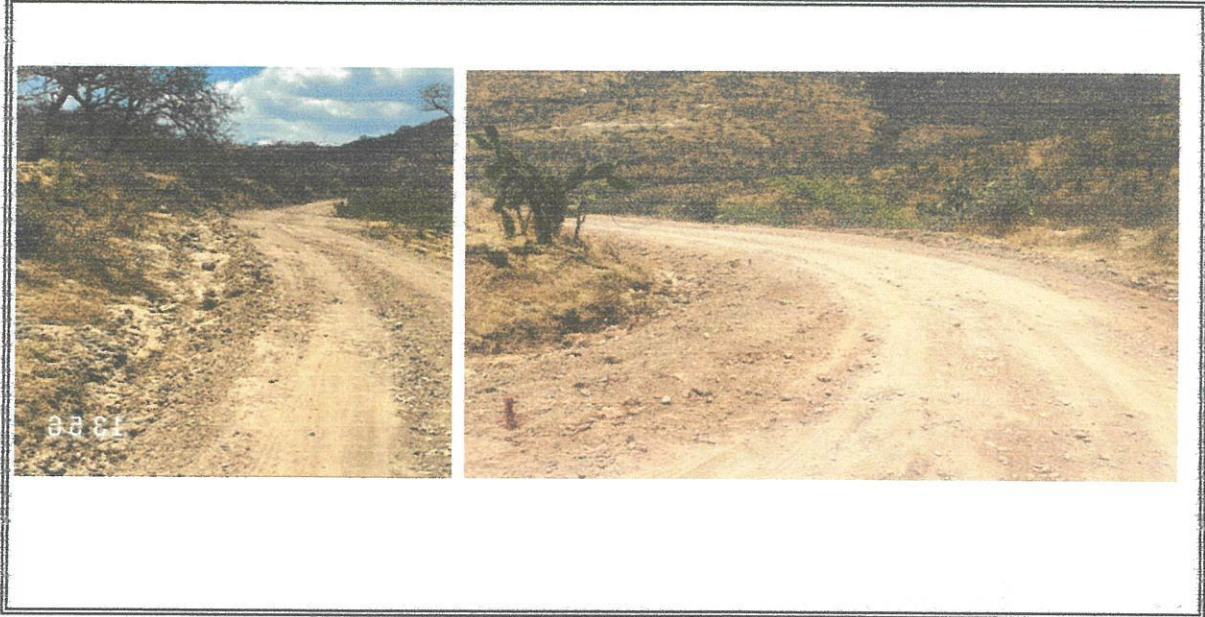

PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.
RINCONADA DE VELAZO
02 DE JUNIO DE 2023-04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
06/09/2023
30.00%

0125

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 23

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE :	3
FECHA REPORTE :	16/06/2023

REAL PROGRAMADO	% AVANCES FIBICO	40	40
	FINANCIERO	0	0

DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE: PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	
UBICACION: RINCONADA DE VELAZO	
TIPO DE OBRA: NUEVA	
MODALIDAD EJEC.: CONTRATO	
No. CONTRATO: NOCHISFONDI/III/2023/04	
EMPRESA: CONTRUCCIONES RAMIREZ	
MONTO CONTRATO: \$1,076,001.05	
FECHA CONTRATO: 02 DE JUNIO 2023	
MONTO ANTICIPO: S/A	
FECHA PAGO ANTICIPO: N/A	
No. AMPL. DE CONTRATO: N/A	
MONTO AMPL. CONTRATO: N/A	
FECHA AMPL. CONTRATO: N/A	
PERIODO DE EJECUCION	INICIO: _____ TERM: _____ FECHAS PROGRAMADAS: 02-Jun-23 04-sep-23 FECHAS REALES: 02-Jun-23 FECHAS REPROGRAMADAS: _____

OBSERVACIONES:

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ESO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO

PARTIDAS	IMPORTE\$	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO				
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MESES										
PRELIMINARES	\$8,591.59	█															24	25.53	
TERRAGERIA	\$57,147.72	█	█															12	12.77
TERRAPLENES Y BASE	\$ 124,810.23		█															9	9.57
CONCRETO	\$737,047.95		█															24	25.53
SUB-TOTAL	\$927,597.11																		
16% I.V.A.	\$148,413.94																		
TOTAL	\$1,076,001.05																		

EJERCICIO 2023

RESIDENTE DE SUPERVISION:
 ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA
Diana Miranda
 0126

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL :
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA




MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
INFORME FOTOGRAFICO




0127

OBRA: PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.
LOCALIDAD: RINCONADA DE VELAZCO
PERIODO DE EJECUCIÓN: 02 DE JUNIO DE 2023-04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA: 16/06/2023
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 40.00%

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 23




MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
INFORME FOTOGRÁFICO

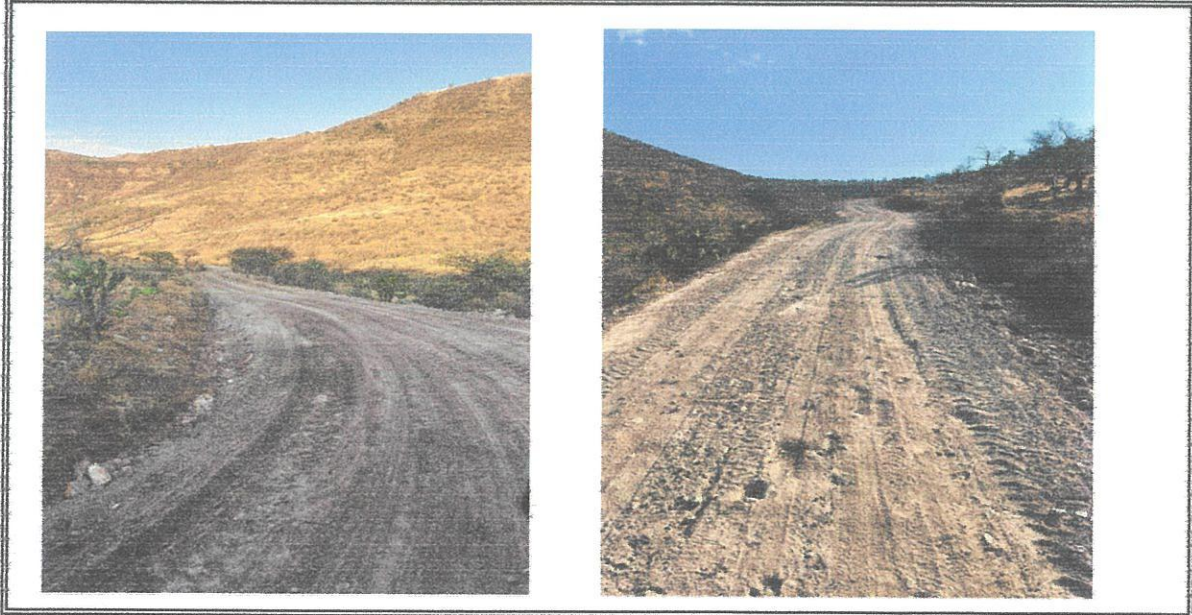

0129

PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.
RINCONADA DE VELAZCO
PERIODO DE EJECUCIÓN: 02 DE JUNIO DE 2023-04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA: 23/06/2023
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 45.00%



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

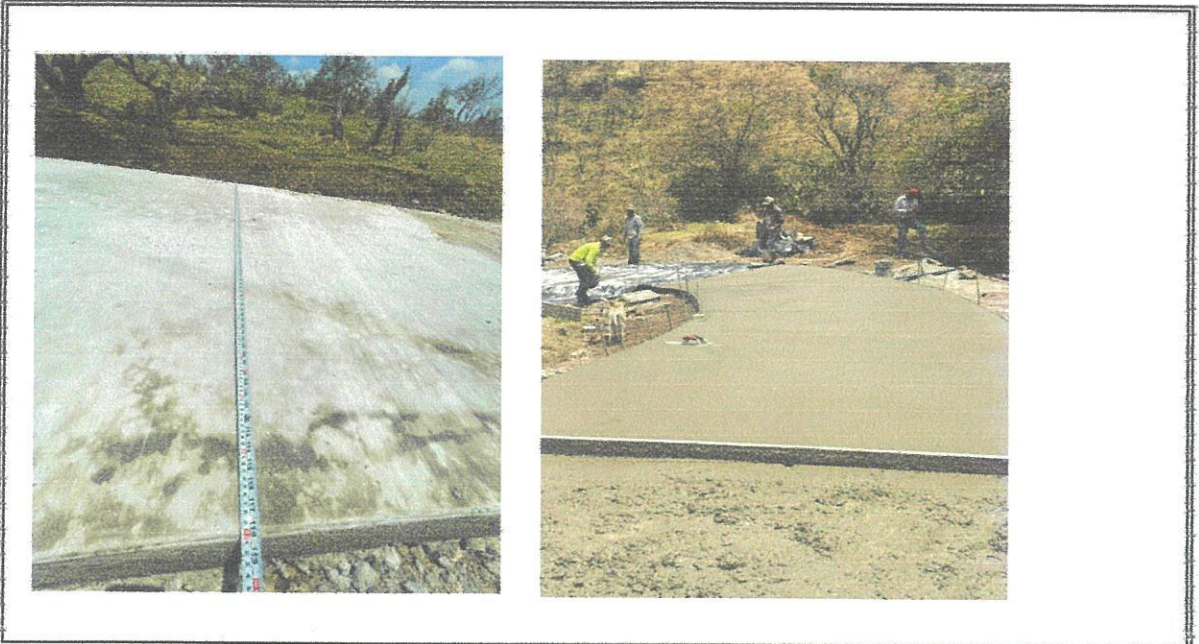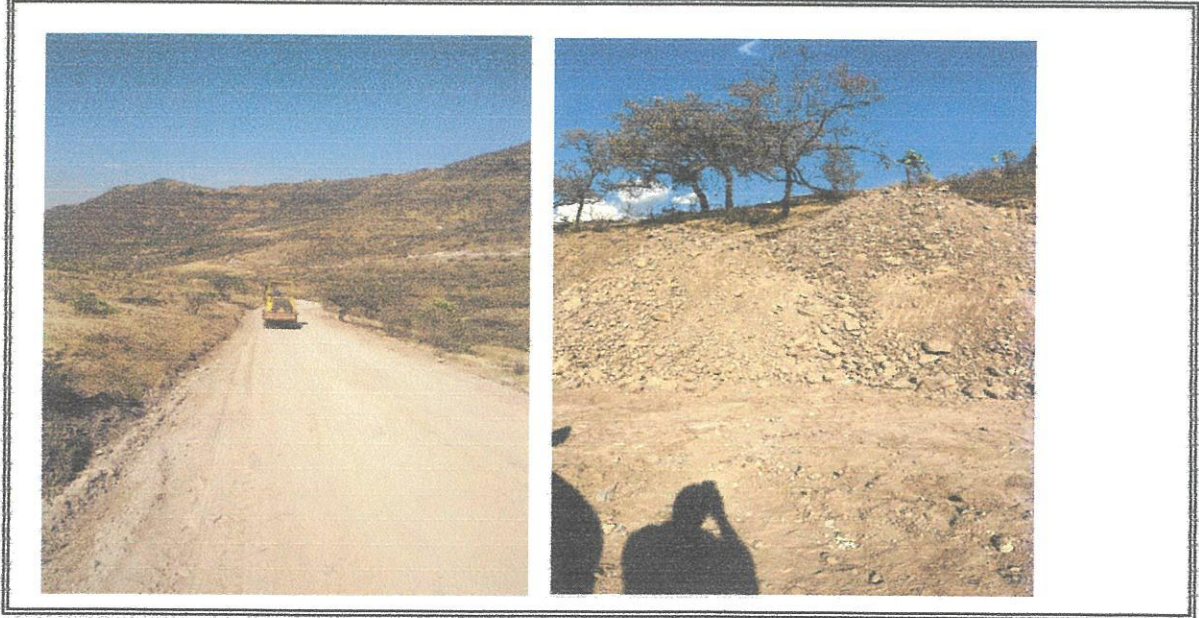

PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

0131

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

RINCONADA DE VELAZCO
02 DE JUNIO DE 2023-04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
30/06/2023
50.00%

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
INFORME FOTOGRÁFICO



0132

PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.
OBRA: RINCONADA DE VELAZO
LOCALIDAD: RINCONADA DE VELAZO
PERIODO DE EJECUCIÓN: 02 DE JUNIO DE 2023-04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA: 30/06/2023
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 50.00%

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Nº REPORTE :	6
FECHA REPORTE :	07/07/2023

REAL PROGRAMADO	
% AVANCES FISICO	60
FINANCIERO	0
	0

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZCO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE NEJUA, ZACATECAS.

UBICACION: RINCONADA DE VELAZCO
TIPO DE OBRA: NUEVA

MODALIDAD EJEC.: CONTRATO

Nº CONTRATO: NOCHIS/FONDI/III/23/04

EMPRESA: CONTRUCCIONES RAMIREZ

MONTO CONTRATO: \$1,076,001.05

FECHA CONTRATO: 02 DE JUNIO 2023

MONTO ANTICIPO: S/A

FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

Nº AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 02-Jun-23, TERM: 04-sep-23

FECHAS PROGRAMADAS: 02-Jun-23

FECHAS REALES: 02-Jun-23

FECHAS REPROGRAMADAS:

OBSERVACIONES:

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO. ESCO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO


PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO	
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
PRELIMINARES	\$9,881.58														24	25.83
TERRACERIA	\$57,147.72														12	12.77
TERRAPLENES Y BASE	\$ 124,810.23														9	9.57
CONCRETO	\$137,047.59														24	25.83
SUB-TOTAL	\$927,587.11															
18% I.V.A.	\$148,413.94															
TOTAL	\$1,076,001.05															

EJERCICIO 2023

CERRADO
FAM (FIII)

RENDIENTE DE SUPERVISION:
ARQ. DIANA NETTE MIRANDA LEDESMA
Diana Miranda


DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

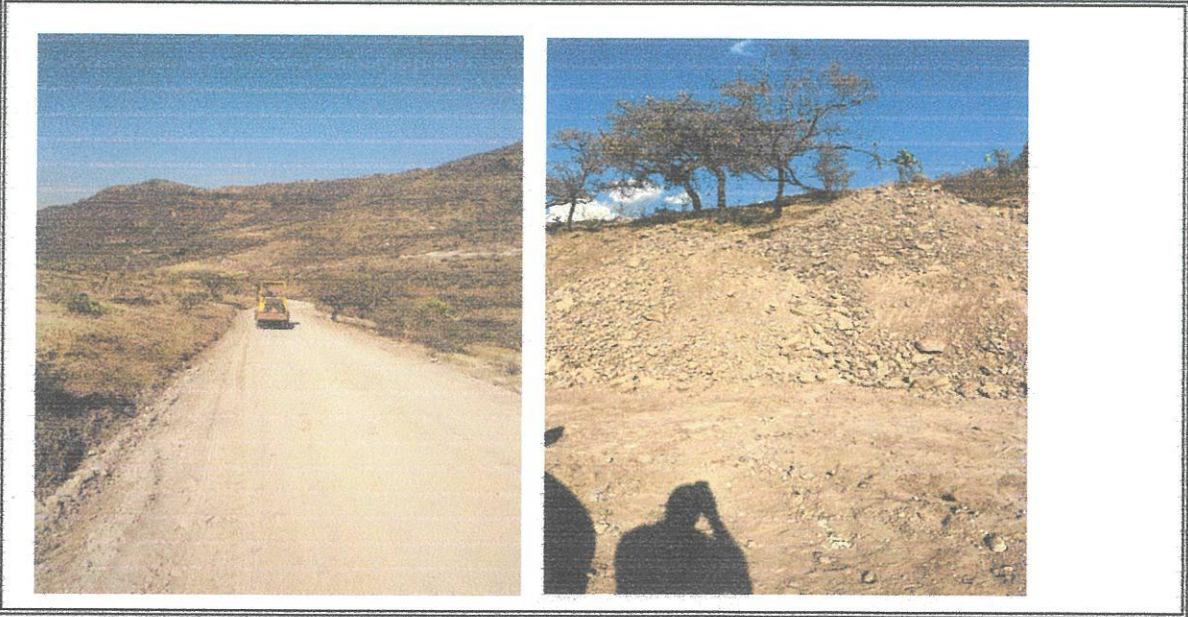

PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

0134


OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

RINCONADA DE VELAZCO
02 DE JUNIO DE 2023-04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
07/07/2023
60.00%

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
INFORME FOTOGRÁFICO

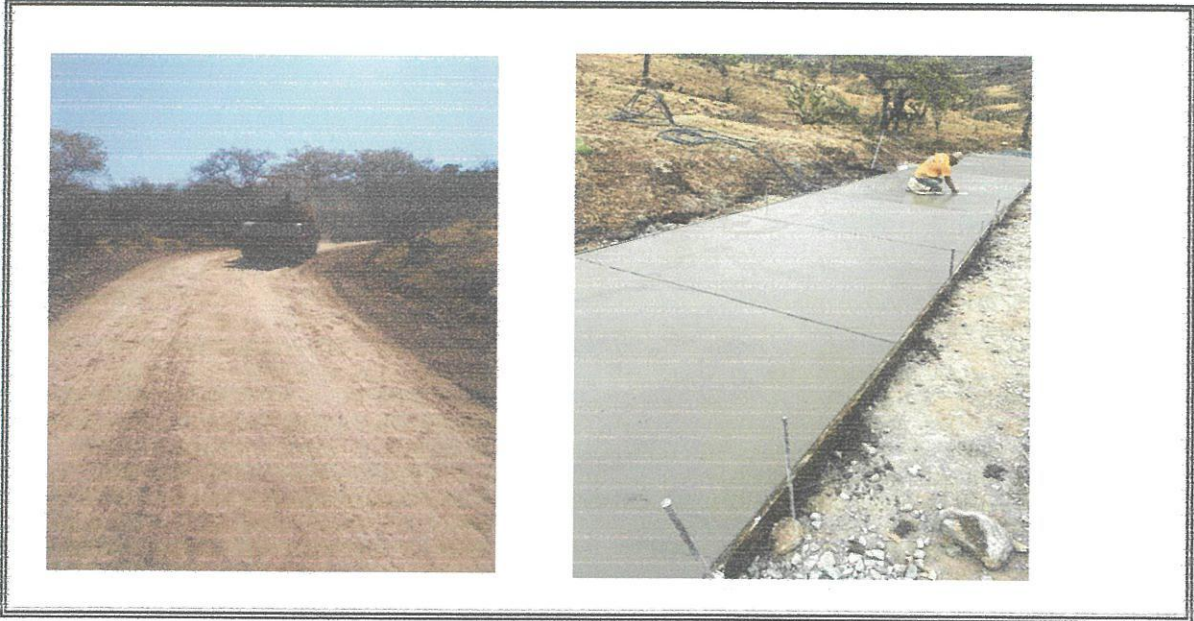

0135

OBRA: PAVIMENTACIÓN CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.
LOCALIDAD: RINCONADA DE VELAZCO
PERIODO DE EJECUCIÓN: 02 DE JUNIO DE 2023-04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA: 07/07/2023
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 60.00%

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Nº. REPORTE :	7
FECHA REPORTE :	14/7/2023

REAL PROGRAMADO	
% AVANCES FISICO	65
FINANCIERO	0
	65
	0

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

UBICACIÓN: RINCONADA DE VELAZO NUEVA

TIPO DE OBRA: NUEVA

MODALIDAD EJEC.: CONTRATO

Nº. CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/04

EMPRESA: CONTRUCCIONES RAMIREZ

MONTO CONTRATO: \$ 1,076,001.05

FECHA CONTRATO: 02 DE JUNIO 2023

MONTO ANTICIPO: S/A

FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

Nº. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 02-jun-23 TERM: 04-sep-23

FECHAS PROGRAMADAS: 02-jun-23

FECHAS REALES: 02-jun-23

FECHAS REPROGRAMADAS:

OBSERVACIONES

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO. ESO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO

PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO	
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
PRELIMINARES	\$3,581.58	█													24	25.53
TERRACERIA	\$57,147.72	█	█												12	12.77
TERRAPLENES Y BASE	\$ 124,810.23	█	█	█											9	9.37
CONCRETO	\$737,047.58	█	█	█											24	25.53
SUB-TOTAL	\$927,587.11															
16% I.V.A.	\$148,413.94															
TOTAL	\$1,076,001.05															

ELABORADO
 (FIII)
 EJERCICIO 2023

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
 ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMIA
Diana Miranda

0136


DR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

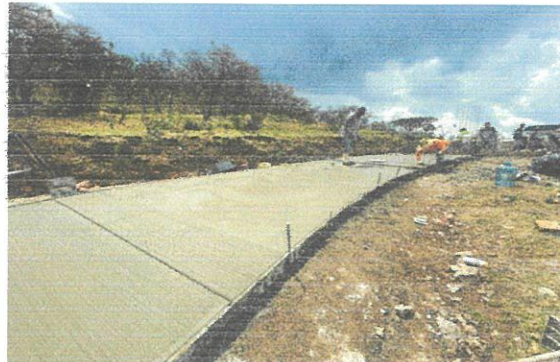

0137

PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

OBRA:

RINCONADA DE VELAZO

LOCALIDAD:

02 DE JUNIO DE 2023-04 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PERIODO DE EJECUCIÓN:

14/7/2023

FECHA



65.00%

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
INFORME FOTOGRÁFICO

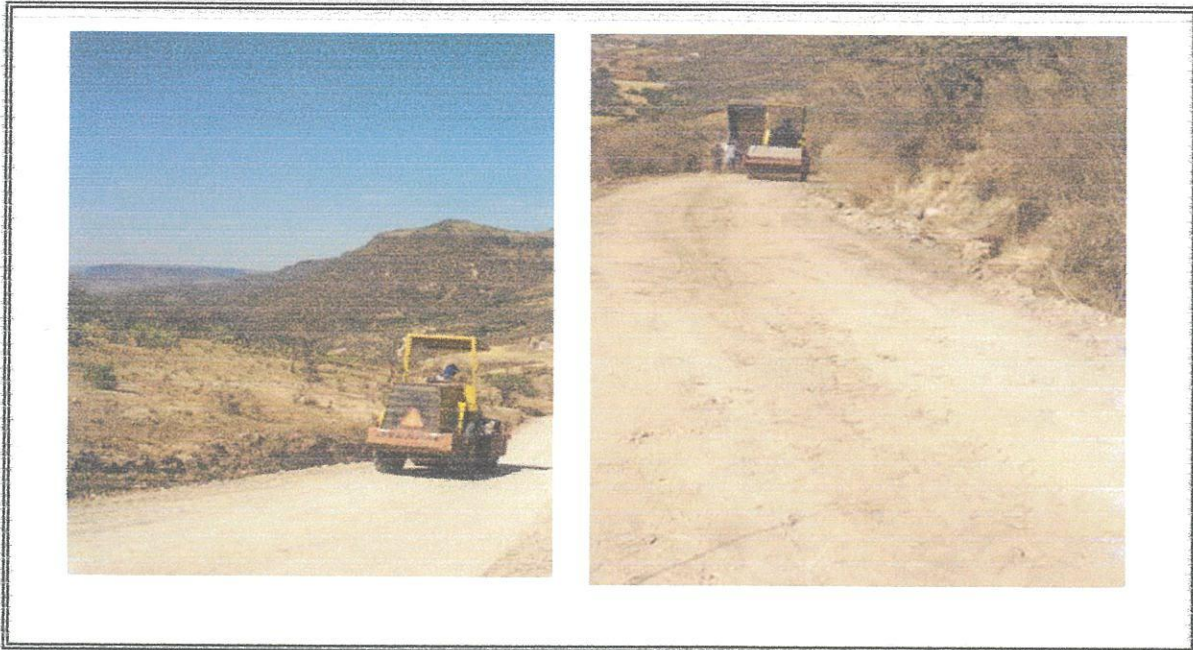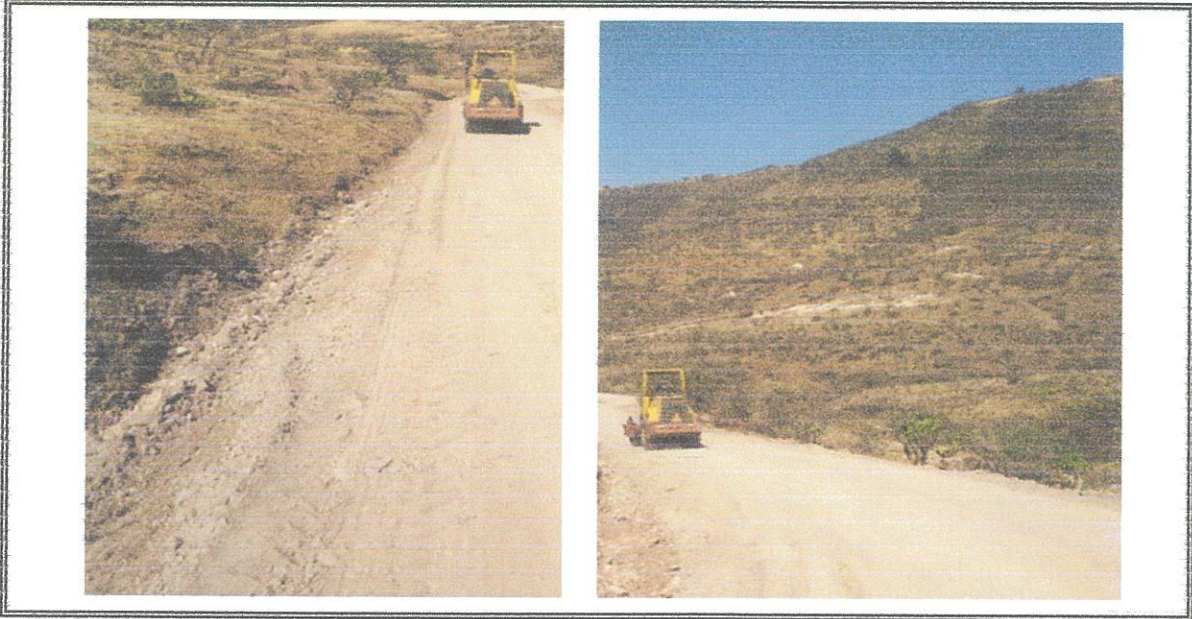

PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS. 0138
OBRA: RINCONADA DE VELAZCO
LOCALIDAD: RINCONADA DE VELAZCO
PERIODO DE EJECUCIÓN: 02 DE JUNIO DE 2023-04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA: 14/7/2023
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 65.00%

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

No. REPORTE:	8
FECHA REPORTE:	21/07/2023

% AVANCES	REAL PROGRAMADO	
	FÍSICO	70
FINANCIERO	0	0

PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO	
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
PRELIMINARES	\$9,881.58														24	25.53
TERRACERIA	\$57,147.72														12	12.77
TERRAPLENES Y BASE	\$ 124,810.23														9	9.57
CONCRETO	\$37,047.48														24	25.53
SUB-TOTAL	\$927,587.11															
16% I.V.A.	\$148,413.94															
TOTAL	\$1,076,001.05															94

DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE:	PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.
UBICACION:	RINCONADA DE VELAZO NUEVA
TIPO DE OBRA:	CONTRATO
MODALIDAD EJEC:	CONTRATO
No. CONTRATO:	NOCHIS/FONDI/III/2023/04
EMPRESA:	CONTRUCCIONES RAMIREZ
MONTO CONTRATO:	\$1,076,001.05
FECHA CONTRATO:	02 DE JUNIO 2023
MONTO ANTICIPO:	S/A
FECHA PAGO ANTICIPO:	N/A
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A
PERIODO DE EJECUCION	INICIO
FECHAS PROGRAMADAS:	02 Jun-23 04 sep-23
FECHAS REALES:	02 Jun-23
FECHAS REPROGRAMADAS:	

OBSERVACIONES

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO. ESO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO

OPERADO
SISM (FIII)
EJERCICIO 2023

RESIDENTE DE SUPERVISION:
ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA



Diana Miranda
0139



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

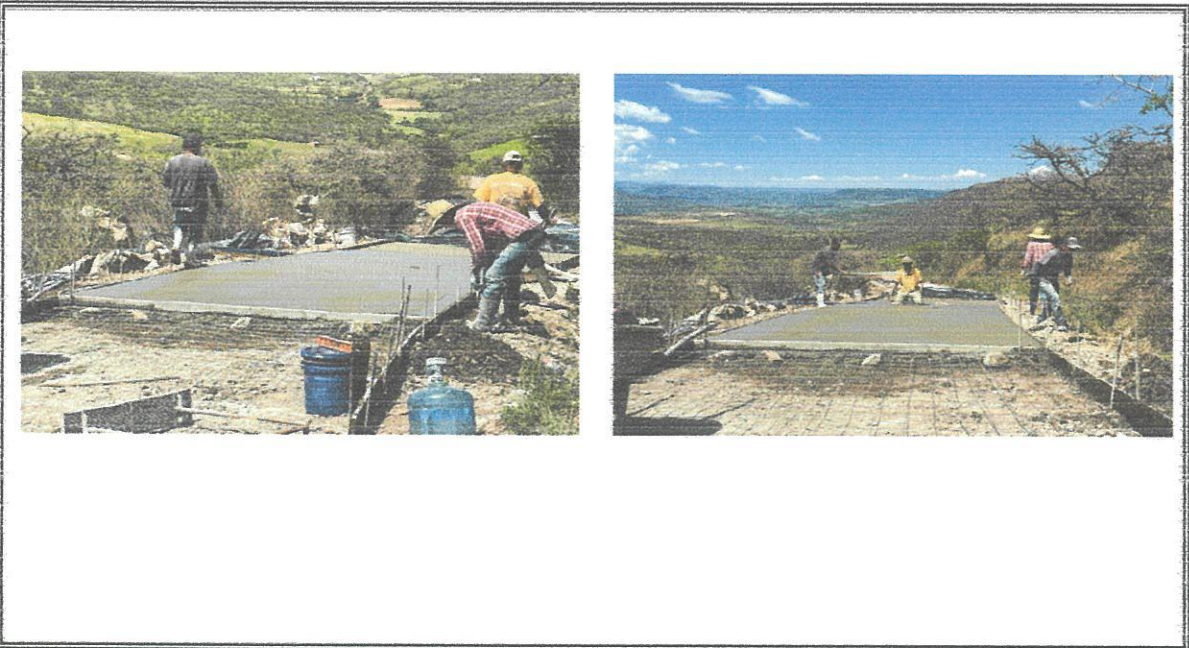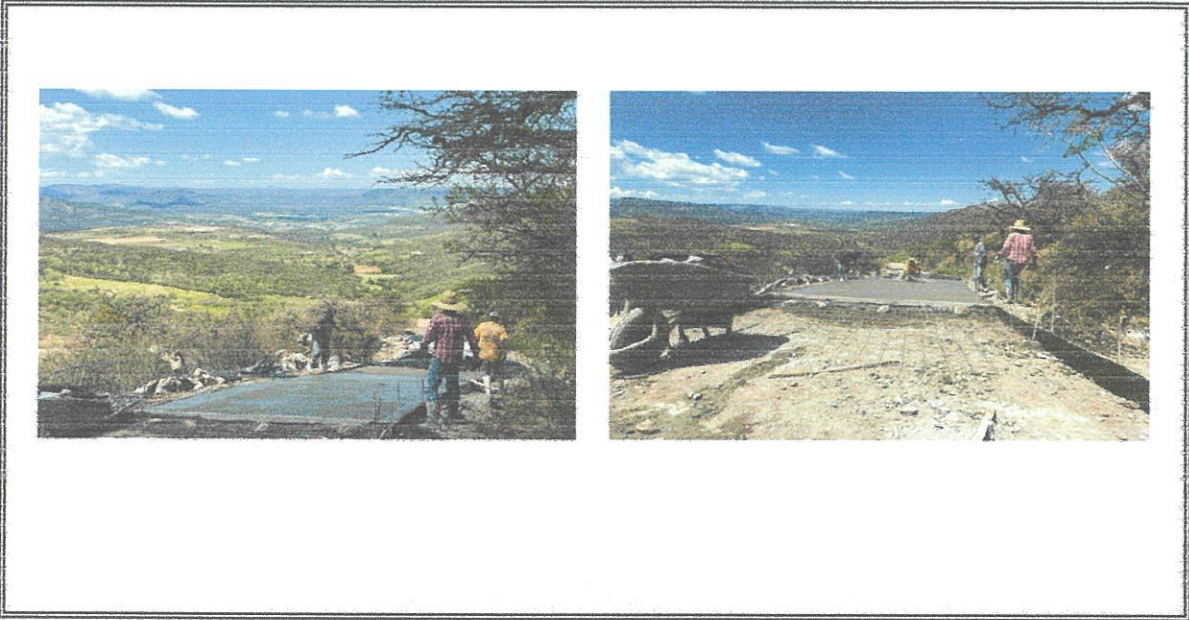

PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

0140

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

RINCONADA DE VELAZCO

02 DE JUNIO DE 2023-04 DE SEPTIEMBRE DE 2023

21/07/2023

70.00%

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

REAL PROGRAMADO	
% AVANCES FÍSICO	75
FINANCIERO	0
%	75
0	0

No. REPORTE :	9
FECHA REPORTE :	28/07/2023

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE MOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

UBICACIÓN: RINCONADA DE VELAZO NUEVA

TIPO DE OBRA: CONTRATO

MODALIDAD EJEC.: NOCHIS/FONDOII/2023/04

No. CONTRATO: CONTRUCCIONES RAMIREZ

EMPRESA: CONTRUCCIONES RAMIREZ

MONTO CONTRATO: \$1,076,001.05

FECHA CONTRATO: 02 DE JUNIO 2023

MONTO ANTICIPO: S/A

FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: TERM.

FECHAS PROGRAMADAS: 02-jun-23 04-sep-23

FECHAS REALES: 02-jun-23

FECHAS REPROGRAMADAS:

OBSERVACIONES

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ESO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO CONSIDERAMOS LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO

PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO	
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
PRELIMINARES	\$9,681.68	█													24	25.83
TERRACERIA	\$57,147.72	█	█												12	12.77
TERRAPLENES Y BASE	\$ 124,810.23	█	█												9	9.57
CONCRETO	\$137,047.58	█	█												24	25.53
SUB-TOTAL	\$927,587.11															
16% I.V.A.	\$148,413.94															
TOTAL	\$1,076,001.05															

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
 DR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL:
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA
Diana Miranda

PERIODO

SM (FIII)



EJERCICIO 2023



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

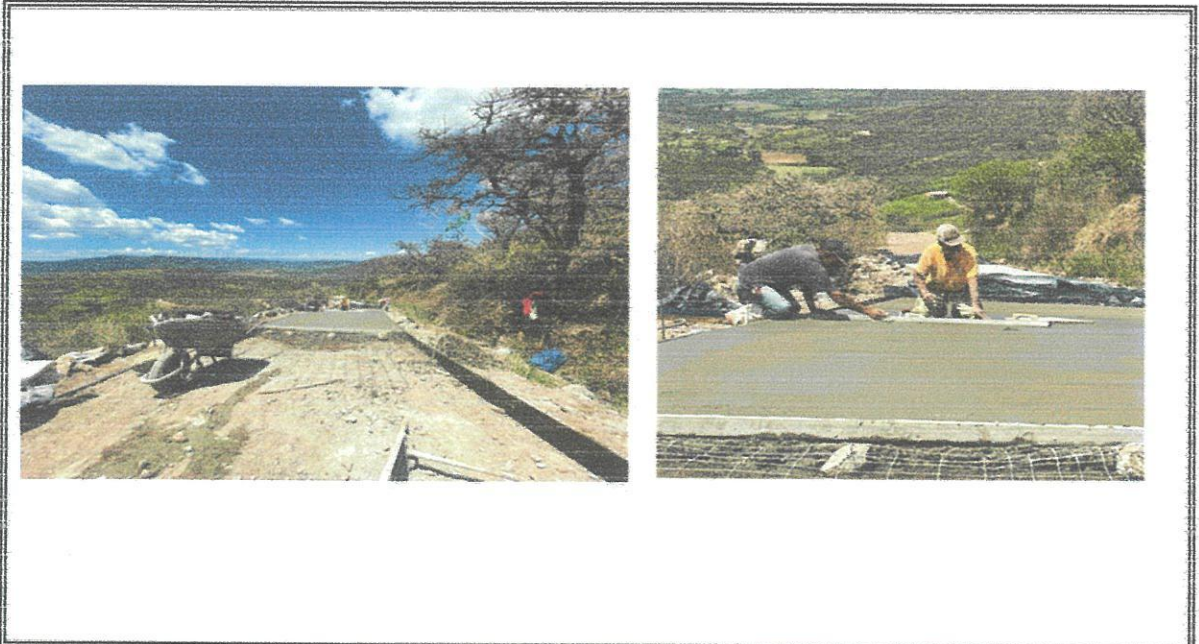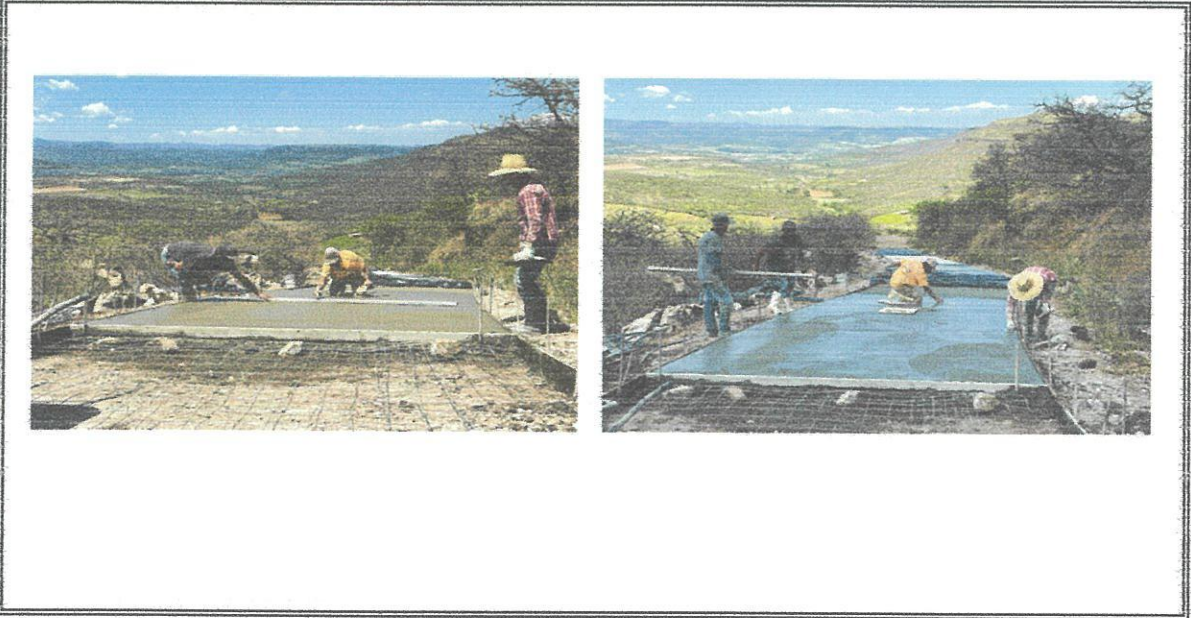

0142

OBRA: PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
LOCALIDAD: RINCONADA DE VELAZCO
PERIODO DE EJECUCIÓN: 02 DE JUNIO DE 2023-04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA: 28/07/2023
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 75.00%

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

REAL PROGRAMADO	
% AVANCES FISICO	80
% AVANCES FINANCIERO	0

Nº. REPORTE :	10
FECHA REPORTE :	08/04/2023

DATOS DE LA OBRA		
NOMBRE:	PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.	
UBICACIÓN:	RINCONADA DE VELAZO NUEVA	
TIPO DE OBRA:	CONTRATO	
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO	
Nº. CONTRATO :	NOCHISFOND0112023/04	
EMPRESA :	CONTRUCCIONES RAMIREZ	
MONTO CONTRATO :	\$ 1,076,001.05	
FECHA CONTRATO :	02 DE JUNIO 2023	
MONTO ANTICIPO :	S/A	
FECHA PAGO ANTICIPO :	N/A	
Nº. AMPL. DE CONTRATO:	N/A	
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A	
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A	
PERIODO DE EJECUCION	INICIO	TERM.
FECHAS PROGRAMADAS:	02-Jun-23	04-sep-23
FECHAS REALES:	02-Jun-23	

OBSERVACIONES	
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">CONTRATO 0143</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">FIRM (FIRM)</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">EJERCICIO 2023</p>	
EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO. ESO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COMIENZA LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO	


PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO	
		MESES														
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
PRELIMINARES	\$3,881.58	█													24	25.83
TERRACERIA	\$57,147.72	█	█												12	12.77
TERRAPIENES Y BASE	\$ 124,810.23	█	█												9	9.57
CONCRETO	\$737,047.58	█	█												24	25.83
SUB-TOTAL	\$927,887.11															
16% I.V.A.	\$148,413.94															
TOTAL	\$1,076,001.05														94	

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:

 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

RESIDENTE DE SUPERVISION:
 ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA


 Diana Miranda



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

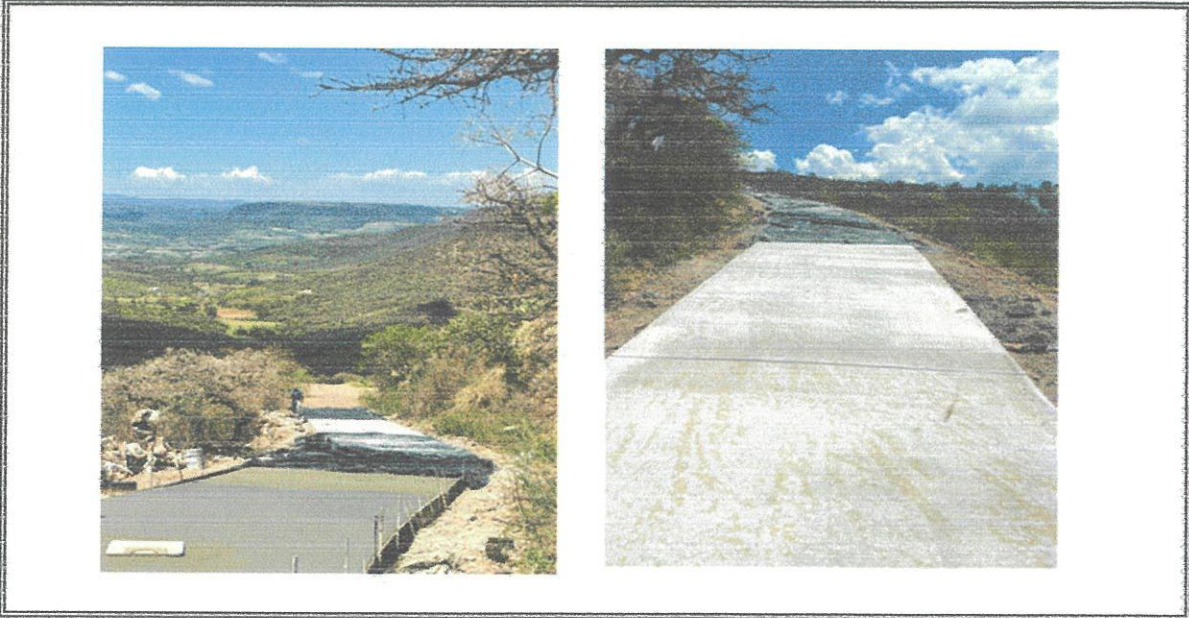

PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

0144

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

RINCONADA DE VELAZCO
02 DE JUNIO DE 2023-04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
08/04/2023
80.00%

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Nº. REPORTE: 11
 FECHA REPORTE: 08/11/2023

REAL PROGRAMADO	
% AVANCES FISICO	85
FINANCIERO	0
	85
	0

PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DÍAS	% EN BASE TIEMPO
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
PRELIMINARES	\$9,591.58													24	25.53
TERRACERIA	\$57,147.72													12	12.77
TERRAPLENES Y BASE	\$ 124,810.23													8	8.57
CONCRETO	\$737,047.58													24	25.53
SUB-TOTAL	\$927,597.11														
16% I.V.A.	\$148,413.94														
TOTAL	\$1,076,011.05														

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

UBICACION: RINCONADA DE VELAZO NUEVA

TIPO DE OBRA: NUEVA

MODALIDAD EJEC.: CONTRATO

Nº. CONTRATO: NOCHIS/FONDI/III/2023/04

EMPRESA: CONTRUCCIONES RAMIREZ

MONTO CONTRATO: \$1,076,001.05

FECHA CONTRATO: 02 DE JUNIO 2023

MONTO ANTICIPO: S/A

FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

Nº. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 02-jun-23 TERM.: 04-sep-23

FECHAS PROGRAMADAS: 02-jun-23

FECHAS REALES: 02-jun-23

FECHAS REPROGRAMADAS:

OBSERVACIONES:


EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO. ESO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO

GRADO
 FARM (FIII)
 EJERCICIO 2023

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

RESIDENTE DE SUPERVISION:
 ARO. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA


Diana Miranda
 0145



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

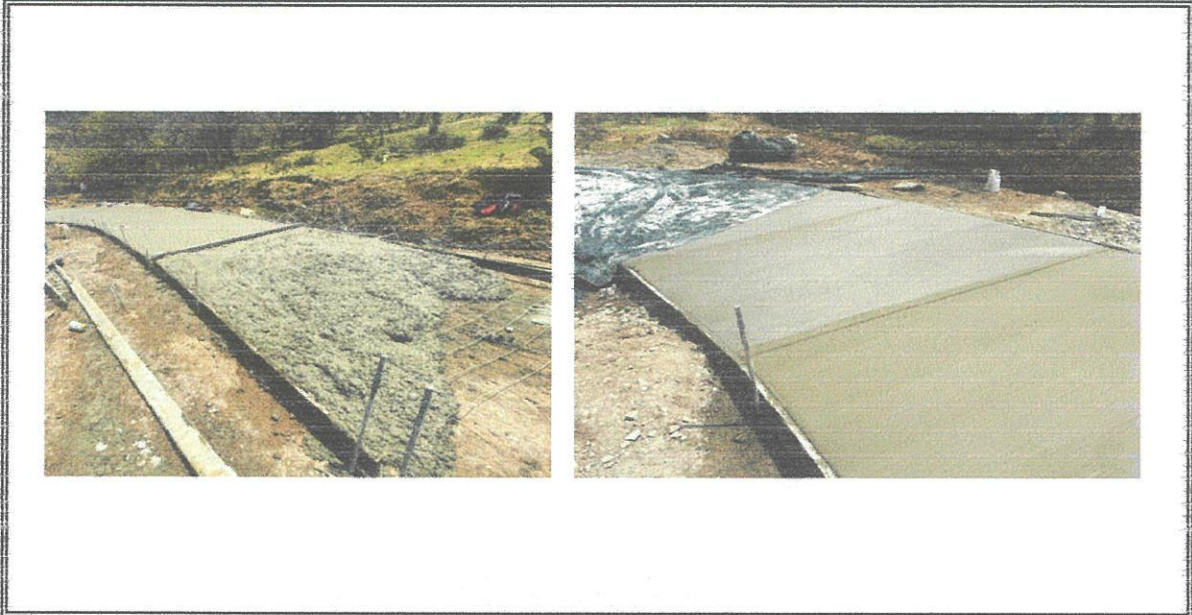

0146

PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

RINCONADA DE VELAZCO
02 DE JUNIO DE 2023-04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
08/11/2023
85.00%

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



0148

PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

OBRA:
LOCALIDAD:

RINCONADA DE VELAZCO

PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA

02 DE JUNIO DE 2023-04 DE SEPTIEMBRE DE 2023

18/8/2023

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

93.00%


OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

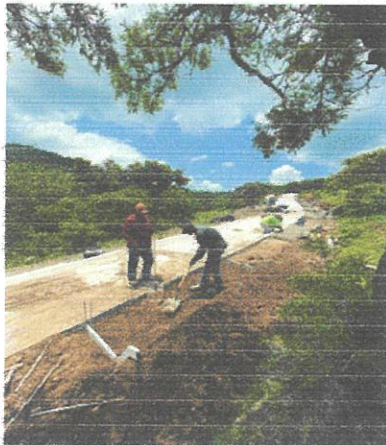

PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

0150

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA


PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

RINCONADA DE VELAZCO

02 DE JUNIO DE 2023-04 DE SEPTIEMBRE DE 2023

25/8/2023

97.00%



INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

% AVANCES	REAL		PROGRAMADO	
	FISICO	100	100	100
FINANCIERO	0	0	0	0

No. REPORTE : 14	08/01/2023
FECHA REPORTE :	

DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE: PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	
UBICACION: RINCONADA DE VELAZO	
TIPO DE OBRA: NUEVA	
MODALIDAD EJEC.: CONTRATO	
No. CONTRATO: NOCHISFONDIII/2023/04	
EMPRESA: CONTRUCCIONES RAMIREZ	
MONTO CONTRATO: \$1,076,001.05	
FECHA CONTRATO: 02 DE JUNIO 2023	
MONTO ANTICIPO: S/A	
FECHA PAGO ANTICIPO: N/A	
No. AMPL. DE CONTRATO: N/A	
MONTO AMPL. CONTRATO: N/A	
FECHA AMPL. CONTRATO: N/A	
PERIODO DE EJECUCION: INICIO TERM.	
FECHAS PROGRAMADAS: 02-jun-23 04-sep-23	
FECHAS REALES: 02-jun-23	
FECHAS REPROGRAMADAS:	
OBSERVACIONES	
EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ESO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO	

PARTIDAS	IMPORTE\$	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO		
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE									
PRELIMINARES	\$9,481.58	█														24	25.53
TERRACERIA	\$57,147.72	█	█													12	12.77
TERRAPLENES Y BASE	\$ 124,810.23	█	█													9	9.57
CONCRETO	\$737,047.58	█	█													24	25.53
SUB-TOTAL	\$927,587.11																
16% I.V.A.	\$148,413.94																
TOTAL	\$1,076,001.05															94	

EJERCICIO 2023


FUNDADO
FOM (FIII)

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL :
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

RESIDENTE DE SUPERVISION:
ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA

Diana Miranda

0151



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



0152


OBRA: PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.
LOCALIDAD: RINCONADA DE VELAZCO
PERIODO DE EJECUCIÓN: 02 DE JUNIO DE 2023-04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA: 09/01/2023
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 100.00%

**OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023**



CONSTRUCCIONES "RAMIREZ"

PLANOS, AVALUOS, PERTAJES, MEDICION DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL

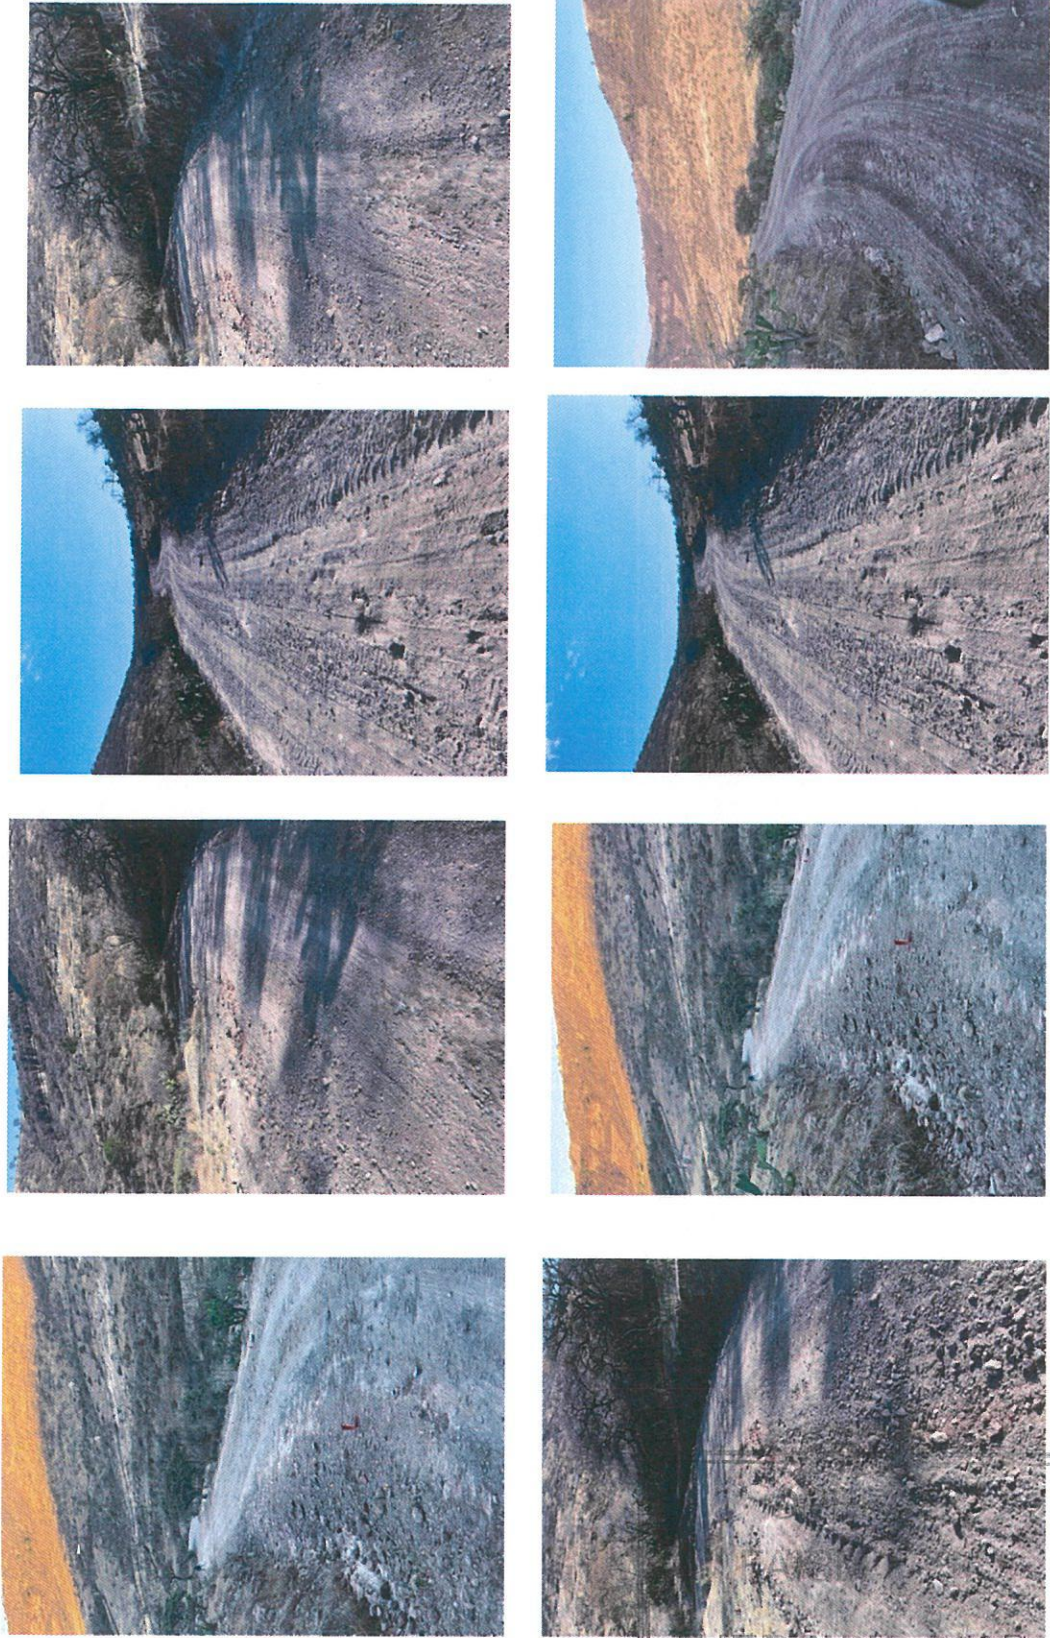



EJERCICIO 2023

0153



CONSTRUCCIONES "RAMIREZ"

PLANOS, AVALUOS, PERITAJES, MEDICION DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL



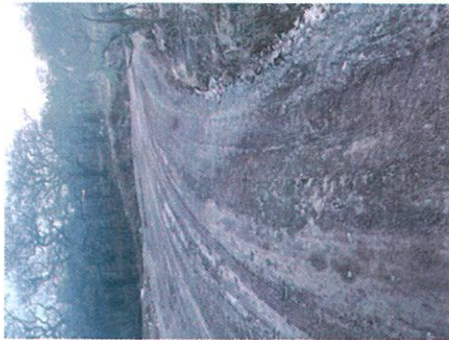
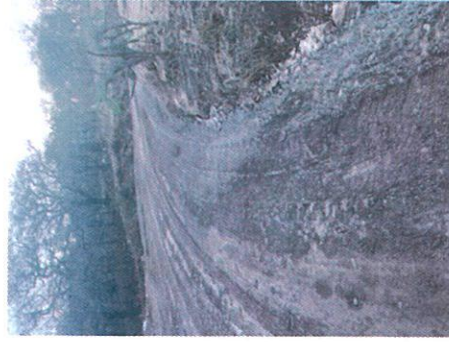


0154

TERMINADO
S.M. (FIII)
ENERO 2023

CONSTRUCCIONES "RAMIREZ"

PLANOS, AVALUOS, PERITAJES, MEDICION DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL

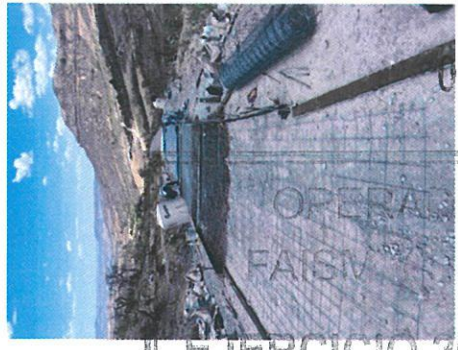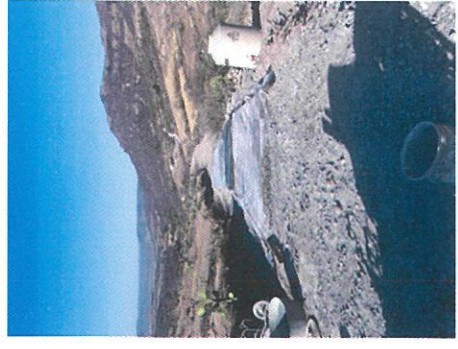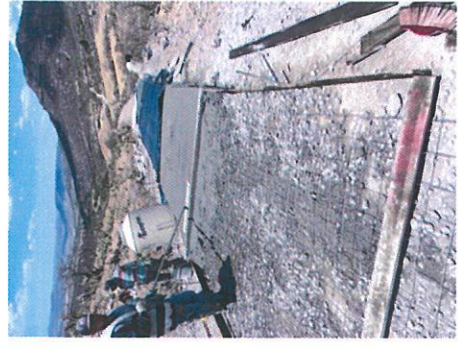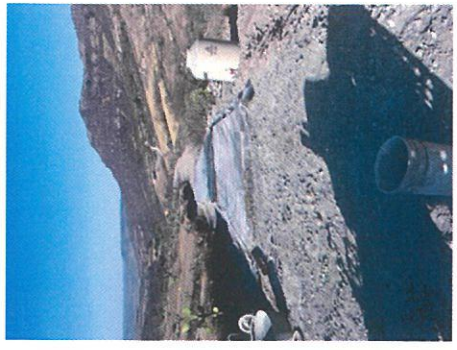


0155
OPERA O
FAISV (III)
EJERCICIO 20 23



CONSTRUCCIONES "RAMIREZ"

PLANOS, AVALUOS, PERITAJES, MEDICION DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL

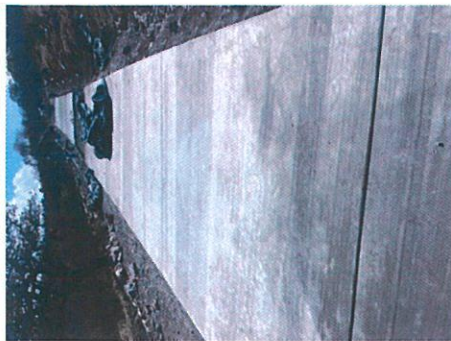

0156


OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 23

MEMORIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA RINCONADA DE VELAZCO



CONSTRUCCIONES "RAMIREZ"

PLANOS, AVALUOS, PERITAJES, MEDICION DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL

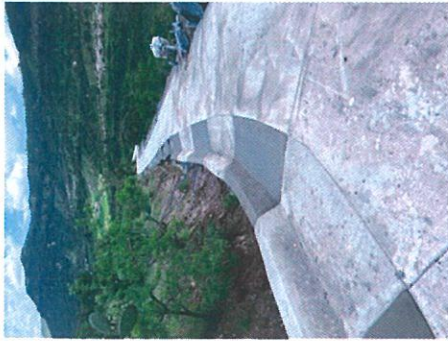

0157

DO
FIII)

2023

MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LA OBRA RINCONADA DE VELAZCO



INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA DE MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA (FT-103.1)

CLIENTE: MA. MERCEDES RODRÍGUEZ FUENTES
 RESPONSABLE: MA. MERCEDES RODRÍGUEZ FUENTES
 OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A RINCONADA DE VELASCO
 PROCEDENCIA: EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS
 UTILIZADO COMO: CAPA DE BASE HIDRÁULICA

FECHA: 30-jun-23
 HOJA: 1 de 1
 MUESTRA: TprinconadaY_01-23
 MUESTREÓ: A.J.V.
 CAPTURÓ: Y.J.M.

ENSAYO	MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA (kg/m ³)	CONTENIDO DE AGUA OPTIMO (%)
1	1,491	20.0

REFERENCIAS:

- NMX-C-416-ONNCCE-VIGENTE Muestreo de Estructuras Terreas y Métodos de Prueba.
- 9. Masa volumétrica seca máxima y contenido de agua óptimo
- NMX-C-467-ONNCCE-VIGENTE Metodos de muestreo.
- NMX-C-475-ONNCCE-VIGENTE Determinación del contenido de agua mediante horno.
- NMX-C-503-ONNCCE-VIGENTE Determinación de contenido de agua mediante secado rapido.
- NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida.

Gonzalo Rodriguez

- Ing. Esp. Álvaro Arriola López (AAL)
Director Técnico / Proyectos Geotécnicos
- Ing. María del Conzuelo Rodríguez Ramírez (MCRR)
Jefe Área de diseño
- M.I. José Alejandro Salcedo Becerra (JASB)
Director General

[Handwritten signature]

- Ing. José Salcedo Zuñiga (JSZ)
Director Técnico / Control de Calidad
- Ing. Gerardo Carrillo Gómez (GCG)
Responsable de Aseguramiento de Calidad
- Ing. Victor Manuel Gutierrez Barajas (VMGB)
Director de Residencia de Obras

0158

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2023

Este informe no puede ser alterado, ni reproducido total ó parcialmente.
 El informe de resultados se refiere única y exclusivamente a las muestras sometidas a prueba.



**(FT-107.1) INFORME DE RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE COMPACTACIÓN
MÉTODO DE LA TROMPA Y ARENA**

CLIENTE: MA. MERCEDES RODRÍGUEZ FUENTES
RESPONSABLE: MA. MERCEDES RODRÍGUEZ FUENTES
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A RINCONADA DE VELASCO
DIRECCIÓN: EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

FECHA: 30-jun-23
ARCHIVO: TCrinconadaY_01-23
HOJA: 1 de 1
TÉCNICO: A.J.V.
CAPTURÓ: Y.J.M.

Espesor de capa de proyecto:	20 cm	Grado de Compactación de Proyecto (%):	100
-------------------------------------	-------	---	-----

Clave de laboratorio	1	2	3	-	-	-
Fecha de muestreo	30-jun-23	30-jun-23	30-jun-23	-	-	-
Localización	Km 0+400 / Lado: Centro / Capa: Base Hidráulica	Km 0+300 / Lado: Izquierdo / Capa: Base Hidráulica	Km 0+200 / Lado: Derecho / Capa: Base Hidráulica	-	-	-
Prof. Capa (cm)	20	18	19	-	-	-
Tipo de MVSM	Porter	Porter	Porter	-	-	-
MVSM (kg/m ³)	1491	1491	1491	-	-	-
MVSL (kg/m ³)	1490	1493	1489	-	-	-
Contenido de Agua (%)	Optima	20	20	-	-	-
	Lugar	20.1	18.0	21.1	-	-
Grado de Compactación (%)	100	100	100	-	-	-

REFERENCIAS:

- NMX-C-467-ONNCE-VIGENTE Metodos de muestreo.
- NMX-C-475-ONNCE-VIGENTE Determinación del contenido de agua mediante horno.
- NMX-C-476-ONNCE-VIGENTE Compactación dinamica estandar y modificada.
- NMX-C-503-ONNCE-VIGENTE Determinación de contenido de agua mediante secado rapido.
- NMX-C-507-ONNCE-VIGENTE Masa volumétrica seca del lugar por el método de trompa y arena.
- NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida.


Observaciones:

El grado de compactación obtenido en la Capa de Base Hidráulica cumple con lo indicado en el proyecto.

- Gonzalo Rodriguez*
- Ing. Esp. Álvaro Arriola López (AAL)
Director Técnico / Proyectos Geotécnicos
 - Ing. María del Conzuelo Rodríguez Ramírez (MCRR)
Jefe Área de diseño
 - M.I. José Alejandro Salcedo Becerra (JASB)
Director General

- Ing. José Salcedo Zuñiga (JSZ)
Director Técnico / Control de Calidad
- Ing. Gerardo Carrillo Gómez (GCG)
Responsable de Aseguramiento de Calidad
- Ing. Victor Manuel Gutierrez Barajas (VMGB)
Director de Residencia de Obras

0159



Este informe no puede ser alterado, ni reproducido parcialmente.
 El informe de resultados se refiere única y exclusivamente a las muestras sometidas a prueba.

CONSTRUCCIONES "RAMIREZ"

PLANOS, AVALUOS, PERITAJES, MEDICION DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ACTA DE TERMINO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS"

Siendo la 14:00 horas del día 04 de septiembre de 2023, se reúnen las partes que intervinieron en dicho contrato de una parte el super intendente de obra, el Ing. Luis David Ramírez el representante legal de la constructora y por parte del H. Ayuntamiento la Arquitecto Diana Ivette Miranda Ledesma, supervisora de la obra. Para proceder la verificación y suscripción de la presente ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA, bajo los siguientes términos:

PRIMERO. - El intendente de obra, se encargó de la obra "PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELAZO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS".

SEGUNDO. - La obra se inició el 04 de septiembre de 2023 y culmino el 01 de septiembre de 2023, con 94 días calendarios de habiéndose terminado al 100% con la obra.

TERCERO. - La obra está culminada al 100 %, se ha verificado cada una de las partidas según el expediente técnico aprobado, además el residente ha cumplido con levantar las observaciones que se han formulado y no habiendo más observaciones se da por culminada con la ejecución de la obra.

CUARTO. - El supervisor de obra comunicara a la Entidad para que proceda a la conformación de comité de recepción y proceda al respectivo acto de recepción de obra.

No habiendo más observaciones y en serial de conformidad se suscribe la presente **ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA.**

POR EL AYUNTAMIENTO

Diana Miranda
ARQ. DIANA IVETTE MIRANDA LEDESMA

CONTRATISTA

Ma. Mercedes Rodríguez Fuentes
C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

0163

FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023
