


MEMORIA FOTOGRAFICA

NOMBRE DE LA OBRAS: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS		CONTRATO: NOCHIS/FOND011/2023/21	CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA	PROGRAMA: PROGRAMA
FECHA DE CONTRATO: FECHA DE INICIO DE OBRA: 08 DE NOVIEMBRE 2023 PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	LOCALIDAD: LINDA VISTA - LOS SANDOVALES	FAISM: FAISM
DESCRIPCION DE CONCEPTO: CLAVE 014 DALLA O CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO SECCION 0.40X0.50 M CON FABRICACION DE CONCRETO F'c= 180 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM JUNGLUYA CUBIERTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM CON REVOLVEDORA, Y SACO TROSCO, HAZO DE CERA DE FABRICACION, BAJAS RESISTENCIAS, CIRIBOS ACABADO CORUN A 4 USOS, ARMADO CON VARRILLAS DEL NUMERO 3 (3/8") DEL NUMERO 2.5 (1/4") Y BARRIDOS A CADA 0.5 MET. DEL NUMERO 2.5. INCLUYE TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIRIBO Y DESCRIBIDA, CORTES, TRABAJOS, DESPESAS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MAHO DE OBRAS, EQUIPO Y FURNAMIENTA DE MAHO		EST. No.: 1	NOTAS: 08/11/2023 A	PERIODO DE: 31 DE: 30 31/12/2023
MONTO CONTRATADO: \$1,799,692.25				



LOGO DE LA EMPRESA

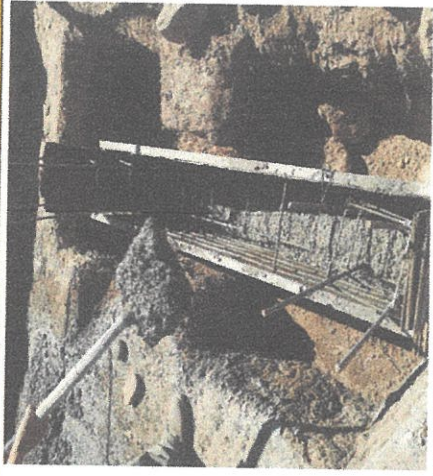

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO GUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

0201

GENERADORES

CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA
 LOCALIDAD: LINDA VISTA - LOS SANDOVALES
 MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 EST. NO. 1
 HOJA: 12 DE 30
 PERIODO DE: 08/1/2023 A 31/12/2023
 NOTAS:

CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2023/21
 MONTO CONTRATADO: \$1,799,692.25


SERVICIOS MELENDEZ
 CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

FECHA DE CONTRATO: 08/11/2023
 FECHA DE INICIO DE OBRAS: 08/11/2023
 FECHA DE TERMINO: 31/12/2023

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 DALLA O CADERA DE CEMENTO DE SECCION 6. SEGUN EL DISEÑO DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2. ADERADO DE 20 MM. INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA. EN REVESTIMIENTOS DE 8 A 10 CM. CON REVOLVEDORA. Y BICO TRIMPO, MANO DE OBRERA DE FABRICACION, BAJAS RESISTENCIAS, CHISPA ACABADO COMUN A 4 UNOS, ARMADO CON 4 VARELLAS DE NUMERO 3 (3"7) Y BARRIDOS A CADA 0.15 MTS. DEL NUMERO 2.6. INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CHISPA Y DESCARRERA, CONTES, TRASLAPES, DESPERDIGOS, VULNERADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO

LOCALIZACION	EJE	TRAMO	TIPO	ANCHO	LARGO	ALTO	AREA	UNIDAD
	A-B	1	CAB. CARRAM.	1.0				MIL
	A-B	2	CAB. CARRAM.	1.0				MIL
							TOTAL	3.20

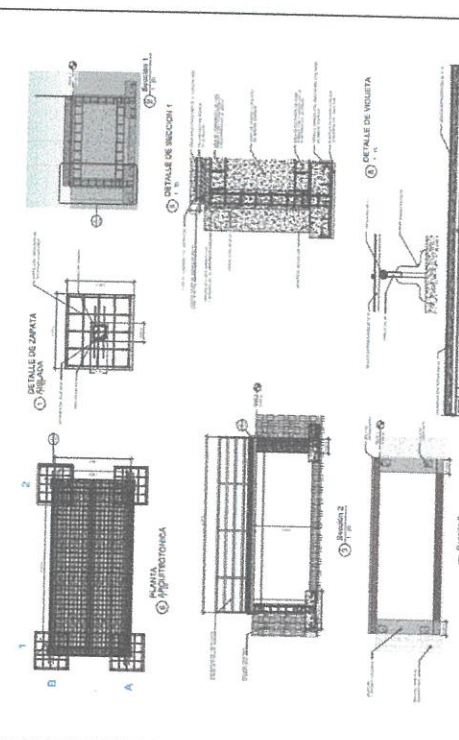

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERVADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA




MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/21		CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAGATECAS		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
MONTA CONTRATADO: \$1,799,692.25		LOCALIDAD: LINDA VISTA - LOS SANDOVALES	
FECHA DE CONTRATO: FECHA DE INICIO DE NOVIEMBRE 2023 PLAZO DE EJECUCION: 66 DIAS FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023		EST. No.: 1	
DESCRIPCION DE CONCEPTO: CLAVE 016		HOJA: 13	
		PERIODO DE: 08/11/2023 A 31/12/2023	
		NOTAS:	



LADO DE LA OBRA

MURO DE FORMAS DE 30 CM DE ANCHO A BASE DE PIEDRA BOLA Y CONCRETO HIECO EN CUBA PUNTO NEGRO ADEGRADO MAXIMO SOMA CON UN REVENDIMIENTO DE 5 A 10 CM A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.00

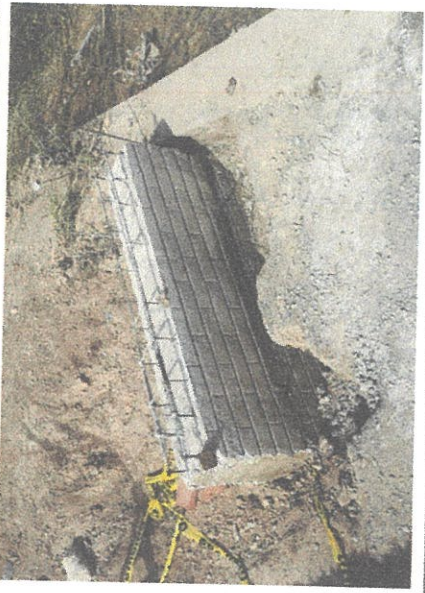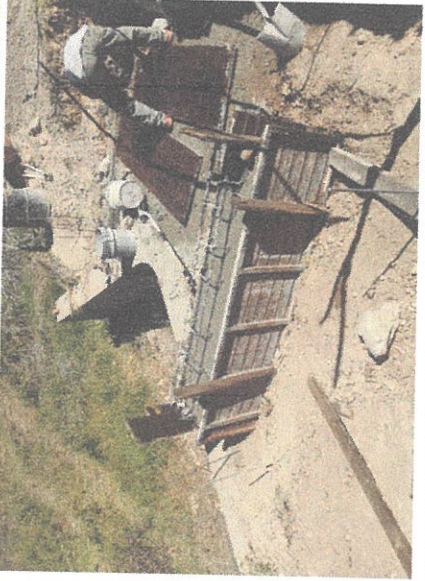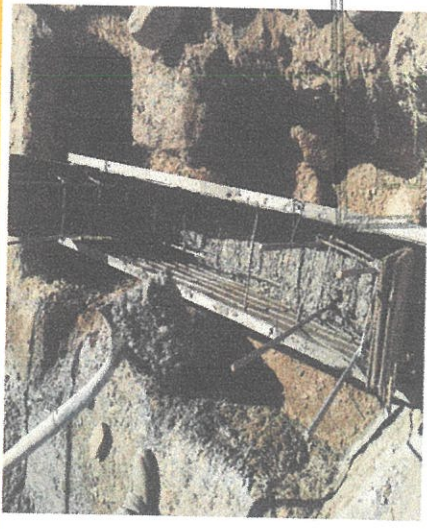

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


ING. JOSE FRANCISCO CALJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

GENERADORES

NOMBRE DE LA OBRA: **CONTRATO. NOCHIS/FONDOIII/2023/21** MONTO CONTRATADO: **\$1,799,692.25**

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



FECHA DE CONTRATO: **1**

FECHA DE INICIO: 08 DE NOVIEMBRE 2023

FECHA DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023

DESCRIPCION DE CONCEPTO: **LOTO DE LA MEJIA**

CLAVE: **017**

DESCRIPCION: **MUR DE FORMAS DE 30 CM DE ANCHO A BASE DE PIEDRA, BOLA Y CONCRETO HERMO EN OBRA PIGRADO REDONDO ADEGRADO MAXIMO 20MM CON UN REBIVIMIENTO DE 8 A 10 CM A UNA PROPORCION DE 6.00 A 1.00**

LOCALIZACION	EJE	TRAMO	TIPO	ANCHO	LARGO	ALTO	AREA	UNIDAD
	A-B	1-2	BOBEDA	1.8	3.75		6.75	M2
TOTAL								6.75

CONTRATISTA: **C. ANGELICA RUANO AVILA**

MUNICIPIO: **LINDA VISTA - LOS SANDOVALES**


NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

EST. No. **1**

HOJA: **14**

PERIODO DE: **08/11/2023** DE: **30**

NOTAS: **A** 31/12/2023

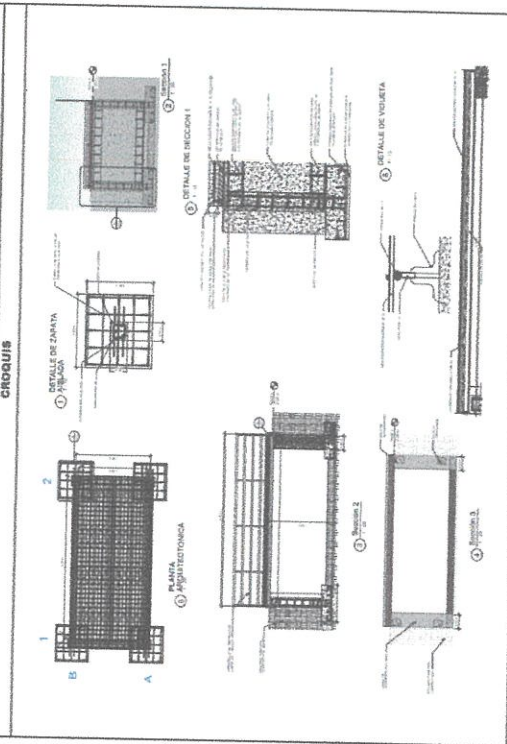

[Signature]

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

[Signature]

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

[Signature]

ING. DIEGO ALEJANDRO MIERVADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2023/21
 MONTO CONTRATADO: \$1,799,892.25

SERVICIOS MELENDREZ
 CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAGATECAS

FECHA DE CONTRATO: 08 DE NOVIEMBRE 2023
 FECHA DE INICIO: 08 DE NOVIEMBRE 2023
 PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023


DESCRIPCION DE CONCEPTO:

CLAVE 018 PAVIMENTO CON CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 AGRIGADO DE 20 MRA. CEMENTO NORMAL. REVENIMIENTOS 8 A 10 CM. DE 0.12 M. DE ESPESOR. ARMADO CON BALLA ELECTRODINAMIA 545 15*10 INCHOS DE 100 RA. INCLUYE: CUBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR

LOCALIZACION	EJE	TRAMO	TIPO	ANCHO	LARGO	ALTO	AREA	UNIDAD
	A - B	1 - 2	PAVIMENTO	1.8	3.75		6.75	M2
TOTAL								6.75

CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA
 LOCALIDAD: LINDA VISTA - LOS SANDOVALES
 MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 EST. No. 1
 HOJAS: 15 DE: 30
 PERIODO DE: 08/11/2023 A 31/12/2023

PROGRAMA: FAISM

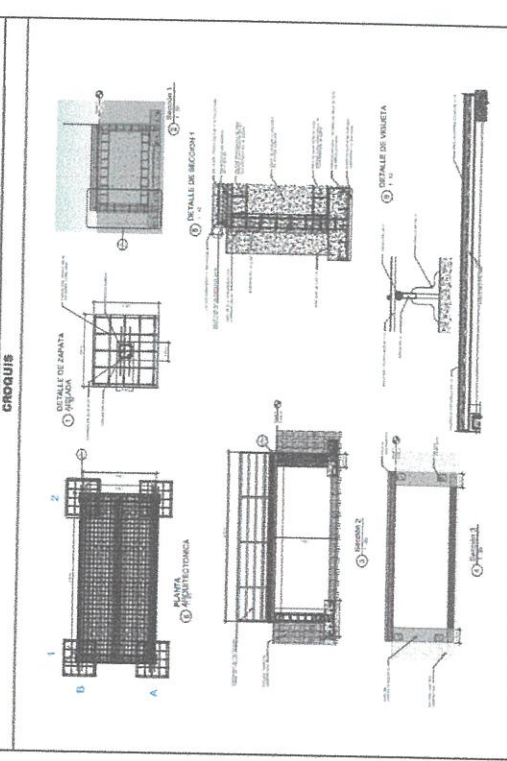

ING. DIEGO ALEJANDRO MERVADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

MEMORIA FOTOGRAFICA

NOMBRE DE LA OBRA: CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/21 NOCHIS/FONDOIII/2023/21		CONTRATISTA: LOCALIDAD: C. ANGELICA RUANO AVILA		PROGRAMA	
MONTO CONTRATADO: \$1,799,992.23		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		LINDA VISTA - LOS SANDOVALES FAISM	
FECHA DE CONTRATO: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAGATECAS		EST. No.: 1		PERIODO DE: 15 DE 30 A 31/12/2023	
FECHA DE INICIO: 06 DE NOVIEMBRE 2023 PLAZO DE EJECUCION: 88 DIAS FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023		NOTAS:			
DESCRIPCION DE CONCEPTO: PAVIMENTO 60% CONCRETO Y 40% ACEROS ABREVIADO DE 25 MM. CEMENTO NORMAL. REVENIMIENTOS 8 A 10 CM. DE 6.12 M. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTRODOLADA 6.6 18-18 ROLLO DE 100 M. INCLUYE: CIERRA METALICA, BANDO DE OBRA Y HERMANDADA MENOR					
CLAVE 018					



OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADERO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

GENERADORES

NOMBRE DE LA OBRA: **NOCHIS/FONDOIII/2023/21** MONTO CONTRATADO: **\$1,799,692.25**

CONTRATISTA: **C. ANGELICA RUANO AVILA**
 MUNICIPALIDAD: **NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.**
 LOCALIDAD: **LINDA VISTA - LOS SANDOVALES**
 PROGRAMA: **FAISM**

EST. No. **1** HOJAS NOMINALES: **16** DEE. 30
 PERIODO DE: **08/11/2023** A **31/12/2023**

NOTAS: **CROQUIS**

CLAVE	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA	UNIDAD	
019	VIGUETA DE ACERO REFORZADO, INCLUIE: ANGULO DE 2 X 3/8, VARILLA DE #5, VARILLA DEL # 4 (127) PARA CUBRILLA, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1-2	VIGUETA				3	PZA	
								TOTAL	3.00

DESCRIPCION DE CONCEPTO:


SERVICIOS MELENDEZ
CONSTRUCCION Y MAQUINARIA

ING. DIEGO ALEJANDRO RIVERA QUIZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

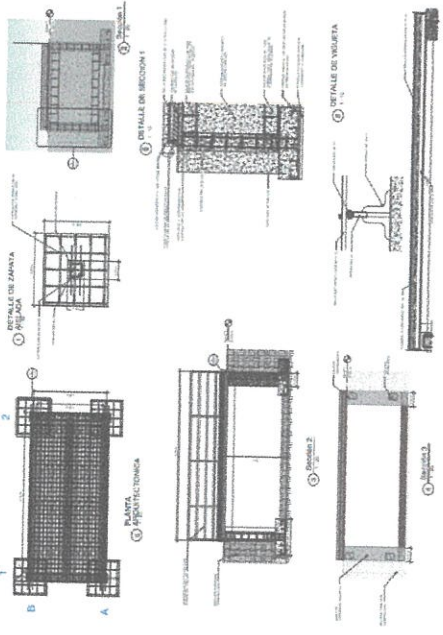

0210

MEMORIA FOTOGRAFICA

NOMBRE DE LA OBRA:		CONTRATO:		MUNICIPIO:		CONTRATISTA:	
CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS		NOCHIS/FONDOI/2023/21		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		C. ANGELICA RUANO AVILA	
MONTTO CONTRATADO:		LOCALIDAD:		PROGRAMA:			
\$1,799,692.25		LINDA VISTA - LOS SANDOVALES		FAISM			
FECHA DE CONTRATO:		EST. No.		HOJA:		PERIODO DE:	
27 DE DICIEMBRE 2023		1		06/11/2023		16 DE 30	
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:		NOTAS:		A		31/12/2023	
NOVIEMBRE 2023							
FECHA DE TERMINO:		LORO DE LA EMPRESA:					
31 DE DICIEMBRE 2023		SERVICIOS MELENDREZ					
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		CONSTRUCCION Y MAQUINARIA					
CLAVE		VIGUETA DE ACERO REFORZADO, INCLUYE, ANCHILLO DE 2 X 21CS, VARILLA DE 6R, VARILLA DEL # 4 (12") PARA COLUMBRILLA, SOLDADURA, BANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
019							



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 23

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

GENERADORES

CONTRATO: **NOCHIS/FONDO111/2023/21** MONTO CONTRATADO: **\$1,799,692.25**

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS**

FECHA DE CONTRATO: **08/11/2023**

FECHA DE INICIO DE OBRAS: **08/11/2023**

FECHA DE TERMINO: **31/12/2023**



DESCRIPCION DE CONCEPTO: **BARANDAL TUBULAR DE 0.90 MTS DE ALTURA A BAMB PULSABANOS TUBULAR 100 100 Y CUADRO C190 DE 1'32" Y BASE DE BOLENA DE 1'12", TERMINADAS EN PRIMARIO COLOR ORO, JUNO DE OBRAS DE ELABORACION, COLOCACION Y HERMANETA**

CLAVE	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA	UNIDAD
020	B	1-2	BARANDAL				1	PZA
							TOTAL	1.00

CONTRATISTA: **C. ANGELICA RUANO AVILA**


MUNICIPIO: **NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.**

EST. No. **1**

HOJA: **17** DE **30**

PERIODO DE: **08/11/2023** A **31/12/2023**

PROGRAMA: **FAISM**

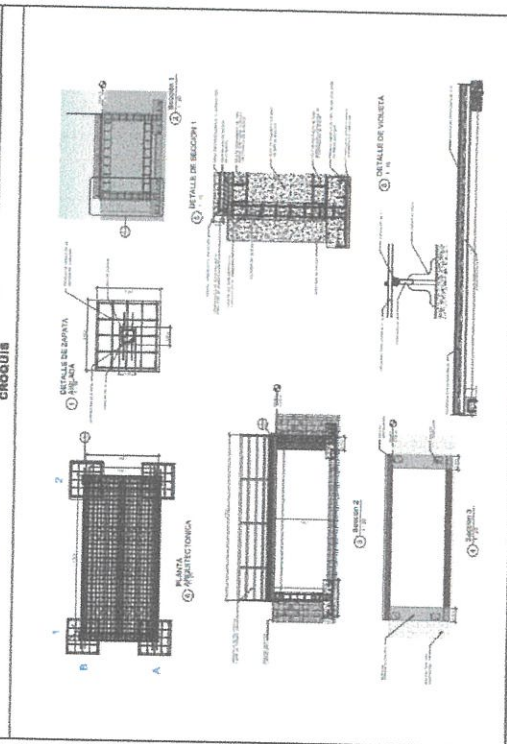

ING. DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

OPERADO FAISM (FIII) EJERCICIO 2023

MEMORIA FOTOGRAFICA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAGATECAS		CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/21	MONTO CONTRATADO: \$1,799,692.25	CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA	PROGRAMA
FECHA DE CONTRATO: FECHA DE INICIO: 06 DE NOVIEMBRE 2023 PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023		SERVICIOS MELENDRÉZ CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	LOCALIDAD: LINDA VISTA - LOS SANDOVALES
DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO: BARRANDAL TUBULAR DE 6.90 MTS DE ALTURA A BASE PASAMANOS TURBULAN MOD 160 Y CUADRO 5:160 DE 1 1/2" Y BARR DE SOLETA DE 1 1/2". TERMINADAS EN PRIMARIO COLOR GRIS. MANO DE OBRA DE ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA.		1619.9614.0000000000		EST. No.: 1	HOJA: 17 DE 30
CLAVE: 023				PERIODO DE: A	31/12/2023

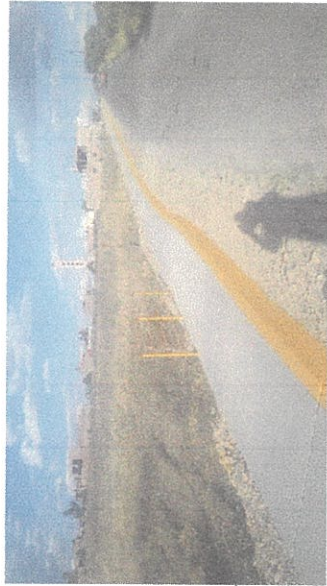

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO GAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR


C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FOND011/2023/21

MONTO CONTRATADO: \$1,799,892.25

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR URSANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

LOGO DE LA EMPRESA: 

FECHA DE CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 08 DE NOVIEMBRE 2023

FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO EN TERRENO PLANO DE 1000 A 2000 M2, INCLUYE: TOPOGRAFIA Y CABLEADO, OPERADOR

CLAVE	LOCALIZACION	EJE	TRAMO	TIPO	ANCHO	LARGO	ALTO	AREA	UNIDAD
021		A - B	3 - 4	TRAZ Y NIV	1.5	4.50		0.1	M2
TOTAL									0.10

CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA

MUNICIPIO: LOCALIDAD:

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

LINDA VISTA - LOS SANDOVALES

PROGRAMA


FAISM

EST. No. 1

HOJA 18

PERIODO DE: 08/11/2023 A 31/12/2023

NOTAS:

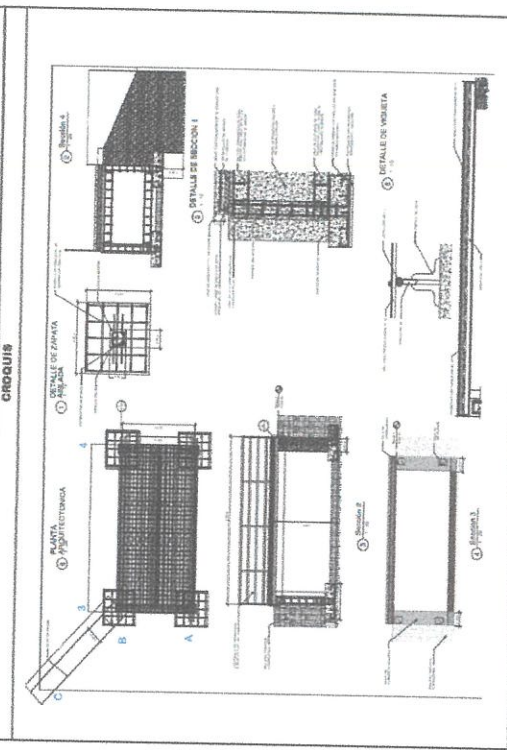

OPERADO FAISM (FIII) EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MARRADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR


C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOII/2023/21		CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS		LOCALIDAD: LINDA VISTA - LOS SANDOVALES	
FECHA DE CONTRATO: FECHA DE INICIO: 08 DE NOVIEMBRE 2023 PLAZO DE EJECUCION: 95 DIAS FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023		PROGRAMA: FAISM	
DESCRIPCION DE CONCEPTO: CLAVE: 021		EST. No. 1 HOJAS: 18 PERIODO DE: A DE: 30 08/11/2023 31/12/2023	
MONTOS: MONTO CONTRATADO: \$1,799,692.25		NOTAS:	



TRAZO Y REVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO EN TERRENO PLANO DE 1000 A 2000 M2, INCLUYE TOPOGRAFO Y CADINERO, OPERADOR

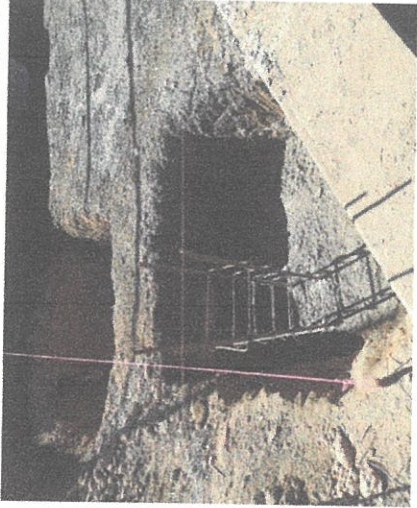

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUIZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

CANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

0215

GENERADORES

NOMBRE DE LA OBRA: **CONTRATO. NOCHIS/FONDOII/2023/21**
 MONTO CONTRATADO: **\$1,799,692.25**

CONTRATISTA: **C. ANGELICA RUANO AVILA**
 LOCALIDAD: **NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.**
 PROGRAMA: **FAISM**


EST. No. **1**
 HOJAS: **19**
 PERIODO DE: **A**
 DE: **08/11/2023** A: **31/12/2023**

FECHA DE CONTRATO: **NOCHIS/FONDOII/2023/21**
 CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

FECHA DE INICIO: **08 DE NOVIEMBRE 2023**
 PLAZO DE EJECUCION: **EN DIAS**
 FECHA DE TERMINO: **31 DE DICIEMBRE 2023**

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 CLAVE 022 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I EN CIPA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTS, INCLUYE MANO DE OBRRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

LOCALIZACION	EJE	TIPO	TIPO	ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	UNIDAD	
A-B	3-4	EXCAVACION		1.80	1.48	4.50	12.00	M2	
								TOTAL	12.00



ING. DIEGO ALVARADO MERVADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

OPERADO
 FAISM (FII)
 EJERCICIO 2023

C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

0216

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		MUNICIPIO:		PROGRAMA	
NOMBRE DE LA OBRA:		C. ANSELICA RUANO AVILA		FAISM	
NOCHIS/FONDOIII/2023/21		LOCALIDAD:			
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.			
MONTD CONTRATADO:		BET. No.		PERIODO DE:	
\$1,799,692.25		1		19 A	
SERVICIOS MELENDRIZ CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA		HOJAS		DI: 30	
LUGAR DE LA OBRA:		08/11/2023		31/12/2023	
FECHA DE CONTRATO :		NOTAS :			
FECHA DE INICIO: 08 DE NOVIEMBRE 2023					
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS					
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023					
DESCRIPCION DE CONCEPTO:					
CLAVE					
022					

EXCAVACION POR MEDIDAS MECANICAS EN TERRENO TIPO I EN CIPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MET, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



OPERADO
FAISM (FIII)
ERCICIO 20 23

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

CANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

0217

GENERADORES

CONTRATO: **NOCHIS/FONDOIII/2023/21** MONTO CONTRATADO: **\$1,799,892.25**

SERVICIOS MELENDRIZ
CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**

FECHA DE CONTRATO: **08/11/2023**

FECHA DE INICIO DE OBRAS: **08/11/2023**

FECHA DE TERMINO: **31/12/2023**

DESCRIPCION DE CONCEPTO: **ACARRIO SOBRE CAMION DE VOLTRO DE 7 M3 DE MATERIAL, PRIMER KILOMETRO SOBRE CAMINO DE TIERRACEREA, CARGA CON MAQUINA**

CLAVE	LOCALIZACION	TRAMO	EJE	TIPO	ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	UNIDAD
023		3-4	A-B	ACARRIO	1.8	1.48	4.80	12.00	M2
TOTAL									12.00

CONTRATISTA: **C. ANGELICA RUANO AVILA**

MUNICIPIO: **NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.**

LOCALIDAD: **LINDA VISTA - LOS SANDOVALES**


PROGRAMA: **FAISM**

EST. No.: **1**

HOJA: **20**

PERIODO DE: **08/11/2023** A **31/12/2023**

NOTAS:

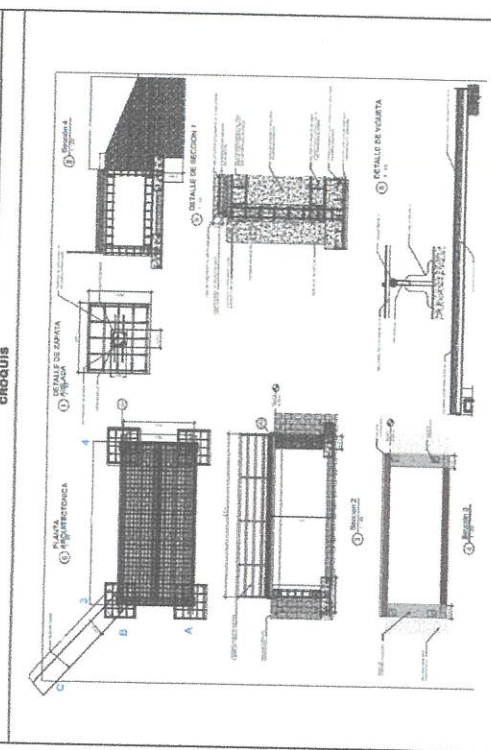

ING. DIEGO ALEJANCRO RIVERA GUZMAN
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

OPERADO FAISM (FIII) EJERCICIO 2023


0218

MEMORIA FOTOGRAFICA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS		CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/21	MONTO CONTRATADO: \$1,799,692.25	CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA	PROGRAMA: FAISM
FECHA DE CONTRATO: FECHA DE INICIO: 01 DE NOVIEMBRE 2023 PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	LOCALIDAD: LINDA VISTA - LOS SANDOVALES	HOJAS: 20	PERIODO DE: A
DESCRIPCION DE CONCEPTO: CLAVE 023		BET. No.: 1	NOTAS: 08/11/2023	DEI: 30	DEI: 30



ACEROSO SOBRE CARRION DE VOLTEO DE 7 #3 DE MATERIAL, PRIMER KILOMETRO SOBRE CARRION DE TERRACENA, CARDA CON BAGUNA

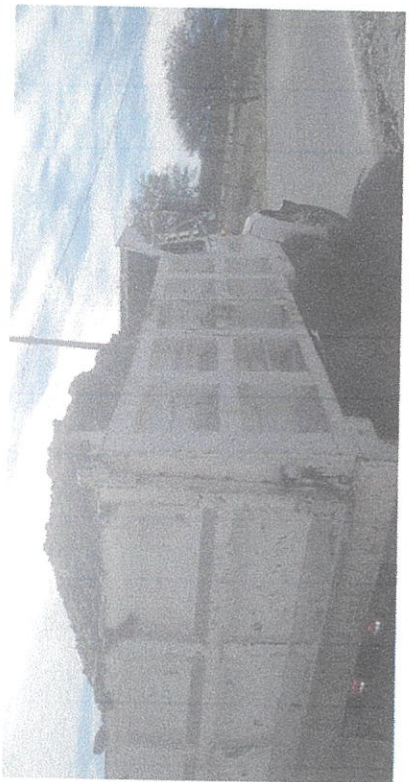

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

ANGELICA
 C-ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/21
 MONTO CONTRATADO: \$1,799,692.25

SERVICIOS MELENDEZ
 CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA

LOGO DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

FECHA DE CONTRATO: 21
 HOJA: 21
 PERIODO DE: A
 DE: 30
 31/12/2023


FECHA DE INICIO: 08 DE NOVIEMBRE 2023
 PLAZO DE EJECUCION: 65 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

CLAVE	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	UNIDAD	
026	ACABADO SOBRE CAMION DE VOLITO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE KILOMETROS SUBSECUENTES, SE COORDINA (3 KM)							12.00	M2
	EJE A-B	3-4	ACARR. SUB.	1.8	1.48	4.50	12.00	M2	
								TOTAL	12.00

CONTRATISTA: C. ANGELICA RIVANO AVILA
 LOCALIDAD: LINDA VISTA - LOS SANDOVALES
 MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 EST. N.º: 1
 HOJA: 21
 PERIODO DE: A
 DE: 30
 31/12/2023

PROGRAMA: FAISM

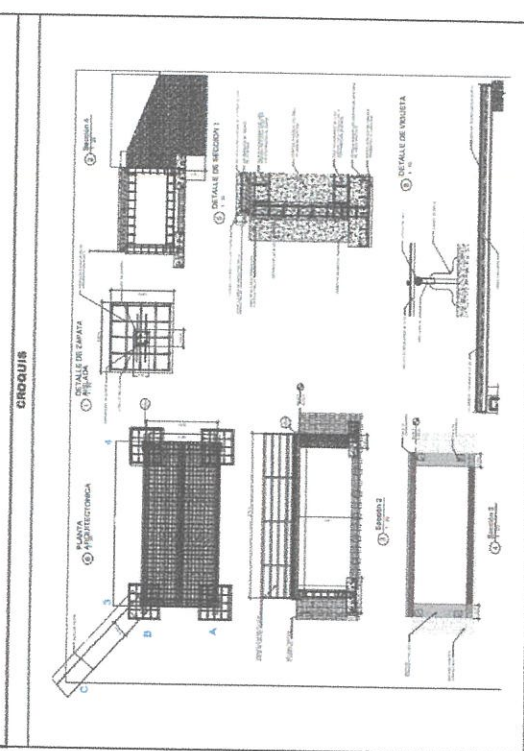

ING. DIEGO ALEJANDRO MERVADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

C. ANGELICA RIVANO AVILA
 CONTRATISTA


OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 20 23

0220

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		MONTO CONTRATADO:	
NOCHIS/FONDOIII/2023/21		\$1,799,692.25	
			
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS			
FECHA DE CONTRATO : 01 DE NOVIEMBRE 2023			
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS			
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023			
DESCRIPCION DE CONCEPTO:			
CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA		PROGRAMA FAISM	
MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		LOCALIDAD: LINDA VISTA - LOS SANDOVALES	
EST. No. 1		HOJAS 08/11/2023	
NOTAS :		PERIODO DE: A 31/12/2023	

ACABADO SOBRE CAMION DE VOLIETO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE KILOMETROS SUSBUJENTES, 89 CORRIEMAN (3 RM)

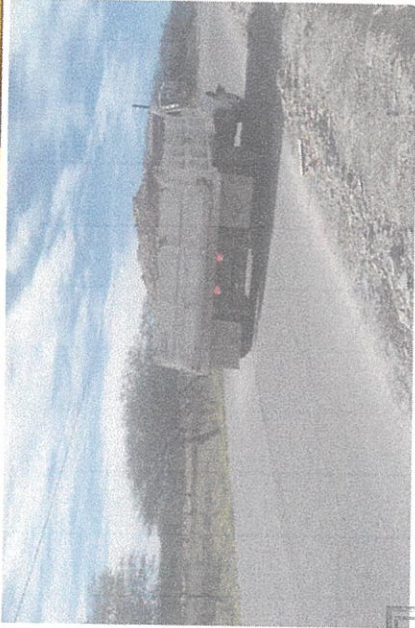

OPERADO
 FAISM (FII)
 EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR


CANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

0221

GENERADORES

NOMBRE DE LA OBRA: **NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.** CONTRATO: **NOCHIS/FONDOIII/2023/21** MONTO CONTRATADO: **\$1,799,692.25**

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS




LOGO DE LA EMPRESA

FECHA DE CONTRATO: **1**
 LOCALIDAD: **NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.**
 EST. No. **1**
 HOJAL: **22**
 PERIODO DE: **A**
 DE: **30**
 08/11/2023 31/12/2023

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FG + 100 KG/CM3 AJUSTADO DE 30 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ADOBRADO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON 80% INCLUIDA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTRADO Y COLADO

EJE	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	ANCHO	LARGO	ALTO	AREA	UNIDAD
A		3	PLANTILLA	0.8	0.60	0.05	0.64	M2
B		3	PLANTILLA	0.8	0.60	0.05	0.64	M2
A		4	PLANTILLA	0.8	0.60	0.05	0.64	M2
B		4	PLANTILLA	0.8	0.60	0.05	0.64	M2
TOTAL								2.56

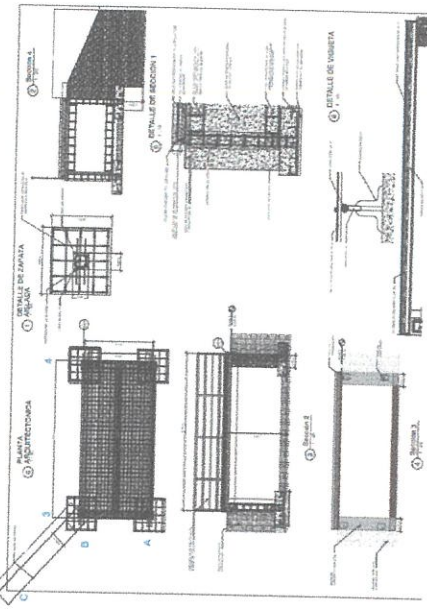

**OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 23**

ING. DIEGO ALEJANDRO MERVADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

Angela
C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

0222

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		MONTO CONTRATADO:	
NOCHIS/FONDOI/2023/21		\$1,709,692.25	
			
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS			
CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA			
MUNICIPALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.			
LOCALIDAD: LINDA VISTA - LOS SANDOVALES			
PROGRAMA FAISM			
EST. No. 1		HOJAS 22	
NOTAS:		PERIODO DE: 08/11/2023 A 31/12/2023	

PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC + 100 KOCIES AGRIGADO DE 20 MM, REBUNIMENTO B A 10 CM, ACABADO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 2000 MTB CON BOTE INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREADO Y COLADO



OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 20 23

ING. DIEGO ALEJANDRO MORGADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

CANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

0223

GENERADORES

NOMBRE DE LA OBRA: **CONTRATO. NOCHIS/FONDOIII/2023/21**
 MONTO CONTRATADO: **\$1,799,692.25**



CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

FECHA DE INICIO: 08 DE NOVIEMBRE 2023
 PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

ZAPATA ABALADA GUARNADA, EN TERRENO TIPO A DE CONCRETO 300 KG/CM3 ARMADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, SECCION 0.50X0.50 MTS. PERALTE DE 0.25 MTS, PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CADA UNO SEJUNTO CON ACINO DE REFUERZO # 3 O 0.17 MTS EN ANCHOS SEPTIDOS, DADO DE CONCRETO SECCION 0.30X0.30 Y UNA ALTIMA DE 1.20 ARCADO SOB 4 VARELLAS # 3 DE DIAMETRO Y 4 SEPTIDO DE 3.2, SEPARADO 0.20 MTS. INCLUYE CIMBRA CORRI, MANO DE OBRA, RECONOCIMIENTA MEDIO.


CLAVE	LOCALIZACION	EJE	TRAMO	TIPO	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA	UNIDAD
028		A - B	3 - 4	ZAPATA				4	PZA
TOTAL									4.00

CONTRATISTA: **C. ANGELICA RUANO AVILA**
 LOCALIDAD: **LINDA VISTA - LOS SANDOVALES**
 PROGRAMA: **FAISM**

MUNICIPIO: **NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.**

EST. NÚ.: **1**
 HOJA: **23**
 PERIODO DE: **A**
 08/11/2023
 31/12/2023

NOTAS:

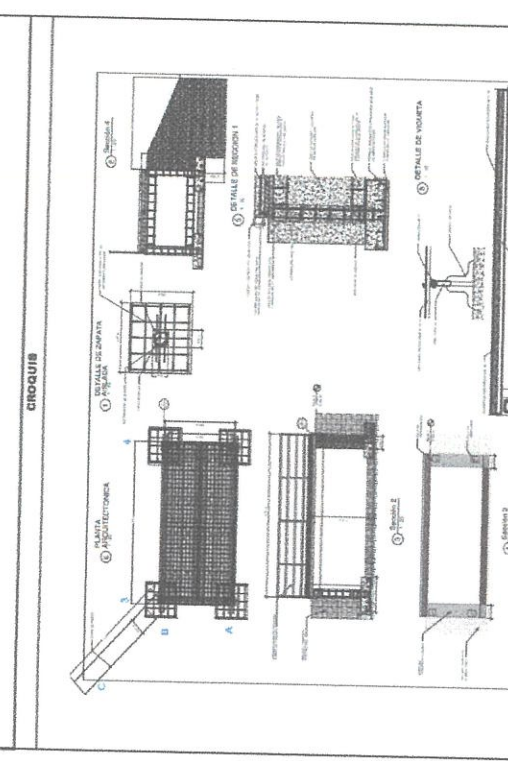

ING. DIEGO ALEJANDRO MERVADO GUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CALERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA



OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

MEMORIA FOTOGRAFICA

NOMBRE DE LA OBRA: NOCHIS/FOND0011/2023/21		CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA		PROGRAMA: FAISM	
CONTRATO: NOCHIS/FOND0011/2023/21		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		LOCALIDAD: LINDA VISTA - LOS SANDOVALES	
MONTO CONTRATADO: \$1,769,692.25		EST. No.: 1		HOJA: 23	
FECHA DE CONTRATO: 06/11/2023		PERIODO DE: A		DIAS: 30	
FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 06/11/2023		FECHA DE TERMINO: 31/12/2023		NOTAS:	



DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 ZAPATA ALHABA CUADRADA, EN TERRENO TIPO A, DE CONCRETO 200 KG/CMT3 ACREGADO DE 50 MM, CEMENTO HORTAL REFINADO B A 10 CM, SECCION HORIZONTAL REFINADO B A 10 CM, SECCION BAJADO 10 CM, PERALTE DE 0.50 MTS, PLANTILLA DE 0.50 MTS DE ESPESOR, ARMADO SECCION CON ACERO DE REPUNDO # 3 DE DIAMETRO Y 1 ESTRIERO DE 3 A, SEPARADO @ 0.20 MTS, INCLUYE CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.

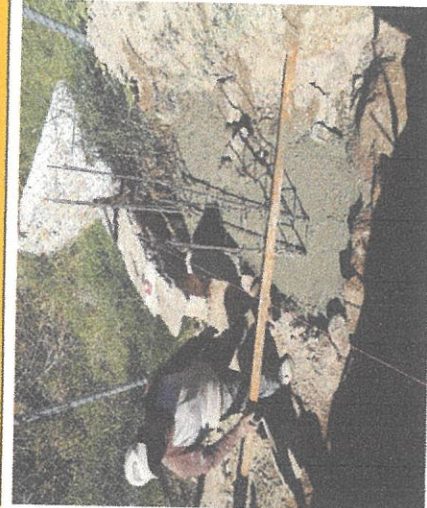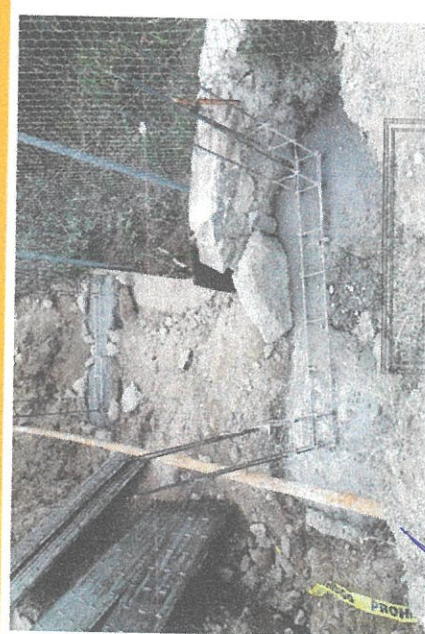

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

ING. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

0225

GENERADORES

NOMBRE DE LA OBRA: NOCHIS/FONDOI/2023/21
 MONTO CONTRATADO: \$1,799,692.25

SERVICIOS MELENDREZ
 CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

FECHA DE CONTRATO: 1
 EST. No. 1
 ROJAS: 08/11/2023
 PERIODO DE: A
 DE: 30
 31/12/2023

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 DALA O GABARRA DE DESPLANTE DE CONCRETO SECCION D.150.20 M.CON FABRICACION DE CONCRETO F'c= 150 KG/CMS. ARMADO DE 20 MM. INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM. CON REVOLVEDORA, 1 SACO TRONPO, MANO DE OBRA DE FABRICACION, BAJAS RESISTENCIAS, CUBRIL ACABADO COMBRIL A.4 USOS, ARBAGO CON 4 VANILLAS DEL NUMERO 3 (16") DEL NUMERO 2.6 (14") Y BSTRIBOS A CADA 6.15 MTR. DEL NUMERO 2.6. INCLUYE TODO EL MATERIAL NECESARIO, CUBRIL Y DESMOLDADORA, CORTES, TRUQUILAPES, DESMOLDADORA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO

CLAVE	LOCALIZACION	EJE	TRAMO	TIPO	ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	UNIDAD
027		A-B	3	CAD. DESPLANTE	1.8				ML
		A-B	4	CAD. DESPLANTE	1.8				ML
TOTAL									3.20

ING. DIEGO ALEJANDRO MERVADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA


OPERADO FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

0226

CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA
 LOCALIDAD: LINDA VISTA - LOS SANDOVALES
 MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 PROGRAMA: FAISM

EST. No. 1
 ROJAS: 08/11/2023
 PERIODO DE: A
 DE: 30
 31/12/2023

NOTAS:

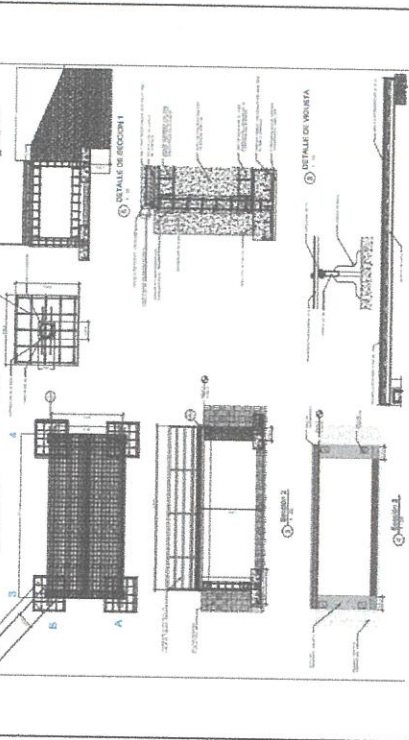

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FOND011/2023/21		MONTO CONTRATADO: \$1,799,692.25	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS		PROGRAMA: FAISM	
CONTRATISTA: MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		LOCALIDAD: LINDA VISTA - LOS SANDOVALES	
FECHA DE CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE 2023		HOJA: 24 DE 30	
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 08/11/2023		PERIODO DE: A 31/12/2023	
FECHA DE TERMINO DE LA OBRA: 31 DE DICIEMBRE 2023		NOTAS:	



DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 CLAVE 027
 DALLA O CADERA DE DESPLANTE DE CONCRETO SECCION RECTANGULO M CON FABRICACION DE CONCRETO F'c= 180 MDCERO, ADECUADO DE 20 CM INCLUYE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, CON REVOLVEDORA, 1 SACO TIEMPO, RAMO DE OBRA DE FABRICACION, BELLAS RESISTENCIAS, CIERRA ACERADO COMUN A 4 USOS, ARMADO CON A VARILLAS DEL NUMERO 2 (3/8") DEL NUMERO 2.5 (1/4") Y ESTRIBOS A CADA 0.45 MTS. DEL NUMERO 2.5. INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIERRA Y DESCIERNA, CORTES, TRABAJOS, DESPERDICIO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, RAMO DE OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.



OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

C-ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

0227

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/21
 MONTO CONTRATADO: \$1,799,692.25



CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

FECHA DE CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE 2023
 FECHA DE INICIO: 08 DE NOVIEMBRE 2023
 PLAZO DE EJECUCION: DE DIAS
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023

DESCRIPCION DE CONCEPTO: DALLA O CADERNA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 150 MCMCA, AGREGADO DE 25 MILICIMETROS, CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM CON REVOLUCORA. 1 SACO TIEMPO, MANO DE OBRAS DE FABRICACION EN TERRENO, CHISPA, ACABADO CONCRETO A 4 USOS, ANILLO CON 4 VARILLAS DEL NUMERO 3 (38") DEL NUMERO 2.5 (14") Y ESTRIEBOS A CADA 0.15 MTS DEL NUMERO 2.5. INCLUIR TODA EL MATERIAL, MEDICAMENTO, CHISPA Y DESCARRIAGA, CORTES, TRAILLAP-EP, DESPENDICIOS, MANUTENIDO Y ARMAJO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRAS, EQUIPO Y MANUTENIMIENTO DE BIENO

CLAVE 02B	LOCALIZACION		TIPO	ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	UNIDAD
	EJE	TRAMO						
	A-B	3	CAD. CERRAMIENTO	1.8				ML
	A-B	4	CAD. CERRAMIENTO	1.8				
TOTAL								3.20


OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALCANJORO MERVADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA
 LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 PROGRAMA: FAISM

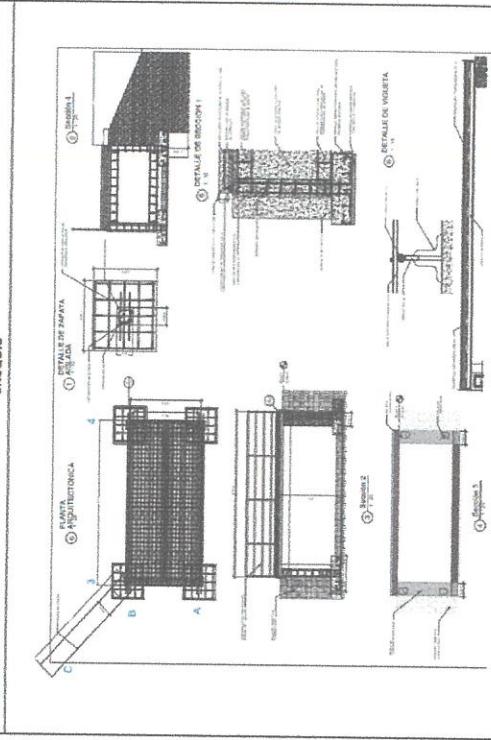

NOTAS:

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATISTA		C. ANGELICA RUANO AVILA		PROGRAMA
MUNICIPIO:		LOCALIDAD:		
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		LINDA VISTA - LOS SANDOVALES		FAISM
EST. No.		HOJA		
1		08/11/2023 A 31/12/2023		
NOTAS :				

CONTRATO:	MONTO CONTRATADO:
NOCHIS/FOND0111/2023/21	\$1,799,892.25



NOMBRE DE LA OBRA:	
CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS	
FECHA DE CONTRATO :	
FECHA DE INICIO 08 DE NOVIEMBRE 2023	
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS	
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023	
DESCRIPCION DE CONCEPTO:	
CLAVE	LOCO DE LA OBRA:
028	

DALLA O CADERIA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO RECCION 6.1X10X30 EL CON FABRICACION DE CONCRETO PCC 150 KILOGRS. ADECUADO DE 30 INCLUIRE, CAMBITO, ARMA, GRAVA Y AGUA, EN REVERIMIENTO DE 8 A 10 CM, CON REVOLVEDORA. 4 SACO TRIDUPO, BANO DE OBRA DE FABRICACION, BAJAS RESISTENCIAS, CERRA ACABADO COMUN A 4 USOS, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NUMERO 5 (14") Y REBTUJOS A CADA 0.15 MTS. DEL NUMERO 2.5 (14"). INCLUIRE TODO EL MATERIAL, NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CONTRA, TRABAJA, DESPRENDIDOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUIZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

CANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

0229

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/21
 MONTO CONTRATADO: \$1,799,692.25



NOMBRE DE LA OBRA: NOCHIS/FONDOIII/2023/21
 CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

FECHA DE CONTRATO: 1
 LOCALIDAD: C. ANIBELCA RUANO AVILA
 MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 ESTADO: QUERÉTARO

FECHA DE INICIO DE OBRAS: 06/11/2023
 PERIODO DE OBRAS: 30
 DE: 30
 A: 31/12/2023

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 MURO DE PIEDRA BRAJA DE 40 CM DE ANCHO ARMADO CON MEZCLA CERAMTO ARENA YA INCLUIDE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACABADOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAL.


CLAVE	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	UNIDAD	
029	EJE B-C		MURO	0.4	1.87	3.00	2.004	M2	
								TOTAL	2.00

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERVADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

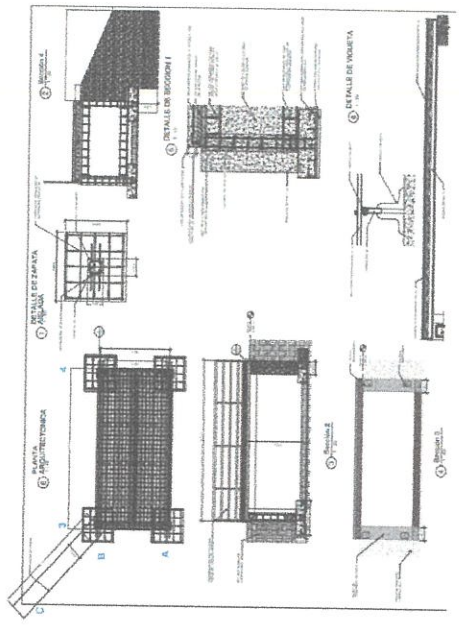

0230

MEMORIA FOTOGRAFICA

NOMBRE DE LA OBRA:		CONTRATO:		MUNICIPIO:		CONTRATISTA:		PROGRAMA:	
CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS		NOCHIS/FONDOIII/2023/21		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		C. ANGELICA RUANO AVILA		PROGRAMA	
FECHA DE CONTRATO :		MONTO CONTRATADO:		LOCALIDAD:		HOJA:		FAISM	
28 DE DICIEMBRE 2023		\$1,799,692.25		LINDA VISTA - LOS SANDOVALES		26		DE: 30	
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:		MUNICIPIO:		EST. No.		PERIODO DE:		31/12/2023	
31 DE DICIEMBRE 2023		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		1		A			
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		MUNICIPIO:		NOTAS :					
MURO DE PIEDRA BRAJA DE 40 CM DE ANCHO ASERTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACABADOS, CORTES, DESPERDIGOS, MAJO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.									
CLAVE		MUNICIPIO:							
029									



OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

CANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

0231

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/21
 MONTO CONTRATADO: \$1,799,692.25

SERVICIOS MELENDREZ
 CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS


FECHA DE CONTRATO: 08 DE NOVIEMBRE 2023
 FECHA DE INICIO: 08 DE NOVIEMBRE 2023
 PLAZO DE EJECUCION: 66 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 BOVEDA A BASE DE TABIQUE ADORON A UN CASCO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL LUGAR D, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CLAVE	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	UNIDAD
020	A - B	3 - 4	BOVEDA	1.8		4.50	8.1	M2
TOTAL								8.10

CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA
 LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 MUNICIPIO: LINDA VISTA - LOS SANDOVALES
 PROGRAMA: FAISM

EST. No. 1
 HOJAS: 37
 PERIODO DE: 08/11/2023 A 31/12/2023

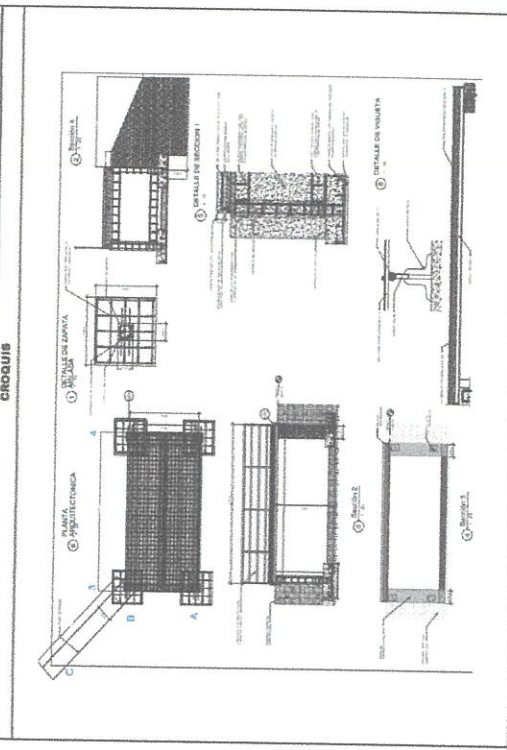

OPERADO
 FAISM (FI1)
 EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERVADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA


0232

MEMORIA FOTOGRAFICA

NOMBRE DE LA OBRA: CONTRATO. NOCHIS/FONDOIII/2023/21		CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA		PROGRAMA: FAISM	
MONTO CONTRATADO: \$1,799,692.25		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		LOCALIDAD: LINDA VISTA - LOS SANDOVALES	
FECHA DE CONTRATO: FECHA DE INICIO: 08 DE NOVIEMBRE 2023 PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023		EST. No.: 1		PERIODO DE: 08/11/2023 A 31/12/2023	
DESCRIPCION DE CONCEPTO: BOVERA A BASE DE TABIQUE ADOBON A UN CLASO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL LUGAR, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
CLAVE: 020					



LOGO DE LA EMPRESA

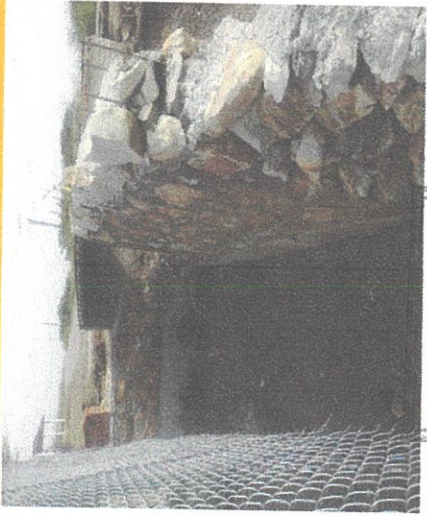

OPERADO
 FAISM (FII)
 EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR


C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

0233

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/21
MONTO CONTRATADO: \$1,799,892.25

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



FECHA DE CONTRATO: 11 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO: 08 DE NOVIEMBRE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 96 DIAS
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023

DESCRIPCION DE CONCEPTO:


CLAVE	LOCALIZACION	EJE	TRAMO	TIPO	ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	UNIDAD
031		A-B	3-4	PAVIMENTO	1.5		4.50	6.75	M2
									TOTAL
									6.75

OPERADO
 FAISM (FI))
 EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MIERVADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA
MUNICIPIO: LOCALIDAD:
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES
EST. No.: 1 HOJAS: 28
PERIODO DE: 08/11/2023 A 31/12/2023

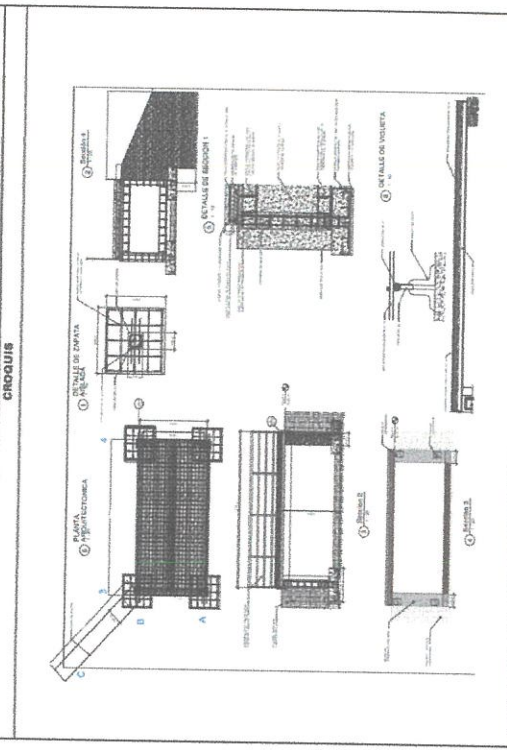

C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

MEMORIA FOTOGRAFICA

NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO:	MUNICIPIO:	LOCALIDAD:	PROGRAMA
CONSTRUCCION DE ANDADOR URSABO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAGATECAS	NOCHIS/FONDOIII/2023/21	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	LINDA VISTA - LOS SANDOVALES	FAISM
FECHA DE CONTRATO:	MUNICIPIO:	EST. No.	HOJAS	PERIODO DE:
01 DE NOVIEMBRE 2023	1	1	28	06/11/2023 A 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 01 DE NOVIEMBRE 2023	NOTAS:			
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS				
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023				
DESCRIPCION DE CONCEPTO:				
CLAVE 031				

SERVICIOS MELENDEZ
CONSTRUCCION Y MAQUINARIA

MONTO CONTRATADO: \$1,799,692.25

USAR AL ENTREGA

PAVIMENTO CON CONCRETO F'CD 200 MORTER APROBADA DE 20 MM. CEMENTO NORMAL. REVENDIMIENTOS A A 16 CM. DE 5.12 M. DE ESPESOR. ARMADO CON MALLA ELECTRODUNADA 4-4 16-10 ROLLO DE 100 M. INCLUYE: SIMBRA INSTALADA, PLANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR



ING. DIEGO ALEJANDRO BERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

0235

GENERADORES

NOMBRE DE LA OBRA: **CONTRATO. NOCHIS/FONDOIII/2023/21** MONTO CONTRATADO: **\$1,799,692.25**

SERVICIOS MELENDREZ
CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAGATECAS

FECHA DE CONTRATO: **LINDO DE LA EMPRESA**

FECHA DE INICIO DE OBRAS: **NOVIEMBRE 2023**

FECHA DE TERMINO: **31 DE DICIEMBRE 2023**

DESCRIPCION DE CONCEPTO: **VIGUETA DE ACERO REFORZADO, INCLUIDO ANCHO DE 2 X 216, VARILLA DE RR. VARILLA DEL #4 (1.27") PARA CULIEBRILLA, SOLDADURA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION**

CLAVE	LOCALIZACION	EJE	TRAMO	TIPO	ANCHO	ALTO	LARGO	PZA	UNIDAD
022		A-B	3-4	VIGAS				3	PZA
TOTAL									3.00

CONTRATISTA: **C. ANGELICA RUANO AVILA**

MUNICIPIO: **NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.**

LOCALIDAD: **LINDA VISTA - LOS SANDOVALES**

PROGRAMA: **FAISM**


EST. No. **1**

HOJA: **29**

PERIODO DE: **A**

DE: **30**

NOTAS: **08/11/2023 31/12/2023**

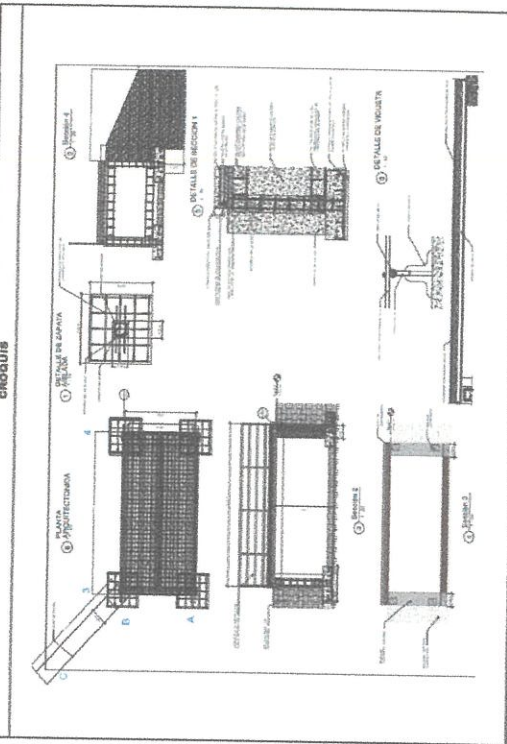

ING. DIEGO ALEJANDRO RIVERA QUESADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 20 23


0236

MEMORIA FOTOGRAFICA

NOMBRE DE LA OBRAS: CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/21		CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA	
MONTO CONTRATADO: \$1,799,692.25		LOCALIDAD: LINDA VISTA - LOS SANDOVALES	
FECHA DE CONTRATO: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS		PROGRAMA: FAISM	
FECHA DE INICIO DE OBRAS: 21 DE DICIEMBRE 2023		EST. No.: 1	
PLAZO DE EJECUCION EN DIAS: 30		HOJAS: 29	
FECHA DE TERMINO: 21 DE ENERO 2024		PERIODO DE: A	
DESCRIPCION DE CONCEPTO: CLAVE 032		NOTAS: 08/11/2023	



VOQUETA DE AEREO REPOZADO. INCLUYE: ANGULO DE 3 X 3 M. VARILLA DE 8L. VARILLA DEL # 4 (12") PARA COLUMNILLA, BOLDADURA, BANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

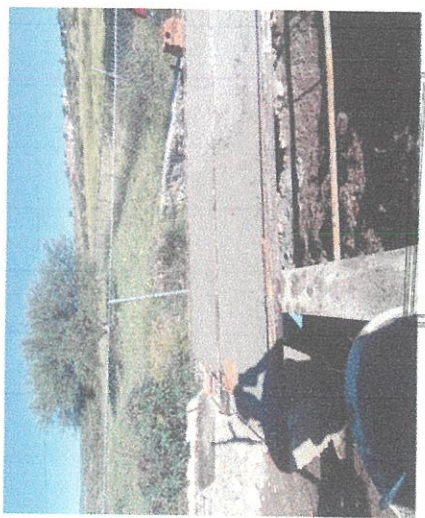

OPERADO
 FAISM (FII)
 EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

CANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

0237

GENERADORES

NOMBRE DE LA OBRA: **CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/21** MONTO CONTRATADO: **\$1,799,692.25**

SERVICIOS MELENDREZ
CONSTRUCCION Y MAQUINARIA

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

FECHA DE CONTRATO: **LUPA DE LA IMPRESA**

FECHA DE INICIO DE NOVIEMBRE 2023

FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

CLAVE	LOCALIZACION	EJE	TRAMO	TIPO	ANCHO	ALTO	LARGO	PZA	UNIDAD
023	BARRONAL TUBULAR DE CEMENTO DE ALTURA A BASE PARAMANOS TUBULAR 1000 Y CUADRO CERO DE 1 1/2" Y BARR DE SOLERA DE 1 1/2". TERMINADOS EN PRIMERIO COLOR GRIS. BANO DE OBRA DE ELABORACION, COLOCACION Y HERRAMIENTA	B	3 - 4	BARRONAL				1	PZA
TOTAL									1.00

CONTRATISTA: **C. ANGELICA RUANO AVILA**

MUNICIPIO: **LINDA VISTA - LOS SANDOVALES**


NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

EST. No. **1**

HOJA: **30** DE: **30**

PERIODO DE: **06/11/2023** A **31/12/2023**

NOTAS:

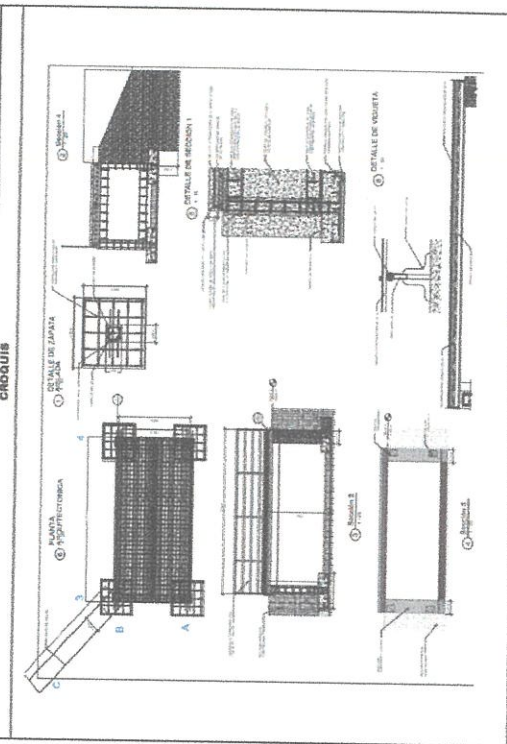

ING. DIEGO ALEJANDRO MERVADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 23



0238

MEMORIA FOTOGRAFICA

NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO:	MONTO CONTRATADO:	PROGRAMA
CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAGATECAS	NOCHIS/FONDOII/2023/21	\$1,799,692.25	LINDA VISTA - LOS SANDOVALES
FECHA DE CONTRATO 1	FECHA DE INICIO: 06 DE NOVIEMBRE 2023	PLAZO DE EJECUCION DE DIAS	FAISM
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023	FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023	EST. No. 1	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAG.
DESCRIPCION DE CONCEPTO:	LOCALIDAD: C. ANGELICA RUANO AVILA	HOJAS: 30 DE 30	PERIODO DE: 06/11/2023 A 31/12/2023
CLAVE 023	NOTAS 1		



EABANDAL TUBULAR DE 6.90 MTS DE ALTURA A BARE PASAMANOS TUBULAR R90 160 Y CUADRO 6120 DE 1 1/2" Y BARE DE COLERA DE 1 1/2". TERMINADA EN PRIMARIO DOLOR OMB. MANO DE OBRA DE ELABORACION, ELEVACION Y HERRAMIENTA

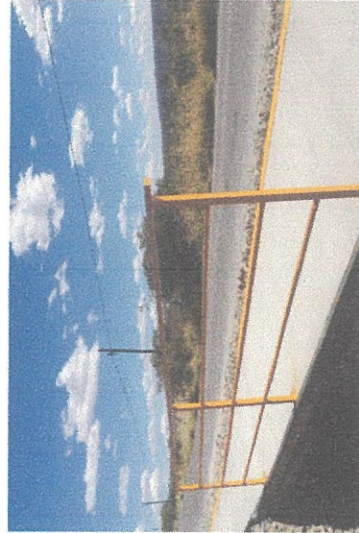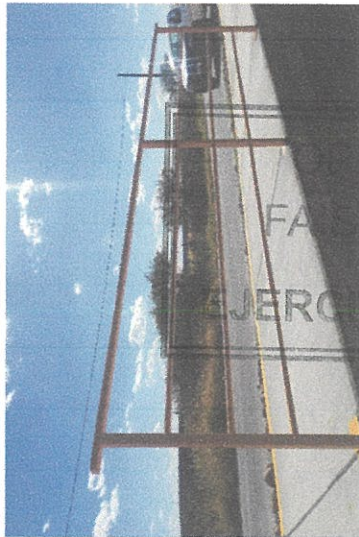

ERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO GUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P10559 Del 20/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024
02:02 p. m.
Página | 1

Concepto: 534 - Obra Pública : 404012 - CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA- LOS SANDOVALES, MUNIC.
GD Folio: 740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-404012-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$611,710.40		GD Folio: 740
0002	8240-511-404012-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$611,710.40	GD Folio: 740
0003	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de	\$611,710.40		GD Folio: 740
0004	2113-001044	ANGELICA RUANO AVILA		\$611,710.40	GD Folio: 740
Sumas iguales =>			<u>1,223,420.80</u>	<u>1,223,420.80</u>	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 23

0240



Usu: Supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS**


Póliza: C03540 Del 20/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024
Página | 02:03 p. m.
1

Concepto: 534 - Obra Pública : 404012 - CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA- LOS SANDOVALES, MUNIC.
GP Folio: 740

Beneficiario: ANGELICA RUANO AVILA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404012-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$611,710.40		GP Folio: 740
0002	8260-511-404012-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$611,710.40	GP Folio: 740
0003	2113-001044	ANGELICA RUANO AVILA	\$611,710.40		GP Folio: 740
0004	1112-08-153	FONDO III 2023 1214132352		\$611,710.40	GP Folio: 740
Sumas iguales =>			<u>1,223,420.80</u>	<u>1,223,420.80</u>	



0241



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/12/2023 16:16

Cuenta/ CLABE Ordenante	1214132352
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
RFC Ordenante	MNM850101AC3
Moneda	MXP
ID Tercero	457
Nombre del Beneficiario	ANGELICA RUANO AVILA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0313588248
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
RFC Beneficiario	RUAA880710SQ6
Importe a Transferir	\$611,710.40
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/12/2023
Número de Referencia	01
Propósito de la Transferencia	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION
Clave de Rastreo	109
Confirmaclón	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha Captura	20/12/2023 02:58:48 p. m.
Ejecutó	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha de Ejecución	20/12/2023 04:15:41 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0242

ORDEN DE PAGO 2023

20-dic

MUNICIPIO: 034 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: RAMO 33 . PROGRAMAS FEDERALES
 SUB-PROGRAMA : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 (RAMO, FONDO O PROGRAMA) (FONDO III 2023)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
 FIRMA DEL SOLICITANTE: _____
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 20 de diciembre de 2023
 CUENTA BANCARIA ORIGEN : 1214132352 BANORTE

No.	CLAVE PRESUPUESTARIA								NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE.	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO						
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	511	FONDO III RAMO 33	404012	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA-LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6141	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA.	NOCHIS/FOND OIII/2023/21	ANGELICA RUANO AVILA	A 534	19/12/2023	611,710.40	(SEICIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 40/100 MN)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2021 - 2024

AUTORIZA: _____
 ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2021 - 2024

AUTORIZA: _____
 DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2021 - 2024

AUTORIZA: _____
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATURA MUNICIPAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2021 - 2024

AUTORIZA: _____
 SÍNDICO MUNICIPAL

FECHA : 20 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA : 20 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA : 20 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA : 20 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.

0243



ANGELICA RUANO AVILA

RUAA880710SQ6

16 DE SEPTIEMBRE 166

CENTRO LOCALIDAD DANIEL CAMARENA

NOCHISTLAN DE MEJIA, NOCHISTLAN.

ZACATECAS, México C.P. 99914

(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Teléfonos: (346)-100-1611, (346)-101-2142

Tipo Comprobante: (I) Ingreso

Exportación: (01) No aplica

Factura A 534

Folio fiscal

79b034ea-257a-4cbe-ac24-5a4b40ff7e4e

RFC Certificador

LSO1306189R5

No. certificado del SAT

00001000000509846663

Fecha y hora certificación

2023-12-19 10:11:16

Lugar Expedición: Zacatecas, 99914

RFC	MNM850101AC3	Fecha expedición	19/12/2023 10:11:15
Nombre	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS	Uso CFDI	(G03) Gastos en general.
Régimen Fiscal	(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos	Dirección Fiscal	99900
Calle	HIDALGO 1	Fecha pago	19/12/2023
Colonia	CENTRO Municipio NOCHISTLAN DE MEJIA C.P. 99900		
Ciudad, Estado	, ZACATECAS. MEXICO		

Clave	ProdServ	ObjImp	Cant	Cve. Unidad	Descripción	Descuento	Precio unitario	Importe
72141121	72141121	02	1.00	(E48) Unidad de servicio	RECIBI DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA LA CANTIDAD DE \$611,710.40 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.2 (DOS) ,PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA-LOS SANDOVALS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS" , CON NUMERO DE CONTRATO NOCHIS/FONDOIII/2023/21 ,PARA EFECTOS DEL PAGO ,SUBTOTAL: \$527,336.55 , IVA 16%: \$84,373.85. TOTAL DE LA FACTURA: \$611,710.40.	0.00	527,336.55	527,336.55

Trasladado Base 527,336.55 Impuesto (002) IVA Tipo Factor Tasa 0.160000

Importe 84,373.848

Subtotal	527,336.55
16 % (002) IVA	84,373.85
Total	611,710.40

SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 40/100 M.N.

Método pago : (PPD) Pago en parcialidades o diferido
 Condiciones pago : crédito Forma pago : (99) Por definir
 Clave moneda: MXN Tipo de cambio : 1

Número Certificado 00001000000508275901

Sello digital del CFDI

P/IU7moFaRLMxa5pYodpFh9oNB60GQ03Fo81wWL6JnAxvsQ4N2pjjw0QnyzfBUePLwL6f23wDezjT0XyzPyjnNQT1fZCF+5K07G1g72E7xi6oMh1MtJcbKcD3m86yMlmNGyFwxrR2J7B5D8Z7v14Lx7PxdCUGYKzm/jlnjvC7bMzq/9aFNEzEmoUJIZz90AxR5mSgmk1IKKbMitekrgvFHUlpXblIbHRTfMxso9mxI1wlp6NWE7ufxqetQLCRxkPwi.ru3zHi00vDwjRlBzDR57hWVY8kK+etv0jDwj+5qTmCd7Yt0/h20Vg6N4soHpvYt59HUagUH2UW2/dPd3D/g==

Sello del SAT

OF2i7G4dJdRE3WzMimcNv99XoOPTk6IRrzXayL/7U9dmMcYK6x9kTQdZNVvbeGgY+BwnORH/YDQqCRG0x0Lhp7pfr0uQ8OY/pKx31WK7/ZHdRd6525w+aokk8SzfFObb1b0QvNsNgHFE0r.dLE2QIXVMjjX+SYZmkSsVRKavIn7c8WFq2LrkC5e20e1AdIK15/Xiv67Jq2IRU17vLwPr8GMrsNgvq5jocquJNmsqbxVzP3LC6ThiKF8xNq60hLDkiLSvPt17agU+huZhP7+mu7VjTO2/hLqQ0mJHkrEwEJCtXy9UGAJa0MUMUdu4GNFolDqW8AKmjMvfHIC5Nkr0Aw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|79b034ea-257a-4cbe-ac24-5a4b40ff7e4e|2023-12-19T10:11:16|LSO1306189R5|P/IU7moFaRLMxa5pYodpFh9oNB60GQ03Fo81wWL6JnAxvsQ4N2pjjw0QnyzfBUePLwL6f23wDezjT0XyzPyjnNQT1fZCF+5K07G1g72E7xi6oMh1MtJcbKcD3m86yMlmNGyFwxrR2J7B5D8Z7v14Lx7PxdCUGYKzm/jlnjvC7bMzq/9aFNEzEmoUJIZz90AxR5mSgmk1IKKbMitekrgvFHUlpXblIbHRTfMxso9mxI1wlp6NWE7ufxqetQLCRxkPwi.ru3zHi00vDwjRlBzDR57hWVY8kK+etv0jDwj+5qTmCd7Yt0/h20Vg6N4soHpvYt59HUagUH2UW2/dPd3D/g==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Factura enviada por correo a : j_melendrez@hotmail.com



0244



ESTIMACION

NÚMERO DE ESTIMACIÓN: 2

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

NO. DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2023/21

UBICACIÓN: COL LINDA VISTA - LOS SANDOVALES

PERIODO: 00 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE

IMPORTE DE CONTRATO: \$1,799,692.25

CLAVE DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO	CONTRATO			ESTIMADO			POR ESTIMAR		
		CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
005	CONSTRUCCION DE ANDADOR GUARNICION DE CONCRETO F C= 150 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORPAM PEVENIMIENTO 8 A 10 CM. SECCION TRAPEZODIAL DE 0.15X0.20X0.40 CIMBRA COMUN A 4 USOS, INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCA EN PRESENTACION DE CUBETA DE 18 LTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	981.00	\$537.55	\$527,336.55	981.0	\$537,550	\$527,336.55	0.00	\$537.550	\$0.00
		IMPORTE		\$527,336.55	IMPORTE		\$527,336.55	IMPORTE		0.00
		IVA		\$84,373.85	IVA		\$84,373.85	IVA		0.00
		TOTAL		\$611,710.40	TOTAL		\$611,710.40	TOTAL		0.00

[Signature]
C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

[Signature]
ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

[Signature]
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DES. ECO. Y SOC.

[Signature]
C. MANUEL JIMENEZ FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



0245



RESUMEN DE ESTIMACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
NO. DE CONTRATO	NOCHIS/FONDOIII/2023/21
UBICACIÓN:	NOCHISTLAN DE MEJIA
PERIODO:	06 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE
IMPORTE DE CONTRATO:	\$1,799,692.25


HOJA	CLAVES DE CONCEPTOS CONTENIDOS	IMPORTE
1	5	\$ 527,336.55


HISTORIAL	
MONTO DEL CONTRATO	\$1,799,692.25
ANTICIPO	\$0.00
(-) DEDUCCIÓN 5 AL M.	\$0.00
ESTIMADO A LA FECHA	\$928,006.03
TOTAL POR ESTIMAR	\$871,686.22


SUBTOTAL	\$ 527,336.55
AMORTIZACION 0%	\$ -
SUBTOTAL	\$ 527,336.55

IVA 16%	\$ 84,373.85
TOTAL DE LA FACTURA	\$ 611,710.40
DEDUCCION 5 A MILLAR	\$ -
IMPORTE A RECIBIR	\$611,710.40

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023


 C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. JOSE FRANCISCO CAIERO DELGADILLO
 SUPERVISOR


 C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

0246

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2023/21
 MONTO CONTRATADO: \$1,799,692.25



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS


FECHA DE CONTRATO: 08/11/2023
 FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 08/11/2023
 PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 GUARNICION DE CONCRETO F.C. 150 EGQUEZ ADECUADO DE 80 MM. DESMOLTO NORMAL. REBOSAMIENTO 8 A 10 CM., SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.4X0.2X0.40 DIMENSA COMUN A 4 URS. INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO ASFALTA O ELIMACA EN PRESENTACION DE CUBIETA DE 19 LIT. MATERIALES, MANO DE OBR. BOMBO Y HERRAMIENTA

LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	UNIDAD
A	0+000 - 0+098	GUARNICION			98.00		M
A	0+100 - 0+144	GUARNICION			44.00		M
A	0+148 - 0+200	GUARNICION			51.00		M
A	0+200 - 0+220	GUARNICION			20.00		M
A	0+220 - 0+300	GUARNICION			70.00		M
A	0+300 - 0+318	GUARNICION			18.00		M
A	0+317.75 - 0+400	GUARNICION			78.25		M
A	0+400 - 0+450	GUARNICION			50.00		M
A	0+451 - 0+500	GUARNICION			38.00		M
A	0+500 - 0+580	GUARNICION			100.00		M
A	0+580 - 0+600	GUARNICION			80.00		M
A	0+600 - 0+620	GUARNICION			15.75		M
A	0+620 - 0+800	GUARNICION			100.00		M
A	0+800 - 1+000	GUARNICION			100.00		M
A	1+000 - 1+019	GUARNICION			19.00		M
TOTAL							991.00

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

CONTRATISTA: C. ANGELICA RIJANO AVILA
 MUNICIPIO: LOCALIDAD:
 NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 LINDA VISTA - LOS SANDOVALES
 PROGRAMA: FAISM
 EST. No. 2
 HOJAS: 1
 PERIODO DE: 08/11/2023 A 31/12/2023
 NOTAS:

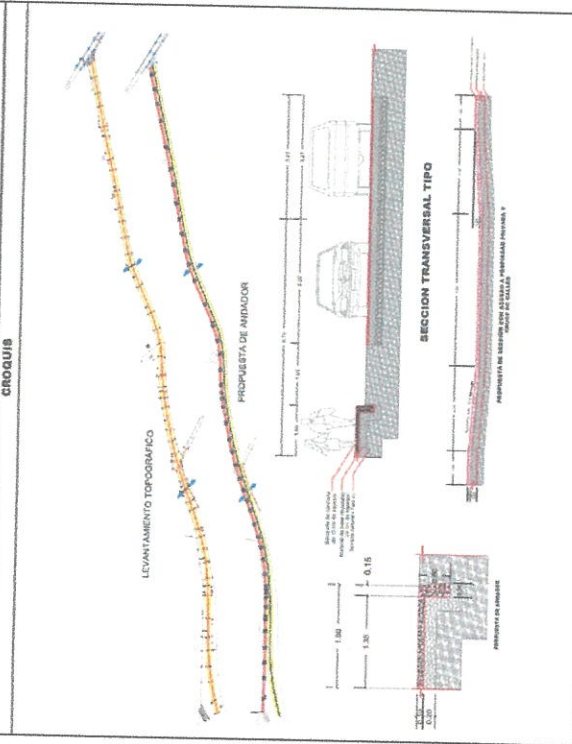

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

C. ANGELICA RIJANO AVILA
 CONTRATISTA

0247



MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/21		CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
MONTO CONTRATADO: \$1,799,692.25		PROGRAMA: FAISM	
FECHA DE CONTRATO: 06 DE NOVIEMBRE 2023		EST. NO.: 2	
FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 06 DE NOVIEMBRE 2023		HOJA: 1	
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023		PERIODO DE: A	
DESCRIPCION DE CONCEPTO: CLAVE DOS		NOTAS: 31/12/2023	



LOGO DE LA EMPRESA

GUARNICION DE CONCRETO Fc= 150 KG/CM3 ARMADO DE 20 MM. CERRILLO NOCANIL RENOVAMIENTO 8 A 10 CM. SECCION TRANSVERSAL DE 6.10X2.30X0.40 CUBIERTA CORON 4.4 USOS. INCLUYE: ENTUBA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCA EN PRESENTACION DE CUARTA DE 18 LTR. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

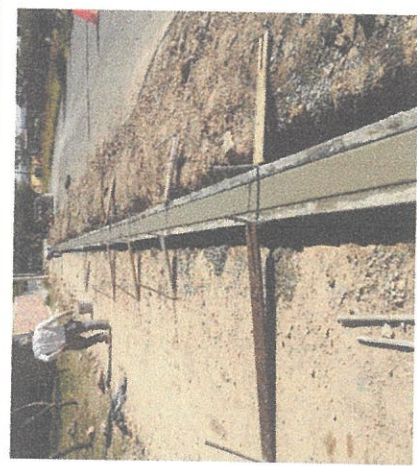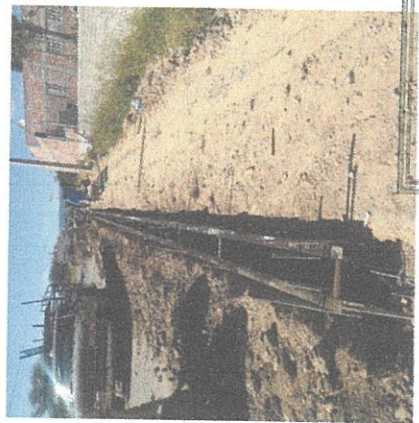

OPERADO
FAISM (FI)
EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

0248



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS**

Póliza: C03541 Del 29/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024
02:08 p. m.
Página | 1

Concepto: 138b - Obra Pública : 404012 - CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA- LOS SANDOVALES, MUNI.
GP Folio: 741

Beneficiario: ANGELICA RUANO AVILA

Folio / Cheque : 4

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404012-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$871,686.22		GP Folio: 741
0002	8260-511-404012-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$871,686.22	GP Folio: 741
0003	2113-001044	ANGELICA RUANO AVILA	\$871,686.22		GP Folio: 741
0004	1112-08-153	FONDO III 2023 1214132352		\$871,686.22	GP Folio: 741
Sumas iguales =>			<u>1,743,372.44</u>	<u>1,743,372.44</u>	



0249



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P10561 Del 29/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024
Página | 02:06 p. m.
1

Concepto: 138b - Obra Pública : 404012 - CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA- LOS SANDOVALES, MUNI.
GD Folio: 741

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-404012-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$871,686.22		GD Folio: 741
0002	8240-511-404012-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$871,686.22	GD Folio: 741
0003	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de	\$871,686.22		GD Folio: 741
0004	2113-001044	ANGELICA RUANO AVILA		\$871,686.22	GD Folio: 741
Sumas iguales =>			<u>1,743,372.44</u>	<u>1,743,372.44</u>	



0250



4 Z 4 0 6 2 0 3 5

MNM850101AC3

CUENTA NUEVA

FECHA: 29 DICIEMBRE 2023

\$ 871,686.22

NOCHISTLAN, ZACATECAS

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGELICA RUANO AVILA

(OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N)

MONEDA NACIONAL

258729

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0870 NOCHISTLAN CTA 121413235-2

No. CUENTA


No. CHEQUE

Manuel Jimenez J. [Signature] FIRMA

2244:512210723:012141323521#0000004

OPERADO FAISM (FII) EJERCICIO 2023

MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR


NOMBRE
RUANO
AVILA
ANGELICA
FECHA DE NACIMIENTO
10/07/1988
SEXO M

DOMICILIO
C 16 DE SEPTIEMBRE 166
DANIEL CAMARENA 99914
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
CLAVE DE ELECTOR RNAVAN88071032M500
CURP RUAA880710MZSNVNO2 AÑO DE REGISTRO 2006 01
ESTADO 32 MUNICIPIO 034 SECCIÓN 0999
LOCALIDAD 0028 EMISIÓN 2013 VIGENCIA 2023

IFPE





ID MEX1092553296<<0999107852733
8807102M2312318MEX<01<<02713<5
RUANO<AVILA<<ANGELICA<<<<<<<<<

0252

29/diciembre/2023

ANGELICA RUANO AVILA

871,686.22

(OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

Se expide este cheque en pago del concepto que se señala ATENTAMENTE



CUENTA C03541	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
1112-08-153		138b - Otra Pública : 404012 - CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA- LOS SANDOVALES, MUNI. GP Folio: 741 FONDO III 2023 1214132352				\$871,686.22
8270-511-6141-2	404012-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital			\$871,686.22	
			Total :		871,686.22	871,686.22

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUMAS IGUALES

0253

FORMULO: REVISO PAGO: AUTORIZO PAGO: AUT. ASIENT. CONT. OPERO AUXIL. PASO AL DIARIO: POLIZA No.

29/diciembre/2023

ANGELICA RUANO AVILA

871,686.22

(OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

Se expide este cheque en pago del concepto que se señala ATENTAMENTE

CUENTA C03541	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
1112-08-153		138b - Obra Pública : 404012 - CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA- LOS SANDOVALES, MUNI. GP Folio: 741 FONDO III 2023 1214132352				\$871,686.22
8270-511-6141-2	404012-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital			\$871,686.22	
Total :					871,686.22	871,686.22

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

SUMAS IGUALES

0254


FIRMA CHEQUE RECIBIDO

FORMULO:	REVISO PAGO:	AUTORIZO PAGO:	AUT. ASIENT. CONT.	OPERO AUXIL.	PASO AL DIARIO:	POLIZA No.
----------	--------------	----------------	--------------------	--------------	-----------------	------------


ORDEN DE PAGO 2023


28-dic

MUNICIPIO: 034 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: RAMO 33 . PROGRAMAS FEDERALES
 SUB-PROGRAMA : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 (RAMO, FONDO O PROGRAMA) (FONDO III 2023)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
 FIRMA DEL SOLICITANTE: 
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 28 de diciembre de 2023
 CUENTA BANCARIA ORIGEN : 1214132352 BANORTE

No.	CLAVE PRESUPUESTARIA								NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE.	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO						
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	511	FONDO III RAMO 33	404012	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA-LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6141	PAGO DE ESTIMACION TRES Y FINIQUITO DE LA OBRA.	NOCHIS/FOND OIII/2023/21	ANGELICA RUANO AVILA	138b	28/12/2023	871,686.22	(OCHISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 22/100 MN)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AUTORIZA:

TESORERÍA MUNICIPAL
 LILIANA ROQUE GOMEZ.
 ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2023

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AUTORIZA:

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
 SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024
 FECHA : 28 DE DICIEMBRE DEL 2023

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AUTORIZA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. JOSE MANUEL JIMENEZ
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FECHA : 28 DE DICIEMBRE DEL 2023

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AUTORIZA:

SINDICATURA MUNICIPAL
 LILIANA ROQUE GOMEZ.
 SÍNDICO MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024
 FECHA : 28 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGAN EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.

0255



ANGELICA RUANO AVILA
RUAA880710SQ6

16 DE SEPTIEMBRE 166
CENTRO LOCALIDAD DANIEL CAMARENA
NOCHISTLAN DE MEJIA, NOCHISTLAN.
ZACATECAS, México C.P. 99914
(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Teléfonos: (346)-100-1611, (346)-101-2142
Tipo Comprobante: (I) Ingreso
Exportación: (01) No aplica

Factura A 537
Folio fiscal
4092872b-74fc-46f8-91b5-1df537c9138b
RFC Certificador
LSO1306189R5
No. certificado del SAT
00001000000509846663
Fecha y hora certificación
2023-12-28 12:53:34
Lugar Expedición: Zacatecas, 99914

RFC	MNM850101AC3	Fecha expedición	28/12/2023 12:53:33
Nombre	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS	Uso CFDI	(G03) Gastos en general.
Régimen Fiscal	(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos	Dirección Fiscal	99900
Calle	HIDALGO 1		
Colonia	CENTRO Municipio NOCHISTLAN DE MEJIA C.P. 99900		
Ciudad, Estado	, ZACATECAS. MEXICO	Fecha pago	28/12/2023

Clave	ProdServ	ObjImp	Cant	Cve. Unidad	Descripción	Descuento	Precio unitario	Importe
72141121	72141121	02	1.00	(E48)	RECIBI DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA LA Unidad CANTIDAD DE \$871,686.22 POR CONCEPTO DE PAGO de DE LA ESTIMACION No.3 (TRES) Y FINIQUITO ,PARA servicio LA OBRA "CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA-LOS SANDOVALES,MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS" , CON NUMERO DE CONTRATO NOCHIS/FONDOIII/2023/21 ,PARA EFECTOS DEL PAGO ,SUBTOTAL: \$751,453.64 , IVA 16%: \$120,232.58. TOTAL DE LA FACTURA: \$871,686.22.	0.00	751,453.64	751,453.64

Trasladado Base 751,453.64 Impuesto (002) IVA Tipo Factor Tasa 0.160000

Importe 120,232.5824

Subtotal	751,453.64
16 % (002) IVA	120,232.58
Total	871,686.22

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.

Método pago : (PPD) Pago en parcialidades o diferido

Condiciones pago : crédito Forma pago : (99) Por definir

Clave moneda: MXN Tipo de cambio : 1

Número Certificado 00001000000508275901

Sello digital del CFDI

SH8dWFzZG9PqnPtuLnEJPIHW40uTOFHZ8vTV1bAs3EFLNwk2JaiMSP8r+Mm0DIGC7tZLkOnfH4Bki6MGAGM+x8C7JuVXjRQKI1GVWUaZjF1FBv0gywcN3Pb1jt75sRp cr5H4JcRrLDumayQTxeL40t2buQkYFw+J6ELKdGI+kFbnA7FkxsBD/MIGqvbvq9WgIwcpOs6E/D/pNE11zKdCAtbMu2pQcPvNDXY6r/MSYo2JjHFJF36szMKMFaSGh mnwQ087ci2mTwjrHB7U8t0+wMZYD816Zrx2PQaTsjevu6vOet6GcJ3HWINhLTnHbGee/JXCfWj39jj5vYEj9Hvw==

Sello del SAT

Z17qWnMDQI4aQ9gdX1zpk+vVZcMWCCYdKLaR0oy+otmA9xA8ABsKuqYAT2s8GZHBmHuP085685nx91x6dWxvp9nX5QZQs1bz52d+sQLTSUI7NV0aeHwKLLN00LD2I nFW2cQUI4rImFGN/tSh0oR1ozsSGaB/uW2lta/bfErJtRwC0iHLBoFmUtDEbcqnU8qzWt03+HdklnapSB1TCZic1zFTuqR5IAwUYir8ZsJFjTv0jeJ0t0kAMm8dD0pu EjBsBPeFYaVtPfn/Rk4/wWQUmFQARUBjY+5KdxDosqqJy7MF3AZ1k5SrT2BTiJvF+GjzEuWim97Mw8s9Op1AubA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4092872b-74fc-46f8-91b5-1df537c9138b|2023-12-28T12:53:34|LSO1306189R5|SH8dWFzZG9PqnPtuLnEJPIHW40uTOFHZ8vTV1bAs3EFLNwk2Jai MSP8r+Mm0DIGC7tZLkOnfH4Bki6MGAGM+x8C7JuVXjRQKI1GVWUaZjF1FBv0gywcN3Pb1jt75sRper5H4JcRrLDumayQTxeL40t2buQkYFw+J6ELKdGI+kFbnA7Fkxs BD/MIGqvbvq9WgIwcpOs6E/D/pNE11zKdCAtbMu2pQcPvNDXY6r/MSYo2JjHFJF36szMKMFaSGhmnwQ087ci2mTwjrHB7U8t0+wMZYD816Zrx2PQaTsjevu6vOet6G cJ3HWINhLTnHbGee/JXCfWj39jj5vYEj9Hvw==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



0256



ESTIMACION

NÚMERO DE ESTIMACIÓN: 3
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
NO. DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2023/21
UBICACIÓN: COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES
PERIODO: 06 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE
IMPORTE DE CONTRATO: \$1,799,692.25

CLAVE DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO	CONTRATO			ESTIMADO			POR ESTIMAR		
		CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
006	CONSTRUCCION DE ANDADOR: PAVIMENTO DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 ASREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 0.10 MTS DE ESPESOR. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR	1320.00	\$544.62	\$718,898.40	1320.0	\$544.620	\$718,898.40	0.00	\$544.620	\$0.00
007	PAVIMENTO DE CONCRETO FC = 250 KG/CM2 AGREGADO DE 19 MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENORES.	45.00	\$723.45	\$32,555.24	45.0	\$723.450	\$32,555.24	0.00	\$723.450	\$0.00
			IMPORTE	\$751,453.64		IMPORTE	\$751,453.64		IMPORTE	0.00
			IVA	\$120,232.58		IVA	\$120,232.58		IVA	0.00
			TOTAL	\$871,686.22		TOTAL	\$871,686.22		TOTAL	0.00

C. ANGÉLICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DEIGADILLO
 SUPERVISOR

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DES. ECO. Y SOC.

MARIAM ELIZABETH FUENTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

0257

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023



RESUMEN DE ESTIMACIÓN

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
NO. DE CONTRATO	NOCHIS/FONDOIII/2023/21
UBICACIÓN:	NOCHISTLAN DE MEJIA
PERIODO:	06 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE
IMPORTE DE CONTRATO:	\$1,799,692.25

HOJA	CLAVES DE CONCEPTOS CONTENIDOS	IMPORTE
1	006 - 007	\$ 751,453.64

HISTORIAL	
MONTO DEL CONTRATO	\$1,799,692.25
ANTICIPO	\$0.00
(F) DEDUCCIÓN 5 AL M. ESTIMADO A LA FECHA	\$1,799,692.25
TOTAL POR ESTIMAR	\$0.00

SUBTOTAL	\$ 751,453.64
AMORTIZACION 0%	\$ -
SUBTOTAL	\$ 751,453.64

IVA 16%	\$ 120,232.58
TOTAL DE LA FACTURA	\$ 871,686.22
DEDUCCION 5 A MILLAR	\$ -
IMPORTE A RECIBIR	\$871,686.22

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSE FRANCISCO CAIERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOH/2023/21
MONTO CONTRATADO: \$1,799,692.25

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS




FECHA DE CONTRATO:
FECHA DE INICIO: 06 DE NOVIEMBRE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023

DESCRIPCION DE CONCEPTO: PAVIMENTO DE CONCRETO FOL-205 IGUALDADADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO A 10 CIL. DE 0.10 PTS DE ESPESOR. ARMADO CON MALLA ELECTRODINAMICA 10-10/10 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE OBRERA METALICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR

CLAVE OBR	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	ANCHO	LARGO	ALTO	AREA	UNIDAD
		A-B	PAVIMENTO	1.35	96.00		129.17	M2
		0+000 - 0+096	PAVIMENTO	1.35	44.00		59.20	
		0+100 - 0+144	PAVIMENTO	1.35	51.00		68.82	
		0+148 - 0+200	PAVIMENTO	1.35	20.00		26.81	
		0+200 - 0+220	PAVIMENTO	1.35	70.00		94.19	
		0+220 - 0+300	PAVIMENTO	1.35	16.00		24.22	
		0+300 - 0+318	PAVIMENTO	1.35	76.25		105.29	
		0+321.79 - 0+400	PAVIMENTO	1.35	60.00		67.28	
		0+400 - 0+460	PAVIMENTO	1.35	38.00		52.48	
		0+460 - 0+500	PAVIMENTO	1.35	100.00		134.66	
		0+500 - 0+600	PAVIMENTO	1.35	80.00		107.64	
		0+600 - 0+680	PAVIMENTO	1.35	18.79		21.19	
		0+680 - 0+800	PAVIMENTO	1.35	100.00		134.66	
		0+800 - 1+000	PAVIMENTO	1.35	100.00		134.66	
		1+000 - 1+019	PAVIMENTO	1.35	19.00		25.37	
							TOTAL	1320.00

LEGO DE LA OBRA:



NOTAS:

CROQUIS

CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA
MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
PROGRAMA: FAISM

REG. No.: 3
Hojas: 1
PERIODO DE: A
DE: 2
31/12/2023


ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

OPERADO FAISM (FIH) EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

MEMORIA FOTOGRAFICA

HOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO:	CONTRATISTA:	PROGRAMA:
NOCHIS/FONDOIII/2023/21	NOCHIS/FONDOIII/2023/21	C. ANGELICA RUANO AVILA	FAISM
MONTRO CONTRATADO:		LOCALIDAD:	
\$1,799,892.25		LINDA VISTA - LOS SANDOVALES	
			
DESCRIPCION DE CONCEPTO:			
PAVIMENTO DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 AGRIGADO DE 20 MIL. CEMENTO NORMAL. REVENIMIENTO 8 A 16 CM. DE 0.10 MTS DE ESPESOR. ARMADO CON MALLA ELECTROBOLGADA 85-1010 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CURBIA METALICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR			
FECHA DE CONTRATO:	FECHA DE INICIO:	HOJE:	PERIODO DE:
15 DE NOVIEMBRE 2023	05 DE NOVIEMBRE 2023	08/11/2023	1 A
PLAZO DE EJECUCION:	FECHA DE TERMINO:	NOTAS:	DET 2:
60 DIAS	31 DE DICIEMBRE 2023		31/12/2023



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 23

0260

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2023/21
 MONTO CONTRATADO: \$1,799,692.25

SERVICIOS MELENDEZ
 CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

LOGO DE LA EMPRESA

FECHA DE CONTRATO: 01/11/2023
 FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 01/11/2023
 PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

PAVIMENTO DE CONCRETO P.C. 250 KG/CM3 ARMADO DE 19 MPA, CEMENTO NORMAL RETENIMIENTO A 10 CM. DE 15 CM DE EPSOM, ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6 C-1010 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE CURBA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENORES.


CLAVE	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	ANCHO	LARGO	ALTO	AREA	UNIDAD
007	A-B	0+098 - 0+100	PAVIMENTO	1.5	4.00		6	M2
	A-B	0+144 - 0+149	PAVIMENTO	1.5	5.00		7.5	M2
	A-B	0+220 - 0+230	PAVIMENTO	1.5	10.00		15	M2
	A-B	0+250 - 0+261	PAVIMENTO	1.5	11.00		16.5	M2
TOTAL								46.00

CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA
 MUNICIPALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 LOCALIDAD: LINDA VISTA - LOS SANDOVALES

PROGRAMA: FAISM

EST. No. 3
 HONORARIOS: 2
 PERIODO DE: 08/11/2023 A 31/12/2023

NOTAS: CROQUIS

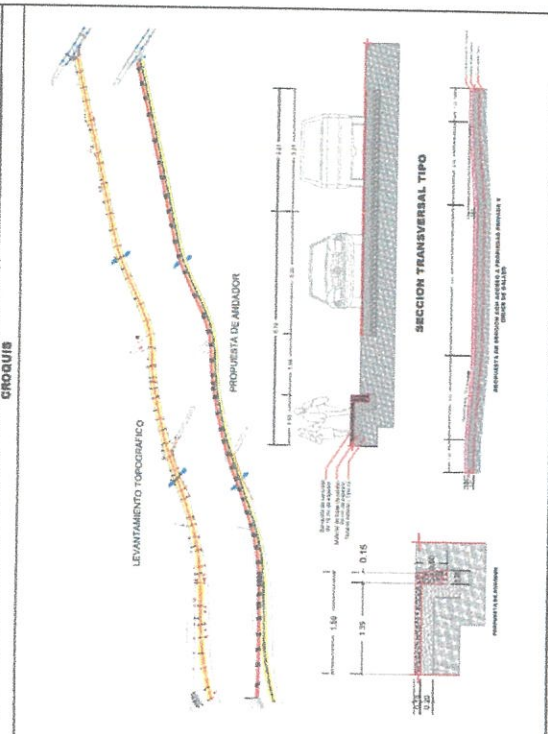

ING. DIEGO ALEJANDRO MERVADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

0261

MEMORIA FOTOGRAFICA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS		CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2023/21		CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA		PROGRAMA: FAISM	
MONTO CONTRATADO: \$1,799,692.25		LOCALIDAD: LINDA VISTA - LOS SANDOVALES		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		PERIODO DE: DE: 2 A: 31/12/2023	
FECHA DE CONTRATO: 1		FECHA DE INICIO: 06 DE NOVIEMBRE 2023		EST. No.: 3		HOJAS: 2	
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS		FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2023		NOTAS:		A	



LOGO DE LA EMPRESA

PAVIMENTO DE CONCRETO P.C. # 250 REGIONE ACREGADO DE 18 MM, CEMENTO NORMAL REVENDIMIENTO 8 A 10 CIL. DE 45 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTRODOLADA 6-6-10-10 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRINA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENORES.

CLAVE:
007



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 23

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO GUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

0262



ACUMULADO DE ESTIMACION

ACUMULADO DE ESTIMACIONES	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
NOMBRE DE LA OBRA:	NOCHIS/FONDOI/2023/I/1
NO. DE CONTRATO:	COL LINDA VISTA - LOS SANDOVALES
UBICACION:	06 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE
PERIODO:	\$1,799,692.25
IMPORTE DE CONTRATO:	

UNIDAD	CONTRATO				ESTIMADO				POR ESTIMAR			
	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
M2	1377.00	\$11.19	\$15,408.63	1377.0	\$11.190	\$15,408.63	0.00	\$11.190	\$0.00	0.00	\$11.190	\$0.00
M3	520.80	\$16.36	\$8,520.29	520.8	\$16.360	\$8,520.29	0.00	\$16.360	\$0.00	0.00	\$16.360	\$0.00
M3	79.00	\$416.08	\$32,870.32	79.0	\$416.080	\$32,870.32	0.00	\$416.080	\$0.00	0.00	\$416.080	\$0.00
M3	324.00	\$447.65	\$145,038.60	324.0	\$447.650	\$145,038.60	0.00	\$447.650	\$0.00	0.00	\$447.650	\$0.00
M	981.00	\$537.55	\$527,336.55	981.0	\$537.550	\$527,336.55	0.00	\$537.550	\$0.00	0.00	\$537.550	\$0.00
M2	1320.00	\$544.62	\$718,898.40	1320.0	\$544.620	\$718,898.40	0.00	\$544.620	\$0.00	0.00	\$544.620	\$0.00
M2	45.00	\$723.45	\$32,555.25	45.0	\$723.450	\$32,555.25	0.00	\$723.450	\$0.00	0.00	\$723.450	\$0.00
M2	6.75	\$11.19	\$75.53	6.8	\$11.190	\$75.53	0.00	\$11.190	\$0.00	0.00	\$11.190	\$0.00
M3	12.00	\$55.70	\$668.40	12.0	\$55.700	\$668.40	0.00	\$55.700	\$0.00	0.00	\$55.700	\$0.00
M3	12.00	\$85.40	\$1,024.80	12.0	\$85.400	\$1,024.80	0.00	\$85.400	\$0.00	0.00	\$85.400	\$0.00
M3/KM	12.00	\$8.39	\$100.68	12.0	\$8.390	\$100.68	0.00	\$8.390	\$0.00	0.00	\$8.390	\$0.00
M2	2.58	\$201.31	\$519.38	2.6	\$201.310	\$519.38	0.00	\$201.310	\$0.00	0.00	\$201.310	\$0.00
PZA	4.00	\$2,375.05	\$9,500.20	4.0	\$2,375.050	\$9,500.20	0.00	\$2,375.050	\$0.00	0.00	\$2,375.050	\$0.00
ML	3.20	\$380.89	\$1,218.85	3.2	\$380.890	\$1,218.85	0.00	\$380.890	\$0.00	0.00	\$380.890	\$0.00
ML	3.20	\$381.32	\$1,220.22	3.2	\$381.320	\$1,220.22	0.00	\$381.320	\$0.00	0.00	\$381.320	\$0.00
M3	1.50	\$2,290.82	\$3,436.23	1.5	\$2,290.820	\$3,436.23	0.00	\$2,290.820	\$0.00	0.00	\$2,290.820	\$0.00

CLAVE DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
001	CONSTRUCCION DE ANDADOR TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO EN TERRENO PLANO DE 1000 A 2000 M2, INCLUYE: TOPOGRAFO Y CADENERO, OPERADOR
002	DESPLAZAR A MAQUINA EN TERRENO DESPECIFICANDO EL MATERIAL PARA DESPLANTAR DE TERRAPLENES FORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL. DE BANCO INCLUYE: COMPACTACION AL 95% PROCTOR, INCLUYE INCORPORACION DE AGUA, EXTENDIDO DE MATERIAL COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA.
003	MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE LA SUB BASE RASANTE BASE COMPACTADA AL 98% UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PETRECO (50% MATERIAL DE BANCO- 50% MATERIAL PETRECO)
004	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.15X0.20X0.40 CIMBRA COMUN A 4 USOS, INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCA EN PRESENTACION DE CUBIETA DE 19 LITS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
005	PAVIMENTO DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 10 MTS. INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR
006	PAVIMENTO DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 AGREGADO DE 19 MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTRODOLADA 6-6-10 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA
007	PUEBLO 1 TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO EN TERRENO PLANO DE 1000 A 2000 M2. INCLUYE: TOPOGRAFO Y CADENERO, OPERADOR
008	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I EN CEPJA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
009	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL. PRIMER KILOMETRO SOBRE CAMINO DE TERRACERA, CARGA CON MAQUINA
010	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE KILOMETROS SUBSECUENTES. SE CONSIDERA: (3 KM)
011	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'c = 100 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. REVENIMIENTO 8 A 10 CM. ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS COM. BOTE INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREO Y COLADO
012	ZAFATA ABALDA CUADRADA, EN TERRENO TIPO A DE CONCRETO 200 KG/CM2 AGREGADO DE 24 MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. SECCION 0.80X0.80 MTS. PERALTE DE 0.25 MTS. PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, ARMADO SENCILLO CON ACERO DE REFUERZO #3 @ 0.17 MTS EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2 REVENIMIENTO 8 A 10 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR
013	DAJA DE BARRA DE DESPLANTE DE CONCRETO SECCION 0.15X0.20 M CON FABRICACION DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM. CON REVOLVEDORA. 1 SACO TROMPO, MANO DE OBRA EN FABRICACION, BAJAS RESISTENCIAS, CIMBRA ACABADO COMUN A 4 USOS ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NUMERO 3 (3B7) DEL NUMERO 2.5 (14T) Y ESTRIBOS A CADA 1.5 MTS. DEL NUMERO 2.5. INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO
014	DAJA O CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO SECCION 0.15X0.20 M CON FABRICACION DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM. CON REVOLVEDORA. 1 SACO TROMPO, MANO DE OBRA EN FABRICACION, BAJAS RESISTENCIAS, CIMBRA ACABADO COMUN A 4 USOS ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NUMERO 3 (3B7) DEL NUMERO 2.5 (14T) Y ESTRIBOS A CADA 0.15 MTS. DEL NUMERO 2.5. INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO
015	MUPO DE FORMAS DE 30 CM DE ANCHO A BASE DE PIEDRA BOLA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIM 20MM CON UN REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.50
016	MUPO DE FORMAS DE 30 CM DE ANCHO A BASE DE PIEDRA BOLA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIM 20MM CON UN REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.50

EJERCICIO 2023

017	BOCEDA A BASE DE TABIQUE ADORON A UN CASCO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL LUGAR O, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.75	\$841.97	\$5,683.30	6.8	\$841.970	\$5,683.30	0.00	\$841.970	\$0.00
018	PAVIMENTO CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTOS 8 A 10 CM. DE 0.12" DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 8-8 10-10 ROLLO DE 100 M. INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	6.75	\$622.13	\$4,199.38	6.8	\$622.130	\$4,199.38	0.00	\$622.130	\$0.00
019	VIGUETA DE ACERO REFORZADO. INCLUYE: ANGULO DE 2 X 3/16, VARILLA DE #6, VARILLA DEL # 4 (1/2) PARA CULIERILLA, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$1,169.25	\$3,507.75	3.0	\$1,169.250	\$3,507.75	0.00	\$1,169.250	\$0.00
020	PARANDAL TUBULAR DE 0.90 MTS DE ALTURA A BASE PASAMANOS TUBULAR MOD 100 Y C/ANDRO C/50 DE 1 1/2" PARA CULIERILLA, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$3,611.70	\$3,611.70	1.0	\$3,611.700	\$3,611.70	0.00	\$3,611.700	\$0.00
021	PUNTEO Y ANIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO EN TERRENO PLANO DE 1000 A 2000 M2. INCLUYE: TOPOGRAFOS Y CADENERO, OPERADOR.	M2	8.10	\$11.19	\$90.64	8.1	\$11.19	\$90.64	0.00	\$11.190	\$0.00
022	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I EN CEPA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	12.00	\$55.70	\$668.40	12.0	\$55.70	\$668.40	0.00	\$55.700	\$0.00
023	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL, PRIMER KILOMETRO.	M3	12.00	\$85.40	\$1,024.80	12.0	\$85.40	\$1,024.80	0.00	\$85.400	\$0.00
024	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL, NO UTILIZABLE KILOMETROS SUBSECUENTES, SE CONSIDERAN (3 KM).	M3/KM	12.00	\$8.39	\$100.68	12.0	\$8.39	\$100.68	0.00	\$8.390	\$0.00
025	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'c = 100 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. REVENIMIENTO 8 A 10 CM. ACARREO HORIZONTAL PARA INSTALACION DE 25.00 MTS CON EOTE INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANIVELACION, MAESTREADO Y COLADO.	M2	2.56	\$201.31	\$515.35	2.6	\$201.31	\$515.35	0.00	\$201.310	\$0.00
026	ZAPATA ALSADA CUADRADA, EN TERRENO TIPO A DE CONCRETO 200 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. REVENIMIENTO NORMAL. REVENIMIENTO 8 A 10 CM. SECCION 0.60X0.80 MTS. PERFORO DE 0.25 MTS. PLANTILLA DE 2.05 MTS DE ESPESOR, ARMADO SENCILLO DE PERFORO DE REFUERZO # 3 @ 0.17 MTS EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO Y SECCION 0.20X0.30 Y UNA ALTURA DE 1.20 ARCADOS CON 4 VARILLAS # 3 DE DIAMETRO Y # 2 ESTRIBO DE 3.2 SEPARADO @ 0.20 MTS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	PZA	4.00	\$2,375.05	\$9,500.20	4.0	\$2,375.05	\$9,500.20	0.00	\$2,375.050	\$0.00
027	DALAO CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO SECCION 0.15X0.20 M CON FABRICACION DE ARMADO NORMAL. REVENIMIENTO 8 A 10 CM. INCLUYE: CEMENTO, ARENA, SACO TROMPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.20	\$380.89	\$1,218.85	3.2	\$380.89	\$1,218.85	0.00	\$380.890	\$0.00
028	DALA C CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO SECCION 0.15X0.20 M CON FABRICACION DE ARMADO NORMAL. REVENIMIENTO 8 A 10 CM. INCLUYE: CEMENTO, ARENA, SACO TROMPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.20	\$381.32	\$1,220.22	3.2	\$381.32	\$1,220.22	0.00	\$381.320	\$0.00
029	MURO DE PIEDRA BRAZA DE 40 CM DE ANCHO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2.00	\$1,373.29	\$2,746.58	2.0	\$1,373.29	\$2,746.58	0.00	\$1,373.290	\$0.00
030	POTEDA A BASE DE TABIQUE ADORON A UN CASCO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL LUGAR O, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.10	\$841.97	\$6,819.96	8.1	\$841.97	\$6,819.96	0.00	\$841.970	\$0.00
031	PAVIMENTO CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTOS 8 A 10 CM. DE 0.12" DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 8-8 10-10 ROLLO DE 100 M. INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	8.10	\$622.13	\$5,039.25	8.1	\$622.13	\$5,039.25	0.00	\$622.130	\$0.00
032	VIGUETA DE ACERO REFORZADO. INCLUYE: ANGULO DE 2 X 3/16, VARILLA DE #6, VARILLA DEL # 4 (1/2) PARA CULIERILLA, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$1,169.25	\$3,507.74	3.0	\$1,169.25	\$3,507.74	0.00	\$1,169.248	\$0.00
033	PARANDAL TUBULAR DE 0.90 MTS DE ALTURA A BASE PASAMANOS TUBULAR MOD 100 Y C/ANDRO C/50 DE 1 1/2" PARA CULIERILLA, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$3,611.70	\$3,611.70	1.0	\$3,611.70	\$3,611.70	0.00	\$3,611.700	\$0.00
										IMPORTE	\$1,551,458.84
										IVA	\$248,233.41
										TOTAL	\$1,799,692.25

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DES. ECO. Y SOC.

ING. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

Manuel Jimenez
C. MANUEL JIMENEZ FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

0264

EJERCICIO 2023

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

% AVANCES FISICO	REAL	PROGRAMADO
	25	10
% AVANCES FINANCIERO	0	0

PARTIDAS	IMPORTES	M E S E S												DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO					
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO							
TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO EN TERRENO PLANO DE 1000 A 2000 M ² . INCLUYE: TOPOGRAFIA Y CADENERO. OPERACION	\$15,408.83																	3	4.89	
DEBALLE A MAQUINA EN TERRENO DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA DEBPLANTE DE TERRAPLENES	\$8,520.29																		3	4.89
FORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE COMPACTACION AL 95% PROCTOR. INCLUYE INCORPORACION DE AGUA, CAPAS DE 25 CM. MATERIALES: EQUIPO	\$32,870.32																		2	3.13
MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE LA SUB BASE DE BANCOS Y MATERIAL PETREO 50% MATERIAL DE BANCO Y 50% MATERIAL PETREO	\$145,038.60																		4	6.25
GUARNICION DE CONCRETO C/ 150 KG/CM ² AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL. TRAFICADO EN 10 CM. SECCION TRAFICADA EN 10 CM. INCLUYE PINTURA PARA TRAFICADO AMARILLO O BLANCA EN PRESENTACION DE CUBETA DE 18 L.T.G. MATERIALES: MANO DE OBRA, EQUIPO Y INSTRUMENTOS	\$527,336.55																		8	7.81
PAVIMENTO DE CONCRETO C/ 250 KG/CM ² AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL. REVENIMIENTO A 10 CM DE 10 MTS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 88-1018 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE CUBRA METALICA, MANO DE OBRA, INSTRUMENTOS Y EQUIPO	\$718,898.40																		25	30.06
PAVIMENTO DE CONCRETO C/ 250 KG/CM ² AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL. REVENIMIENTO A 10 CM DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 88-1018 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE CUBRA METALICA, MANO DE OBRA Y INSTRUMENTOS Y EQUIPO	\$32,855.28																		25	30.06

No. REPORTE:	1
FECHA REPORTE:	17/11/2023

DATOS DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VIST. LOS SANCORVALES, MUNICIPIO DE HOCHISTLAN DE MEJIA

UBICACION:	HOCHISTLAN DE MEJIA
TIPO DE OBRA:	MEJIA
MODALIDAD BANC:	CONTRATO
No. CONTRATO:	NOCHIBFONCHII020321
EMPRESA:	C. ANGELICA RUANO ARILLA
MONTO CONTRATO:	\$1,709,892.25
FECHA CONTRATO:	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
MONTO ANTICIPO:	\$0.00
FECHA PAGO ANTICIPO:	N/A

No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO TERMIN
FECHAS PROGRAMADAS:	06-nov-23 31-dic-23
FECHA REALIZ:	13-nov-23
FECHAS REPROGRAMADAS:	

OBSERVACIONES:
EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ESO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SERIA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.

**OPERA
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023**

RESIDENTE DE SUPERVISION:
ING. JOSE FRANCISCO CALERO DELGADILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Nº. REPORTE: 1
FECHA REPORTE: 17/11/2023

% AVANCES FÍSICO	REAL	PROGRAMADO
	0	0
% AVANCES FINANCIERO	REAL	PROGRAMADO
	0	0

DATOS DE LA OBRA		PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA													DÍAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO	
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VIST. LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	PARTIDAS	IMPORTE\$	MESES													
UBICACIÓN:	NOCHISTLAN DE MEJIA			AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO							
TIPO DE OBRA:	NUOVA																
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO																
Nº. CONTRATO:	NOCHISFONDOIFR0202321	PUENTE 1	\$34,766.42													15	23.44
EMPRESA:	C. ANGELICA RUANO AVILA	PUENTE 2	\$36,064.36													16	25.00
MONTO CONTRATO:	\$1,799,692.25																
FECHA CONTRATO:	06 DE NOVIEMBRE DE 2023																
MONTO ANTICIPO:	\$0.00																
FECHA PAGO ANTICIPO:	N/A																
Nº. AMPL. DE CONTRATO:	N/A																
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A																
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A																
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO TERMIN.																
FECHAS PROGRAMADAS:	6-nov-23 31-jul-23																
FECHAS REALES:	13-nov-23																
FECHAS REPROGRAMADAS:																	
OBSERVACIONES:																	
SUBTOTAL			\$1,551,488.84														
IVA			\$248,233.41														
TOTAL			\$1,799,822.25														
<p align="right">PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA</p> <p align="center">M E S E S</p> <p align="center">AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO</p>																	
GUBTOTAL			\$1,551,488.84														
IVA			\$248,233.41														
TOTAL			\$1,799,822.25														
TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION																64	

RESORTE DE SUPERVISIÓN:
ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
José

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

EJERCICIO 2023

0266



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA LOS SANDOVALES, MUNICIPIO
DE NOCHISTLAN DE MEJIA
NOCHISTLAN DE MEJIA
06 DE NOVIEMBRE DE 2023-31 DE DICIEMBRE DE 2023
17 DE NOVIEMBRE DE 2023
10.00%

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0267



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



0268

OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA - LOS SANDOVALES, MUNICIPIO
LOCALIDAD: DE NOCHISTLAN DE MEJIA
PERIODO DE EJECUCIÓN: NOCHISTLAN DE MEJIA
FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2023-31 DE DICIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 17 DE NOVIEMBRE DE 2023
10.00%

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Nº. REPORTE : 2
FECHA REPORTE : 24/11/2023

DATOS DE LA OBRA
NOMBRE: CONSTRUCCION DE ANDARQUE URBANO COL. BANDOLVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE NUEVA LEON
UBICACION: NOCHISTLAN DE NUEVA LEON
TIPO DE OBRA: NUEVA
MODALIDAD E/REG.: CONTRATO
No. CONTRATO: NOCHIS/FONDI/17033/21
EMPRESA: C. ANGELICA RUANO AVILA

MONTO CONTRATO: \$1,799,692.25
FECHA CONTRATO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

MONTO ANTICIPO: \$0.00
FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

NO. AMPL. DE CONTRATO: N/A
MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A
PERIODO DE EJECUCION: N/A
FECHAS PROGRAMADAS: 8-nov-23 a 31-dic-23
FECHAS REALES: 13-nov-23

OBSERVACIONES:
EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA EN CUENTA AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ES DECIR, AL TOTAL DE DIAS QUE SE PUEDEN EJECUTAR LA OBRA, POR LO QUE EL PORCENTAJE SERA SIEMPRE TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.

% AVANCE	REAL		PROGRAMADO	
	FINANCIERO	PHISICO	FINANCIERO	PHISICO
0	0	25	0	35
0	0	0	0	0

PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO				
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ENERO	FEBRERO											
TRAZO Y REVELACION CON CERCA TOPOGRAFICO EN TERRENO PLANO DE 1000 A 2000 M2, INCLUYE TOPOGRAFO Y CABENERO, OPERADOR	\$15,408.63																	3	4.89
TERMINOS Y ACABADOS EN TERRENO DESPLANTE DE TERRAPLENES	\$8,520.29																	3	4.00
FORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE RECONSTRUCCION DE PROTECTOR, INCLUYE INCORPORACION DE EXTENSO DE MATERIAL COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIALES, EQUIPO	\$32,670.32																	2	3.13
REGLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE LA SUB PAVANTE BASE COMPACTADA AL 99% UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PETREDO 60% MATERIAL DE BANCO- 40% MATERIAL (PETREDO)	\$145,036.80																	4	6.25
ELABORACION DE CONCRETOS FC= 145 (RUCHO) AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL, REFINAMIENTOS 8 A 10 CM. SECCION TRANSVERSAL DE 0.10X0.20X0.40 CIBRERA PARA TENER A LA USOC, INCLUYE: PLANTERA PARA TENER A LA USOC, MANO DE OBRA Y MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	\$527,339.66																	5	7.81
PAVIMENTO DE CONCRETO FC= 250 (RUCHO) AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL, REFINAMIENTOS 8 A 10 CM. DE 1.10 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA 18 CM DE ELECTROSOLDADA 66-1010 ROLLO DE 100 MTS, INCLUYE: CIBRERA METALICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR	\$716,888.40																	25	39.06
PAVIMENTO DE CONCRETO FC= 250 (RUCHO) AGREGADO DE 19 MM. CEMENTO NORMAL, REFINAMIENTOS 8 A 10 CM. DE 1.10 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA 18 CM DE ELECTROSOLDADA 66-1010 ROLLO DE 100 MTS, INCLUYE: CIBRERA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENORES.	\$32,565.25																	26	39.00
																		84	TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION

RESPONSABLE DE SUPERVISION:
ING. JOSE FRANCISCO CUERO DELGADILLO


DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALEJANDRO MIPACADO QUEZADA

FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0269



INFORME FOTOGRÁFICO

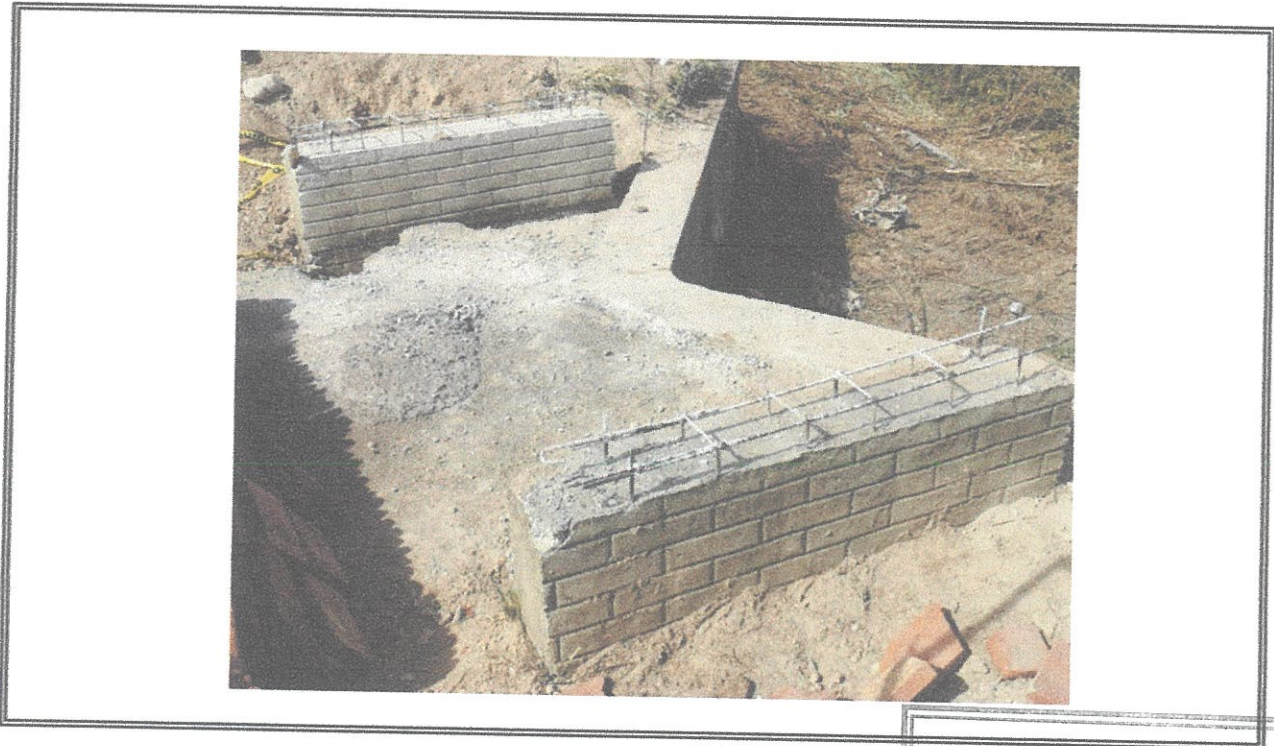

0271

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):


CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VIST- LOS SANDOVALES, MUNICIPIO
DE NOCHISTLAN DE MEJIA
NOCHISTLAN DE MEJIA

06 DE NOVIEMBRE DE 2023-31 DE DICIEMBRE DE 2023
24 DE NOVIEMBRE DE 2023

25.00%

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2023

INFORME FOTOGRÁFICO

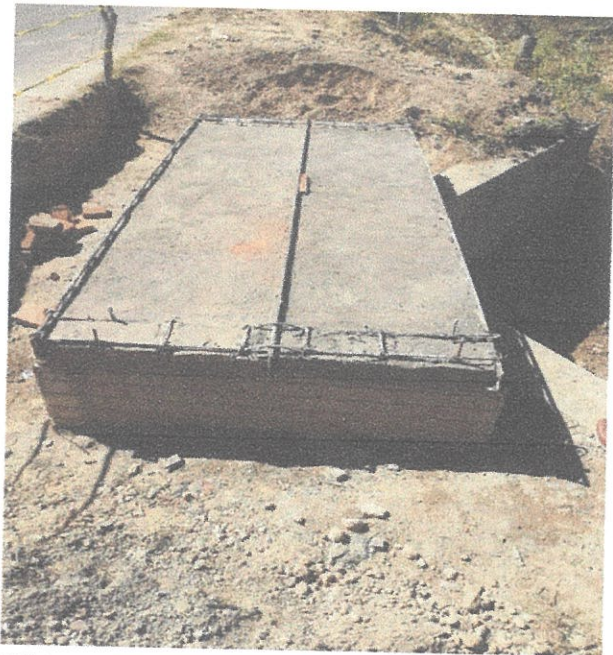

0272

OPERADO
FAISM (FIIL)
EJERCICIO 2023

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VIST- LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA

NOCHISTLAN DE MEJIA

06 DE NOVIEMBRE DE 2023-31 DE DICIEMBRE DE 2023

24 DE NOVIEMBRE DE 2023

25.00%

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

% AVANCES FISICO	REAL	PROGRAMADO
0	50	50
0	0	0

No. REPORTE: 3
FECHA REPORTE: 01/12/2023

DATOS DE LA OBRA
 NOMBRE: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. SANJOSE - LOS SAHONES - MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA
 UBICACION: NOCHISTLAN DE MEXIA
 TIPO DE OBRA: NUEVA
 MODALIDAD A/R/C: CONTRATO
 No. CONTRATO: MOC-HIS/FONDO01/2023/21
 EMPRESA: C. ANGELICA RUANO AVILA

MONTO CONTRATO: \$1,759,892.25
 FECHA CONTRATO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

MONTO ANTICIPO: \$0.00
 FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A
 MONTO AMPL. DE CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A
 PERIODO DE EJECUCION: INICIO: N/A, TERMINO: N/A

FECHAS PROGRAMADAS: 6-nov-23 a 31-dic-23
 FECHAS REALES: 13-nov-23

OBSERVACIONES:

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ESO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR REALIZANDO A LO LARGO DEL TIEMPO POR LO QUE NO CONCIERDE LA SUMA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.

PARTIDAS	IMPORTE	M E S E S												DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO			
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ENERO	FEBRERO	ENERO	FEBRERO	ENERO	FEBRERO	ENERO					
TRAZO Y NIVELACION CON BARROTO TOPOGRAFICO EN TERRENO PLANO DE 100x4 2000 M2, INCLuye: TOPOGRAFIA Y CABERERO, OPERADOR	\$15,408.63																3	4.59
DESPLAZA AMADURA EN TERRENO COMPACTADO DE MATERIAL PAJA, DESPLANTE DE TERRAPLENES	\$8,520.29																3	4.00
FORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCOS, INCLuye: DESPLANTE, PROCTOR, INCLuye INCORPORACION DE AGUA, EXTENSO DE MATERIAL, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, MATERIALES, EQUIPO	\$32,670.32																2	3.13
MEZCLADO TENDIDO Y CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE LA SUB RASANTE BASE COMPACTADA AL 98% UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PIEDRO 60% MATERIAL DE BANCO- 40% MATERIAL PIEDRO	\$145,035.60																4	6.23
ELABORACION DE CONCRETOS (C= 350 KG/CM3, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, REGUCHIL TRAPEZOIDAL DE 0.10X0.20X0.40 CIMBRA COMBA A USOS, INCLuye: PINTURA PARA PROTECCION DE BARRAS DE ACERO, PREPARACION DE CUJETA DE 19 LITROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	\$527,339.65																9	7.81
PAVIMENTO DE CONCRETO F'c= 350 KG/CM3 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM, DE 0.10 MTS DE ESPESOR, INCLuye: PINTURA PARA PROTECCION DE BARRAS DE ACERO, PREPARACION DE CUJETA DE 19 LITROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	\$716,689.40																25	36.06
PAVIMENTO DE CONCRETO F'c= 350 KG/CM3 AGREGADO DE 19 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM, DE 0.10 MTS DE ESPESOR, INCLuye: PINTURA PARA PROTECCION DE BARRAS DE ACERO, PREPARACION DE CUJETA DE 19 LITROS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENORES.	\$32,565.26																25	36.08
TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION																	64	

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ING. DIEGO ALFONSO MERCADO QUEZADA

AGENTE DE SUPERVISION:
 ING. JOSE FRANCISCO CALERO DELGADILLO

OPERADO
 FAISM (FII)
 EJERCICIO 2023

0273

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE: 3
FECHA REPORTE: 01/12/2023

% AVANCES FISCAL FINANCIERO	0	0
% AVANCES REAL PROGRAMADO	0	0

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA

PARTIDAS	IMPORTE	MESES												DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO	
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ENERO	FEBRERO			
PUENTE 1	\$34,786.42														9	14.06
PUENTE 2	\$36,004.30														0	0.38
SUBTOTAL	\$1,551,458.84															
IVA	\$248,233.41															
TOTAL	\$1,799,692.25															

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO SOL, LINDA VIST.-LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA

UBICACION: NOCHISTLAN DE MEXIA

TIPO DE OBRA: NUEVA

MODALIDAD EJEC.: CONTRATO

No. CONTRATO: NOCHIS/FONDI/2022/21

EMPRESA: C. ANGELICA RUANC AVILA

MONTO CONTRATO: \$1,799,692.25

FECHA CONTRATO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2023

MONTO ANTICIPO: \$0.00

FECHA PAG. ANTICIPO: N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCION: INICIO TERMIN.

FECHAS PROGRAMADAS: 6-nov-23 31-dic-23

FECHAS REALES: 13-nov-23

FECHAS REPROGRAMADAS: OBSERVACIONES

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ES DECIR, DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO

RECIBIDO DE SUPERVISIÓN:
ING. JOSE FRANCISCO SANCHEZ DELGADILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA


0274

EJERCICIO 2023



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

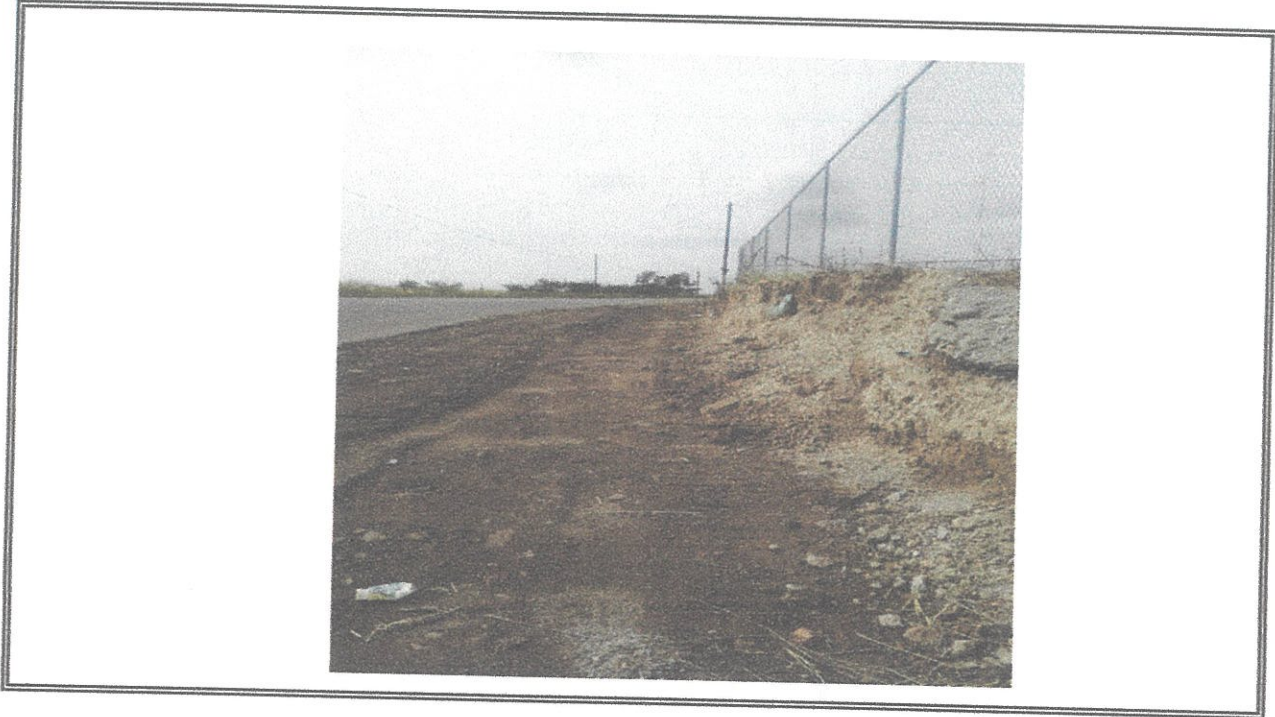

0275

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VIST- LOS SANDOVALES, MUNICIPIO
DE NOCHISTLAN DE MEJIA
NOCHISTLAN DE MEJIA
06 DE NOVIEMBRE DE 2023-31 DE DICIEMBRE DE 2023
01 DE DICIEMBRE DE 2023
60.00%

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

INFORME FOTOGRÁFICO



0276

OPERADO

FAISM (EJ) (EJERCICIO 2023)

EJERCICIO 2023

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VIST- LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA
NOCHISTLAN DE MEJIA
06 DE NOVIEMBRE DE 2023-31 DE DICIEMBRE DE 2023
01 DE DICIEMBRE DE 2023
60.00%

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE: 4
FECHA REPORTE: 09/12/2023

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PASADIZO URBANO COL. VILLA LOS SANCIBALES MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA

UBICACION: NOCHISTLAN DE MEJIA

TIPO DE OBRA: NUEVA

MODALIDAD EJE: CONTRATO

No. CONTRATO: NOCHIS/FONDIS/III/2023/21

EMPRESA: C. ANGELICA RUANO AVILA

MONTO CONTRATO: \$1,759,822.25

FECHA CONTRATO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

MONTO ANTICIPO: \$0.00

FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: N/A

FECHAS PROGRAMADAS: 8-nov-23

FECHAS REALES: 13-nov-23

FECHAS REPROGRAMADAS: N/A

OBSERVACIONES:

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, DEBIDA A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO ANTES DE QUE COMIENZE EL PERIODO QUE COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.

% AVANCE	PROGRAMADO	
	REAL	PROGRAMADO
FISICO	70	60
FINANCIERO	0	0

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA

PARTIDAS	IMPORTE	MESES												DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO			
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ENERO	FEBRERO	ENERO	FEBRERO	ENERO	FEBRERO						
TRAZO Y INVIACION CON ARBOLITO TOPOGRAFICO EN TERRENO PLANO DE 100x A 2000 M2. INCLUYE: TOPOGRAFO Y CADENERO. OPERADOR	\$16,408.63																3	4.50
MEZCLAME A MAQUINA EN TERRENO DESPLANTE DE MATERIAL PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES	\$8,520.29																3	4.50
FORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DESPLANTE DE MATERIAL PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES. INCLUYE INCORPORACION DE AGUA. EXTENSO DE MATERIAL COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIALES: EQUIPOJ	\$32,670.32																2	3.13
MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE LA SUB BASEANTE BASE COMPACTADA AL 98% UTILIZANDO MATERIAL DE BLANCO Y MATERIAL PETREO (60% MATERIAL DE BLANCO, 40% MATERIAL PETREO)	\$145,038.80																4	6.25
GUARNICION DE CONCRETOS FC=150 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL. REVENDIMIENTO 8 A 10 CM. BRICCHON TRAPEZOIDAL DE 0.18X0.30X0.40 CIMBRA CON 4 USOS. INCLUYE: PINTURA PARA PROTECCION DE CUBIERTA DE 18 LITROS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	\$427,338.65																5	7.81
PAVIMENTO DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL. REVENDIMIENTO 8 A 10 CM. DE 0.10 MTS DE ESPESOR. MANO DE OBRA 10 CM DE 16 CM DE ELECTRO SOLDADA 66-10-10 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR	\$718,886.40																25	36.06
PAVIMENTO DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL. REVENDIMIENTO 8 A 10 CM. DE 16 CM DE ELECTRO SOLDADA 66-10-10 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENORES.	\$32,566.26																25	36.06
TOTAL																	64	

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALFONSO MERCADO QUEZADA

FRENTE DE SUPERVISION:
ING. JOSE FRANCISCO CALERO DELGADILLO


0277

FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

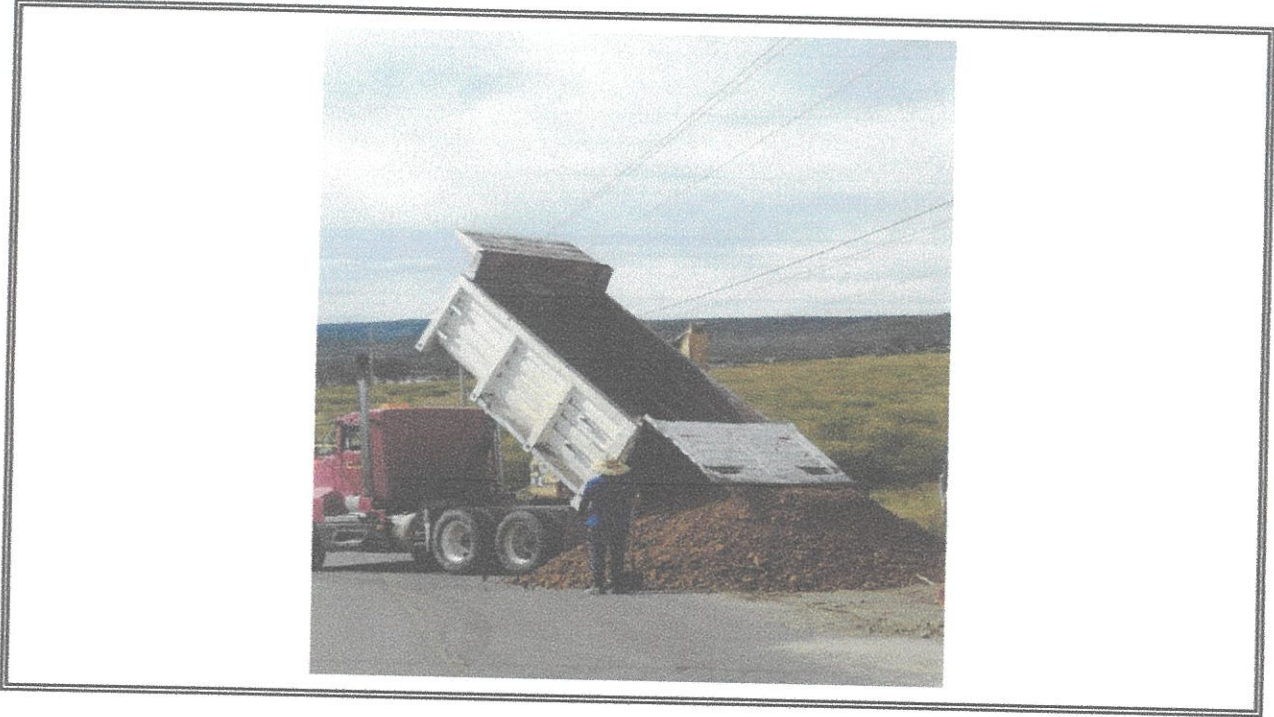


OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VIST- LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA
NOCHISTLAN DE MEJIA
06 DE NOVIEMBRE DE 2023-31 DE DICIEMBRE DE 2023
08 DE DICIEMBRE DE 2023
70.00%

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2023

0279

INFORME FOTOGRÁFICO

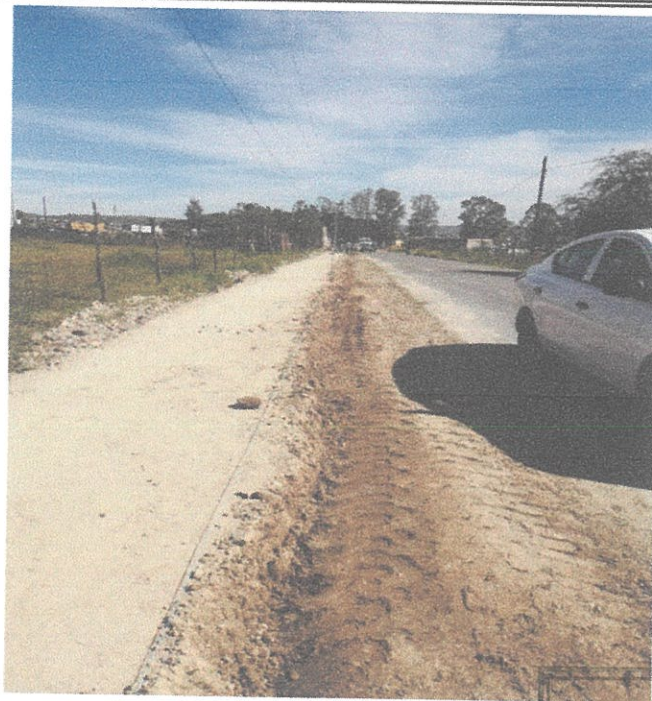

0280

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VIST- LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA

NOCHISTLAN DE MEJIA

06 DE NOVIEMBRE DE 2023-31 DE DICIEMBRE DE 2023

08 DE DICIEMBRE DE 2023

70.00%

OPERADO

FAISOM (FII)

EJERCICIO 2023

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE: 6
FECHA REPORTE: 15/12/2023

DATOS DE LA OBRA
 NOMBRE: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL SANBOVALES, MUNICIPIO DE HOCHETLAN DE MEJIA
 UBICACION: NOCHISTLAN DE MEJIA
 TIPO DE OBRA: NUEVA
 MODALIDAD DE BIEN: CONTRATO
 No. CONTRATO: HOCHIB/FONDO/II/2023/21
 EMPRESA: C. ANGELICA RUANO AVILA

MONTRO CONTRATO: \$1,709,892.25
 FECHA CONTRATO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2023

MONTRO ANTICIPO: \$0.00
 FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A
 MONTRO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A
 PERIODO DE EJECUCION: INICIO TERMINO
 FECHAS PROGRAMADAS: 6-nov-23 31-dic-23
 FECHAS REALES: 13-nov-23

OPERADORA
FAISM (FII)
EJERCICIO 2023

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA EN CUENTA PARA EL PAGO DE LA OBRA QUE TIENE EL CONTRATO, RESPONDIENDO A LA FORMA DE PAGO QUE SE ESTABLECE EN EL CONTRATO, DEBIENDO ENTENDER QUE EL PAGO SE ENTENDE EJECUTANDO LA PAR. POR LO QUE NO CONSIDERAR LA SUMA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.

% AVANCE FINANCIERO	REAL PROGRAMADO	
	60	70
	6	0

PARTIDAS	MONTOS	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO				
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO											
TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO EN TERRENO PLANO DE 1000 A 2000 M2, INCLUYE TOPOGRAFIA Y CADENERO, OPERADOR	\$15,408.83																	3	4.59
DESPLANTE A MAQUINA EN TERRENO DESPLANTANDO EL MATERIAL PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES	\$8,500.29																	3	4.59
FORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE COMPACTACION DE MATERIAL PROCTOR, INCLUYE INCORPORACION DE AGUA EXTERNO DE MATERIAL COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIALES EQUIPO	\$32,870.32																	2	3.13
MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE LA SUB BASANTE BASE COMPACTADA AL 98% UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO 10% MATERIAL PERIENO	\$145,038.90																	4	9.25
QUILACION DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTOS A 10 CM. SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.15X0.20X0.40 CIMBRA CON REFORZAMIENTO EN PRETUMA PARA TRAFICO AMARILLO PARA 1000 CM2 PRESBITACION DE CUBETA DE 19.176 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	\$427,336.55																	5	7.81
PAVIMENTO DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTOS A 10 CM. 10 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA 6-6-10 MTS DE ELECTROSOLDADA 6-6-10 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR	\$716,886.40																	25	36.06
PAVIMENTO DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 Y 10% CEMENTO NORMAL REVENIMIENTOS A 10 CM. 10 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA 6-6-10 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENORES.	\$32,355.26																	25	36.06
																		64	TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

RECIBENTE DE SUPERVISION:
 ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO

0281

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE: 8
FECHA REPORTE: 14/12/2022

DATOS DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE
ANDADOR URBANO COL.
LINDA VIST. LOS
BANDOVALES, MUNICIPIO DE
NOCHISTLAN DE MEJIA

UBICACION: NOCHISTLAN DE MEJIA
TIPO DE OBRA: NUEVA
MODALIDAD E/EC: CONTRATC

No. CONTRATO: NOCHIB/FONDO/II/2022/21
EMPRESA: C. ANGELICA RUANO AVILA

MONTO CONTRATO: \$1,758,692.25
FECHA CONTRATO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2022

MONTO ANTICIPO: 80.00
FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A
MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 06-NOV-23, TERMINA: 31-DIC-23
FECHAS PROGRAMADAS: 06-NOV-23
FECHAS REPROGRAMADAS: 13-NOV-23
OBSERVACIONES:

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ESO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.

% AVANCES FISICO FINANCIERO	REAL	PROGRAMADO
	6	70
	6	0

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA


PARTIDAS	IMPORTE	MESES												DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO				
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	FEBRERO						
PUENTE 1	\$34,706.42															9	14.06		
PUENTE 2	\$38,084.39															0	0.38		
SUBTOTAL																			
IVA																			
TOTAL																			
<table border="1"> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>REAL</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </table>																PROGRAMADO	REAL
PROGRAMADO	REAL																		
...	...																		
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL DE DIAS INICIALES EN BASE A PROGRAMACION</td> <td>64</td> </tr> </table>																TOTAL DE DIAS INICIALES EN BASE A PROGRAMACION	64		
TOTAL DE DIAS INICIALES EN BASE A PROGRAMACION	64																		

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

RESPONSABLE DE SUPERVISION
ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO

0282





INFORME FOTOGRÁFICO



0283

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA- LOS SANDOVALES, MUNICIPIO
DE NOCHISTLAN DE MEJIA
NOCHISTLAN DE MEJIA

06 DE NOVIEMBRE DE 2023-31 DE DICIEMBRE DE 2023
15 DE DICIEMBRE DE 2023

80.00%



INFORME FOTOGRÁFICO



0284

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2023

OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VIST- LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA
LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA
PERIODO DE EJECUCIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DE 2023-31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 80.00%

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

HA. REPORTE: 6
FECHA REPORTE: 22/12/2023

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDAVIST-LOS SANDIVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA
UBICACION: NOCHISTLAN DE MEJIA
TIPO DE OBRA: NUEVA
MODALIDAD EJEC.: CONTRATO
No. CONTRATO: NOCHIB/FONDI/030321
EMPRESA: C. ANGELICA RUANO AVILA

MONTO CONTRATO: \$1,759,892.25
FECHA CONTRATO: 09-DE-NOVIEMBRE-DE-2023

MONTO ANTICIPO: \$0.00
FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A
MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: N/A, TERMINO: N/A
FECHAS PROGRAMADAS: 9-nov-23 a 31-dic-23
FECHAS REALES: 13-nov-23
FECHAS REPROGRAMADAS: OBSERVACIONES

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO. DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN INICIAR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.

% AVANCES		REAL		PROGRAMADO	
FIBICO	90	90	80		
FINANCIERO	50	50	0		

PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO				
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MESES										
TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO EN TERRENO PLANO DE 1000 A 2500 M2, INCLuye TOPOGRAFIA Y CABEZERO. OPERADOR	\$15,408.03																	3	4.00
DESPLAZAR Y MAQUINA EN TERRENO DESPERDICIANO EL MATERIAL PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES	\$5,520.29																	3	4.00
FORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO INCLuye COMPACTACION AL 90% PROCTOR, INCLuye INCORPORACION DE AGUA, EXTENSO DE MATERIAL COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIALES: EQUIPO	\$32,070.32																	2	3.13
MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE LA SUB RASANTE BASE CONCRETO ARMADO EN TERRENO (MATERIAL DE BANCO-80% MATERIAL PEREIRO)	\$145,038.00																	4	0.25
GUARDACION DE CONCRETO FC= 180 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORAML REVENIMIENTO 8 A 10 CM. SECCION DE 10 CM. DE 0.1000 2000/40 CIMBRA COMIDA 4 LUS DE 0.1000 2000/40 CIMBRA PARA PAUSA TRAFICO AMARILLA O BLANCA EN PRESENTACION DE CUBETA DE 19 LTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	\$527,338.65																	5	7.81
PAVIMENTO DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 REVENIMIENTO 8 A 10 CM. CEMENTO NORAML ESPESOR ARMADO CON MALLA 1 MTS DE ELECTRODOLADA 95-1010 ROLLO DE 100 MTS INCLuye CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR	\$715,689.40																	25	39.06
PAVIMENTO DE CONCRETO FC = 250 KG/CM2 REVENIMIENTO 8 A 10 CM. CEMENTO NORAML ESPESOR ARMADO CON MALLA 1 MTS DE ELECTRODOLADA 6-6-15-19 ROLLO DE 100 MTS INCLuye CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENORES.	\$32,566.25																	25	39.06
																		64	TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

RESORTE DE SUPERVISION:
ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO

0285

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2023



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



0287

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA
NOCHISTLAN DE MEJIA
06 DE NOVIEMBRE DE 2023-31 DE DICIEMBRE DE 2023
22 DE DICIEMBRE DE 2023
90.00%

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

INFORME FOTOGRÁFICO



0288

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VIST- LOS SANDOVALES, MUNICIPIO
DE NOCHISTLAN DE MEJIA
NOCHISTLAN DE MEJIA
06 DE NOVIEMBRE DE 2023-31 DE DICIEMBRE DE 2023
22 DE DICIEMBRE DE 2023
90.00%

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 20 23

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE: 7
FECHA REPORTE: 26/12/2023

DATOS DE LA OBRA
NOMBRE: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE JESUS
UBICACION: NOCHISTLAN DE JESUS
TIPO DE OBRA: NUEVA
MODALIDAD (R/E): CONTRATO
No. CONTRATO: NOCHIFONDI/2023/21
EMPRESA: C. ANGELICA RUANO AVILA

MONTO CONTRATO: \$1,739,492.25
FECHA CONTRATO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2023
MONTO ANTICIPO: \$0.00
FECHA PAGO ANTICIPO: N/A
No. AMPL. DE CONTRATO: N/A
MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 8-nov-23, TERMINA: 31-dic-23
FECHAS PROGRAMADAS: 8-nov-23
FECHAS REALES: 13-nov-23
FECHAS REPROGRAMADAS:
OBSERVACIONES:

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ES DECIR A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR REALIZANDO A LO LARGO DEL TIEMPO QUE LE CORRESPONDE LA SUMA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.

% AVANCES FISICO FINANCIERO	REAL PROGRAMADO
95	90
50	0

PARTIDAS	IMPORTE	MESES												DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO			
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO					
TRAZO Y INTELIGENCIA CON SERIADOS TOPOGRAFICO EN TERRENO PLANO DE 1000 A 2000 M2, INCLUYE: TOPOGRAFIA Y CADENENO, OPERADOR	\$15,408.63																3	4.89
DESPLAZAR A MAQUINA EN TERRENO PLANO DE 1000 A 2000 M2, INCLUYE: DESPLAZANTE DE TERRAPLENES	\$8,920.29																3	4.60
FORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL COMPACTADO AL 95% CON EL 85% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORADO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIALES, EQUIPO	\$32,870.32																2	3.13
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE LA SUB PAVIMENTACION DE BANCOS Y MATERIAL PETREO 60% MATERIAL DE BANCOS, 40% MATERIAL PETREO	\$145,035.60																4	6.25
ELABORACION DE CONCRETO F'c= 180 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO A 10 CM, BRICION TRAPEZOIDAL DE 0.10X0.20X0.40 CHIBRA COMINA A USOS, INCLUYE: PINTURA PARA PROTECCION DE BARRAS, 1 LITRO, PREPARACION DE CUERPA 0.10 LITRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	\$527,339.65																6	7.81
PAVIMENTO DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO A 10 CM, DE 0.10 MTS DE ESPESOR, INCLUYE: CORRALLA ELECTRO SOLDADA 66*10 ROLLO DE 100 MTS, INCLUYE: CHIBRA METALICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR	\$718,689.40																25	39.06
PAVIMENTO DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO A 10 CM, DE 0.10 MTS DE ESPESOR, INCLUYE: CORRALLA ELECTRO SOLDADA 66*10 ROLLO DE 100 MTS, INCLUYE: CHIBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENORES.	\$32,565.23																25	39.06
TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION																	64	

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALEJANDRO MARRICADO QUEZADA

RESPONSABLE DE SUPERVISION:
ING. JOSE FRANCISCO CUERO DELGADILLO

0289

OPERATIVO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

% AVANCES FISCO	REAL PROGRAMADO
50	50
50	0

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA

Nº IMPORTE: 7
FECHA IMPORTE: 20/12/2023

DATOS DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE
ANDADOR URBANO-COL.
LINDA VIST-LOS
SANDOVALES, MUNICIPIO DE
NOCHISTLAN DE MEJIA

LUBICACION: NOCHISTLAN DE MEJIA
TIPO DE OBRA: NUEVA
MODALIDAD EJEC.: CONTRATO

No. CONTRATO: NOCHIS/FONDO/II/2023/21
EMPRESA: C. ANGELICA RUANO AVILA

MONTO CONTRATO: \$1,789,692.25
FECHA CONTRATO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2023
MONTO ANTICIPO: \$0.00
FECHA PASO ANTICIPO: N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A
MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 8-nov-23
TERMINO: 31-dic-23
FECHAS PROGRAMADAS: 13-nov-23
FECHAS REALES: OBSERVACIONES

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ESO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.

PARTIDAS	IMPORTE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO
PUNTE 1	\$24,786.42								9	14.06
PUNTE 2	\$26,084.28								6	9.38
SUBTOTAL	\$1,551,428.84									
	N/A									
TOTAL	\$1,789,692.25									
									64	TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION

PERCENTAJE DE SUPERVISIÓN:

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALEX ANDO-RIERCADO QUEZADA


0290

EJERCICIO 2023



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

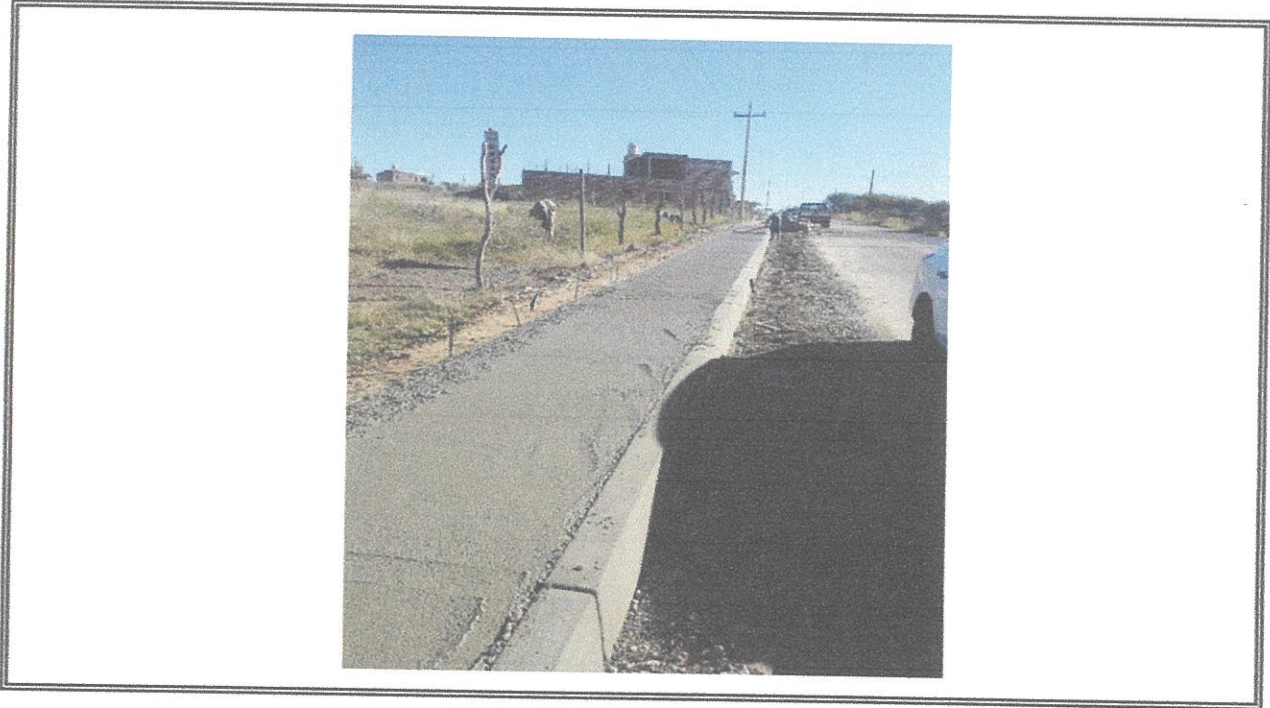

0291

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VIST- LOS SANDOVALES, MUNICIPIO
DE NOCHISTLAN DE MEJIA
NOCHISTLAN DE MEJIA
06 DE NOVIEMBRE DE 2023-31 DE DICIEMBRE DE 2023
29 DE DICIEMBRE DE 2023
95.00%

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

INFORME FOTOGRÁFICO



0292

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VIST- LOS SANDOVALES, MUNICIPIO
DE NOCHISTLAN DE MEJIA
NOCHISTLAN DE MEJIA
06 DE NOVIEMBRE DE 2023-31 DE DICIEMBRE DE 2023
29 DE DICIEMBRE DE 2023
95.00%

OPERADO
FAISM (FIII)

EJERCICIO 20 23

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Nº. REPORTE: **B**
FECHA REPORTE: **31/12/2023**

DATOS DE LA OBRA

HOMBRE: CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VIST. LOS SAUDIAVALES, MUNICIPIO DE ROCHISTLAN DE MEJIA

UBICACIÓN: NOCHISTLAN DE MEJIA

TIPO DE OBRA: NUEVA

MODALIDAD FIANZ: CONTRATO

Nº. CONTRATO: NOCHIS/FONCIII/2023/21

IMPRESA: C. ANGELICA RUANO AYLA

MONTO CONTRATO: \$1.799.892.25

FECHA CONTRATO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2023

MONTO ANTICIPO: 30.00

FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

Nº. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN: N/A

FECHAS PROGRAMADAS: 6-10-23

FECHAS REALES: 13-10-23

FECHAS REPROGRAMADAS: 13-10-23

OBSERVACIONES

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ESO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100% DEL PONCENTAJE BASE TIEMPO.

% AVANCE	REAL		PROGRAMADO	
	FÍSICO	FINANCIERO	100	100
	100	100	100	100

M E S E S
PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA

PARTIDAS	IMPORTE	MESES												DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO			
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	ENERO	FEBRERO	ENERO	FEBRERO						
TRAZO Y UBICACIÓN CON MARBETO TOPOGRAFICO EN TERRENO PLANO DE 100x4 2000 M2. INCLUDE: TOPOGRAFIA Y CADENERS. OPERADOR	\$15.408.63																3	4.88
DESPLAZA A MAQUINA EN TERRENO DESPERDIGANDO EL MATERIAL PARA DESPLAZA DE TERRAPLENES	\$8.620.29																3	4.00
FORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PEGOSO Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR. INCLUDE: COMPACTACION DE SUBCAPAS DE 20 CM. MATERIAL ES: EQUIPO	\$32.670.32																2	3.13
MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE LA SUB BASE MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PETREDO (60% MATERIAL DE BANCO 40% MATERIAL PETREDO)	\$145.038.80																4	8.25
ELABORACION DE CONCRETO F'c=160 KG/CM2 AGREGADO DE 50 MM. SECCION RECTANGULAR DE 0.10 CM. SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.1300-2000.00 CMBRA COMEN A UNOS. INCLUDE: PINTURA PARA PROTECCION ANTIACIDO BLANCA EN PREPARACION DE ACEROS Y ALAMBRE MATALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$637.338.65																5	7.81
PAVIMENTO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 0.10 MTS DE ESPESOR. CORCHADO CON HALLA DE 100 MTS. INCLUDE: CMBRA METALICA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS MENORES	\$718.686.40																25	39.06
PAVIMENTO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 AGREGADO DE 19 MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 18 CM DE ELECTRODOLADA 6.6-10.10 ROLLO DE 100 MTS INCLUDE: CMBRA METALICA. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENORES.	\$32.460.26																25	39.06
																	64	TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALCAJAL/MERCADO QUEZADA

MEMBRANTE DE SUPERVISION:
ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO

0293

**OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023**

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

% AVANCES FISICO	REAL	PROGRAMADO
100	100	100
FINANCIERO	100	100

PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO			
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	M E S E S									
PUENTE 1	\$34,768.42																9	14.06
PUENTE 2	\$36,064.38																8	9.38
SUBTOTAL																		
IVA																		
TOTAL																		

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE ANILLO URBANOCOL. UNIDADES SANCOVALES MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA

UBICACION: NOCHISTLAN DE MEXIA

TIPO DE OBRA: NUEVA

MODALIDAD EJEC.: CONTRAT.

No. CONTRATO: NOCHIBFOND/CO/2023/21

EMPRESA: C. ANGELICA RUANO AVILA

MONTO CONTRATO: \$1,789,692.25

FECHA CONTRATO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2023.

MONTO ANTICIPO: \$0.00

FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCION: INICIO 6-NOV-23 TERMIN 31-06-23

FECHAS REPROGRAMADAS: 13-NOV-23

OBSERVACIONES:

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA EN CUENTA PARA EL CALCULO DE LOS DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ES DECIR, EL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO SE EJECUTANCO A LA PAR, POR LO QUE EL PORCENTAJE DE OBRA SUMA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADERO QUEZADA

RESPONSABLE DE SUPERVISION:
ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO

0294

EJERCICIO 20 23

INFORME FOTOGRÁFICO



0295

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VISTA- LOS SANDOVALES, MUNICIPIO
DE NOCHISTLAN DE MEJIA
NOCHISTLAN DE MEJIA
06 DE NOVIEMBRE DE 2023-31 DE DICIEMBRE DE 2023
31 DE DICIEMBRE DE 2023
100.00%

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2023

INFORME FOTOGRÁFICO



0296

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO COL. LINDA VIST- LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA
NOCHISTLAN DE MEJIA
06 DE NOVIEMBRE DE 2023-31 DE DICIEMBRE DE 2023
31 DE DICIEMBRE DE 2023
100.00%

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2023



[Handwritten signature]

0297


OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023



Andrea

0298

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

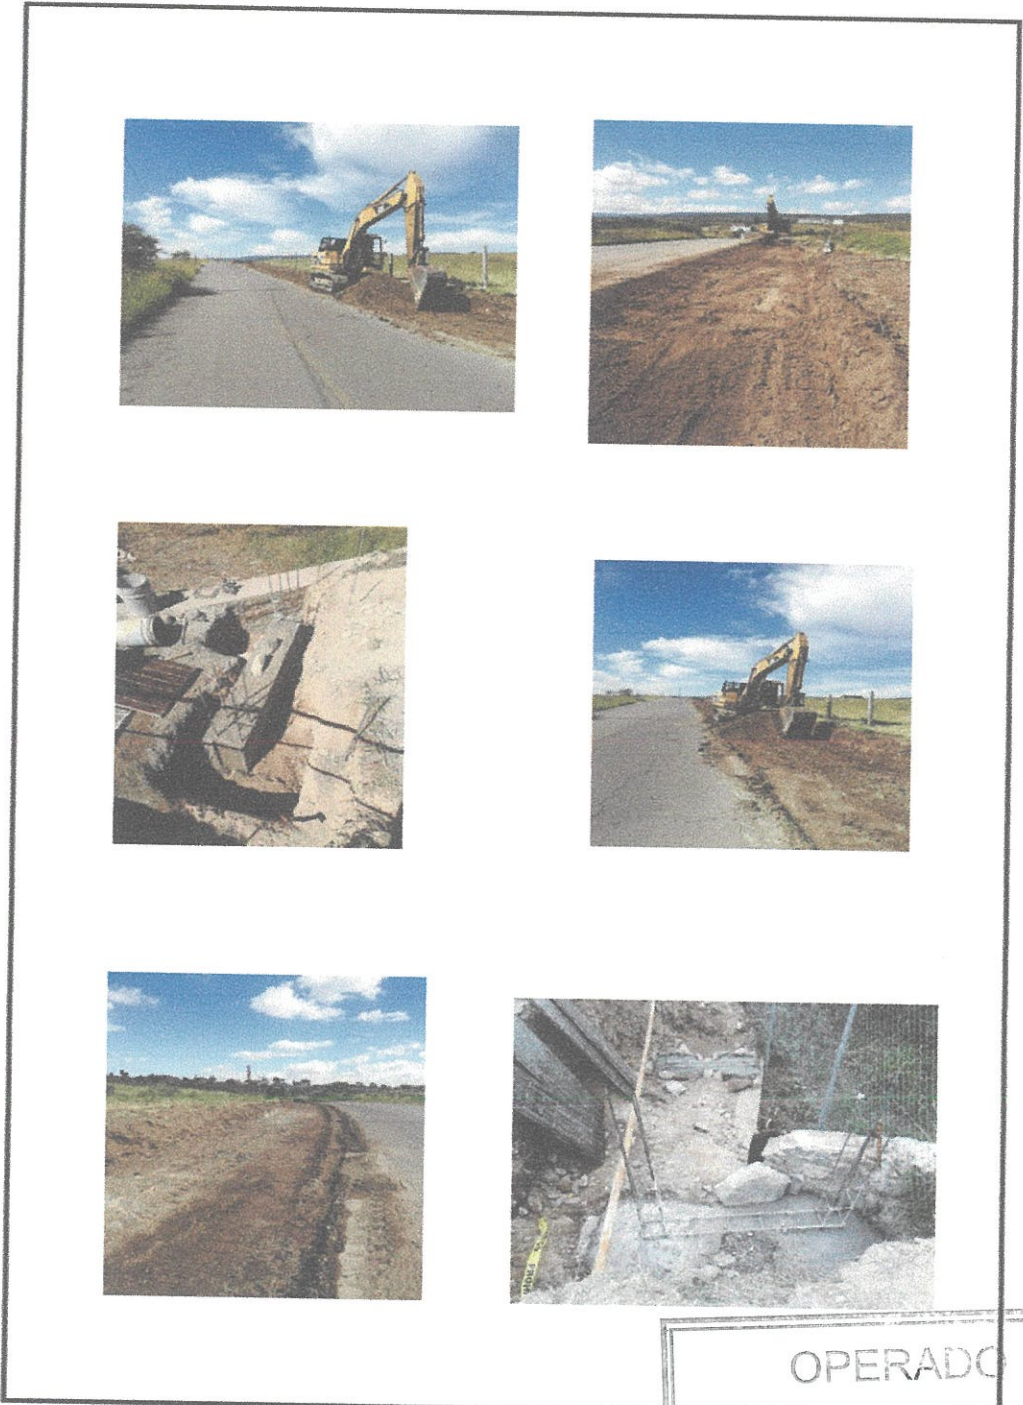

Angela

0299

OPERADO
FAISM (FIL)
EJERCICIO 20 23
