

CÉDULA DE REGISTRO

C20243100002355

MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

PRESENTE:

Se expide la presente cédula con base en las facultades otorgadas por los Artículos 16, 17 y 30, fracción XXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas: Título Cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios y Título Cuarto de su Reglamento, Título III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas y Título III de su Reglamento; Artículo 41, fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen los Lineamientos para el Registro Único de Proveedores y Contratistas Validados de Gobierno del Estado de Zacatecas, publicado el 12 de octubre de 2022, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

Cédula de Contratista

No. Cédula	DLC/C/101/2024		
Razón Social	MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ		
Dirección	LA CIENEGUITA 3 CONOCIDO	Teléfono	3467132929
Estado	Zacatecas	Municipio	NOCHISTLAN DE MEJIA
R.F.C.	MAMM880814NIA	Capital Contable	\$1,902,252.91


Especialidad	Porcentaje
Pavimentación.	25
Construcción y mantenimiento a obras complementarias al sistema de alcantarillado sanitario.	25
Construcción, rehabilitación y mantenimiento de los sistemas y obras complementarias de agua potable.	25
Construcción de caminos rurales.	25

Los datos registrados para la emisión de la presente cédula están sujetos a verificación y fiscalización por parte de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado. Esta cédula puede ser suspendida o cancelada de acuerdo a la normatividad vigente aplicable a la materia. La vigencia de ésta cédula es de 12 meses a partir de la fecha de validación

La vigencia de ésta cédula es de 12 meses a partir de la fecha de validación de la información presentada

Zacatecas, Zac. a 8 de marzo del 2024

La presente cédula será válida hasta el día 8 de marzo del 2025



Memorándum de Verificación

MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

PRESENTE:

Felicidades por haber realizado el trámite y obtenido la Cédula en el Registro Único de Proveedores y Contratistas Validados, a través de la plataforma electrónica RUPCOVA; trámite que forma parte de los programas de modernización que Gobierno del Estado implementa para brindar una mejor atención a las personas interesadas en realizarlo, facilitando la realización vía internet, sin tener que trasladarse a las oficinas de la Secretaría de la Función Pública.

Es nuestro objetivo establecer un efectivo control que permita brindar certeza de la capacidad técnica, jurídica, económica y material de las personas físicas y morales con las que el Gobierno del Estado celebre contratos de adquisiciones, servicios y obra pública.

Los datos proporcionados por los interesados en el trámite de inscripción o revalidación son recibidos de buena fe, por lo que la Secretaría de la Función Pública, podrá requerir en cualquier momento los documentos originales que acrediten la información proporcionada para su cotejo.

La Secretaría está facultada para cancelar la Cédula, sin perjuicio de accionar la vía legal correspondiente cuando la información proporcionada resulte falsa.

Asimismo, la Secretaría se reserva el derecho para efectuar visitas de verificación a los domicilios de las personas con registro para constatar la veracidad de la información asentada y documentación presentada en el trámite de registro; en caso de que el proveedor o contratista se niegue a dar las facilidades necesarias para que la Secretaría ejerza sus funciones de verificación, podrá suspender la cédula hasta por el término de doce meses.


Si durante la vigencia de la cédula existen modificaciones a los datos proporcionados en el registro, el proveedor o contratista tendrá la obligación de comunicarlo en un plazo no mayor a diez días hábiles a la fecha en que ocurrió la modificación a la Secretaría con la finalidad de mantener actualizada la información en el RUPCOVA, acreditando lo anterior con el documento respectivo.

Lo anterior, con base en las facultades otorgadas por los Artículos 16, 17 y 30, fracción XXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas: Título Cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios y Título Cuarto de su Reglamento, Título III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas y Título III de su Reglamento; Artículo 41, fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen los Lineamientos para el Registro Único de Proveedores y Contratistas Validados de Gobierno del Estado de Zacatecas, publicado el 12 de octubre de 2022, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

ATENTAMENTE.

M.A.G. MARIO ALBERTO BAÑUELOS MONTELLANO

Director de Contrataciones Públicas



DIRECCION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO

**C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
PRESENTE:**

Se expide la presente cédula con base en las facultades otorgadas por los artículos 30 fracción XXXV de la Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 33, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas, Título III de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios De Zacatecas.

El siguiente Registro Único de Proveedores y Contratistas del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas; está verificado y cumple con los requisitos que marcan la normativa vigente.

Cédula de Contratista

No. Cédula	Nochistlán/02/2024
Razón Social	MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
Dirección	LA CIENEGUITA NO 3
Teléfono	3467132929
Estado	ZACATECAS
Municipio	NOCHISTLAN DE MEJIA
RFC	MAMM880814NIA

La Vigencia de la presente cédula es hasta el 31 diciembre de 2024.


**ATENTAMENTE
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.**



ING. ANA GABRIELA TACHIQUIN RAMIREZ



**CONTRALORIA
MUNICIPAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2024-2024**



0099

Municipio de Nochistlán de Mejía Zacatecas
Dirección de Desarrollo Económico y Social

ACTA DE ENTREGA DEL ÁREA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha: 28 de febrero del 2024


En relación con el contrato de obra pública, precios unitarios y tiempo determinado No. **NOCHIS/FONDOIII/2024/06**, Relativo de los trabajos: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**. Se reunieron en el lugar de los trabajos, por parte del Municipio, el Ing. José Francisco Cajero Delgadillo residente de obra, por parte de la empresa el C. Magdalena Martínez Melendrez, Para poner a disposición del contratista el área donde habrá de ejecutarse los trabajos del contrato, el cual estará bajo su resguardo durante todo el tiempo que dure la obra, para lo cual debería tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden y la seguridad del inmueble, mismo que terminados los trabajos deberá entregar como mínimo en las condiciones que lo recibe a reserva de las áreas que se intervendrán para el: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presenta, firmando de conformidad, al calce de la hoja de la presente, a las 9:00 horas del día 05 de octubre 2023 otorgando una copia a todos los presentes.

Por el municipio.


Por la empresa



Ing. José Francisco Cajero Delgadillo
RESIDENTE DE OBRA



Ing. Elías Macías Ledesma
SUPERINTENDENTE DE OBRA





MELENDREZ CONSTRUCCIONES



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESENTE

ASUNTO: INICIO DE OBRA


NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 29 DE FEBRERO DEL 2024

POR MEDIO DEL PRESENTE Y DERIVADO DE LA INVITACION A PARTICIPAR EN LA OBRA, LE INFORMO A USTED QUE EL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS"

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO, DESEANDOLE ÉXITO Y PROSPERIDAD.

*Magdalena Martinez
Melendrez*

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ



0101

CALLE LA CIENEGUITA #3 A , VELADORES, C.P. 99900, NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS, MX.

DIRECCIÓN: UNIDAD DE PLANEACIÓN

NO. DE OFICIO: 479

SECCION: 3

EXPEDIENTE: ADMVO. 2021-2024

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
PRESENTE.

Por este medio me dirijo a usted para designarlo como responsable de la supervisión de la siguiente **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** con número de contrato **NOCHIS/FONDOIII/2024/06**, de la cual se le hace responsable de la recopilación revisión de la documentación para conformación del expediente técnico que requiere la dependencia ejecutora Dirección de Desarrollo Económico y Social. Dicha información se debe de entregar al responsable del fondo correspondiente.

Documentación a entregar:

- Oficio de invitación.
- Oficio de adjudicación.
- Presupuesto contratado.
- Tarjeta de precios unitarios.
- Permisos de construcción
- Factibilidad de la obra
- Calendario de ejecución del contratista.
- Asignación de residente.
- Oficio de inicio de obra.
- Programa de obra.
- Catálogo de conceptos contratados.
- Revisión y entrega de generadores y estimaciones de obra con fotografías.
- Memoria fotográfica global impresa y digital.
- Bitácora convencional y reporte fotográfico.
- Reporte de visita semanal (día de corte los días viernes).
- Pruebas de laboratorio (pavimentaciones o estructuras con concreto).
- Revisión y análisis correcto de generadores y estimaciones de obra.
- Acta de entrega recepción.
- Fianzas o garantías de obra.
- Finiquito.
- Convenio de ampliación de metas. (oficio de aprobación, proyecto y presupuesto).

Sin más por el momento a ~~propósito~~ para enviar un cordial saludo, quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración.

Unidad de
Planeación
2021-2024
Nochistlan de Mejia, Zac.

UP

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 28 DE FEBRERO DE 2024
UNIDAD DE PLANEACIÓN



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

Publi
28 Feb / 2024

OPERADO	0102
FAISM (FIII)	
EJERCICIO 2024	



MELENDREZ CONSTRUCCIONES



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PRESENTE

ASUNTO: RESIDENTE DE OBRA


NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 29 DE FEBRERO DEL 2024

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO A USTED QUE EL RESIDENTE DE OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS" SERA EL ING. ELIAS MACIAS LEDEZMA.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO, DESEANDOLE ÉXITO Y PROSPERIDAD.

*Magdalena Martinez
Melendrez*

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ



0103

CALLE LA CIENEGUITA #3 A , VELADORES, C.P. 99900, NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS, MX.



BITACORA DE OBRA

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

No. PROYECTO 404004

HOJA PORTADA

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS"				
LOCALIZACION	NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS				
No. DE CONTRATO	NOCHIS/FONDOSIII/2024/06				
MONTO CONTRATADO	\$ 1'667,134.32				
FECHA DE INICIO	PROGRAMADA	28/02/2024	REAL	28/02/2024	
FECHA DE TERMINO	PROGRAMADA	28/05/2024	REAL	09/05/2024	

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL	MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
DOMICILIO	LA CIENEGUITA 3 CONOCIDO
TELEFONO	346 713 29 29

Magdalena Martinez
Melendrez

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO
FAISM (FIIT)

EJERCICIO 2024

0104

ANOTACIONES



No. DE CONTRATO		NOCHIS/FONDOSIII/2023/06	
FOLIO		001	
No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
1	28 DE FEB AL 02 DE MARZO	TERRACERIAS	RETIRO DE EMPEDRADO



No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
2	04 AL 05 DE MARZO	TERRACERIAS	ACARREOS EN CAMION DE BOLTEO



No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
3	04 AL 08 DE MARZO	TERRACERIAS	EXCAVACIONES EN CORTE

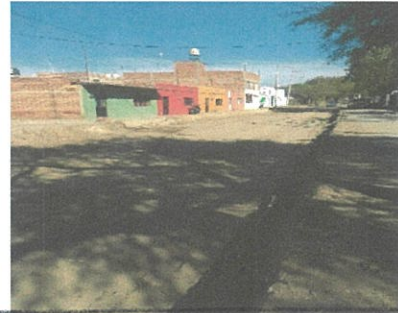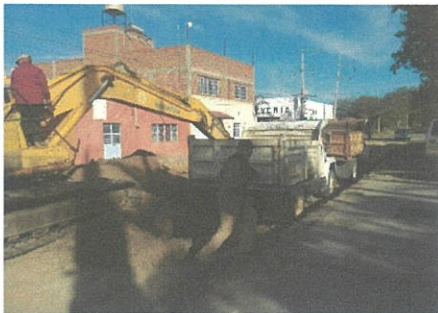


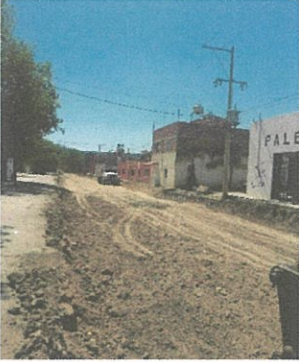




Magdalena Martinez
Melendrez

CONTRATIASTA

OPERADO
FAISM (FIII)
SUPERVISOR
EJERCICIO 2024

0105

ANOTACIONES

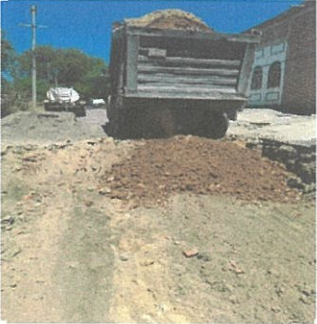No. DE CONTRATO		NOCHIS/FONDOSIII/2024/06	
FOLIO		002	
No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
	04 AL 08 DE MARZO	TERRACERIAS	EXCAVACIONES EN CORTE
			
No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
4	06 AL 08 DE MARZO	TERRACERIAS	EXCAVACIONES Y ACARREOS EN CAMION
			
No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
5	23 MARZO AL 09 DE ABRIL	SUB-BASE Y BASE	SUMINISTRO, MEZCLADO Y TENDIDO DE LA SUBASE
			

Magdalena Martinez
Melendrez

CONTRATIASTA



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOSIII/2024/06

FOLIO: 003

No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
-------------	-------	--------------	---------------------

	25 MARZO AL 05 DE ABRIL	SUB-BASE Y BASE	SUMINISTRO, MEZCLADO Y TENDIDO DE LA SUBASE
--	-------------------------------	--------------------	---




No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
-------------	-------	--------------	---------------------

6	AL 06 AL 12 DE ABRIL	BASE	SUMINISTRO, MEZCLADO Y TENDIDO DE LA BASE
---	-------------------------	------	---



No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
-------------	-------	--------------	---------------------

	AL 06 AL 12 DE ABRIL	BASE	SUMINISTRO, MEZCLADO Y TENDIDO DE LA BASE
--	----------------------------	------	---

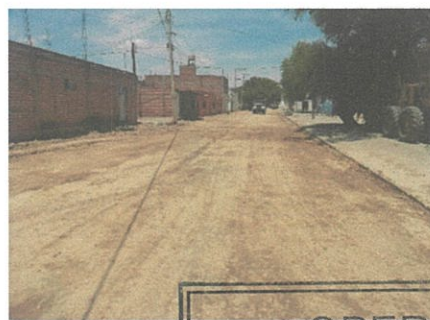

0107


Magdalena Martinez
Melendrez

CONTRATIASTA

OPERADO
FAISM (FIII)
SUPERVISOR
EJERCICIO 2024

ANOTACIONES

No. DE CONTRATO		NOCHIS/FONDOSIII/2024/06	
FOLIO		004	
No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
7	AL 13 AL 19 DE ABRIL	GUARNICIONES Y BANQUETAS	CIMBRADO, ARMADO Y COLADO DE GUARNICION DE CONCRETO

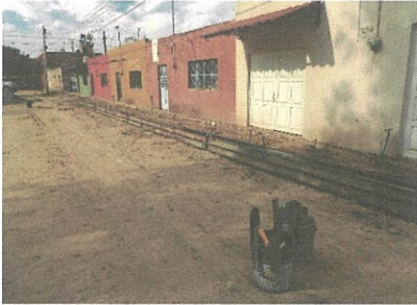

No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
	AL 13 AL 19 DE ABRIL	GUARNICIONES Y BANQUETAS	CIMBRADO, ARMADO Y COLADO DE GUARNICION DE CONCRETO



No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
	AL 13 AL 19 DE ABRIL	GUARNICIONES Y BANQUETAS	CIMBRADO, ARMADO Y COLADO DE GUARNICION DE CONCRETO



Magdalena Martinez
Melendrez
CONTRATIATA

OPERADO
SUPERVISOR
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024



Usu: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C01570 Del 09/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024 09:31 a. m.
Página | 1

Concepto: 70BB - Obra Pública : 404004 - PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DEL MUNICIPI. GP
Folio: 313

Beneficiario: **MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404004-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$1,667,134.32		FF:511, GP Folio: 313
0002	8260-511-404004-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$1,667,134.32	FF:511, GP Folio: 313
0003	2113-000616	MAGDALENA MARTINEZ	\$1,667,134.34		FF:511, GP Folio: 313
0004	1112-08-163	FONDO III 2024 1255080241		\$1,667,134.34	FF:511, GP Folio: 313
Sumas iguales =>			<u>3,334,268.66</u>	<u>3,334,268.66</u>	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 24

0110



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza


MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P04468 Del 09/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
09:29 a. m.
Página | 1

Concepto: 70BB - Obra Pública : 404004 - PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DEL MUNICIPI. GD
Folio: 331

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-404004-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$1,667,134.32		FF:511, GD Folio: 331
0002	8240-511-404004-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$1,667,134.32	FF:511, GD Folio: 331
0003	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de	\$1,667,134.32		FF:511, GD Folio: 331
0004	2113-000616	MAGDALENA MARTINEZ		\$1,667,134.32	FF:511, GD Folio: 331
Sumas iguales =>			<u>3,334,268.64</u>	<u>3,334,268.64</u>	



0111



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/05/2024 12:55

Cuenta/ CLABE Ordenante	1255080241
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
RFC Ordenante	MNM850101AC3
Moneda	MXP
ID Transacción	323
Nombre del Beneficiario	MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
Cuenta CLABE Beneficiario	0592391588
Título de la Cuenta	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
RFC Beneficiario	MAMM880814NIA
Importe a transferir	\$1,667,134.34
IVA	\$0.00
Fecha de Emisión	09/05/2024
Número de Referencia	01
Procedente de la Transferencia	PAGO DE FACTSUR ANO 70BB
Clase de Cuentas	22
Comprobante	OK. OPERACION EFECTUADA
Comprobante	\$0.00
IVA	\$0.00
Carácter	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha de Emisión	09/05/2024 12:54:58 p. m.
Ejecución	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha de Ejecución	09/05/2024 12:55:22 p. m.
Autorización	
Fecha de Autorización 1:	
Autorización	
Fecha de Autorización 2:	
Autorización	
Fecha de Autorización 3:	
Autorización 1:	
Fecha de Aceptación 1:	
Autorización 2:	
Fecha de Aceptación 2:	
Motivo de Ejecución	Individual
Nombre de Archivo	

Operada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de Monterrey.

Para cualquier aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución correspondiente al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 15 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México (52) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0112

OPERADO

FAISM (FIII)

EJERCICIO 2024

ORDEN DE PAGO 2024

08-may

MUNICIPIO: 034 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: RAMO 33 . PROGRAMAS FEDERALES
 SUB-PROGRAMA : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 (RAMO, FONDO O PROGRAMA) (FONDO III 2024)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 CARGO SOLICITANTE: ENCARGADO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
 FIRMA DEL SOLICITANTE: [Firma]
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 8 de mayo de 2024
 CUENTA BANCARIA ORIGEN : 1255080241

No.	CLAVE PRESUPUESTARIA								NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE.	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO						
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	511	FONDO III RAMO 33	404004	PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN ZACATECAS.	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6141	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO	NOCHIS/FOND OIII/2024/06	MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ	70BB	08/05/2023	1,667,134.34	(UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 34/100 MN)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024

AUTORIZA:

[Firma]
 L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ.
 ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL

FECHA :08 DE MAYO DEL 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024

AUTORIZA:

[Firma]
 JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA : 08 DE MAYO DEL 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024

AUTORIZA:

[Firma]
 PROF. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA : 08 DE MAYO DEL 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATURA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024

AUTORIZA:

[Firma]
 LILIANA ROQUE GOMEZ.
 SÍNDICO MUNICIPAL

FECHA : 08 DE MAYO DEL 2024

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 77 FRACCIÓN XI, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.

0113

ORDENADO
ENCARGADO
FONDO III (FIII)
EJERCICIO 2024

RFC emisor: MAMM880814NIA
 Nombre emisor: MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
 Folio: 105
 RFC receptor: MNM850101AC3
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
 Código postal del receptor: 99900
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: B6F74273-E813-49A5-AE6C-F5DA445F70BB
 No. de serie del CSD: 00001000000512429097
 Código postal, fecha y hora de emisión: 99900 2024-05-08 10:03:22
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
72141103		1.00	E48	Unidad de servicio	1,437,184.7588	1,437,184.76		Si objeto de impuesto.	
Descripción	PAGO DE LA PRIMERA Y UNICA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS" CON NUM. DE CONTRATO NOCHIS/FONDOIII/2024/06				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	1,437,184.76	Traslado	16.00%	229,949.56
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,437,184.76
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 229,949.56
 Total \$ 1,667,134.32

Sello digital del CFDI:

SwuqUd12WkRtGi4nMClwANKTVZUIf5As33s//FUI/9/46v8+VXNsThDlm5Hxcq1Y+3+fHhJKMoFWN7pgco/36Vyy/53gcz8W9xm3JyM4uRCJTPmcbMCGdzjy+L8q7YsNlleaNVM+ZCLERL9R Jx5Hwk4ToreONwmY3BNgAju252qTpbVK20CGGONcuCdGvMflCmfCg6slH18P4OIIIGUxhMy+uHb5WRDmhn8B4kqOImJKQWSMc5Dq7K2/NucNOCs7shBrVTZ0EHlnlwdqEJ1+HdmfFHi X3bDVNyxIhXxSiZizmUv8kp75VSNyd1Uc+njVOGvW4zU+qG/UXoysw0+tg==

Sello digital del SAT:

T0nn3Qc70eQw3uBVG328p6sp++j9YYGC2RhyJsko6NphJCHQFk8fOroMpczJD6irFUJYjIk0XFNvXnQEWZi2iEnzf2q49slTxS4viFsiNK1fPN7OHLH/gWqZJcmvRMB5LKV9sL1COE3a aCMvB3i0WCA0iLWXwK+p6NuJMwerg1jpKH75/tJGRMdq/HHJUS7Vn3z5rh1hpHOzOH7wSsWZc2M4oohsOPg77V1Cw63U2nsv4KE+5C+4NUuC8M5/C5Ckv3OPes7zcgNclzOsd2vD872T Rg4s6t+E6dFUUnuZ1Cqpkrdw5c3ySiZe9jay9I8CtdIEtbiMsYLSJdMw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B6F74273-E813-49A5-AE6C-F5DA445F70BB|2024-05-08T10:03:51|SAT970701NN3|SwuqUd12WkRtGi4nMClwANKTVZUIf5As33s//FUI/9/46v8+VXNsThDlm5Hxcq1Y+3+fHhJKMoFWN7pgco/36Vyy/53gcz8W9xm3JyM4uRCJTPmcbMCGdzjy+L8q7YsNlleaNVM+ZCLERL9R Jx5Hwk4ToreONwmY3BNgAju252qTpbVK20CGGONcuCdGvMflCmfCg6slH18P4OIIIGUxhMy+uHb5WRDmhn8B4kqOImJKQWSMc5Dq7K2/NucNOCs7shBrVTZ0EHlnlwdqEJ1+HdmfFHiX3bDVNyxIhXxSiZizmUv8kp75VSNyd1Uc+njVOGvW4zU+qG/UXoysw0+tg==|00001000000504465028|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-05-08 10:03:51
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



0114



ESTIMACION

NÚMERO DE ESTIMACION:
1

HOMBRE DE LA OBRA:
NO. DE CONTRATO:
UBICACION:
PERIODO:
IMPORTE DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS
NOCHISTLAN/NOCHISTLAN/2024/06
NOCHISTLAN/DEMEJIAS ZACATECAS
28 DE FEBRERO A 28 DE MAYO
\$1,667,134.32

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

010706 Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano

RETA-01 Retiro de empedrado con recuperación de material, incluye: almacenamiento a una distancia máxima de 20 mts.

P-03 Demolicion concreto simple de 15 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaletos

TEMP-3 Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes deacuerdo al proyecto

010818 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m³ de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria. Carga con maquina.

ACAR-02 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m³ de material no utilizable, kilometros subsecuentes, se concideran (2 km)

METAC-0002 Meziado tendido y compactacion de la sub construcion de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material petro (40% tepetate - 60% cascajo)

METAC-0002-1 Meziado tendido y compactacion de la construcion de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (60% tepetate - 40% cascajo)

170701 Guarnición de Concreto f'c=f'c=150 Kg/cm² agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. , sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 armada con dos varillas de 3/8" y grapas de alambreon de 1/4", cimbra común a 20 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en hormigon, pintura de beta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

BAS-BANC-01 Meziado tendido y compactacion de la construcion de base para banquetas compactada con ballarina al 100% utilizando material de banco (tepetate)

010715 Banqueta de Concreto f'c=f'c=150 Kg/cm² agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrolitica 66-1010 rollo de 100 mts, incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.

030504 Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm² agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrolitica 66-1010 rollo de 100 mts, incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.

UNIDAD	CONTRATO			ESTIMADO			POR ESTIMAR			
	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
M2	1208.13	\$9.83	\$11,875.92	1208.13	\$9.83	\$11,875.92	0.00	\$9.83	\$0.00	
M3	153.00	\$22.75	\$3,480.75	153.00	\$22.75	\$3,480.75	0.00	\$22.75	\$0.00	
M2	143.14	\$65.04	\$9,309.83	143.14	\$65.04	\$9,309.83	0.00	\$65.04	\$0.00	
M3	703.57	\$90.01	\$63,328.34	703.57	\$90.01	\$63,328.34	0.00	\$90.01	\$0.00	
M3	703.57	\$143.48	\$100,948.22	703.57	\$143.48	\$100,948.22	0.00	\$143.48	\$0.00	
M3/KM	1407.14	\$14.51	\$20,417.60	1407.14	\$14.51	\$20,417.60	0.00	\$14.51	\$0.00	
M3	362.44	\$460.21	\$166,798.51	362.44	\$460.21	\$166,798.51	0.00	\$460.21	\$0.00	
M3	241.63	\$441.94	\$106,785.96	241.63	\$441.94	\$106,785.96	0.00	\$441.94	\$0.00	
M	133.00	\$486.18	\$64,661.94	133.00	\$486.18	\$64,661.94	0.00	\$486.18	\$0.00	
M3	52.80	\$251.60	\$13,284.48	52.80	\$251.60	\$13,284.48	0.00	\$251.60	\$0.00	
M2	176.00	\$450.03	\$79,205.28	176.00	\$450.03	\$79,205.28	0.00	\$450.03	\$0.00	
M2	1208.13	\$659.77	\$797,087.93	1208.13	\$659.77	\$797,087.93	0.00	\$659.77	\$0.00	
IMPORTE			\$1,437,184.76	IMPORTE			\$1,437,184.76	IMPORTE		
IVA			\$229,949.56	IVA			\$229,949.56	IVA		
TOTAL			\$1,667,134.32	TOTAL			\$1,667,134.32	TOTAL		

ING. JOSE FRANCISCO CABERO DELGADILLO
SUPERVISOR


ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DES. ECO. Y SOC.

PROF. RAFAEL AGAYO SUDIVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ
CONTRATISTA

RECIBIDO
(FIII)
EXERCICIO 2024

0115



RESUMEN DE ESTIMACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS
NO. DE CONTRATO: NOCHIS/FONDI003/2024/06
UBICACION: NOCHISTLAN DE MEJIA
PERIODO: 28 DE FEBRERO A 28 DE MAYO
IMPORTE DE CONTRATO: \$1,667,134.32


HOJA	CLAVES DE CONCEPTOS CONTENIDOS	IMPORTE
1	010706 - RETA-01 - P-03 - TEMP*3 - 010818 - ACAR-02 - METAC-0002 - METAC-0002-01 - 170701 - BAS-BAND-01 - 170715 - 030504	\$ 1,437,184.76

HISTORIAL	
MONTO DEL CONTRATO	\$1,667,134.32
ANTICIPO	\$0.00
(-) DEDUCCION 5 AL M.	\$0.00
ESTIMADO A LA FECHA	\$1,664,134.32
TOTAL POR ESTIMAR	\$0.00


SUBTOTAL	\$ 1,437,184.76
AMORTIZACION 0%	\$ -
SUBTOTAL	\$ 1,437,184.76

IVA 16%	\$ 229,949.56
TOTAL DE LA FACTURA	\$ 1,667,134.32
DEDUCCION 5 A MILLAR	\$ -
IMPORTE A RECIBIR	\$1,667,134.32

OPERADO
FAISM (FIII) 0116
EJERCICIO 2024


 PROF. RAFAEL AGUAYO-SALDIVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR


 C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ
 CONTRATISTA

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDI/2024/06
 MONTO CONTRATADO: \$1,667,134.32

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

MELENDEZ CONSTRUCCIONES

LOGO DE LA EMPRESA


FECHA DE CONTRATO: 28 DE FEBRERO 2024
 FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024
 PLAZO DE EJECUCION: 91 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 28 DE MAYO 2024

DESCRIPCION DE CONCEPTO: Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano.

CLAVE	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD
3-6	A-B	TRAZ Y NIV	25.3	6.40	161.92			M2
1-6	B-C	TRAZ Y NIV	8.7	3.50	30.45			
2-6	C-D	TRAZ Y NIV	17	8.50	144.50			
1-6	D-E	TRAZ Y NIV	7.7	10.30	79.31			
2-6	E-F	TRAZ Y NIV	37.3	8.50	317.05			
1-6	F-G	TRAZ Y NIV	8.10	10.70	86.70			
2-6	G-H	TRAZ Y NIV	35.61	8.90	316.95			
2-5	H-I	TRAZ Y NIV	9.5	7.50	71.25			
TOTAL								1208.13

CONTRATISTA: C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ
 LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA
 PROGRAMA: FAISM

EST. No. 1
 HOJA: 1 DE 12
 PERIODO DE: 28/02/2024 A 28/05/2024

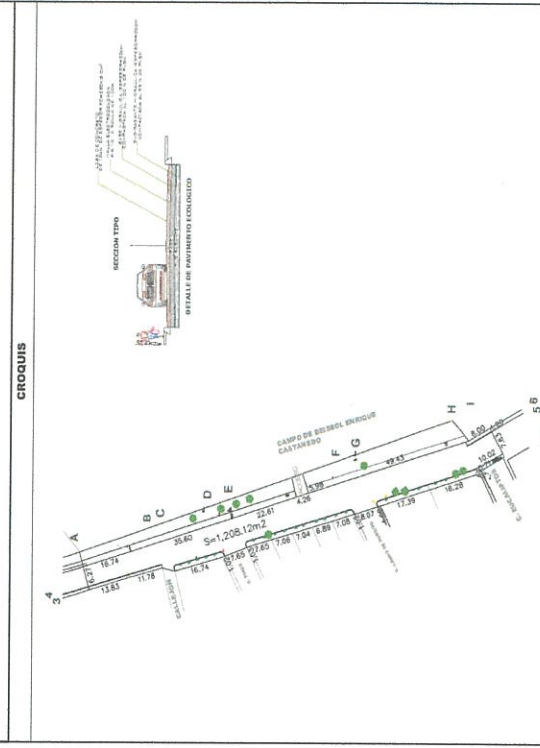

MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ
 CONTRATISTA

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ
 CONTRATISTA

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

OPERADO
 FAISM (FIH)
 EJERCICIO 2024

0117

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		NOCHIS/FONDOIII/2024/06	
NOMBRE DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS	
MONTO CONTRATADO:		\$1,667,134.32	
CONTRATISTA:		C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ	
MUNICIPIO:		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
LOCALIDAD:		NOCHISTLAN DE MEJIA	
PROGRAMA:		FAISM	
EST. No.	1	HOJA:	28/02/2024
PERIODO DE:	1	A	28/05/2024
NOTAS :			




LOGO DE LA EMPRESA

Trazo y nivelación con aparatos topograficos en terreno plano

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

CLAVE
010706

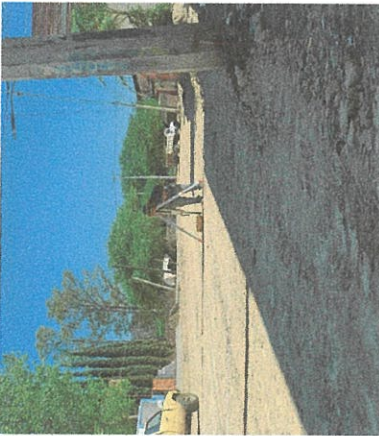

ING. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR


Magdalena Martinez
MeLendez
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ
CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0118

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOI011/2024/06
 MONTO CONTRATADO: \$1,667,134.32



LOGO DE LA EMPRESA


FECHA DE CONTRATO: 28 DE FEBRERO 2024
 FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024
 PLAZO DE EJECUCION: 91 D.A.S
 FECHA DE TERMINO: 28 DE MAYO 2024


DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 Retiro de empedrado con recuperacion de materiales, incluir: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.

LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD
3 - 6	A - B	RET. EMPEDRADO	25.3	6.40	20.51	0.127	M3
1 - 6	C - C	RET. EMPEDRADO	4.7	3.50	3.86	0.127	
2 - 6	D - D	RET. EMPEDRADO	7.7	6.50	18.30	0.127	
1 - 6	E - E	RET. EMPEDRADO	37.3	10.30	10.04	0.127	
2 - 6	F - F	RET. EMPEDRADO	8.10	8.50	40.15	0.127	
1 - 6	G - G	RET. EMPEDRADO	35.61	10.38	10.98	0.127	
2 - 6	H - H	RET. EMPEDRADO	9.5	8.50	4.12	0.127	
2 - 6	H - I	RET. EMPEDRADO	9.5	7.80	9.02	0.127	
TOTAL							153.00


CONTRATISTA: C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ
 MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 EST. No. 1
 HOJA: 2
 PERIODO DE: 28/02/2024 A 28/05/2024
 NOTAS: CROQUIS

PROGRAMA: FAISM
 LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 DIA: 12
 MES: 28/05/2024

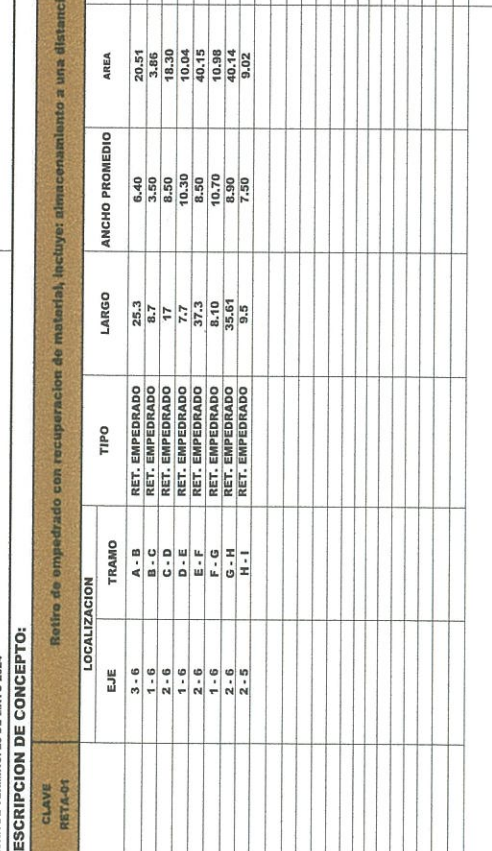


 ING. JOSE FRANCISCO CAJERO BELGADILLO
 SUPERVISOR

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024



 ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

01119

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		MUNICIPIO:		CONTRATISTA:	
NOCHIS/FONDOI/2024/06		NOCHISTLAN DE MEJIA		C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ	
MONTA DE LA OBRA:		MUNICIPIO:		LOCALIDAD:	
NOCHIS/FONDOI/2024/06		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA	
MONTA CONTRATADO:		EST. No.		HOJA:	
\$1,667,134.32		1		2	
		PERIODO DE:		DE:	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS		28/02/2024		28/05/2024	
FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024 PLAZO DE EJECUCION: 91 DIAS FECHA DE TERMINO: 28 DE MAYO 2024		NOTAS:			
DESCRIPCION DE CONCEPTO: CLAVE: RETA-51					

Restro de empedrado con recuperacion de material, incluye almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.

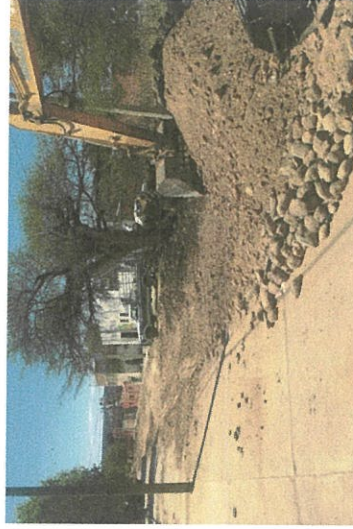

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

Magdalena Martinez
Melendez
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ
CONTRATISTA

0120

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		CONTRATISTA:	
NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO:	
NOCHIS/FONDOI/2024/06		C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ	
MONTTO CONTRATADO:		LOCALIDAD:	
\$1,667,134.32		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
		PROGRAMA:	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS		FAISM	
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024 PLAZO DE EJECUCION: 91 DIAS FECHA DE TERMINO: 28 DE MAYO 2024		EST. No. : 3 HOJA: 1 PERIODO DE: 28/02/2024 A 28/05/2024	
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		NOTAS :	
CLAVE P-03			


Demolicion concreto simple de 15 cm de espesor promedio con mediana metálicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaños



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024


 ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


 ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR


 C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
 CONTRATISTA

0122

GENERADORES

CONTRATISTA: C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
 MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA
 PROGRAMA: FAISM

EST. No. 1
 HOJA: 4
 PERIODO DE: 28/02/2024 A 28/05/2024


NOTAS:
 CROQUIS

CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2024/06
 MONTO CONTRATADO: \$1,667,134.32

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

FECHA DE CONTRATO: 28 DE FEBRERO 2024
 PLAZO DE EJECUCION: 91 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 28 DE MAYO 2024

LOGO DE LA EMPRESA: MELENDEZ CONSTRUCCIONES

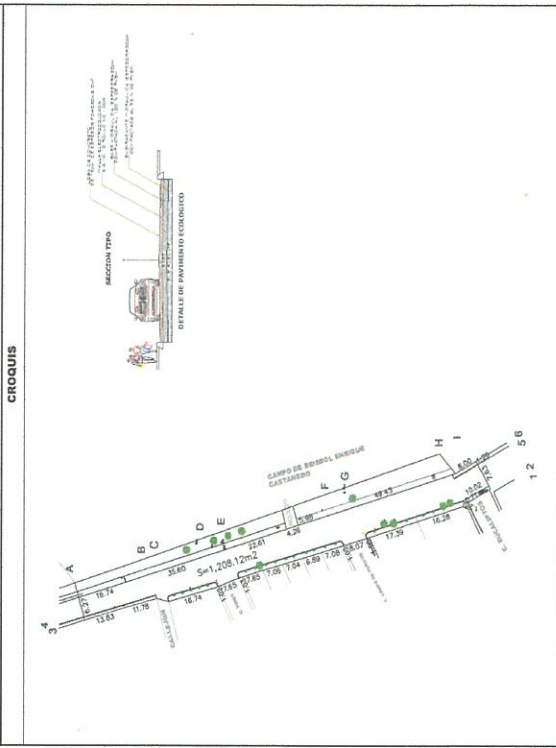

LOCALIZACION		TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD	
EJE	3-6	A-B	EXCAVACION	25.3	6.40	94.30	0.58	M3	
	1-6	B-C	EXCAVACION	8.7	3.50	17.73	0.58		
	2-6	C-D	EXCAVACION	17	8.50	84.16	0.58		
	1-6	D-E	EXCAVACION	7.7	10.30	46.19	0.58		
	2-6	E-F	EXCAVACION	37.3	8.50	184.65	0.58		
	1-6	F-G	EXCAVACION	8.10	10.70	50.50	0.58		
	2-6	G-H	EXCAVACION	35.61	8.50	184.57	0.58		
	2-5	H-I	EXCAVACION	9.5	7.50	41.47	0.58		
								TOTAL	703.57

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
 CONTRATISTA

0123

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		CONTRATISTA:	
NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO:	
NOCHIS/FONDOI/2024/06		C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ	
MONTO CONTRATADO:		LOCALIDAD:	
\$1,667,134.32		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0374 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS			
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024 PLAZO DE EJECUCION: 91 DIAS FECHA DE TERMINO: 28 DE MAYO 2024			
DESCRIPCION DE CONCEPTO: Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motobuladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo al proyecto			
CLAVE TEMP:3	EST. No. 1	HOJA: 4	PROGRAMA FAISM
	NOTAS :	PERIODO DE: A	DE: 12
		28/02/2024	28/05/2024




 ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


 ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR


 C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
 CONTRATISTA

OPERADO
 FAISM (F III)
 EJERCICIO 2024

0124

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2024/06
 MONTO CONTRATADO: \$1,667,134.32

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS



FECHA DE CONTRATO: 28 DE FEBRERO 2024
 FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024
 PLAZO DE EJECUCION: 91 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 28 DE MAYO 2024


LOGO DE LA EMPRESA

DESCRIPCION DE CONCEPTO: Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con máquina.

EJE	TRAMO	LOCALIZACION	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD
3-6	A-B		ACARREO	25.3	6.40	94.30	0.58	M3
1-6	B-C		ACARREO	8.7	3.50	17.73	0.58	
2-6	C-D		ACARREO	17	8.50	84.16	0.58	
1-6	D-E		ACARREO	7.7	10.30	46.19	0.58	
2-6	E-F		ACARREO	37.3	8.50	184.65	0.58	
1-6	F-G		ACARREO	8.10	10.70	50.50	0.58	
2-6	G-H		ACARREO	35.61	8.90	184.57	0.58	
2-5	H-I		ACARREO	9.5	7.50	41.47	0.58	
TOTAL								703.57

CONTRATISTA: C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
 MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA
 PROGRAMA: FAISM

EST. No. 1
 HOJA: 5 DE 12
 PERIODO DE: 28/02/2024 A 28/05/2024

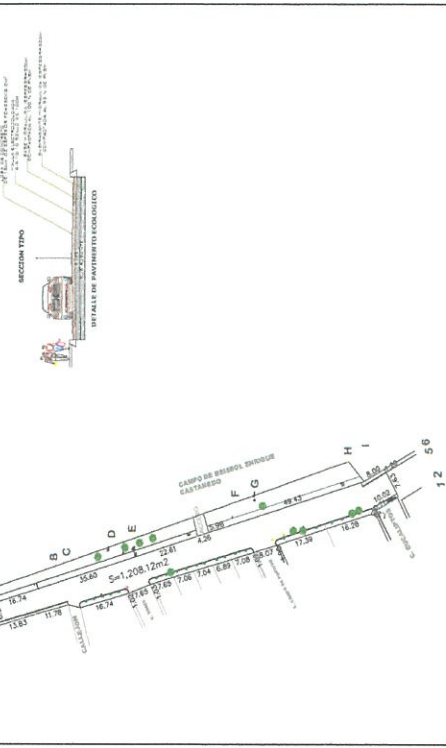

ARG. JUAN CARLOS AELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
 CONTRATISTA

OPERADO
 FAISM (FII)
 EJERCICIO 2024

0125

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		MUNICIPIO:		CONTRATISTA:	
NOCHIS/FONDOIII/2024/06		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ	
NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO:		LOCALIDAD:	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS		NOCHISTLAN DE MEJIA		NOCHISTLAN DE MEJIA	
MONTTO CONTRATADO:		HOJA:		PROGRAMA	
\$1,667,134.32		28/02/2024		FAISM	
FECHA DE CONTRATO :		EST. No.		PERIODO DE:	
28 DE FEBRERO 2024		1		5 A	
PLAZO DE EJECUCION: 91 DIAS		DE: 12		28/05/2024	
FECHA DE TERMINO: 28 DE MAYO 2024		NOTAS :			
DESCRIPCION DE CONCEPTO:					




LOGO DE LA EMPRESA

Acurrreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería, Carga con maquina.

CLAVE

010818

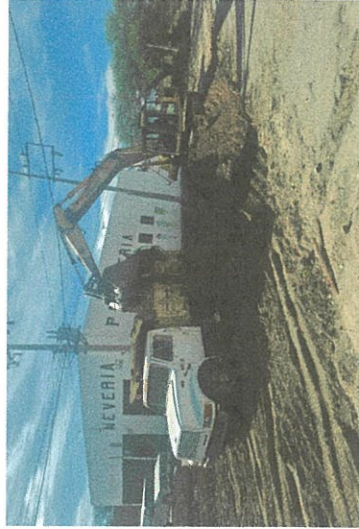

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

Magdalena Martinez
Meleendez
C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
CONTRATISTA

0126

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2024/06
 MONTO CONTRATADO: \$1,667,134.32

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

MELENDEZ CONSTRUCCIONES


FECHA DE CONTRATO: 28 DE FEBRERO 2024
 FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024
 PLAZO DE EJECUCION: 91 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 28 DE MAYO 2024

DESCRIPCION DE CONCEPTO: Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsiguientes, se concideran (2 km)

EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA (2 KM)	ALTO	UNIDAD
3 - 6	A - B	ACARREO SUB	25.3	6.40	94.30	0.58	M3/KM
1 - 6	B - C	ACARREO SUB	8.7	3.50	17.73	0.58	
2 - 6	C - D	ACARREO SUB	17	8.50	84.16	0.58	
1 - 6	D - E	ACARREO SUB	7.7	10.30	46.19	0.58	
2 - 6	E - F	ACARREO SUB	37.3	8.50	194.65	0.58	
1 - 6	F - G	ACARREO SUB	8.10	10.70	50.50	0.58	
2 - 6	G - H	ACARREO SUB	35.61	6.90	194.57	0.58	
2 - 5	H - I	ACARREO SUB	9.5	7.80	41.47	0.58	
TOTAL							1407.14

CONTRATISTA: C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
 LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA
 EST. No. 1
 PERIODO DE: 6
 DE: 28/02/2024
 A: 28/05/2024

PROGRAMA: FAISM
 HOJA: A
 NOTAS: CROQUIS

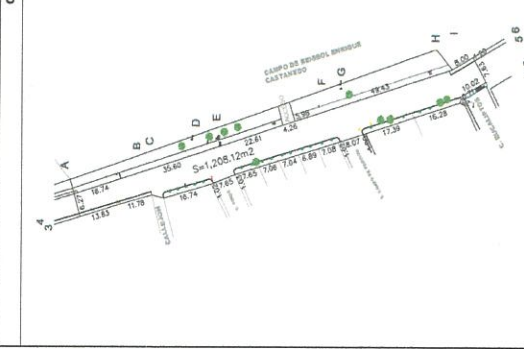

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

ING. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

Magdalena Martinez Melendez
 C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
 CONTRATISTA

0127

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		CONTRATISTA:	
NOCHIS/FONDOIII/2024/06		C. MAGALENA MARTINEZ MELENDREZ	
MUNICIPIO:		LOCALIDAD:	
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS		NOCHISTLAN DE MEJIA	
MONTO CONTRATADO:		PROGRAMA	
\$1,667,134.32		FAISM	
			
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS			
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024 PLAZO DE EJECUCION: 91 DIAS FECHA DE TERMINO: 28 DE FEBRERO 2024			
DESCRIPCION DE CONCEPTO: Acerreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se contabilizan (2 km)			
EST. No. 1		HOJA: 6 DE 12	
28/02/2024		PERIODO DE: A	
NOTAS :			

Acerreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se contabilizan (2 km)



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

Magdalena Martinez Melendrez
C. MAGALENA MARTINEZ MELENDREZ
CONTRATISTA

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

0128

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2024/06
 MONTO CONTRATADO: \$1,667,134.32

MELENDRIZ CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

LOGO DE LA EMPRESA

FECHA DE CONTRATO :
 FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024
 PLAZO DE EJECUCION: 91 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 28 DE MAYO 2024

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

Clave: MRETAC-0002

Descripción: Briciado terrido y compactación de la construcción de la sub rasante base compactada al 98 %, utilizando material de banco y material patro (40% tepalcates - 60% cascabe)

EJE	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD
3-6	A-B	25.3	SUBASE	6.40	48.58	0.3	M3	
1-6	B-C	8.7	SUBASE	3.50	9.14	0.3		
2-6	C-D	17	SUBASE	8.50	43.35	0.3		
1-6	D-E	7.7	SUBASE	10.30	23.79	0.3		
2-6	E-F	37.3	SUBASE	8.50	95.12	0.3		
1-6	F-G	8.10	SUBASE	10.70	26.01	0.3		
2-6	G-H	35.61	SUBASE	8.90	95.08	0.3		
2-5	H-I	9.5	SUBASE	7.50	21.38	0.3		
TOTAL								362.44

OPERADO
 FAISM (FII)
 EJERCICIO 2024

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

MAGDALENA MARTINEZ MELENDRIZ
 CONTRATISTA

0129

CONTRATISTA: C. MAGALENA MARTINEZ MELENDRIZ

MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

PROGRAMA: FAISM

EST. No. 1


HOJA: 7

PERIODO DE: A

28/02/2024

28/05/2024


NOTAS:

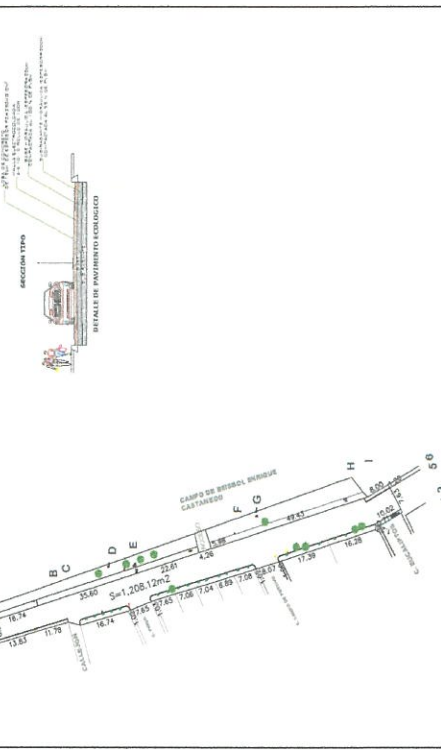

CROQUIS

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2024/06		CONTRATISTA: C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA	
FECHA DE CONTRATO : 28 DE FEBRERO 2024		PROGRAMA FAISM	
FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024		PERIODO DE: 7 A	
PLAZO DE EJECUCION: 91 DIAS		HOJA: 28/02/2024	
FECHA DE TERMINO: 28 DE MAYO 2024		DE: 12	
DESCRIPCION DE CONCEPTO: Meclado (tenido) y compactacion de la construcion de la sub rasante base compactada al 98 %, utilizando material de banco y material peltro (40% topetate - 60% cascajo)		NOTAS :	
CLAVE METAC-0002		LOGO DE LA EMPRESA	

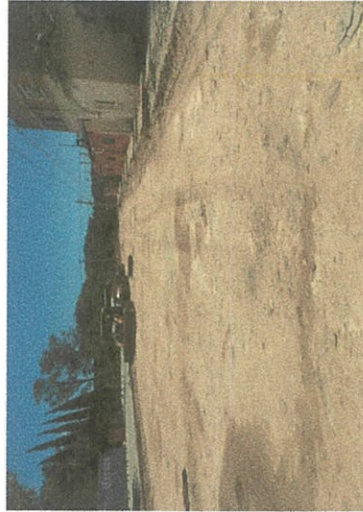

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ
 C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
 CONTRATISTA



GENERADORES

CONTRATO:	NOCHIS/FONDOIII/2024/06	MONTO CONTRATADO:	\$1,667,134.32
-----------	-------------------------	-------------------	----------------

NOMBRE DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS


FECHA DE CONTRATO :
 FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024
 PLAZO DE EJECUCION: 91 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 28 DE MAYO 2024



DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (60% topoteste - 40% cascajo)

CLAVE MET/AC-0003-01	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD
	3-6	A-B	BASE	25.3	6.40	32.38	0.2	M2
	1-6	B-C	BASE	8.7	3.50	6.09	0.2	
	2-6	C-D	BASE	17	8.50	26.90	0.2	
	1-6	D-E	BASE	7.7	10.30	15.86	0.2	
	2-6	E-F	BASE	37.3	8.50	63.41	0.2	
	1-6	F-G	BASE	8.10	10.70	17.34	0.2	
	2-6	G-H	BASE	35.61	8.90	63.39	0.2	
	2-6	H-1	BASE	9.5	7.50	14.25	0.2	
								TOTAL
								241.63

CONTRATISTA:	C. MAGALENA MARTINEZ MELENDRIZ	PROGRAMA	FAISM
MUNICIPIO:	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	NOCHISTLAN DE MEJIA	
EST. No.	1	HOJA:	B
NOTAS:		PERIODO DE:	A
			28/02/2024
			28/05/2024

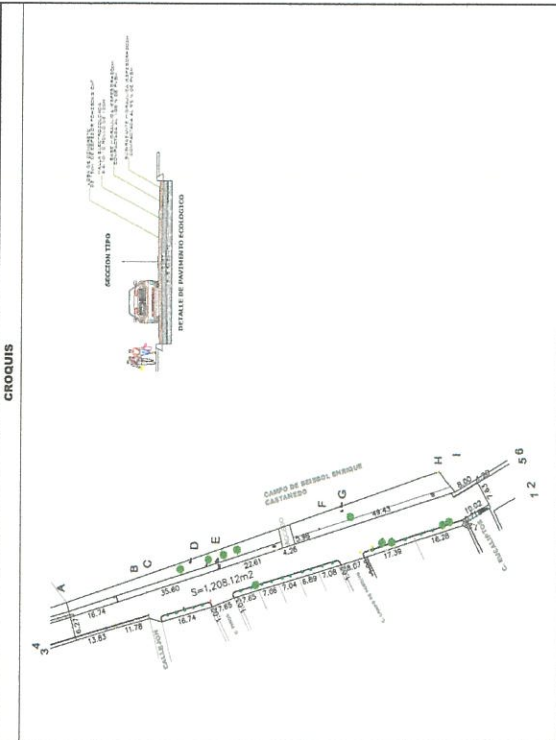

ING. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

Magalena Martinez Melendrez
 C. MAGALENA MARTINEZ MELENDRIZ
 CONTRATISTA

0131

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		MUNICIPIO:		CONTRATISTA:	
NOCHIS/FONDOI/2024/06		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ	
NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO:		LOCALIDAD:	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS		NOCHISTLAN DE MEJIA		NOCHISTLAN DE MEJIA	
MONTA DE LA OBRA:		EST. No.		HOJA:	
\$1,667,134.32		1		8	
FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024		PERIODO DE:		DE: 12	
PLAZO DE EJECUCION: 91 DIAS		28/02/2024		28/05/2024	
FECHA DE TERMINO: 28 DE MAYO 2024		NOTAS:		A	
DESCRIPCION DE CONCEPTO:					
Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (60% lepedate - 40% cascajo)					
CLAVE METAC-0902-01					



LOGO DE LA EMPRESA



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

Magdalena Martinez Melendez
C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
CONTRATISTA


Ing. Jose Francisco Cajero Delgadillo
ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

Arq. Juan Carlos Avelar Ramirez
ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

0132

GENERADORES

CONTRATISTA:	C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ	
MUNICIPIO:	LOCALIDAD:	
PROGRAMA	FAISM	
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
EST. No.	HOJA:	PERIODO DE:
1	26/02/2024	A
NOTAS :	28/05/2024	
CROQUIS		

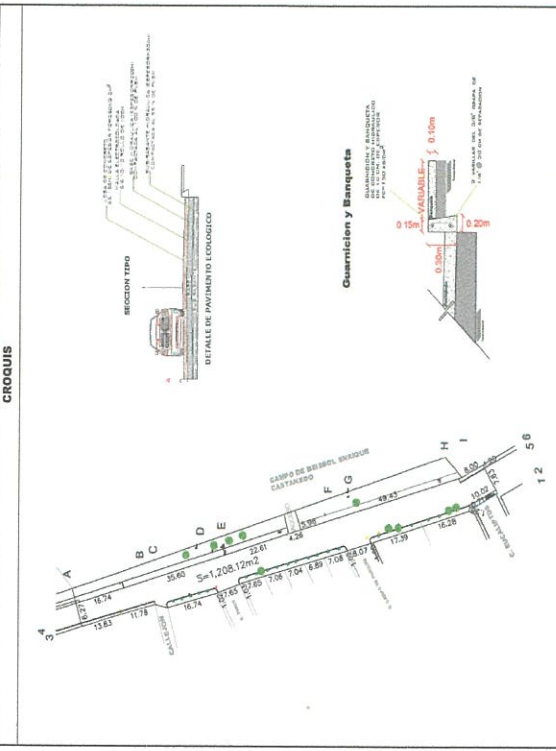

EJE	TRAMO	TIPO	LARGO 1	ANCHO PROMEDIO	LARGO 2	ALTO	UNIDAD
4	A-B	GUARNICIONES	25.5				M
B	3-4	GUARNICIONES	1.15				
2	1-2	GUARNICIONES	1.75				
D	1-2	GUARNICIONES	1.75				
E	1-2	GUARNICIONES	1.86				
F	E-F	GUARNICIONES	37.6				
G	1-2	GUARNICIONES	1.75				
2	G-H	GUARNICIONES	35.6				
H	1-2	GUARNICIONES	1.75				
5	H-1	GUARNICIONES	9.24				
TOTAL							133.00

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 Guarnición de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm., sección Trapezoidal de 0.75 X 0.20 X 0.40 armada con dos varillas de 3/8" y grapas de alambros de 1/4" cimbra común a 20 usos, incluye: Pintura para tráfico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2024/06

MONTO CONTRATADO: \$1,667,134.32

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

FECHA DE CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024

PLAZO DE EJECUCION: 91 DIAS

FECHA DE TERMINO: 28 DE MAYO 2024

LOGO DE LA EMPRESA:

OPERADO

FAISM (FIII)

EJERCICIO 2024

ARC. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO

SUPERVISOR

Margdalena Melendez

C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ

CONTRATISTA


0133

MEMORIA FOTOGRAFICA

NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO.	MUNICIPIO:	MONTRO CONTRATADO:	PROGRAMA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS	NOCHIS/FONDOIII/2024/06	C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ	\$1,667,134.32	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
		LOCALIDAD:		
FECHA DE CONTRATO :		EST. No.	HOJA:	DE: 12
FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024		1	28/02/2024	PERIODO DE: A
PLAZO DE EJECUCION: 91 DIAS				28/05/2024
FECHA DE TERMINO: 28 DE MAYO 2024				
DESCRIPCION DE CONCEPTO:	NOTAS :			
CLAVE 170701	Guarnición de Concreto f _c =150 Kg/cm ² agregado de 20 mm, cantonete normal revestimiento 8 a 10 cm., sección Trapezoidal de 0.75 X 0.20 X 0.40 armada con dos varillas de 3/8" y grapas de alambro de 1/8" cimbra común a 20 usos, incluye Pintura para tráfico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.			




LOGO DE LA EMPRESA

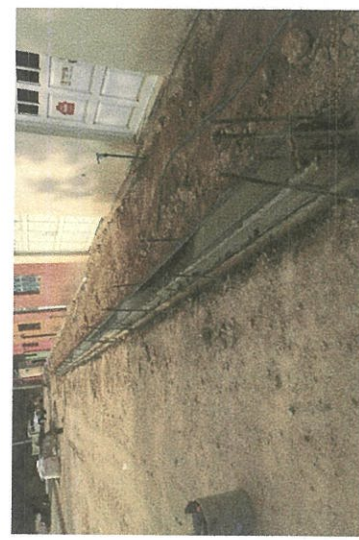

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR


C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0134

GENERADORES

CONTRATISTA: C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
 MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA
 LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 PROGRAMA: FAISM


EST. No. 1
 HOJA: 10 DE 12
 PERIODO DE: 28/02/2024 A 28/05/2024

NOTAS:

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/06
 MONTO CONTRATADO: \$1,667,134.32

LOGO DE LA EMPRESA:

FECHA DE CONTRATO:
 FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024
 PLAZO DE EJECUCION: 91 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 28 DE MAYO 2024

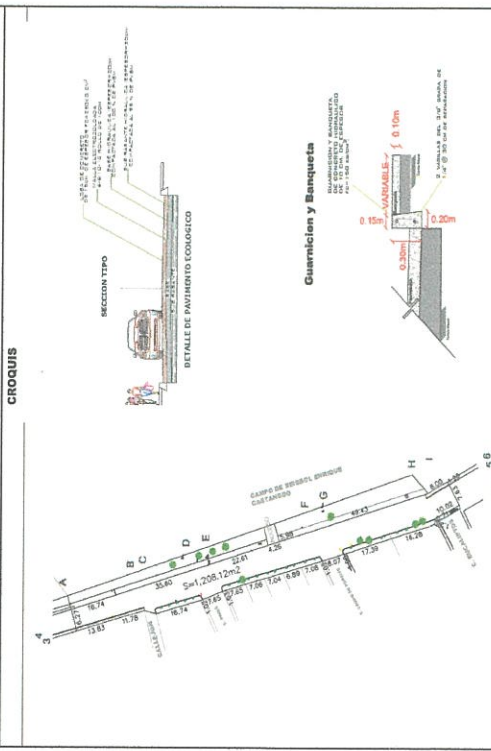

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
 CONTRATISTA

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

0135

MEMORIA FOTOGRAFICA

NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO:	MUNICIPIO:	CONTRATISTA:	PROGRAMA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0271 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS	NOCHIS/FONDOIII/2024/06	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ	FAISM
FECHA DE CONTRATO :	MONTTO CONTRATADO:	EST. No.	HOJA:	PERIODO DE:
20 DE FEBRERO 2024	\$1,667,134.32	1	28/02/2024	10 DE: 12
PLAZO DE EJECUCION: 91 DIAS	LOGO DE LA EMPRESA			
FECHA DE TERMINO: 20 DE MAYO 2024				
DESCRIPCION DE CONCEPTO:	<p>Mezclado, tendido y compactación de la construcción de base para banquetas compactada con ballarina al 95% utilizando material de banco (tepalcate).</p>			
CLAVE BAS-BANQ-01	NOTAS :			


Mezclado, tendido y compactación de la construcción de base para banquetas compactada con ballarina al 95% utilizando material de banco (tepalcate).

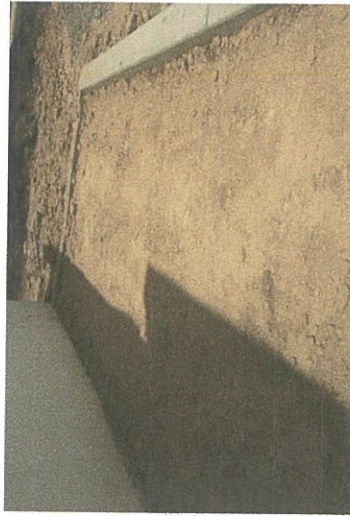

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024


ARC. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR


C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
 CONTRATISTA

GENERADORES




CONTRATISTA: C. MAGALENA MARTINEZ MILENDEZ
 MUNICIPIO: LOCALIDAD:
 NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. NOCHISTLAN DE MEJIA
 EST. No. 1 HOJA: 11 DE: 12
 PERIODO DE: 28/02/2024 A 28/05/2024
 NOTAS:
 PROGRAMA
 FAISM
 CROQUIS

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/06
 MONTO CONTRATADO: \$1,667,134.32
 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS
 FECHA DE CONTRATO :
 FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024
 PLAZO DE EJECUCION: 91 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 28 DE MAYO 2024
 DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 CLAVE 170715 LOCALIZACION



Banqueta de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, tubos y chabra coman, mismo de obra, barramiente

LOCALIZACION	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD
	3-4	A-B	BANQUETA	25.5	0.97	24.74		M2
	1-2	C-D	BANQUETA	17.00	1.60	27.20		
	1-2	E-F	BANQUETA	37.1	1.60	59.36		
	1-2	G-H	BANQUETA	35.00	1.60	56.00		
	5-6	H-I	BANQUETA	9	0.97	8.73		
TOTAL								176.00



Magdalena Martinez
 C. MAGALENA MARTINEZ MILENDEZ
 CONTRATISTA

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

0137




MEMORIA FOTOGRAFICA

NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO:	MUNICIPIO:	CONTRATISTA:	PROGRAMA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS	NOCHIS/FONDOIII/2024/06	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	C. MAGALENA MARTINEZ MELENDREZ	FAISM
MONTO CONTRATADO:	FECHA DE CONTRATO :	EST. No.	HOJA:	PERIODO DE:
\$1,667,134.32	28 DE FEBRERO 2024	1	28/02/2024	11 DE: 12
PLAZO DE EJECUCION: 91 DIAS	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	NOTAS :	
28 DE MAYO 2024	28 DE FEBRERO 2024	28 DE MAYO 2024		



DESCRIPCION DE CONCEPTO: Benjueta de Concreto f'c=7.0550 Kg/cm2 agregado de 20 mm, conoete normal revestimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, Inicijer: cimbar común, mano de obra, herramienta menor.

CLAVE
170715

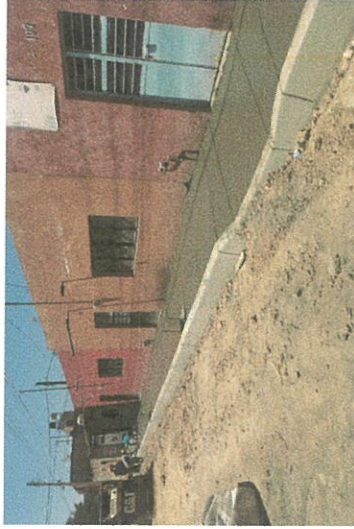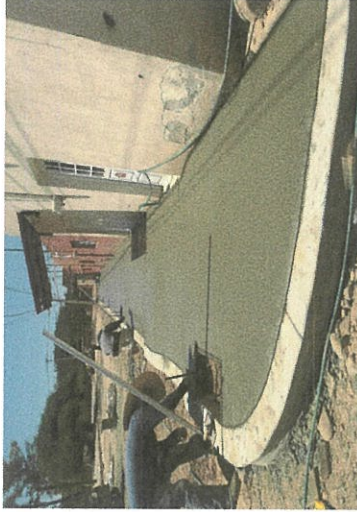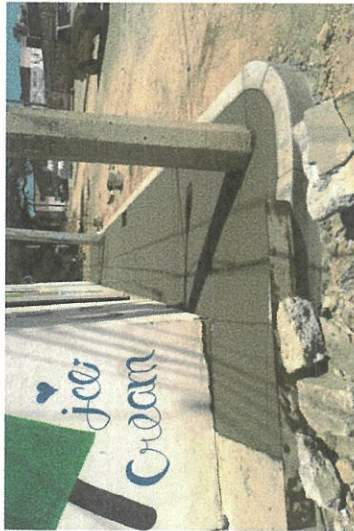

OPERADO
FAISM (F II)
EJERCICIO 2024

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR


Magdalena Martinez
Melendrez
C. MAGALENA MARTINEZ MELENDREZ
CONTRATISTA

0138

GENERADORES


CONTRATISTA:	C. MAGALENA MARTINEZ MILENDEZ		
MUNICIPIO:	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		
PROGRAMA:	FAISM		
EST. No.:	1	HOJA:	12 DE 12
NOTAS:	28/02/2024 A 28/05/2024		


CONTRATO:	NOCHIS/FONDOI/2024/06		
MONTO CONTRATADO:	\$1,667,134.32		
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0374 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS		
FECHA DE CONTRATO:			
FECHA DE INICIO:	28 DE FEBRERO 2024		
PLAZO DE EJECUCION:	91 DIAS		
FECHA DE TERMINO:	28 DE MAYO 2024		
DESCRIPCION DE CONCEPTO:	Pavimento de concreto Fc=250 Kg/cm2 agragado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de espesor, armado con (malla electrosoldada 65-1010 rollo de 100 mts, incluye: cimbras metálicas, mano de obra y herramienta menor.		

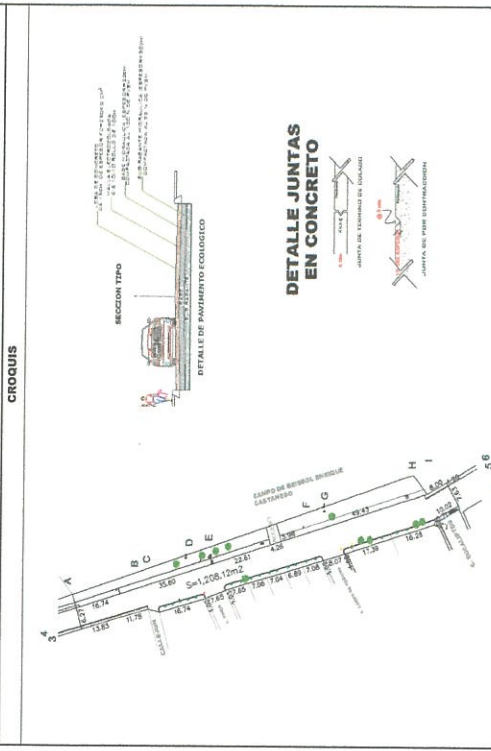


LOCALIZACION	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD
	3-6	A-B	PAVIMENTO	25.3	6.40	161.92		M2
	1-6	B-C	PAVIMENTO	8.7	3.50	30.45		
	2-6	C-D	PAVIMENTO	17	8.50	144.50		
	1-6	D-E	PAVIMENTO	7.7	10.30	79.31		
	2-6	E-F	PAVIMENTO	37.3	8.50	317.05		
	1-6	F-G	PAVIMENTO	8.10	10.70	86.70		
	2-6	G-H	PAVIMENTO	35.61	8.30	295.95		
	2-5	H-1	PAVIMENTO	9.5	7.50	71.25		
						1208.13		
							TOTAL	1208.13

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024


ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR


C. MAGALENA MARTINEZ MILENDEZ
 CONTRATISTA


ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

0139



MEMORIA FOTOGRAFICA

NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO:	MONTTO CONTRATADO:	PROGRAMA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS	NOCHIS/FONDOIII/2024/06	\$1,667,134.32	FAISM
FECHA DE CONTRATO :	CONTRATISTA:		
FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024	C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ		
PLAZO DE EJECUCION: 91 DIAS	MUNICIPIO:		
FECHA DE TERMINO: 28 DE MAYO 2024	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		
DESCRIPCION DE CONCEPTO:	EST. No.		
	1		
	HOJA:		
	28/02/2024		
	PERIODO DE:		
	12		
	DE:		
	28/09/2024		
	NOTAS :		
	A		




LOGO DE LA EMPRESA

Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2, agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, laicuya: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.

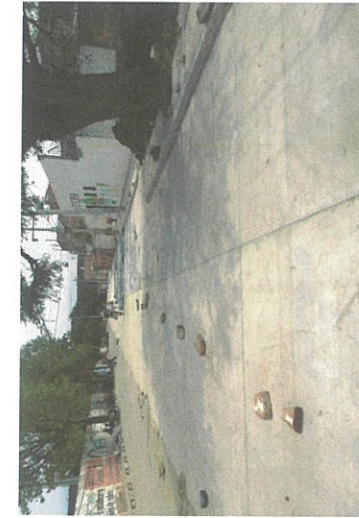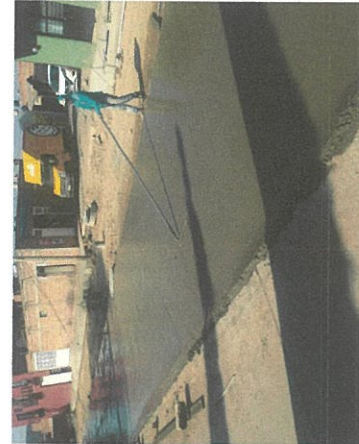


ARO, JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR


C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
 CONTRATISTA

**OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024**

0140

ACUMULADO DE ESTIMACIONES



NÚMERO DE ESTIMACIÓN:
ACUMULADO DE ESTIMACIONES

NOMBRE DE LA OBRA:
NOCHISTLAN DENEJUELAS ZACATECAS
NOCHISTLAN DENEJUELAS ZACATECAS
28 DE FEBRERO A 28 DE MAYO
\$1,687,134.32

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

010706	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperación de material. Incluye: almacenamiento a una distancia máxima de 20 mts.
P-03	Demolicion concreto simple de 15 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspalears
TEMP-3	Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo al proyecto
010818	Acarrec camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.
ACAR-02	Acarrec sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se concideran (2 km)
METAC-0002	Mezclado tendido y compactacion de la construcción de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material petro (40% tepetate - 60% cascajo)
METAC-0002-1	Mezclado tendido y compactacion de la construcción de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (60% tepetate - 40% cascajo)
170701	Guarnición de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal reventimiento 8 a 10 cm, sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 armada con dos varillas de 3/8" y grapas de alambrom de 1/4" cimbra común a 20 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
BAS-BANQ-01	Mezclado tendido y compactacion de la construcción de base para banquetas compactada con balainna al 100% utilizando material de banco (tepetate)
170715	Banqueta de Concreto f'c=f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal reventimiento 8 a 10 cm, de 0.10 mts de espesor, armado con normal reventimiento 66-1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.
030604	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal reventimiento 8 a 10 cm, de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.

UNIDAD	CANTIDAD	CONTRATO			ESTIMADO			POR ESTIMAR		
		P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
M2	1208.13	\$9.83	\$11,875.92	1208.13	\$9.83	\$11,875.92	0.00	\$9.83	\$0.00	
M3	153.00	\$22.75	\$3,480.75	153.00	\$22.75	\$3,480.75	0.00	\$22.75	\$0.00	
M2	143.14	\$65.04	\$9,309.83	143.14	\$65.04	\$9,309.83	0.00	\$65.04	\$0.00	
M3	703.57	\$90.01	\$63,328.34	703.57	\$90.01	\$63,328.34	0.00	\$90.01	\$0.00	
M3	703.57	\$143.48	\$100,948.22	703.57	\$143.48	\$100,948.22	0.00	\$143.48	\$0.00	
M3/KM	1407.14	\$14.51	\$20,417.60	1407.14	\$14.51	\$20,417.60	0.00	\$14.51	\$0.00	
M3	362.44	\$460.21	\$166,798.51	362.44	\$460.21	\$166,798.51	0.00	\$460.21	\$0.00	
M3	241.63	\$441.94	\$106,785.96	241.63	\$441.94	\$106,785.96	0.00	\$441.94	\$0.00	
M	133.00	\$486.18	\$64,661.94	133.00	\$486.18	\$64,661.94	0.00	\$486.18	\$0.00	
M3	52.80	\$251.60	\$13,284.48	52.80	\$251.60	\$13,284.48	0.00	\$251.60	\$0.00	
M2	176.00	\$450.03	\$79,205.28	176.00	\$450.03	\$79,205.28	0.00	\$450.03	\$0.00	
M2	1208.13	\$659.77	\$797,087.93	1208.13	\$659.77	\$797,087.93	0.00	\$659.77	\$0.00	
		IMPORTE	\$1,437,184.76	IMPORTE	\$1,437,184.76	IMPORTE	\$1,437,184.76	IMPORTE	0.00	
		IVA	\$229,949.56	IVA	\$229,949.56	IVA	\$229,949.56	IVA	0.00	
		TOTAL	\$1,667,134.32	TOTAL	\$1,667,134.32	TOTAL	\$1,667,134.32	TOTAL	0.00	

[Signature]
PROF. RAFAEL AGUIRRE SALDARRIEN
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

[Signature]
Magdalena Martínez
CONTRATISTA
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ

0141

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP
0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA

ZACATECAS

0144

OBRA:

LOCALIDAD:

NOCHISTLAN DE MEJIA

PERIODO DE EJECUCIÓN:

28 DE FEBRERO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024



FECHA

01 DE MARZO DE 2024

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

5.00%

INFORME FOTOGRÁFICO

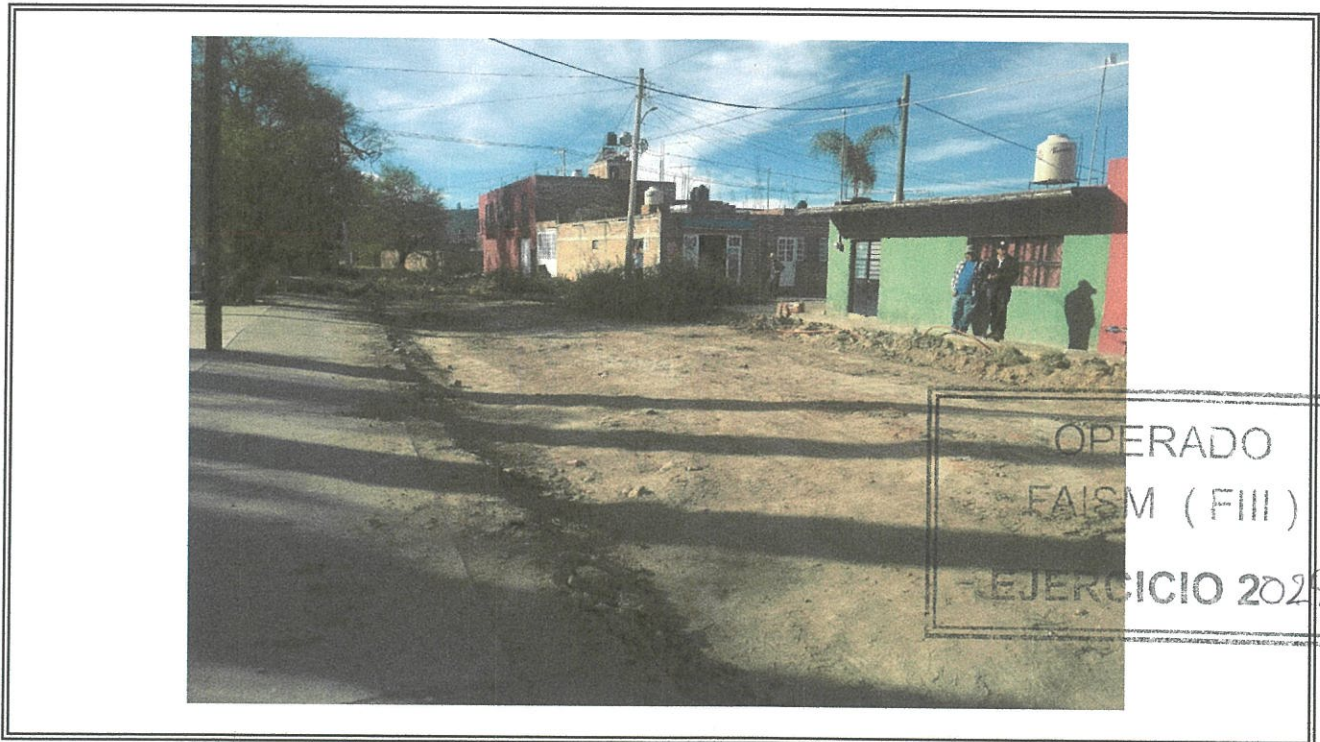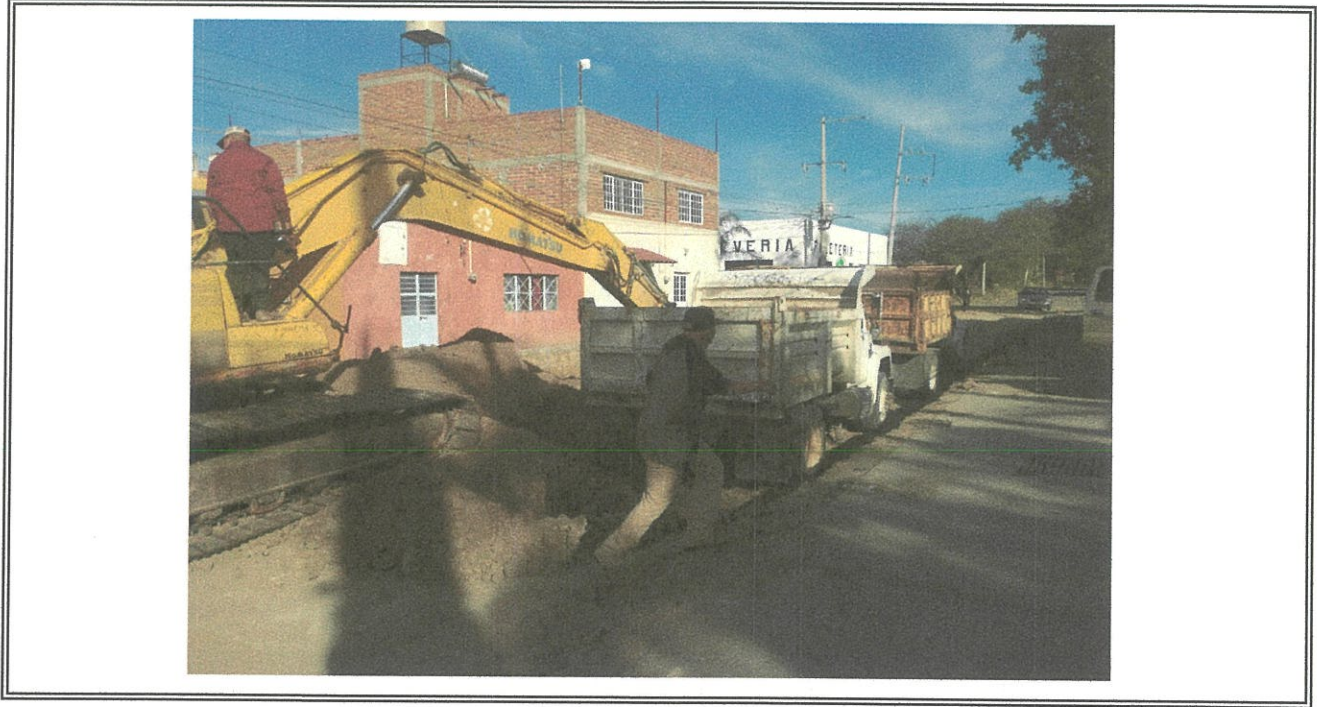

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP
0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA

ZACATECAS
NOCHISTLAN DE MEJIA
28 DE FEBRERO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024
01 DE MARZO DE 2024

0145

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

% AVANCES FISICO	REAL	PROGRAMADO
FINANCIERO	15	25
	0	0

No. REPORTE :	2
FECHA REPORTE :	09/03/2024

DATOS DE LA OBRA		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA		
UBICACION :	NOCHISTLAN DE MEJIA	
TIPO DE OBRA :	NUEVA	
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO	
No. CONTRATO :	NOCHIS/FOND011/2024/06	
EMPRESA :	C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ	
MONTO CONTRATO :	\$1,667,134.32	
FECHA CONTRATO :	28 DE FEBRERO DE 2024	
MONTO ANTICIPO :	\$0.00	
FECHA PAGO ANTICIPO :	N/A	
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A	
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A	
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A	
PERIODO DE EJECUCION	INICIO	TERM.
FECHAS PROGRAMADAS:	28-feb-24	31-may-24
FECHAS REALES:	29-feb-24	

PARTIDAS	IMPORTES	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO									
Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano	\$11,875.92															6	6.59
Retiro de empinado con recuperacion de material, incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.	\$3,480.75															11	12.09
Demolicion concreto simple de 15 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaños	\$9,309.83															18	19.78
Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando peralientes de acuerdo al proyecto	\$63,328.34															19	20.88
Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	\$100,946.22															30	32.97
Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se consideraran (2 km)	\$20,417.60															30	32.97
Mezclado tendido y compactacion de la construcion de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material petro (40% tepalcate - 60% cascajo)	\$166,796.51															19	20.88
Mezclado tendido y compactacion de la construcion de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (60% tepalcate - 40% cascajo)	\$106,785.96															19	20.88
																91	TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION

EJERCICIO 2024

CERRADO

SUM (FIII)

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO. EL PERIODO QUE SE TOMAN PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR SUMANDO LA PRR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL A 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.

RESIDENTE DE SUPERVISION:



ING. JOSE FRANCISCO CALERO DELGADILLO
 0146

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

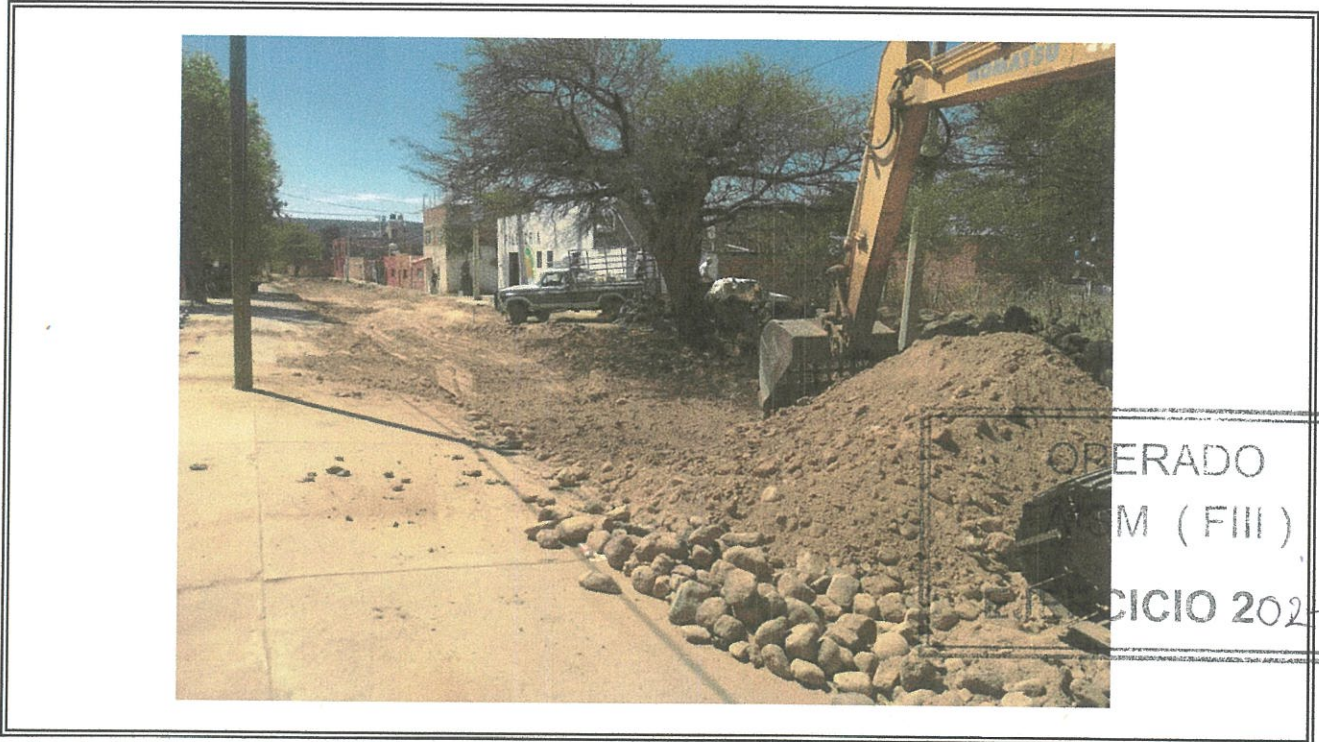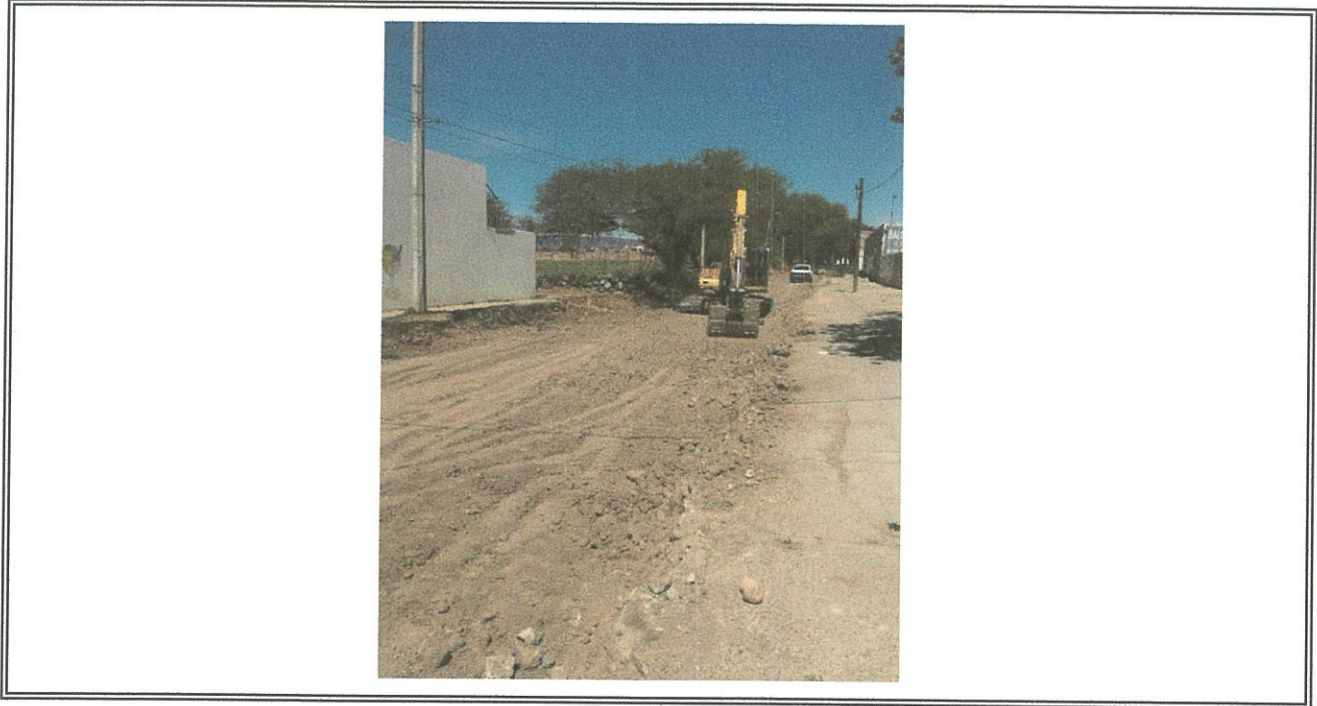


OPERADO
M (FIII)
EJERCICIO 2024

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP
0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA
ZACATECAS

OBRA:	NOCHISTLAN DE MEJIA	0148
LOCALIDAD:	NOCHISTLAN DE MEJIA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024	
FECHA	09 DE MARZO DE 2024	
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):	15.00%	

INFORME FOTOGRÁFICO

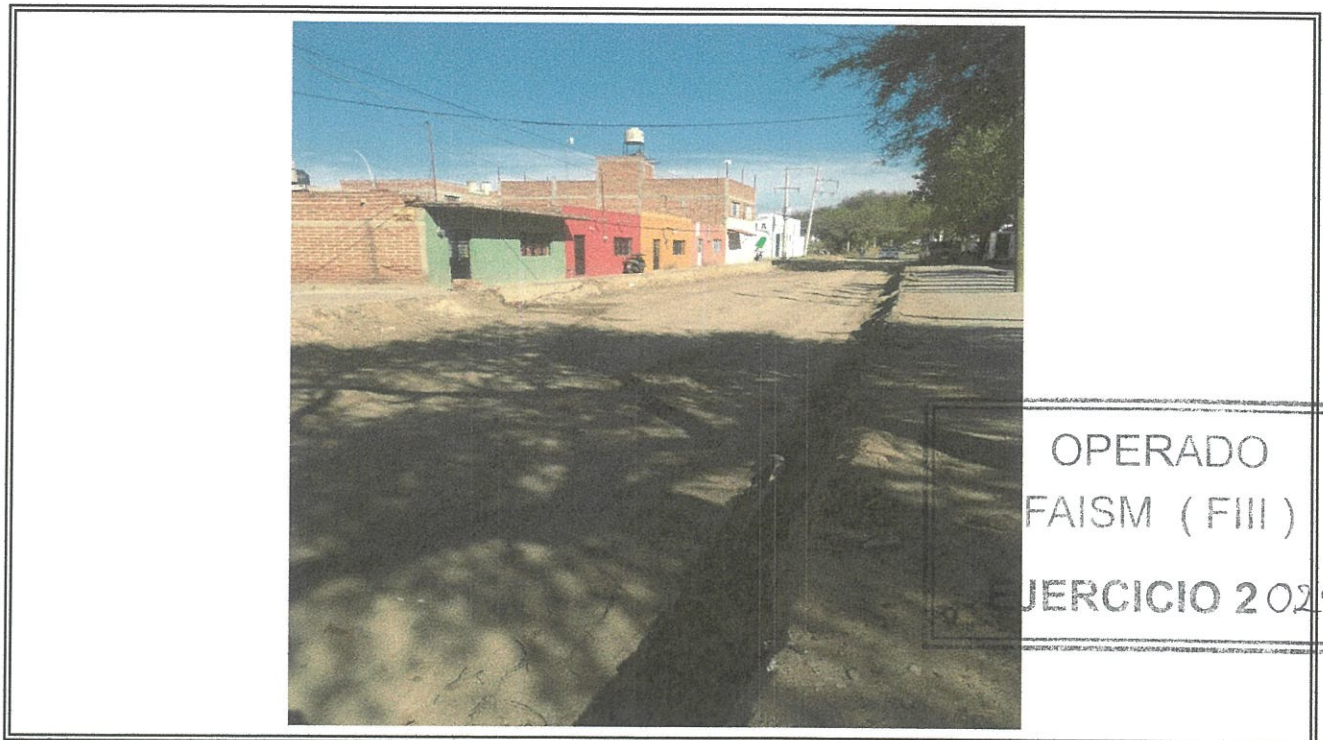

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP
0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA
ZACATECAS**

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA

NOCHISTLAN DE MEJIA
28 DE FEBRERO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024
09 DE MARZO DE 2024

0149

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

% AVANCES FÍSICO	REAL	PROGRAMADO
40	0	40
FINANCIERO	0	0

No. REPORTE :	3
FECHA REPORTE :	05/04/2024

DATOS DE LA OBRA		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA		
UBICACIÓN :	NOCHISTLAN DE MEJIA	
TIPO DE OBRA :	NUEVA	
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO	
No. CONTRATO :	NOCHIS/FONDOIII/2024/06	
EMPRESA :	C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ	
MONTO CONTRATO :	\$1,687,134.32	
FECHA CONTRATO :	28 DE FEBRERO DE 2024	
MONTO ANTICIPO :	\$0.00	
FECHA PAGO ANTICIPO :	N/A	
No. AMPL. DE CONTRATO :	N/A	
MONTO AMPL. CONTRATO :	N/A	
FECHA AMPL. CONTRATO :	N/A	
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERM.
FECHAS PROGRAMADAS :	28-feb-24	31-may-24
FECHAS REALES :	29-feb-24	

FECHAS-REPROGRAMADAS:

OBSERVACIONES

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, EXCEPTO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO AL APARAR POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.

TERMINADO

SM (FIII)

EJECUCION 20,24

PARTIDAS	IMPORTES	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DÍAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO								
Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano	\$11,875.92														6	6.59
Retiro de empotrado con recuperación de material, incluye: almacenamiento a una distancia máxima de 20 mts.	\$3,480.75														11	12.09
Demolicion concreto simple de 15 cm de espesor promedio con medios mecanicos Incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaños	\$9,309.83														18	19.78
Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo al proyecto	\$63,328.34														19	20.88
Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	\$100,948.22														30	32.97
Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se consideraran (2 km)	\$20,417.60														30	32.97
Mezclado tendido y compactación de la construcción de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material petro (40% tepatate - 60% cateajo)	\$166,798.51														19	20.88
Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (60% tepatate - 40% cateajo)	\$106,785.96														19	20.88
TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION																
91																

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA


RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO

0150



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

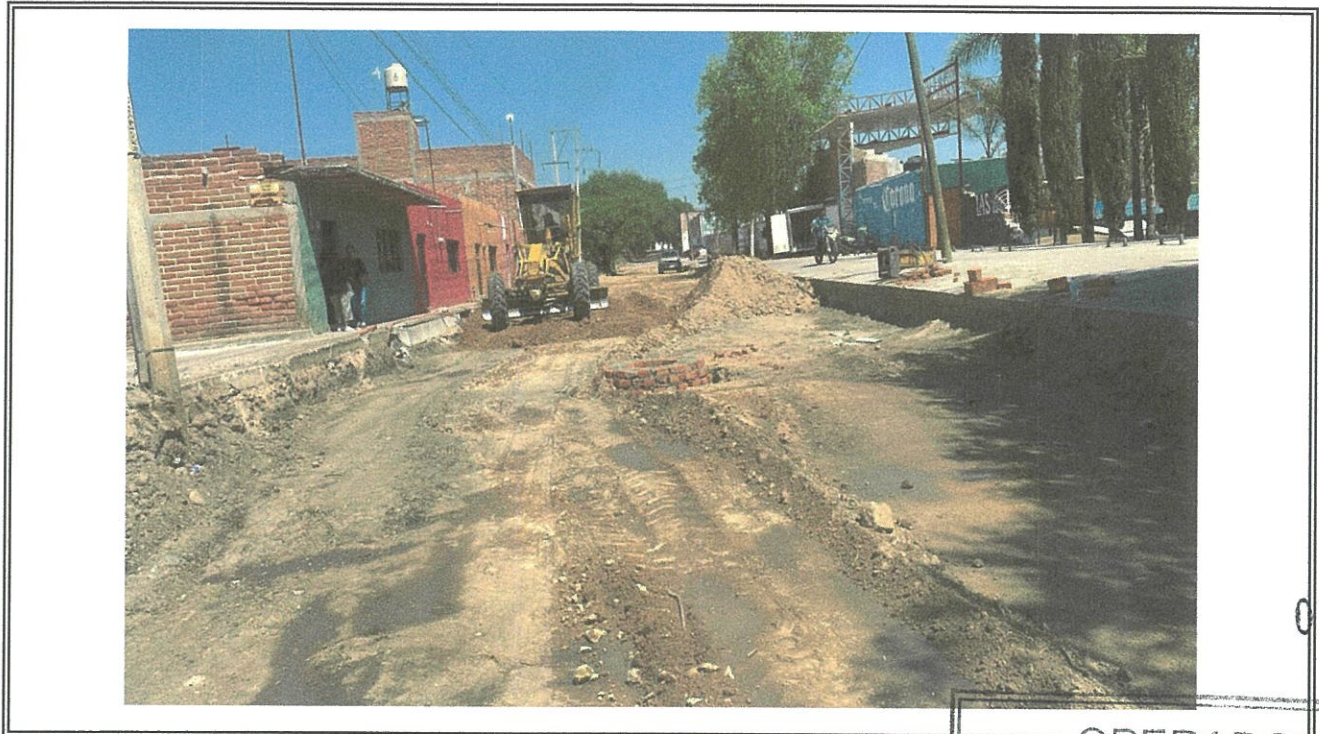

0152

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP
0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA
ZACATECAS

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA


PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN DE MEJIA

28 DE FEBRERO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024

05 DE ABRIL DE 2024

40.00%



INFORME FOTOGRÁFICO



**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP
0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA**

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA


ZACATECAS
NOCHISTLAN DE MEJIA
28 DE FEBRERO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024
05 DE ABRIL DE 2024

0153



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

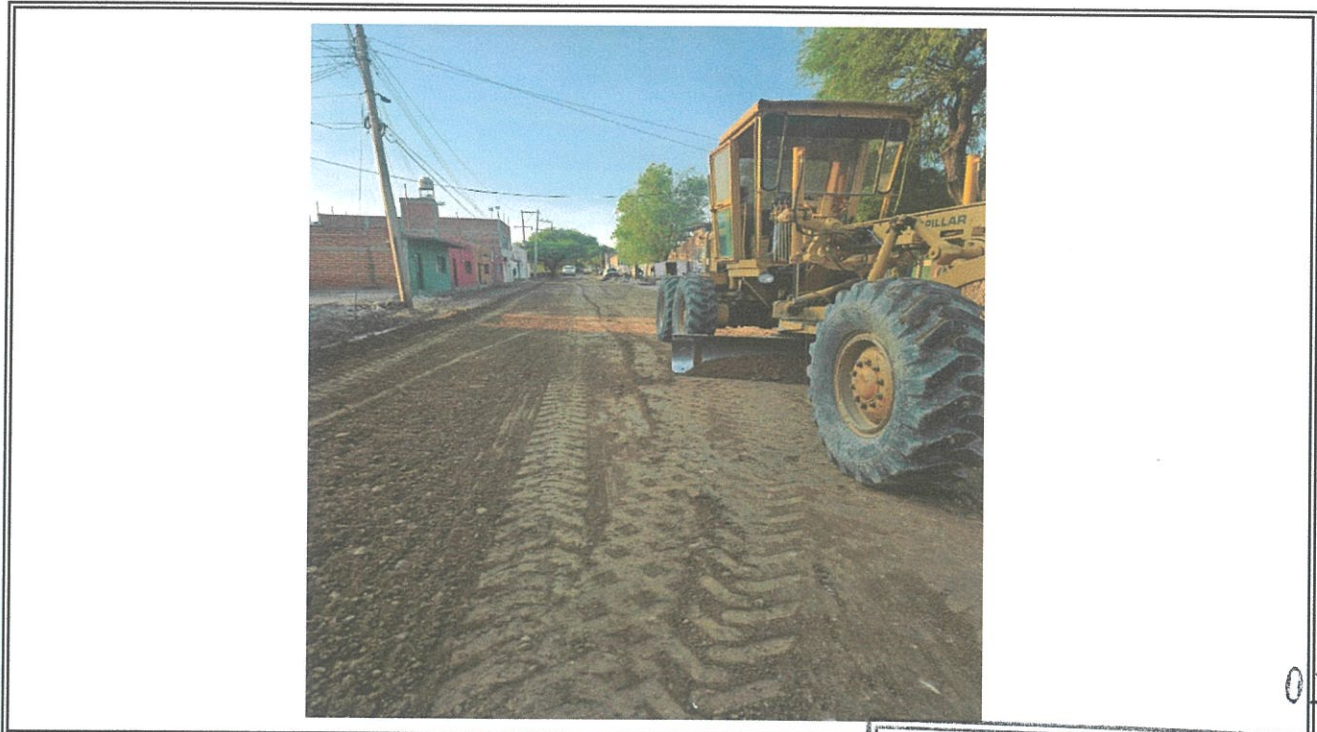

0156

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP
0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA

ZACATECAS

NOCHISTLAN DE MEJIA

28 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE MAYO DE 2024


12 DE ABRIL DE 2024

60.00%

FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

INFORME FOTOGRÁFICO

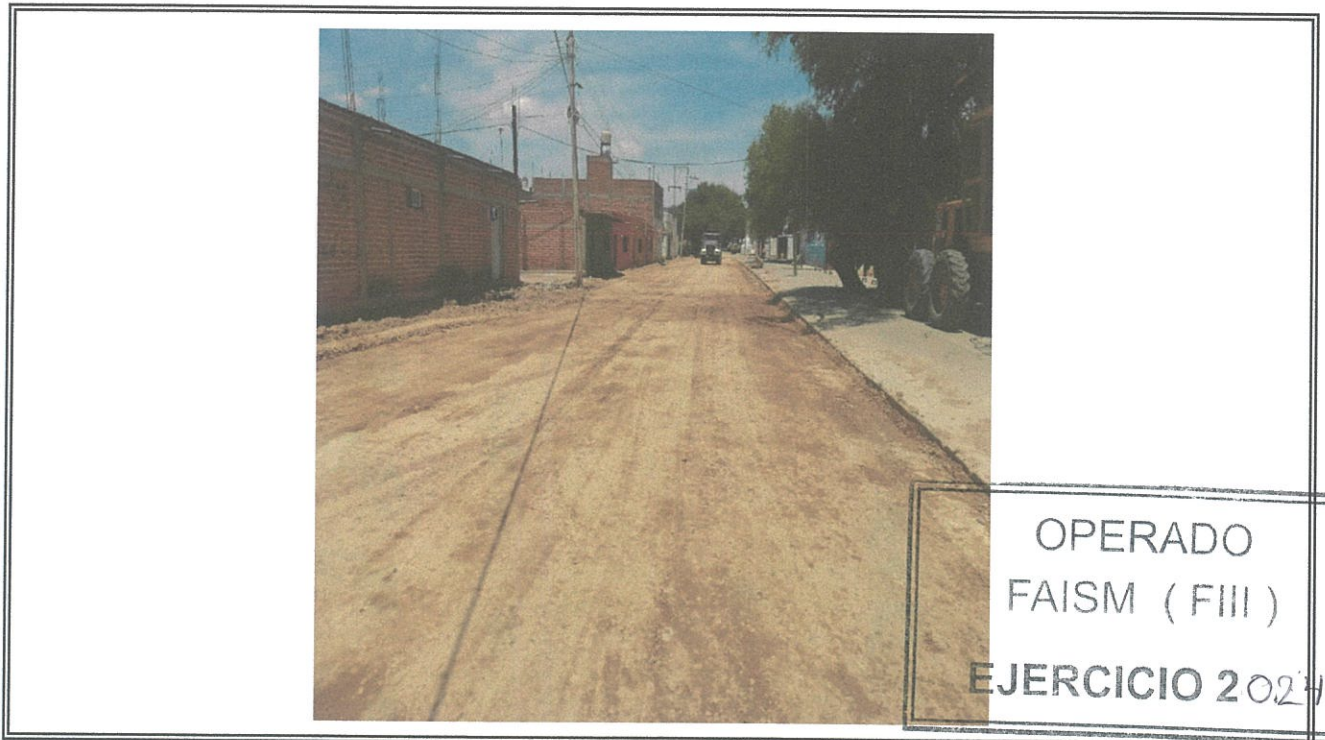

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP
0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA
ZACATECAS

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA


NOCHISTLAN DE MEJIA
28 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE MAYO DE 2024
12 DE ABRIL DE 2024

0157



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


INFORME FOTOGRÁFICO

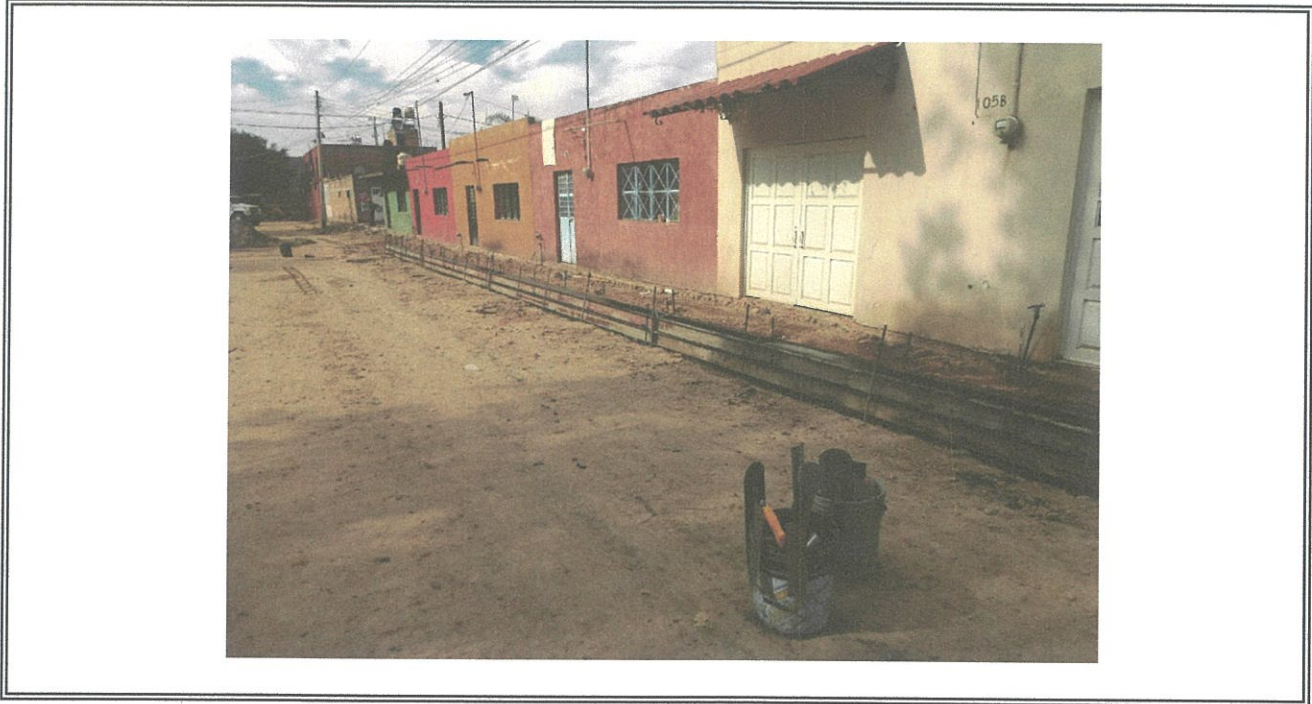


CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP
0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA
ZACATECAS

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN DE MEJIA
28 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE MAYO DE 2024
19 DE ABRIL DE 2024
75.00%



INFORME FOTOGRÁFICO

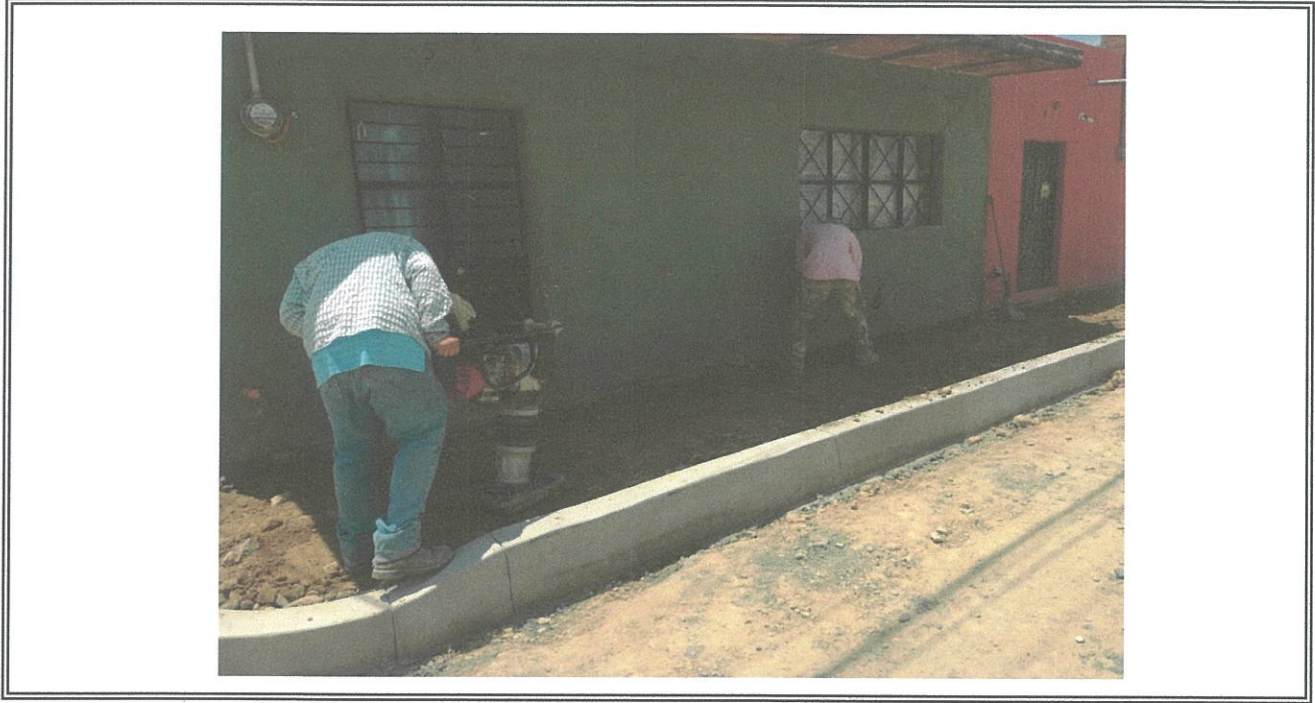

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA

NOCHISTLAN DE MEJIA
28 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE MAYO DE 2024
19 DE ABRIL DE 2024

0161

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE: 6
 FECHA REPORTE: 26/04/2024

% AVANCES FÍSICO		REAL FINANCIERO		PROGRAMADO	
80	0	80	0	70	0

DATOS DE LA OBRA		PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DÍAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO																																																														
		M E S E S																																																																											
UBICACIÓN:	TIPO DE OBRA:	MODALIDAD EJEC.:	No. CONTRATO:	EMPRESA:	MONTO CONTRATO:	FECHA CONTRATO:	MONTO ANTICIPO:	FECHA PAGO ANTICIPO:	No. AMPL. DE CONTRATO:	MONTO AMPL. CONTRATO:	FECHA AMPL. CONTRATO:	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHAS PROGRAMADAS:	FECHAS REALES:	FECHAS REPROGRAMADAS:	IMPORTE	PARTIDAS																																																												
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	NUEVA	CONTRATO	C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ	\$1,667,134.32	28 DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	INICIO TERM.	28-feb-24 31-may-24	28-feb-24	28-feb-24		Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano																																																												
																\$11,875.92																																																													
																\$3,480.75																																																													
																\$9,309.83																																																													
																\$53,328.34																																																													
																\$100,948.22																																																													
																\$20,417.60																																																													
																\$166,798.51																																																													
																\$106,785.96																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="12">PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA</th> <th rowspan="2">DÍAS PROGRAMADOS</th> <th rowspan="2">% EN BASE TIEMPO</th> </tr> <tr> <th colspan="12">M E S E S</th> </tr> <tr> <th>ENERO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>JUNIO</th> <th>JULIO</th> <th colspan="6"></th> <th rowspan="2">91</th> <th rowspan="2">TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																		PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DÍAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO	M E S E S												ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO							91	TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION																			
PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DÍAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO																																																																
M E S E S																																																																													
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO							91	TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION																																																															

ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ARO. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
 ING. JOSE FRANCISCO GALERO DELGADILLO

0162

OPORTUNIDAD
FAIS (FIII)


EJERCICIO 2024

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ESCRIBIENDO QUE MAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO LA PAR. POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

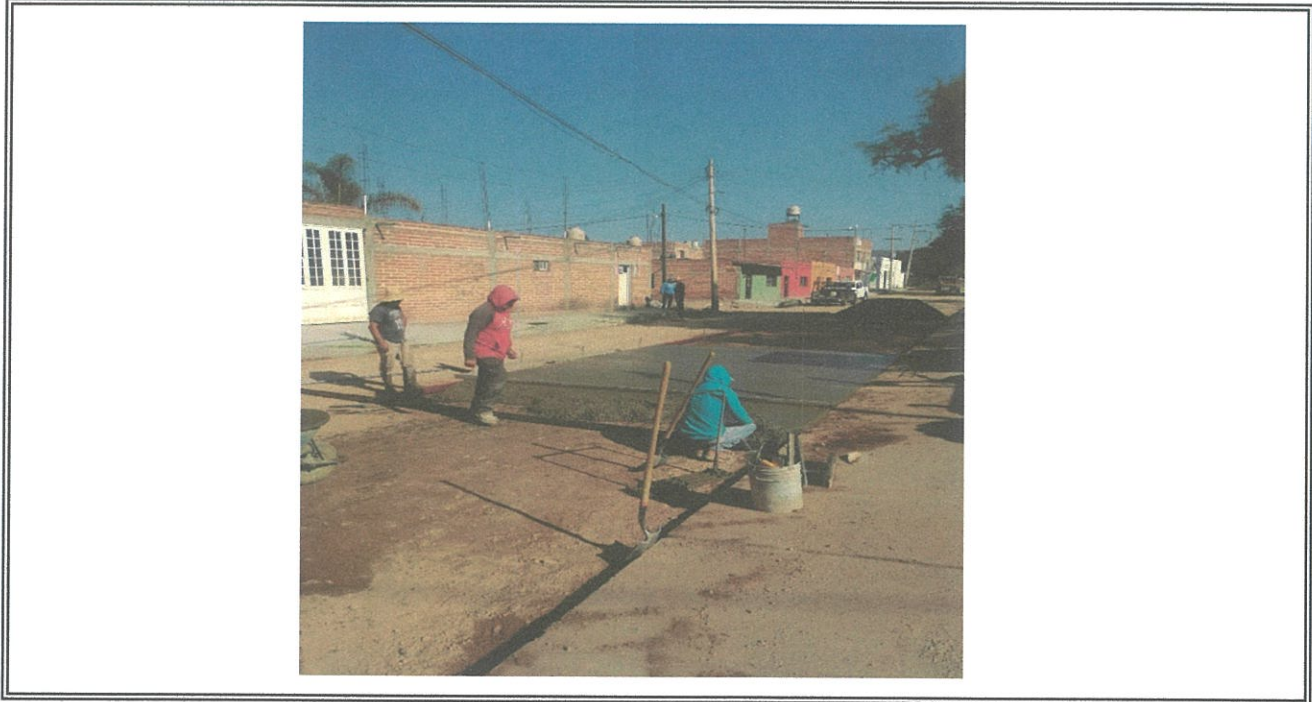

0164



CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP
0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

ZACATECAS
NOCHISTLAN DE MEJIA
28 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE MAYO DE 2024
26 DE ABRIL DE 2024
80.00%

PREPADO
FAISM (FIH)
EJERCICIO 2024

INFORME FOTOGRÁFICO

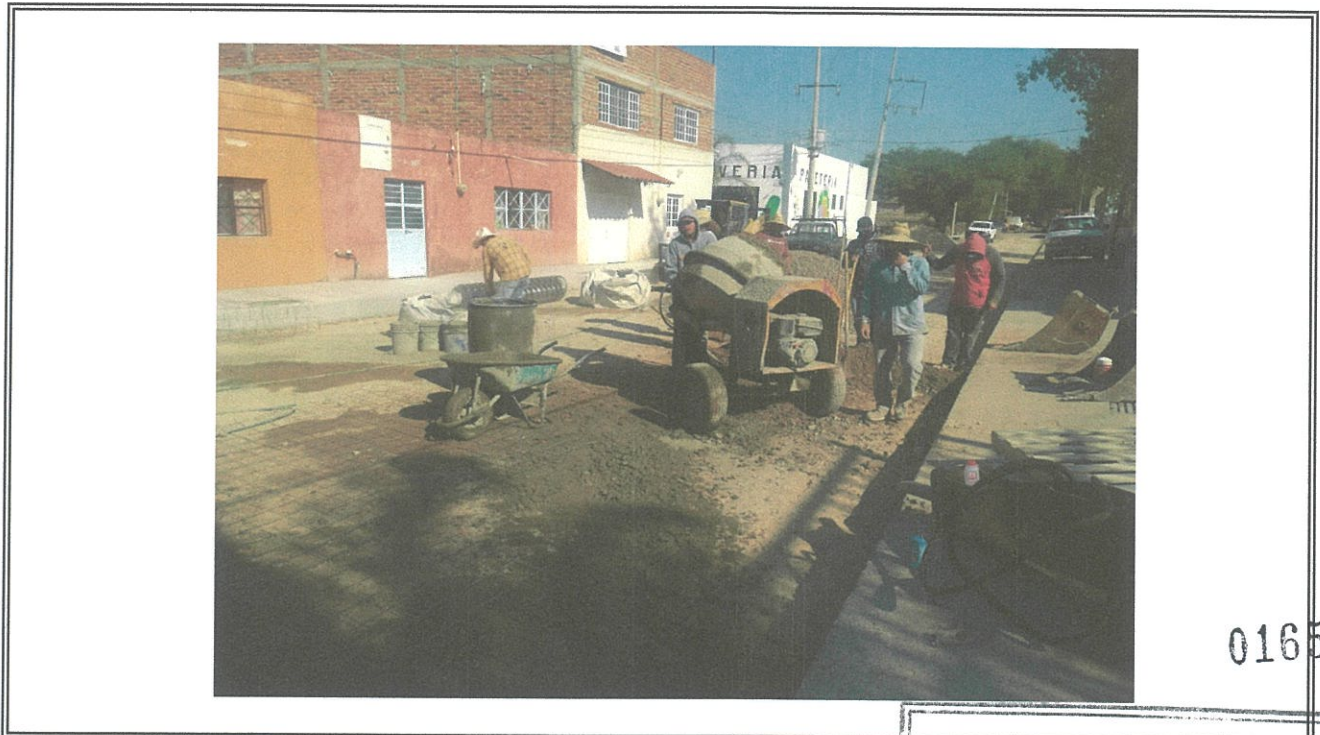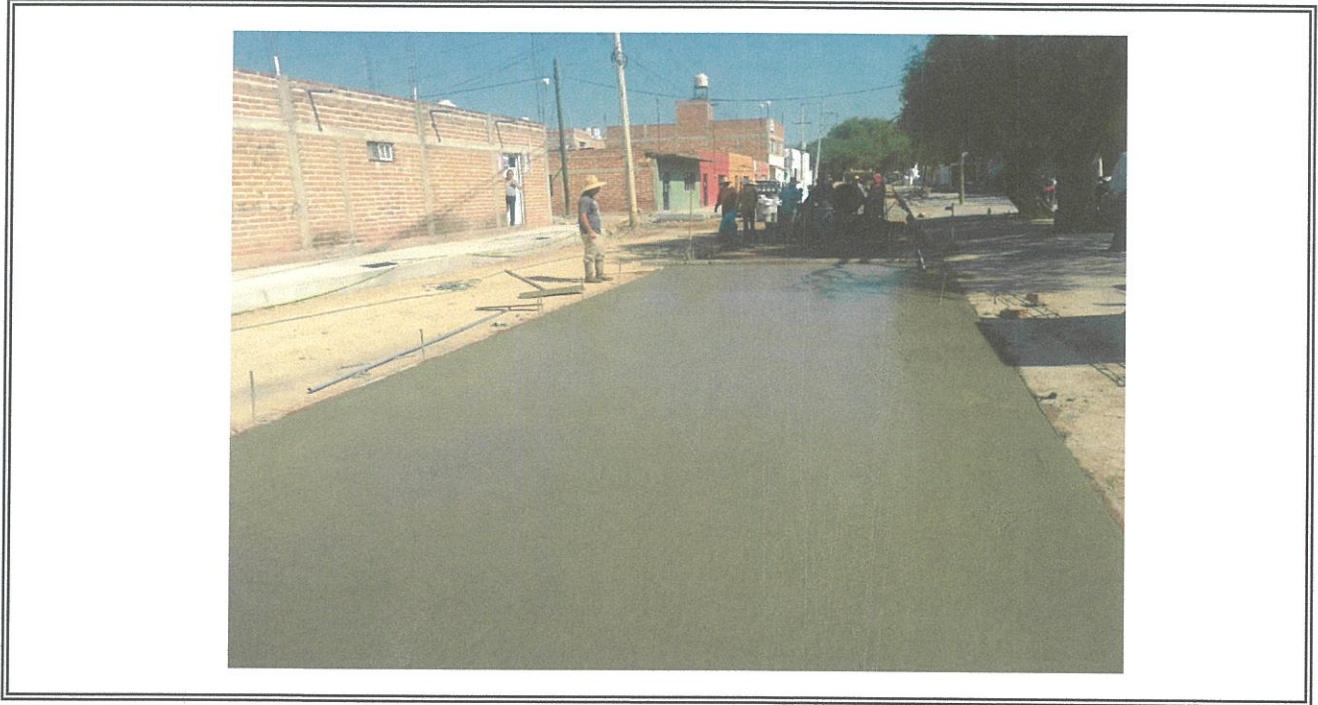

0165

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP
0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA
ZACATECAS**

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA

NOCHISTLAN DE MEJIA
28 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE MAYO DE 2024
26 DE ABRIL DE 2024

**OPERADO
FAISM (FII)**
EJERCICIO 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE :	7
FECHA REPORTE :	03/05/2024

% AVANCES FÍSICO	90	REAL PROGRAMADO	75
% AVANCES FINANCIERO	0	REAL PROGRAMADO	0

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA

UBICACIÓN : NOCHISTLAN DE MEJIA

TIPO DE OBRA : NUEVA

MODALIDAD EJEC.: CONTRATO

No. CONTRATO : NOCHIS/FOND0III/2024/06

EMPRESA : C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

MONTO CONTRATO : \$1,667,134.32

FECHA CONTRATO : 28 DE FEBRERO DE 2024

MONTO ANTICIPO : \$0.00

FECHA PAGO ANTICIPO : N/A

No. AMPL. DE CONTRATO : N/A

MONTO AMPL. CONTRATO : N/A

FECHA AMPL. CONTRATO : N/A

PERIODO DE EJECUCION INICIO TERM.

FECHAS PROGRAMADAS: 28-feb-24 31-may-24

FECHAS REALES: 29-feb-24

FECHAS REPROGRAMADAS: OBSERVACIONES

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ES DECIR, CADA VEZ QUE HAY UN PAGO EN EL CONTRATO, SE EJECUTA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE COMIENZA LA SUMA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.

PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO								
Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano	\$11,875.92														6	6.59
Refrío de empedrado con recuperación de material, incluye: almacenamiento a una distancia máxima de 20 mts.	\$3,480.75														11	12.09
Demolicion concreto simple de 15 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaños	\$9,309.83														18	19.78
Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando aline de la superficie y dejando pendientes de acuerdo al proyecto	\$63,328.34														19	20.88
Acarreo sobre camión de volco de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	\$100,946.22														30	32.97
Acarreo sobre camión de volco de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se consideran (2 km)	\$20,417.60														30	32.97
Mezclado tendido y compactación de la construcción de la sub rasante base compactada al 95 % utilizando material de banco y material petro (40% tepalcate - 60% cascajo)	\$166,796.51														19	20.88
Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % usando material de banco y material petro (60% tepalcate - 40% cascajo)	\$106,785.96														19	20.88
															91	TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION


ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

RESIDENTE DE SUPERVISION:

ING. JOSE FRANCISCO CALERO DELGADILLO


0166





MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

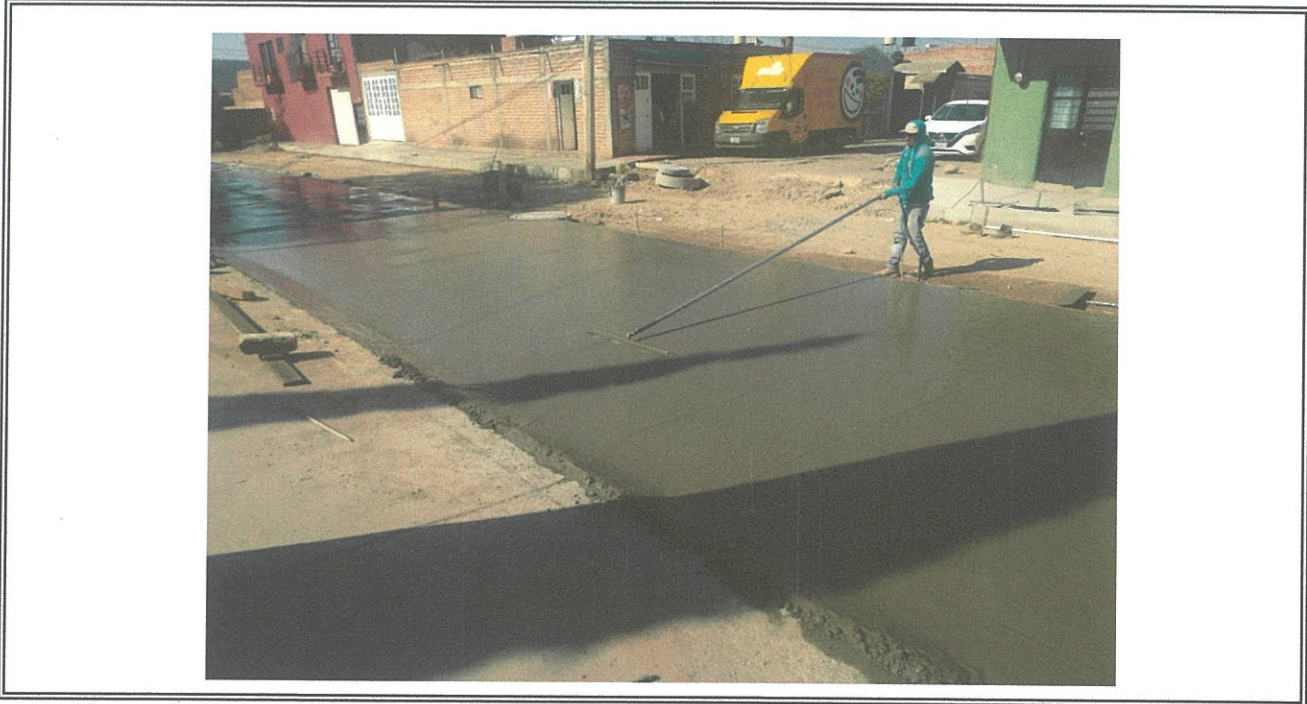

0168

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP
0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA
ZACATECAS

NOCHISTLAN DE MEJIA
FAISM (FIII)

28 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE MAYO DE 2024


03 DE MAYO DE 2024

EJERCICIO 2024

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

90.00%

INFORME FOTOGRÁFICO

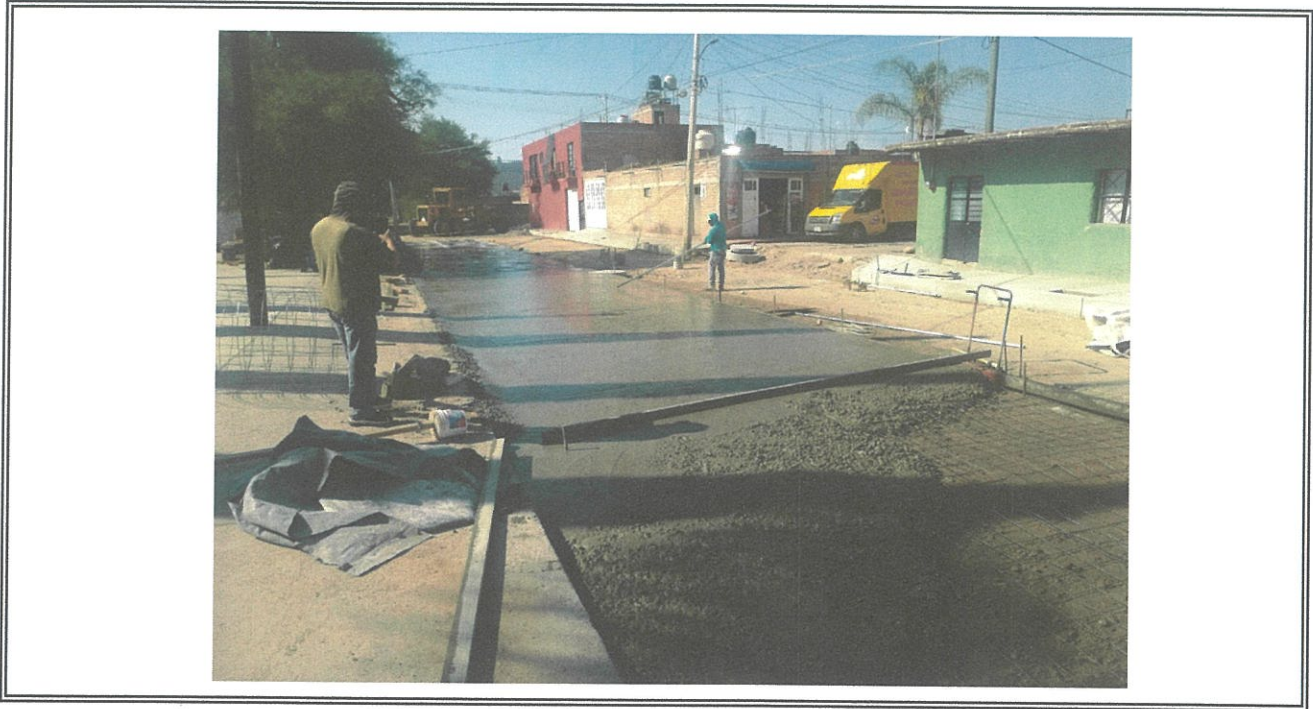

0169

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP
0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA
ZACATECAS

OPERADO
FAISM (EJIA)

NOCHISTLAN DE MEJIA

28 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE MAYO DE 2024

EJERCICIO 2024

03 DE MAYO DE 2024

90.00%

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE: 3
 FECHA REPORTE: 10/05/2024

% AVANCES FÍSICO	REAL	PROGRAMADO
	100	80
% AVANCES FINANCIERO	REAL	PROGRAMADO
	0	0

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA

UBICACIÓN: NOCHISTLAN DE MEJIA

TIPO DE OBRA: NUEVA

MODALIDAD EJEC.: CONTRATO

No. CONTRATO: NOCHISFONDOI/2024/06

EMPRESA: C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

MONTO CONTRATO: \$1,667,134.32

FECHA CONTRATO: 28 DE FEBRERO DE 2024

MONTO ANTICIPO: \$0.00

FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO TERM.

FECHAS PROGRAMADAS: 28-feb-24 31-may-24

FECHAS REALES: 29-feb-24

FECHAS REPROGRAMADAS:

OBSERVACIONES:

PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO								
Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano	\$11,875.92														6	6.59
Retiro de empedrado con recuperación de material, incluye: almacenamiento a una distancia máxima de 20 mts.	\$3,480.75														11	12.09
Demolicion concreto simple de 15 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traslados	\$9,309.83														18	19.78
Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motorvibradora) considerando aline de la superficie y dejando pendientes de acuerdo al proyecto.	\$63,328.34														19	20.88
Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	\$100,948.22														30	32.97
Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se consideran (2 km)	\$20,417.60														30	32.97
Mezclado tendido y compactación de la construcción de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material piedra (40% tepalcate - 60% cascajo)	\$166,796.51														19	20.88
Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material piedra (60% tepalcate - 40% cascajo)	\$106,785.96														19	20.88
															91	TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ES O DEBIDO QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
 ING. FRANCISCO CAJERO DELGADILLO

ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ARC. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

EJERCICIO 2024

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Nº. REPORTE:	8
FECHA REPORTE:	10/05/2024

% AVANCES FÍSICO	REAL	PROGRAMADO
	100	80
% AVANCES FINANCIERO	REAL	PROGRAMADO
	0	0

DATOS DE LA OBRA		PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA													DÍAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO		
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	M E S E S			M E S E S					
UBICACIÓN:	NOCHISTLAN DE MEJIA	\$64,961.94															19	20.88
TIPO DE OBRA:	NUOVA	\$13,284.48															25	27.47
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO	\$79,205.28															26	28.57
No. CONTRATO:	NOCHISFONDIII/202406	\$79,087.93															35	38.46
EMPRESA:	C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ																	
MONTO CONTRATO:	\$1,667,134.32																	
FECHA CONTRATO:	28 DE FEBRERO DE 2024																	
MONTO ANTICIPO:	\$0.00																	
FECHA PAGO ANTICIPO:	N/A																	
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A																	
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A																	
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A																	
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO TERM.																	
FECHAS PROGRAMADAS:	28-feb-24 31-may-24																	
FECHAS REPROGRAMADAS:	29-feb-24																	
OBSERVACIONES:																		
SUBTOTAL		\$1,437,184.76																
IVA		\$229,949.56																
TOTAL		\$1,667,134.32																
TOTAL DE DÍAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION																	91	

REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA
FASE III (FIII)
EJERCICIO 2024

ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ARO, JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ



RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
 ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO

0171



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

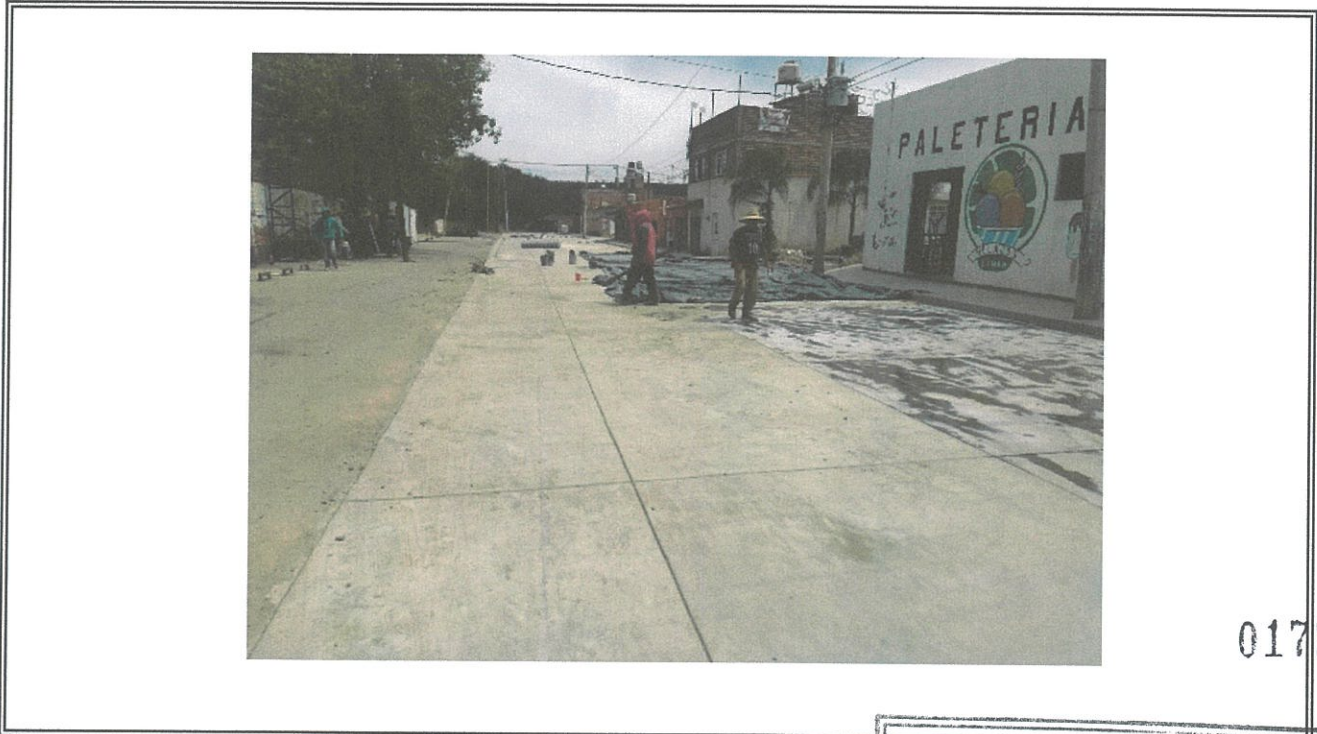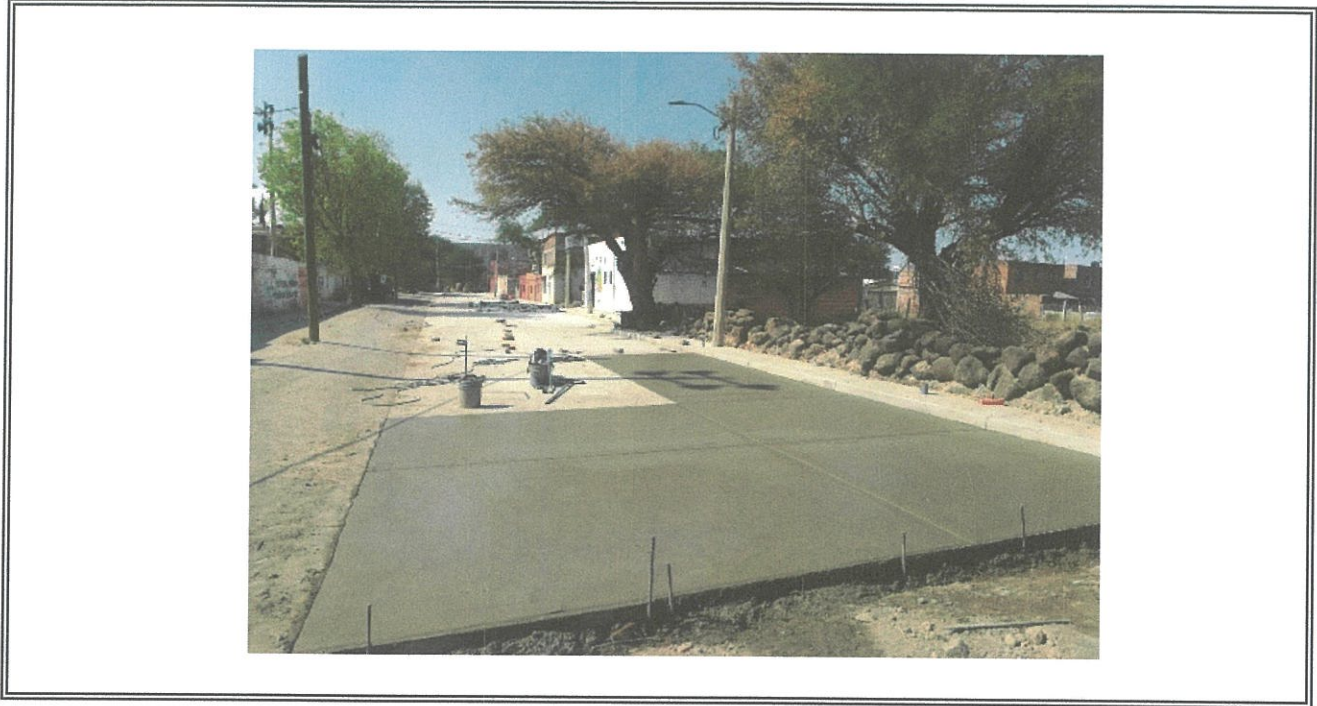

0172

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP
0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA
ZACATECAS

OPERADO
FAISM (FIII)

NOCHISTLAN DE MEJIA
28 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE MAYO DE 2024


10 DE MAYO DE 2024

EJERCICIO 2024

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

100.00%

INFORME FOTOGRÁFICO

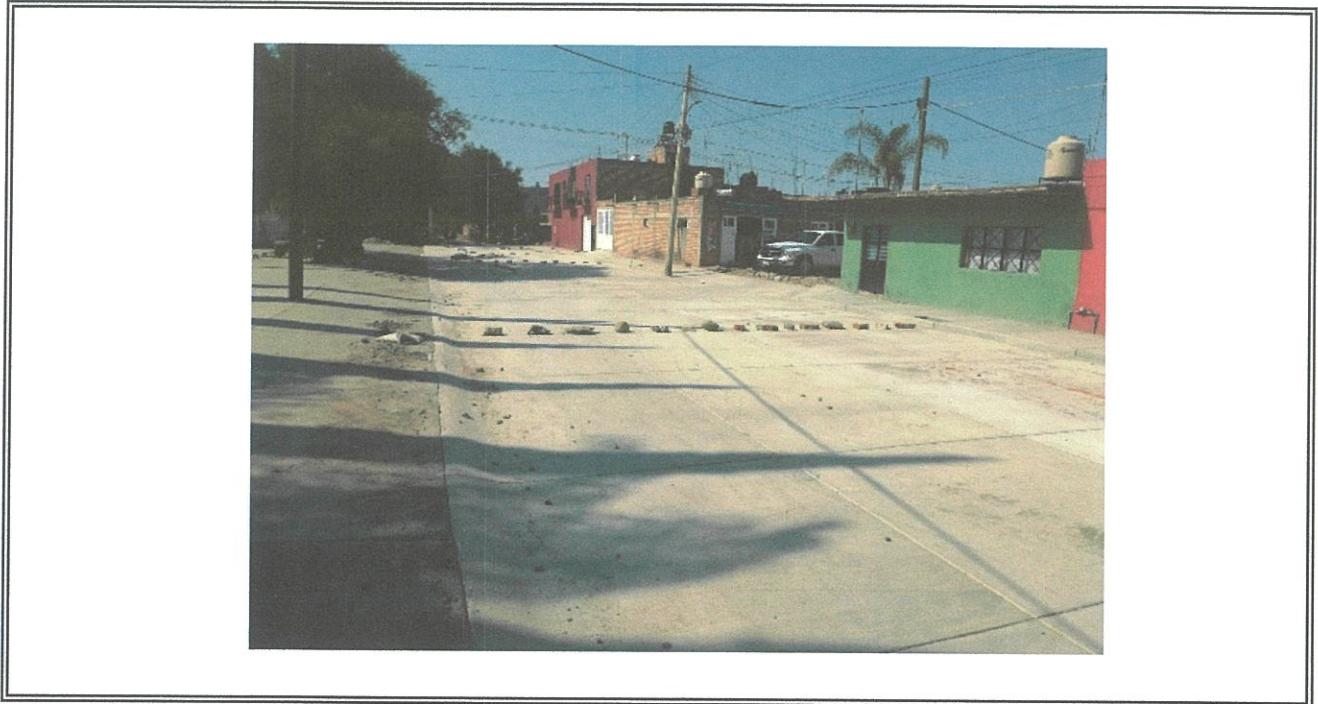

0173

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP
0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA
ZACATECAS**

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN DE MEJIA


28 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE MAYO DE 2024

10 DE MAYO DE 2024

100.00%


FAISM - (FIII)

EJERCICIO 2024

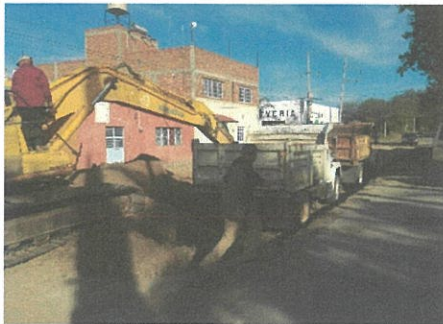




0174

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

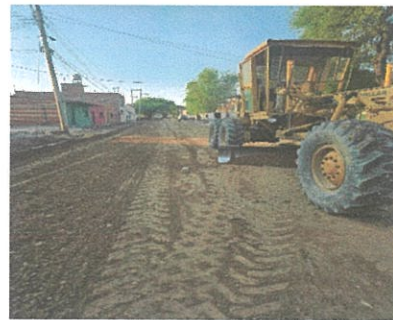

0175

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

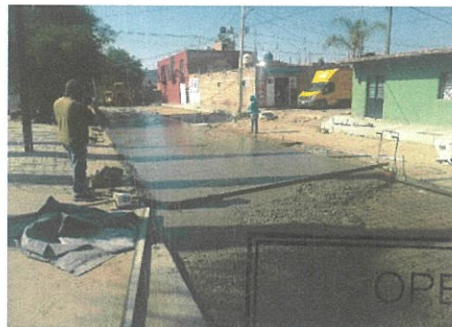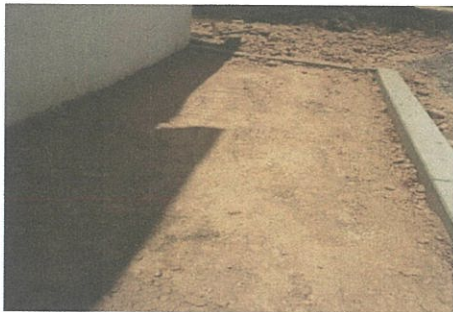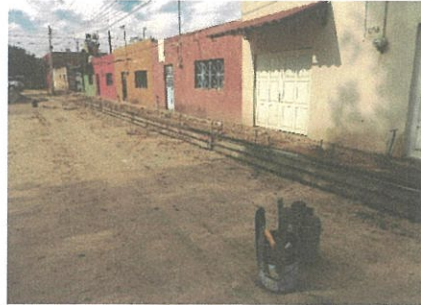



0176

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024



0177

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

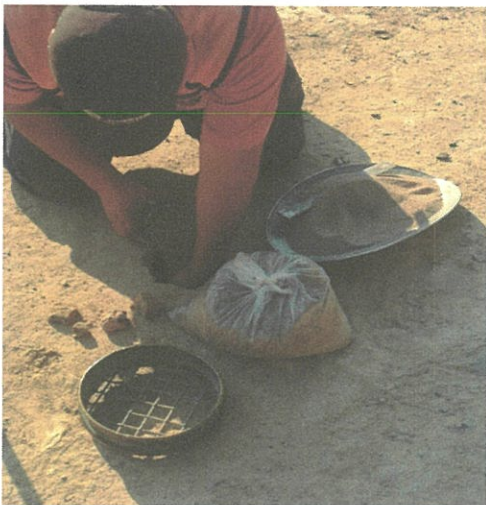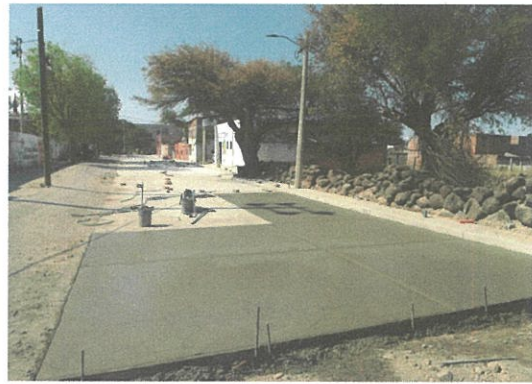

0178

OPERADO
FAISM- (FIII)
EJERCICIO 2024



MAQUIPA

EXPEDIENTE 001COMP - (001-002)

FECHA DE RECIBO 25-Abril-2024

NO. DE OBRA 029/2024

FECHA DE INFORME 27-Abril-2024

OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP
LOCALIZACIÓN	CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC,
COMPAÑIA	MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

INFORME DE COMPACTACIONES

TRAMO ANALIZADO

CALLE xxxxx

CAPA REPORTADA

BSE HIDRAULICA

PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE P.V.S.M.

GRADO DE COMPACTACIÓN DE PROYECTO

COMPACTACIÓN ESTÁTICA PORTER

100 % DE SU P.V.S.M.


PRUEBA No.	UBICACIÓN		ESPESOR (cm)		ANCHO CAPA (mts)	PESO VOLUMETRICO (KG/M3)		HUMEDAD (%)		% DE COMPACTACION
	ESTACION	LADO	PROBADA	PROYECTO		MAXIMO	DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR	
001	FRANJA IZQUIERDA	CENTRO	20.00	20.00	7.00	1619	1630	19.62	18.01	100.68
002	FRANJA DERECHA	CENTRO	21.00	20.00	7.00	1619	1651	19.62	17.05	101.98


OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

FUENTE NORMATIVA: SCT M-MMP-1-01/03

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El tramo analizado **CUMPLE** con el grado de compactacion minimo (100 % de su P.V.S.M.)

P.A. 
 LABORATORISTA
 Víctor Alonso Acosta Lamas


 GERENTE GENERAL
 Jorg. Jorge H. Parada Chavez

0179



MAQUIPA

EXPEDIENTE 001MAX - 029/2024

FECHA DE RECIBO 25-Abril-2024

NO. DE OBRA 029/2024

FECHA DE INFORME 27-Abril-2024

OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP
LOCALIZACIÓN	CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP, NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC,
COMPAÑÍA	MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

COMPACTACIÓN POR CARGA ESTÁTICA PORTER.

ENSAYE No. 186

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

Material producto de calas capa de Base Hidraulica xxxxx.

MOLDE No. 4

PESO HUMEDO	3993.00	grs.
ALTURA MOLDE	12.61	cm
ALTURA FALTANTE	2.02	cm
ALTURA MATERIAL	10.60	cm
AREA MOLDE	194.58	cm ²
VOLUMEN DEL MATERIAL	2061.58	cm ³

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD ÓPTIMA

PESO HÚMEDO	300.00	grs.
PESO SECO	250.80	grs.
DIFERENCIA	49.20	grs.
HUMEDAD ÓPTIMA W_o	19.62	(%)

LECTURAS DEL MATERIAL COMPACTO

1	2.03	cm
2	2.01	cm
3	2.04	cm
4	1.98	cm
PROMEDIO	2.02	cm

PESO ESPECÍFICO HÚMEDO γ_m 1,936.87 Kg/m³

PESO ESPECÍFICO SECO MÁXIMO $\gamma_{dm\acute{a}x}$ 1,619.22 Kg/m³

P.A. Acosta Lamas

VICTOR ALFONSO ACOSTA LAMAS
LABORATORISTA CAMPO

Jorge H. Parada Chavez

GERENTE GENERAL
OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0180

Localización
Compañía

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO
CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP, NOCHISTLAN DE MEIA, ZAC.
MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

INFORME DE PRUEBAS DE CONTROL DE CONCRETO HIDRAULICO

COLADO DE PAVIMENTO CALLE XXX FRANJA DERECHA

Tomada de:					LABORATORIO	<input type="checkbox"/>	LABORATORIO	<input type="checkbox"/>
Expediente No.	2	Familia No.		36286	DEPENDENCIA	NO	CONCRETERA	NO
Muestra No.	474	475	476	477				

DATOS DE PROPORCIONAMIENTO DE LA MUESTRA


DOSIFICACION HECHO EN OBRA 2 1/2 : 36 (BOTES : PALA) (CEMENTO : ARENA/GRAVA)
 REVENIMIENTO DE PROYECTO (cms) **10 +/- 2.5**
 RESISTENCIA DEL PROYECTO (Kg/cm2) **250**
 ADITIVO, MARCA, FINALIDAD Y CANTIDAD R. 28 / NO INDICA EN REMISIÓN

DATOS DE LA MEZCLA EN OBRA

EQUIPO DE MEZCLADO REVOLVEDORA DE 1/2 SACO No. Remisión S/N HORA SALIDA 6:40 HORA DE VALIADO 11:00
 SISTEMA DE VIBRADO REGLEADO
 CEMENTO, MARCA, TIPO MOCTEZUMA CPC-30R
 TEMPERATURA CONCRETO FRESCO (°c) 27.2 °C
 REVENIMIENTO OBTENIDO (cms) 9

DATOS DE LOS ESPECIMENES



No. Cilindro	474	475	476	477
Díametro (cms):	14.95	14.85	14.95	14.90
Volumétrico antes de ruptura (kg / m3):	2245	2286	2290	2294
Fecha de colado:	25-abr-24	25-abr-24	25-abr-24	25-abr-24
Fecha de ruptura:	02-may-24	09-may-24	23-may-24	23-may-24
Edad (días):	7	14	28	28
Carga de ruptura (kg) :	39,120	41,620	50,450	50,890
Area (cm2):	175.53	173.19	175.53	174.36
Resistencia obtenida (kg/cm2):	222.87	240.32	287.42	291.87
% Resistencia proyecto:	89.15	96.13	114.97	116.75

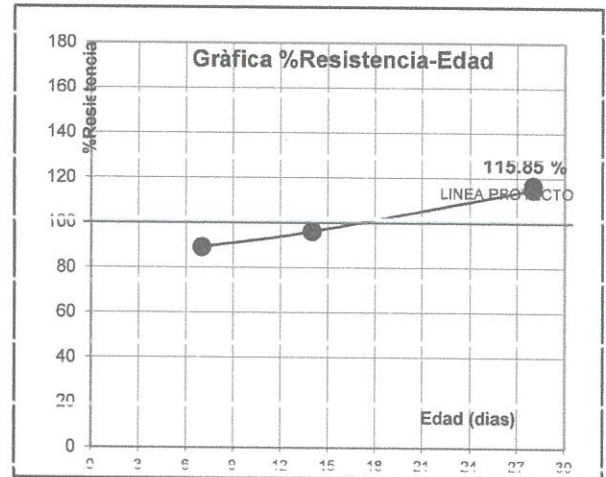

NORMAS DE REFERENCIA: ELABORACION DE CILINDROS (NMX-C-161-2013 -ONNCCCE vs ASTM-C-31); REVENIMIENTO (NMX-C-156-ONNCCCE-2010 vs ASTM-C-143; RESISTENCIA A LA COMPRESION (NMX-C-63-ONNCCCE-2014 vs ASTM-C-39, NMX-C-435-ONNCCCE-2010 TEMPERATURA CONCRETO; CABECEO DE ESPECIMENES CILINDRICOS (NMX-C-109-ONNCCCE-2013) GABINETES, CUARTOS HUMEDOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONDICIONES DE DISEÑO Y OPERACION (NMX-C-148-ONNCCCE-2010); ASTM C-51-11 (2007).

EL RESULTADO DE PRUEBA INFORMADO SOLO AMPARA EL MATERIAL ANALIZADO
 ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE ESTE LABORATORIO

TIPOS DE FALLA
PRESENTADOS
EN EL ESPECIMEN



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONCRETO ENSAYADO A LA EDAD DE 28 DIAS HA CUMPLIDO CON RESISTENCIA DE PROYECTO, (100% FC)

INFORME DE ENSAYE RECIENTE, LOS INFORMES DE ENSAYES ANTERIORES FUERON REPORTADOS POR ESTE LABORATORIO EN SU MOMENTO

VICTOR ALFONSO ACOSTA LAMAS
LABORATORISTA

ING. JORGE H. PARADA CHAVEZ
GERENTE GENERAL

0181

Obra
Localización
Compañía

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO
CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP, NOCHISTLAN DE MEIA, ZAC.
MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

INFORME DE PRUEBAS DE CONTROL DE CONCRETO HIDRAULICO

COLADO DE PAVIMENTO CALLE XXX FRANJA IZQUIERDA

Tomada de:					LABORATORIO	<input type="checkbox"/>	LABORATORIO	<input type="checkbox"/>
Expediente No.	1	Familia No.	36285		DEPENDENCIA	<input type="checkbox"/>	CONCRETERA	<input type="checkbox"/>
Muestra No.	470	471	472	473		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

DATOS DE PROPORCIONAMIENTO DE LA MUESTRA


DOSIFICACION: HECHO EN OBRA 2 1/2 : 36 (BOTES : PALA) (CEMENTO : ARENA/GRAVA)
 REVENIMIENTO DE PROYECTO (cms): **10 +/- 2.5**
 RESISTENCIA DEL PROYECTO (Kg/cm²): **250**
 ADITIVO, MARCA, FINALIDAD Y CANTIDAD: R. 28 / NO INDICA EN REMISION

DATOS DE LA MEZCLA EN OBRA

EQUIPO DE MEZCLADO	REVOLVEDORA DE 1/2 SACO	No. Remision	S/N	HORA SALIDA	T.UU	HORA DE VALIADO	G.TU
SISTEMA DE VIBRADO	REGLEADO						
CEMENTO, MARCA, TIPO	MOCTEZUMA	CPC-30R					
TEMPERATURA CONCRETO FRESCO (°C)	27.8 °C						
REVENIMIENTO OBTENIDO (cms)	11						

DATOS DE LOS ESPECIMENES


No. Cilindro	470	471	472	473
Diametro (cms):	15.00	14.95	14.95	14.85
o Volumétrico antes de ruptura (kg / m ³):	2267	2267	2264	2298
Fecha de colado:	25-abr-24	25-abr-24	25-abr-24	25-abr-24
Fecha de ruptura:	02-may-24	09-may-24	23-may-24	23-may-24
Edad (días):	7	14	28	28
Carga de ruptura (kg):	39,070	41,370	51,340	51,040
Area (cm ²):	176.70	175.53	175.53	173.19
Resistencia obtenida (kg/cm ²):	221.10	235.69	292.49	294.71
% Resistencia proyecto:	88.44	94.28	117.00	117.88

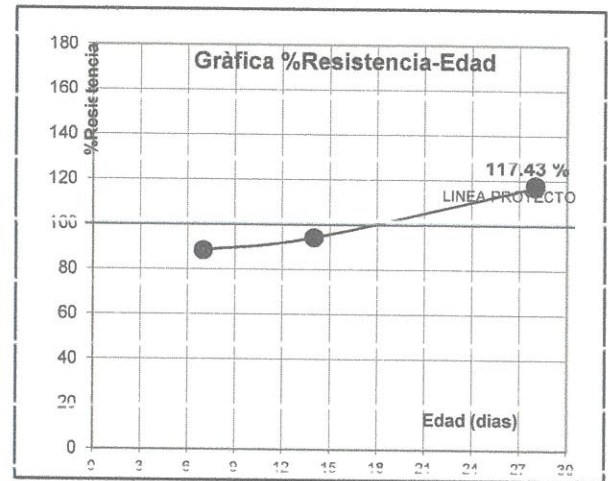

NORMAS DE REFERENCIA: ELABORACION DE CILINDROS (NMX-C-161-2013 -ONNCE vs ASTM-C-31); REVENIMIENTO (NMX-C-156-ONNCE-2010 vs ASTM-C-143; RESISTENCIA A LA COMPRESION (NMX-C-63-ONNCE-2014 vs ASTM-C-39; NMX-C-435-ONNCE-2010 TEMPERATURA CONCRETO; CABECEO DE ESPECIMENES CILINDRICOS (NMX-C-109-ONNCE-2013) GABINETES, CUARTOS HUMEDOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONDICIONES DE DISEÑO Y OPERACION (NMX-C-148-ONNCE-2010); ASTM C-51-11 (2007).

EL RESULTADO DE PRUEBA INFORMADO SOLO AMPARA EL MATERIAL ANALIZADO
 ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE ESTE LABORATORIO

TIPOS DE FALLA
PRESENTADOS
EN EL ESPECIMEN



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONCRETO ENSAYADO A LA EDAD DE 28 DIAS HA CUMPLIDO CON RESISTENCIA DE PROYECTO, (100% FC)

INFORME DE ENSAYE RECIENTE, LOS INFORMES DE ENSAYES ANTERIORES FUERON REPORTADOS POR ESTE LABORATORIO EN SU MOMENTO

0182

P.A. [Signature]
VICTOR ALFONSO ACOSTA LAMAS
 LABORATORISTA

[Signature]
ING. JORGE H. PARADA CHAVEZ
 GERENTE GENERAL



MELENDREZ CONSTRUCCIONES

ASUNTO: ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 28 DE MAYO DEL 2024

POR MEDIO DEL PRESENTA, SE FORMULA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA REALIZADA POR MEDIO DEL PROGRAMA FONDO III. EFECTUADA POR C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ, REUNIENDOSE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES PARTES QUE INTERVIENEN, Y FIRMANDO DE COMUN ACUERDO.

DATOS DE LA OBRA

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS"

PROGRAMA: FONDO III

LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA

MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

FECHA DE INICIO (CONTRATO): 28 DE FEBRERO DEL 2024

FECHA DE TERMINO (CONTRATO): 28 DE MAYO DEL 2024


FECHA DE INICIO REAL: 28 DE FEBRERO DEL 2024

FECHA DE TERMINO REAL: 09 DE MAYO DEL 2024

NUMERO DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/06

MONTO DEL CONTRATO: \$ 1'667,134.32 (UN MILLON SEICIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.)

HABIENDO DADO UN RECORRIDO POR LA OBRA SE COMPROBO OBJETIVAMENTE LA TERMINACION DE LA MISMA, DE ACUERDO CON EL PROYECTO, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES APROBADAS POR LAS PARTES, POR LO CUAL SE RECIBE DE CONFORMIDAD Y CON ENTERA SATISFACCION LOS TRABAJOS REALIZADOS.



Angel Paloma Rodriguez Rodriguez

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

Magdalena Martinez Melendrez

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS

0183

CALLE LA CIENEGUITA #3 A , VELADORES, C.P. 99900, NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS, MX.



MELENDREZ CONSTRUCCIONES



ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ.

ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PRESENTE

ASUNTO: TERMINO DE OBRA

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 09 DE MAYO DEL 2024

HAGO REFERENCIA AL CONTRATO NUMERO **NOCHIS/FONDOIII/2024/06** RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS" CON UN IMPORTE DE \$ 1'667,134.32 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2024 CELEBRADO EN ESA DEPENDENCIA A SU DIGNO CARGO SE LE INFORMA QUE SE TERMINA EN TIEMPO Y FORMA LOS TRABAJOS DE DICHO CONTRATO EL 09 DE MAYO DEL 2024 DE LA OBRA DENOMINADA:

NOMBRE: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS"

MONTO DEL CONTRATO: \$ 1'667,134.32

PLAZO DE EJECUCION: DEL 28 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DEL 2024

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO, DESEANDO LE ÉXITO Y PROSPERIDAD.

*Magdalena Martinez
Melendrez*

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

0184

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

CALLE LA CIENEGUITA #3 A , VELADORES, C.P. 99900, NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS, MX.



MELENDREZ CONSTRUCCIONES

ASUNTO: ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 28 DE MAYO DEL 2024

POR MEDIO DEL PRESENTA, SE FORMULA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA REALIZADA POR MEDIO DEL PROGRAMA FONDO III. EFECTUADA POR C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ, REUNIENDOSE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES PARTES QUE INTERVIENEN, Y FIRMANDO DE COMUN ACUERDO.

DATOS DE LA OBRA

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS"

PROGRAMA: FONDO III

LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA

MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

FECHA DE INICIO (CONTRATO): 28 DE FEBRERO DEL 2024

FECHA DE TERMINO (CONTRATO): 28 DE MAYO DEL 2024

FECHA DE INICIO REAL: 28 DE FEBRERO DEL 2024

FECHA DE TERMINO REAL: 09 DE MAYO DEL 2024

NUMERO DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/06


MONTO DEL CONTRATO: \$ 1'667,134.32 (UN MILLON SEICIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.)

HABIENDO DADO UN RECORRIDO POR LA OBRA SE COMPROBO OBJETIVAMENTE LA TERMINACION DE LA MISMA, DE ACUERDO CON EL PROYECTO, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES APROBADAS POR LAS PARTES, POR LO CUAL SE RECIBE DE CONFORMIDAD Y CON ENTERA SATISFACCION LOS TRABAJOS REALIZADOS.


ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ


ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO


Magdalena Martinez
Melendrez

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

CONTRATISTA



0186

CALLE LA CIENEGUITA #3 A , VELADORES, C.P. 99900, NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS, MX.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

Ejercicio 2024

FECHA DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION:
29 DE MAYO 2024

DATOS GENERALES:

FONDO:	III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social Municipal.	NO. DE PROYECTO:	404004
ESTADO:	032 Zacatecas	PROGRAMA:	DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION
MUNICIPIO:	034: Nochistlán de Mejía	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA YO ACCIÓN:	
LOCALIDAD:	NOCHISTLAN DE MEJIA		<u>CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.</u>
METAS CUMPLIDAS:			
FECHA REAL INICIO:			28 FEBRERO 2024
FECHA REAL TERMINACION:			28 MAYO 2024

*M^o Alejandra Macías C.
Lidia Chavez*

Firmar al calce

Página 1

Isela de Jesús Rodríguez Garza

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0187

ESTRUCTURA FINANCIERA:

	TOTAL	F.I.S.M.	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
INVERSIÓN APROBADA	\$1'667,134.32	\$1'667,134.32	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA	\$1'667,134.32	\$1'667,134.32	0.00	0.00	0.00

MODALIDAD DE EJECUCION: C(X) AC () AM () AD () M() EQ()

En el municipio de: **NOCHISTLAN DE MEJIA** siendo las 12 :00 HRS. Del día: **29 DE MAYO DEL 2024**

los **PROF. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR**, PRESIDENTE MUNICIPAL; **LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ**, SINDICA MUNICIPAL, **ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA**, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; **LIC. ARMANADO AGUIRRE GOMEZ** SECRETARIO DE GOBIERNO, **C. SERGIO HINOJOZA PEREZ** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, y representantes de las diferentes dependencias que intervienen para efectuar y dar constancia de la **entrega-recepción de la obra**, descrita en la parte superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la ley de adquisiciones y obras públicas y 49 de su reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente trizada y operando de acuerdo a la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto, en condiciones de ser recibida por la unidad de su operación (comité o dependencia que se encargará en lo sucesivo de su conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime al ejecutor de la obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en ella y se obliga por la presente a corregir la deficiencia detectada sin costo para la federación.

El H. Ayuntamiento representado por el **PROF. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR**, por este medio y este momento hace la entrega a los **Integrantes del Comité de obra**, quien será la entidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quienes reciben de conformidad los que en ella intervienen firmando al calce.

M^g Alejandra Macías c.
Lidio Chavez

Isela de Jesus Rodriguez Garcia

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

anexo

188

POR EL MUNICIPIO
ENTREGAN:



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROF. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR,


RECIBEN LA OBRA:

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

VOCAL DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA


Anely Paloma Rodriguez Rodriguez


Isela de Jesus Rodriguez Garcia

TESTIGOS:

Lidia Chavez Ma Alejandra Macias c.

Firmar al calce

Página 3



0189



MELENDEZ CONSTRUCCIONES

FINIQUITO

NÚMERO DE ESTIMACIÓN:

FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

NO. DE CONTRATO:

NOCHISTLAN/OND000/2024/06

UBICACION:

NOCHISTLAN DE MEJIAS ZACATECAS

PERIODO:

28 DE FEBRERO A 28 DE MAYO

IMPORTE DEL CONTRATO:

\$1,667,134.32

CONTRATO

ESTIMADO

POR ESTIMAR

UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
M2	1208.13	\$9.83	\$11,875.92	1208.13	\$9.83	\$11,875.92	0.00	\$9.83	\$0.00
M3	153.00	\$22.75	\$3,480.75	153.00	\$22.75	\$3,480.75	0.00	\$22.75	\$0.00
M2	143.14	\$65.04	\$9,309.83	143.14	\$65.04	\$9,309.83	0.00	\$65.04	\$0.00
M3	703.57	\$90.01	\$63,328.34	703.57	\$90.01	\$63,328.34	0.00	\$90.01	\$0.00
M3	703.57	\$143.48	\$100,948.22	703.57	\$143.48	\$100,948.22	0.00	\$143.48	\$0.00
M3/KM	1407.14	\$14.51	\$20,417.60	1407.14	\$14.51	\$20,417.60	0.00	\$14.51	\$0.00
M3	362.44	\$460.21	\$166,798.51	362.44	\$460.21	\$166,798.51	0.00	\$460.21	\$0.00
M3	241.63	\$441.94	\$106,785.96	241.63	\$441.94	\$106,785.96	0.00	\$441.94	\$0.00
M	133.00	\$486.18	\$64,661.94	133.00	\$486.18	\$64,661.94	0.00	\$486.18	\$0.00
M3	52.80	\$251.60	\$13,284.48	52.80	\$251.60	\$13,284.48	0.00	\$251.60	\$0.00
M2	176.00	\$450.03	\$79,205.28	176.00	\$450.03	\$79,205.28	0.00	\$450.03	\$0.00
M2	1208.13	\$659.77	\$797,087.93	1208.13	\$659.77	\$797,087.93	0.00	\$659.77	\$0.00
		IMPORTE	\$1,437,184.76			IMPORTE	\$1,437,184.76		
		IVA	\$229,949.56			IVA	\$229,949.56		
		TOTAL	\$1,667,134.32			TOTAL	\$1,667,134.32		

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

010706 Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano

RETA-01 Retiro de empedrado con recuperación de material, incluye: almacenamiento a una distancia máxima de 20 mts.

P-03 Demolicion concreto simple de 15 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaños

TEMP-3 Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) conciderando afine de la superficie y dejando pendientes deacuerdo al proyecto

010818 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria. Carga con maquina.

ACAR-02 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilometros subsucesntes, se concideran (2 km)

METAC-0002 Mezclado tendido y compactacion de la construccion de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material petro (40% tepalate - 60% cascajo)

METAC-0002-1 Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (60% cascajo - 40% tepalate)

170701 Guarnición de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm. , sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 armada con dos varillas de 3/8" y grapas de alambreon de 1/4" cimbra común a 70 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentacion de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

BAS-BANCO 030504 Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base para banquetas compactada con ballarina al 100% utilizando material de banco (tepalate)

170705 Banchetas de Concreto f'c=f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.

030504 Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.

ING. JOSE FRANCISCO CALERO DELGADILLO
SUPERVISOR

ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
DIRECTOR DE DES. ECO. Y SOC.

PROF. RAFAEL GAYO SAUJWAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ
CONTRATISTA

Magdalena Martinez Meleendez

0190

EJERCICIO 2024

ACTA DERECHOS Y OBLIGACIONES

Siendo las **9:00 horas** del día **28 de mayo de 2024**, en el espacio que ocupa la oficina de Desarrollo económico y social, Ubicado en el edificio de la presidencia Municipal marcado con el No. 1, de la calle Hidalgo, esquina con la Plaza Principal en Nochistlán, Zac. Las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, conforme a lo dispuesto en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas con el objeto de llevar a cabo el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones sobre los trabajos ejecutados al amparo del contrato No. **NOHIS/FONDOIII/2024/06** que suscribieron Desarrollo económico y social el contratista **C. Magdalena Martínez Melendrez**.

ANTECEDENTES

Con fecha **28 febrero de 2024** las partes celebran contrato de Obra Pública con base a Precio Unitario y tiempo determinado identificado con el No. De Contrato: **NOHIS/FONDOIII/2024/06** para llevar a cabo los trabajos de obra: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**. Con fecha de iniciación real de los trabajos el día **28 febrero de 2024** y la fecha de terminación real el día **09 de mayo del 2024**.

Quedando un monto total contratado de **\$1'667,134.32** (un millón seiscientos sesenta y siete mil ciento treinta y cuatro pesos 32/100M.N) Esta cantidad incluye el impuesto al valor agregado.

Durante del proceso de la obra se autorizaron un total de **1 (una)** estimacion a precio unitario por trabajos ejecutados por un monto total de **\$1'667,134.32** (un millón seiscientos sesenta y siete mil ciento treinta y cuatro pesos 32/100M.N) Esta cantidad incluye el impuesto al valor agregado.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprenden:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

Operado: FONDO III

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024


0191

RELACIÓN DE ESTIMACIONES PAGADAS POR TRABAJOS EJECUTADOS

Por lo anterior manifiestan las partes que no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

No. de Estimac.	Fecha	Importe Total	Deducciones	Anticipo (Amortización)
1	09 de mayo de 2024	\$1'667,134.34	\$0.00	\$0.00

Sin otro asunto que tratar, se cierra la presente Acta firmado de conformidad las personas que interviene en este acto.

RESIDENTE DE OBRA 	CONTRATISTA Magdalena Martinez Melendrez
ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO.	C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.

