

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESENTE

ASUNTO: RESIDENTE DE OBRA

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 29 DE FEBRERO DEL 2024

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO A USTED QUE EL RESIDENTE DE OBRA DENOMINADA "RAHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS" SERA EL ING. LUIS DAVID RAMIREZ VILLEGAS.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO, DESEANDOLE ÉXITO Y PROSPERIDAD.



C. ANGELICA RUANO AVILA

OPERADO
FAISM (FIII)

EJERCICIO 2024

0103



Angélica Ruano Avila

RUAA880710506

16 de Septiembre 166
Centro Localidad Daniel Camarena
Nochistlán de Mejía, Zac.
México C.P.99914



CEL. 346 101 2142



j_melendrez@hotmail.com

BITACORA DE OBRA

C. ANGELICA RUANO AVILA

No. PROYECTO 404005
HOJA PORTADA

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE	PAVIMENTACION, EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.				
LOCALIZACION	NOCHISTLAN DE MEJIA				
No. DE CONTRATO	NOCHIS/FONDOSIII/2024/07				
MONTO CONTRATADO	\$887,747.48				
FECHA DE INICIO	PROGRAMADA	28/02/2024	REAL	31/05/2024	
FECHA DE TERMINO	PROGRAMADA	08/03/2024	REAL	17/05/2024	

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL	ANGELICA RUANO AVILA
DOMICILIO	16 DE SEPTIEMBRE 166
TELEFONO	3461012142



CONTRATISTA



SUPERVISOR DE OBRA
OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

No. DE CONTRATO		NOCHIS/FONDOSIII/2024/07	
FOLIO		001	
No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
1	08/03/2024 AL 15/03/2024	TERRACERIAS	SE REALIZAN EXCAVACIONES EN TERRENO NATURAL Y ACARREOS DEL MISMO MATERIAL PRODUCTO DEEXCAVACION



No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
	08/03/2024 AL 15/03/2024	TERRACERIAS	SE REALIZAN EXCAVACIONES EN TERRENO NATURAL Y ACARREOS DEL MISMO MATERIAL PRODUCTO DEEXCAVACION



No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
2	18/03/2024 AL 22/03/2024	TERRACERIAS	SE CONTINUA CON EXCAVACIONES EN TERRENO NATURAL Y ACARREOS DEL MISMO MATERIAL PRODUCTO DEEXCAVACION Y DEMOLICION DE BANQUETA



[Handwritten Signature]

CONTRATIASTA

OPERADO
FAISM (FIII)
SUPERVISOR
EJERCICIO 2024

0105

No. DE CONTRATO		NOCHIS/FONDOSIII/2024/07	
FOLIO		002	
No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
	18/03/2024 AL 22/03/2024	TERRACERIAS	SE CONTINUA CON EXCAVACIONES EN TERRENO NATURAL Y ACARREOS DEL MISMO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION DE BANQUETA



No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
3	25/03/2024 AL 29/03/2024	TERRACERIAS	SE CONTINUA CON EXCAVACIONES EN TERRENO NATURAL Y ACARREOS DEL MISMO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION



No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
	25/03/2024 AL 29/03/2024	TERRACERIAS	SE CONTINUA CON EXCAVACIONES EN TERRENO NATURAL Y ACARREOS DEL MISMO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES COMO CORTE EN CARPETA ASFALTICA




CONTRATIASTA

0106
OPERADO
SUPERVISOR
FAISM (FHH)
EJERCICIO 2024

No. DE CONTRATO		NOCHIS/FONDOSIII/2024/07	
FOLIO		003	
No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
4	15/04/2024 AL 19/04/2024	BASE	SUMINISTRO, MEZCLADO Y TENDIDO DE BASE UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIALPETREO



No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
	15/04/2024 AL 19/04/2024	BASES	MEZCADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE



No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
5	22/04/2024 AL 26/04/2024	GUARNICIONES	CIMBRADO ARMADO Y COLADO DE GUARNICIONES



0107

[Signature]

CONTRATIASTA

[Signature] OPERADO
SUPERVISOR (FIII)
EJERCICIO 2024

ANOTACIONES

No. DE CONTRATO		NOCHIS/FONDOSIII/2023/13	
FOLIO		004	
No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
	22/04/2024 AL 26/04/2024	GUARNICIONES	CIMBRADO ARMADO Y COLADO DE GUARNICIONES



No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
6	29/04/2024 AL 03/05/2024	BANQUETAS	MEZCLASO TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE PARA BANQUETA ASI COMO COLADO DE BANQUETAS



No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
	28/04/2024 AL 03/05/2024	BANQUETAS	COLADO DE BANQUETAS



[Handwritten Signature]

CONTRATIASTA

OPERADO
SUPERVISOR
FAISM (FII)
EJERCICIO 2024

0108

ANOTACIONES


No. DE CONTRATO		NOCHIS/FONDOSIII/2024/07	
FOLIO		005	
No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
7	06/05/2024 AL 17/05/2024	CONCRETO	ARMADO Y COLADO DE LOSA DE CONCRETO



No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
	06/05/2024 AL 17/05/2024	CONCRETO	ARMADO Y COLADO DE LOSA DE CONCRETO



No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
	06/05/2024 AL 17/05/2024	CONCRETO	ARMADO Y COLADO DE LOSA DE CONCRETO

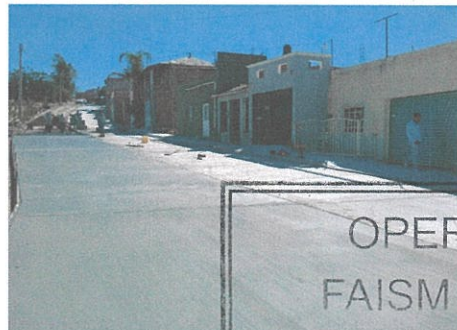

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

[Signature]

CONTRATIATA

[Signature]

SUPERVISOR



Usu: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C01249 Del 08/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 02:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Anticipo a Proveedor : 1, 404005 - REHABILITACION DE PAVIENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Obra Pública : 404005

Beneficiario: ANGELICA RUANO AVILA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1134-001044	ANGELICA RUANO AVILA	\$379,408.52		FF:511, Anticipo a Proveedor : 1, 404005 - REHABILITACION DE PAVIENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
0002	1112-08-163	FONDO III 2024 1255080241		\$379,408.52	FF:511, Anticipo a Proveedor : 1, 404005 - REHABILITACION DE PAVIENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
Sumas iguales =>			<u>379,408.52</u>	<u>379,408.52</u>	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0110



Transferencia

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927


09/04/2024 15:04

Cuenta/ CLABE Ordenante	1255080241
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
RFC Ordenante	MNM850101AC3
Moneda	MXP
ID Tercero	457
Nombre del Beneficiario	ANGELICA RUANO AVILA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0313588248
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
RFC Beneficiario	RUAA880710SQ6
Importe a Transferir	\$379,408.52
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/04/2024
Número de Referencia	01
Propósito de la Transferencia	ANTICIPO
Clave de Rastreo	9
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha Captura	09/04/2024 03:04:01 p. m.
Ejecutó	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha de Ejecución	09/04/2024 03:04:22 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



0111

ORDEN DE PAGO 2024

08-abr

MUNICIPIO: 034 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: RAMO 33 . PROGRAMAS FEDERALES
 SUB-PROGRAMA : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 (RAMO, FONDO O PROGRAMA) (FONDO III 2024)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
 FIRMA DEL SOLICITANTE: _____
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 8 de abril de 2024
 CUENTA BANCARIA ORIGEN : 1255080241

No.	CLAVE PRESUPUESTARIA								NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE.	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO						
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	511	FONDO III RAMO 33	404005	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA , ZACATECAS	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6141	PAGO DE ANTICIPO.	NOCHIS/FOND OIII/2024/07	ANGELICA RUANO AVILA	A 550	08/04/2023	379,408.52	(TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 52/100 MN)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORIZA:



TESORERIA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORIZA:



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
 DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORIZA:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 PROF. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORIZA:



SINDICATURA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ.
 SÍNDICO MUNICIPAL

FECHA : 08 DE ABRIL DEL 2024

FECHA : 08 DE ABRIL DEL 2024

FECHA : 08 DE ABRIL DEL 2024

FECHA : 08 DE ABRIL DEL 2024

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 75 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA , PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.

0112

EJERCICIO 2024

ORDENADO (RAMO III)



ANGELICA RUANO AVILA
RUAA880710SQ6
 16 DE SEPTIEMBRE 166
 CENTRO LOCALIDAD DANIEL CAMARENA
 NOCHISTLAN DE MEJIA, NOCHISTLAN.
 ZACATECAS, México C.P. 99914
 (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Teléfonos: (346)-100-1611, (346)-101-2142
Tipo Comprobante: (I) Ingreso
Exportación: (01) No aplica

Factura A 550
Folio fiscal
 efd6659d-987d-4293-afed-d6850ff65385
RFC Certificador
 LSO1306189R5
No. certificado del SAT
 00001000000509846663
Fecha y hora certificación
 2024-04-08 09:31:53
Lugar Expedición: Zacatecas, 99914

RFC	MNM850101AC3	Fecha expedición	08/04/2024 09:31:52
Nombre	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS	Uso CFDI	(G03) Gastos en general.
Régimen Fiscal	(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos	Dirección Fiscal	99900
Calle	HIDALGO 1		
Colonia	CENTRO Municipio NOCHISTLAN DE MEJIA C.P. 99900		
Ciudad, Estado	, ZACATECAS. MEXICO	Fecha pago	08/04/2024

Clave	ProdServ	ObjImp	Cant	Cve. Unidad	Descripción	Descuento	Precio unitario	Importe
72141121	72141121	02	1.00	(E48)	RECIBI DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA LA Unidad CANTIDAD DE \$379.408.52 POR CONCEPTO DE PAGO de DEL 30% DE ANTICIPO ,PARA LA OBRA: servicio "REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE JESUITAS, COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS" , CON NUMERO DE CONTRATO NOCHIS/FONDOIII/2024/07 , PARA EFECTOS DEL PAGO , SUBTOTAL: \$327,076.31 , IVA 16%: \$52,332.21. TOTAL DE LA FACTURA: \$379,408.52.	0.00	327,076.31	327,076.31

Trasladado Base 327,076.31 Impuesto (002) IVA Tipo Factor Tasa 0.160000 *Importe 52,332.2096*

Subtotal	327,076.31
16 % (002) IVA	52,332.21
Total	379,408.52

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 52/100 M.N.

Método pago : (PPD) Pago en parcialidades o diferido
Condiciones pago : crédito **Forma pago :** (99) Por definir
Clave moneda: MXN **Tipo de cambio :** 1

Número Certificado 00001000000508275901

Sello digital del CFDI
 k/NLW0gxe6E5wMy/Fe/qA1suDBICmERDbv72PXj6l2T6h+v7Nz4WMwrpQqMUUekQkXbDNNcOT9TAHmTYC/m46+M7ehF5zG0WcFO1GUPUUPCmlg/H+JBZaAFEzHmx4qRksZ8ikEY1YWdg4p8FLdoq3S/gEQ5xcH/Zsea2y/FwCwvRh/KE+Ewq66zL9XJz7eWNSZQgXyZKosfz7bQptjPpWuS6zeZCSpCHOnrItJBkXb/miNPEhX0d4zVTW0AI7qgP5v+bthlGfd5GSdGAXzlbZp59ddJn8jPmcl7kNHTKizw7lMQF1I3p+KERVubnY6alwaYGjKmcE0mpvgIgwR2kGQ==

Sello del SAT
 SZYnuvm1c//Fo4/IyavAk1xd3B2fCbr1f4wlGoe6vIHPNaYTIUe2qFxpLb6TgtwpaGjuunfDxdIIE0R+BQDxIkdys9jr06Uf4b0QUMC299xubdloub6tkl+F3xX2Ti0K4S9gwn+mT3CJ8aCn7kCsSrvCwn+z1kmvpUX9wWw4OYrjavU3nra4rXCWvhtdvEfuXK2DqYCVVWiKrdugfLLKkQ7E9LxL/leiclf4DIjbfImqZJOFzdt3shFmTbzoifFrLi2nEM23Rsg8rmZaDmfbTGbvIc0SWioBKgtZEwgvOKHyrbvvmAjdR6CnHATPufUT8kUYQnI1flkaz7jQ886g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|efd6659d-987d-4293-afed-d6850ff65385|2024-04-08T09:31:53|LSO1306189R5|k/NLW0gxe6E5wMy/Fe/qA1suDBICmERDbv72PXj6l2T6h+v7Nz4WMwrpQqMUUekQkXbDNNcOT9TAHmTYC/m46+M7ehF5zG0WcFO1GUPUUPCmlg/H+JBZaAFEzHmx4qRksZ8ikEY1YWdg4p8FLdoq3S/gEQ5xcH/Zsea2y/FwCwvRh/KE+Ewq66zL9XJz7eWNSZQgXyZKosfz7bQptjPpWuS6zeZCSpCHOnrItJBkXb/miNPEhX0d4zVTW0AI7qgP5v+bthlGfd5GSdGAXzlbZp59ddJn8jPmcl7kNHTKizw7lMQF1I3p+KERVubnY6alwaYGjKmcE0mpvgIgwR2kGQ==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0





Usu: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C01569 Del 10/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
09:23 a. m.
Página | 1

Concepto: A560 - Obra Pública : 404005 - REHABILITACION DE PAVIENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL. GP
Folio: 312

Beneficiario: ANGELICA RUANO AVILA

Folio / Cheque : 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404005-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$1,264,695.09		FF:511, GP Folio: 312
0002	8260-511-404005-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$1,264,695.09	FF:511, GP Folio: 312
0003	2113-001044	ANGELICA RUANO AVILA	\$1,264,695.09		FF:511, GP Folio: 312
0004	1134-001044	ANGELICA RUANO AVILA		\$379,408.53	FF:511, GP Folio: 312
0005	1112-08-163	FONDO III 2024 1255080241		\$885,286.56	FF:511, GP Folio: 312
Sumas iguales =>			<u>2,529,390.18</u>	<u>2,529,390.18</u>	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0114



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P04463 Del 21/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024 09:20 a. m.
Página | 1

Concepto: A560 - Obra Pública : 404005 - REHABILITACION DE PAVIENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL. GD
Folio: 330

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-404005-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$1,264,695.09		FF:511, GD Folio: 330
0002	8240-511-404005-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$1,264,695.09	FF:511, GD Folio: 330
0003	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de	\$1,264,695.09		FF:511, GD Folio: 330
0004	2113-001044	ANGELICA RUANO AVILA		\$1,264,695.09	FF:511, GD Folio: 330
Sumas iguales =>			<u>2,529,390.18</u>	<u>2,529,390.18</u>	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0115



Imprimir

Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927


Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

21/05/2024 15:05

Cuenta/ CLABE Ordenante	1255080241
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
RFC Ordenante	MNM850101AC3
Moneda	MXP
ID Tercero	457
Nombre del Beneficiario	ANGELICA RUANO AVILA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0313588248
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
RFC Beneficiario	RUAA880710SQ6
Importe a Transferir	\$885,286.56
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	21/05/2024
Número de Referencia	01
Propósito de la Transferencia	PAGO DE FACTURA NO 560
Clave de Rastreo	23
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha Captura	21/05/2024 03:05:08 p. m.
Ejecutó	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha de Ejecución	21/05/2024 03:05:37 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



0116

ORDEN DE PAGO 2024

21-may

MUNICIPIO: 034 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: RAMO 33 . PROGRAMAS FEDERALES
 SUB-PROGRAMA : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 (RAMO, FONDO O PROGRAMA) (FONDO III 2024)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 CARGO SOLICITANTE: ENCARGADO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
 FIRMA DEL SOLICITANTE: 
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 21 de mayo de 2024
 CUENTA BANCARIA ORIGEN : 1255080241

No.	CLAVE PRESUPUESTARIA								NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE.	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO						
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	511	FONDO III RAMO 33	404005	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA , ZACATECAS	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6141	PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	NOCHIS/FOND OIII/2024/07	ANGELICA RUANO AVILA	A 560	21/05/2023	885,286.56	(OCHOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 56/100 MN)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORIZA:



TESORERIA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024

L.C. ROCIO ROQUE GÓMEZ.
 ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL

FECHA : 21 DE MAYO DEL 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORIZA:



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024

ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA : 21 DE MAYO DEL 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORIZA:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024

PROF. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA : 21 DE MAYO DEL 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORIZA:



SINDICATURA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024

L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ.
 SÍNDICO MUNICIPAL

FECHA : 21 DE MAYO DEL 2024

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL..."AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA..."LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA , PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.

EJERCICIO FAISM OPERATIVO

0117



ANGELICA RUANO AVILA

RUAA880710SQ6

16 DE SEPTIEMBRE 166
CENTRO LOCALIDAD DANIEL CAMARENA
NOCHISTLAN DE MEJIA, NOCHISTLAN.
ZACATECAS, México C.P. 99914

(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Teléfonos: (346)-100-1611, (346)-101-2142

Tipo Comprobante: (I) Ingreso

Exportación: (01) No aplica

Factura A 560

Folio fiscal

98879353-1953-4242-9f90-dae69bd3373f

RFC Certificador

LSO1306189R5

No. certificado del SAT

00001000000509846663

Fecha y hora certificación

2024-05-21 14:07:58

Lugar Expedición: Zacatecas, 99914

RFC	MNM850101AC3	Fecha expedición	21/05/2024 14:07:57
Nombre	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS	Uso CFDI	(G03) Gastos en general.
Régimen Fiscal	(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos	Dirección Fiscal	99900
Calle	HIDALGO 1		
Colonia	CENTRO Municipio NOCHISTLAN DE MEJIA C.P. 99900		
Ciudad, Estado	, ZACATECAS. MEXICO	Fecha pago	21/05/2024

Clave	ProdServ	ObjImp	Cant	Cve. Unidad	Descripción	Descuento	Precio unitario	Importe
72141121	72141121	02	1.00	(E48)	RECIBI DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA LA Unidad CANTIDAD DE \$885,286.56 POR CONCEPTO DE PAGO de DE ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO ,PARA LA servicio OBRA: "REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE JESUITAS, COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS" , CON NUMERO DE CONTRATO NOCHIS/FONDOIII/2024/07 , PARA EFECTOS DEL PAGO , SUBTOTAL: \$763,178.07 , IVA 16%: \$122,108.49. TOTAL DE LA FACTURA: \$885,286.56.	0.00	763,178.07	763,178.07

Trasladado Base 763,178.07 Impuesto (002) IVA Tipo Factor Tasa 0.160000

Importe 122,108.4912

Subtotal	763,178.07
16 % (002) IVA	122,108.49
Total	885,286.56

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.

Método pago : (PPD) Pago en parcialidades o diferido

Condiciones pago : crédito Forma pago : (99) Por definir

Clave moneda: MXN Tipo de cambio : 1

Número Certificado 00001000000508275901

Sello digital del CFDI

XZQr5ob4xTNQoGVccCtVrTAFQwfrwNrtzC7WmC5kNkig62Q8+C3AtLhNhhV5FqoIGRBPBqsdDdH7HkARP2JXgPXNDMIjGhFNN9qH48Qsd9qDy2QRVjeoJ2tBw0WRHDX5jggcF4g+tagl4hAhAqypxNYxQNfeS5VGqspZI8tWE6aKtCiooo8Qaeo/rILNjFY6009HPac3mWfxtzHr/zrXtL/CgPGmuCehZe2rouhGVqQtsX1Kf+rvCoqQ6xS5usGCfCiGBHayjvChjFIGzfZr1fMZPqHU8PemRxankvXFyW/W7pOctPA2DSxXIQD6wkATc7PUY2st8QyPMCTJ37aA==

Sello del SAT

Qnsfa1340ZSHUZFviCu2U3bXyd1OnboE4ocilQ0kzPeyz7ZiYHWz5X9nf3DrLY5yMa3jwHsq8+0oNlMk0bMv2xY7VQOpNhVsAtYZPWSks0yJato8FLHnn08j5CKvjokOcjmt2XO4RpV6g48ssEdm641U8JBBUHK+MHRRe1Rig7W8V019ubt9pZyCPlfBzLe027vHtmjvUDKT/55GcLwJvo4IMfXApclxhifnIWFJlMEY8EM+I4tU2NH/p7wCnqM1yTkacmPPzEiuyhh6OSC8AE/5+LI87zh2dlhTQz0jB2/7aaYvTv3eqZcdkd193FEQxDClvAREf7HBo2Jb/UVZ3g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|98879353-1953-4242-9f90-dae69bd3373f|2024-05-21T14:07:58|LSO1306189R5|XZQr5ob4xTNQoGVccCtVrTAFQwfrwNrtzC7WmC5kNkig62Q8+C3AtLhNhhV5FqoIGRBPBqsdDdH7HkARP2JXgPXNDMIjGhFNN9qH48Qsd9qDy2QRVjeoJ2tBw0WRHDX5jggcF4g+tagl4hAhAqypxNYxQNfeS5VGqspZI8tWE6aKtCiooo8Qaeo/rILNjFY6009HPac3mWfxtzHr/zrXtL/CgPGmuCehZe2rouhGVqQtsX1Kf+rvCoqQ6xS5usGCfCiGBHayjvChjFIGzfZr1fMZPqHU8PemRxankvXFyW/W7pOctPA2DSxXIQD6wkATc7PUY2st8QyPMCTJ37aA==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



0118

ESTIMACION



NÚMERO DE ESTIMACIÓN:

1

NOMBRE DE LA OBRA:
NO. DE CONTRATO
UBICACIÓN:
PERIODO:
IMPORTE DE CONTRATO:

REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS
NOCHISFONDOI0112024/07
28 DE FEB A 31 DE MAY
\$1,264,695.09

CLAVE DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO	CONTRATO			ESTIMADO			POR ESTIMAR		
		CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
001	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m ² , incluye: Topógrafo y cadenero, operador	1175.49	\$12.67	\$14,893.46	1175.49	\$12.67	\$14,893.46	0.00	\$12.670	\$0.00
002	Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaños	126.09	\$81.12	\$10,228.42	126.09	\$81.12	\$10,228.42	0.00	\$81.12	\$0.00
003	Corte de carpeta asfáltica de un espesor promedio de 5 cm con maquina de disco especial para este tipo de trabajos. incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	25.50	\$167.36	\$4,267.67	25.50	\$167.36	\$4,267.67	0.00	\$167.36	\$0.00
004	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m ³ de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	32.00	\$158.52	\$5,072.64	32.00	\$158.52	\$5,072.64	0.00	\$158.52	\$0.00
005	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m ³ de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se concideran (3 km)	96.00	\$19.75	\$1,896.00	96.00	\$19.75	\$1,896.00	0.00	\$19.75	\$0.00
006	Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) conciderando afine de la superficie y dejando pendientes deacuerdo al proyecto	406.20	\$47.17	\$19,160.45	406.20	\$47.17	\$19,160.45	0.00	\$47.17	\$0.00
007	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m ³ de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	406.20	\$158.52	\$64,390.82	406.20	\$158.52	\$64,390.82	0.00	\$158.52	\$0.00
008	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m ³ de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se concideran (3 km)	1218.60	\$19.75	\$24,067.35	1218.60	\$19.75	\$24,067.35	0.00	\$19.75	\$0.00
009	Mazclado tendido y compactacion de la construccion de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (50% material de banco - 50% material petreo)	253.87	\$481.22	\$122,167.32	253.87	\$481.22	\$122,167.32	0.00	\$481.22	\$0.00
010	Mazclado tendido y compactacion de la construccion de base para banquetas compactada con ballarina al 100% utilizando material de banco (tepalcates)	32.00	\$516.23	\$16,519.36	32.00	\$516.23	\$16,519.36	0.00	\$516.23	\$0.00
011	Guarnición de Concreto f'c=150 Kg/cm ² agregado de 20 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm., sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 4 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	127.00	\$430.83	\$54,715.4*	127.00	\$430.83	\$54,715.41	0.00	\$430.83	\$0.00
012	Banqueta de Concreto f'c=150 Kg/cm ² agregado de 20 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm. de 0.08 ms de espesor, armado con malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mis, incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	160.00	\$422.96	\$67,673.60	160.00	\$422.96	\$67,673.60	0.00	\$422.96	\$0.00
013	Pavimento de concreto f'c = 250 Kg/cm ² agregado de 19 mm cemento normal revestimiento 8 a 10 cm de 15 cm de espesor, armado con malla electrosoldada de 6-6/10-10 rollo de 10 mis, incluye cimbra metálica, mano de obra y herramientas menores	1015.49	\$674.75	\$685,201.88	1015.49	\$674.75	\$685,201.88	0.00	\$674.75	\$0.00
		IMPORTE		\$1,090,254.39	IMPORTE		\$1,090,254.39	IMPORTE		0.00
		IVA		\$174,440.70	IVA		\$174,440.70	IVA		0.00
		TOTAL		\$1,264,695.09	TOTAL		\$1,264,695.09	TOTAL		0.00

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR


ING. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DES. ECO. Y SOC.

PROF. RAFAEL AGUIAYO SALDIVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

0119

EJERCICIO 2024



RESUMEN DE ESTIMACIÓN

REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS (COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS	
NOMBRE DE LA OBRA:	NOCHIS/FONDOIII/2024/07
NO. DE CONTRATO	NOCHISTLAN DE MEJIA
UBICACION:	28 DE FEB A 31 DE MAY
PERIODO:	\$1,264,695.09
IMPORTE DE CONTRATO:	

HOJA	CLAVES DE CONCEPTOS CONTENIDOS	IMPORTE
1	001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008 - 009 - 010 - 011 - 012 - 013	\$ 1,090,254.39


HISTORIAL	
MONTO DEL CONTRATO	\$1,264,695.09
ANTICIPO	\$379,408.52
(-) DEDUCCION 5 AL M.	\$0.00
ESTIMADO A LA FECHA	\$885,286.56
TOTAL POR ESTIMAR	\$0.00

SUBTOTAL	\$ 1,090,254.39
AMORTIZACION 30%	\$ 327,076.32
SUBTOTAL	\$ 763,178.07

IVA 16%	\$ 122,108.49
TOTAL DE LA FACTURA	\$ 885,286.56
DEDUCCION 5 A MILLAR	\$ -
IMPORTE A RECIBIR	\$885,286.56



 PROF. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DES. ECO. Y SOC.



 ING. JOSE FRANCISCO CAIERO DELGADILLO
 SUPERVISOR




 C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2024/07		CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA	
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
MONTO CONTRATADO: \$1,264,695.09		LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA	
LOGO DE LA EMPRESA: 		PROGRAMA: FAISM	
FECHA DE CONTRATO :		EST. No.: 1	
FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024		HOJA: 28/02/2024	
PLAZO DE EJECUCION: 94 DIAS		PERIODO DE: 1 DE: 12	
FECHA DE TERMINO: 31 DE MAYO 2024		A 31/05/2024	
DESCRIPCION DE CONCEPTO:			
CLAVE 001			

Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2, incluyen: Topógrafo y cateneno, operador

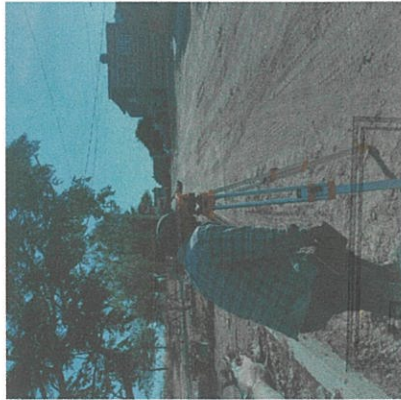

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/07
 MONTO CONTRATADO: \$1,264,695.09

SERVICIOS MELENDRIZ CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA

LOGO DE LA EMPRESA


REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

FECHA DE CONTRATO :
 FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024
 PLAZO DE EJECUCION: 94 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 31 DE MAYO 2024

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspalears

CLAVE	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD	
002	EJE 2-3	E-D	DEMOLICION	80.11	1.07	85.62		M2	
	EJE 2-6	C-D	DEMOLICION	21.95	1.00	21.95			
	EJE 4-6	A-B	DEMOLICION	18.92	1.00	18.92			
								TOTAL	126.09

CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA
 LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 EST. No. 1
 HOJA: 2
 PERIODO DE: A
 DE: 12
 31/05/2024

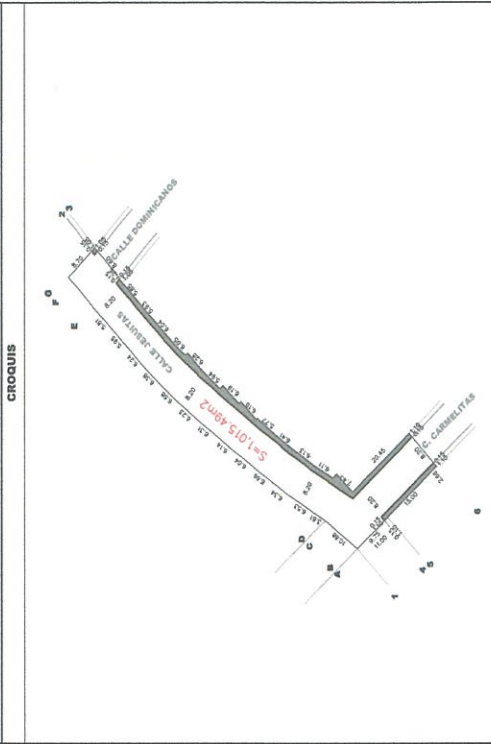

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 20 24

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2024/07
 MONTO CONTRATADO: \$1,264,695.09

SERVICIOS MELENDREZ
CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA

LOGO DE LA EMPRESA


REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

FECHA DE CONTRATO :
 FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024
 PLAZO DE EJECUCION: 94 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 31 DE MAYO 2024

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 CLAVE 002 Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos Incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaños

LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD
2-3	E-D	DEMOLICION	80.11	1.07	85.62		M2
2-6	C-D	DEMOLICION	21.95	1.00	21.95		
4-6	A-B	DEMOLICION	16.92	1.00	16.92		
TOTAL							126.09

CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA
 LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 EST. No. 1
 HOJA: 2
 PERIODO DE: A
 DE: 12
 31/05/2024

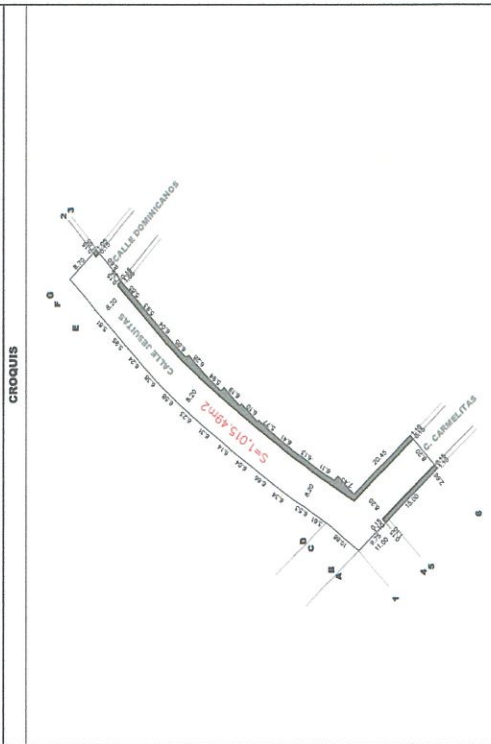

NOTAS :
 CROQUIS

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 20 24

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		C. ANGÉLICA RUANO AVILA		PROGRAMA	
MUNICIPIO:		LOCALIDAD:		FAISM	
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA			
EST. No.	1	HOJA:	2	PERIODO DE:	DE: 13
			28/02/2024	A	31/05/2024
NOTAS :					

CONTRATADO:
MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
MONTO CONTRATADO: \$1,264,695.09



LOGO DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA OBRA: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS
REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

FECHA DE CONTRATO :

FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024


PLAZO DE EJECUCION: 94 DIAS

FECHA DE TERMINO: 31 DE MAYO 2024

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

CLAVE
002

Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopleo y traspaños

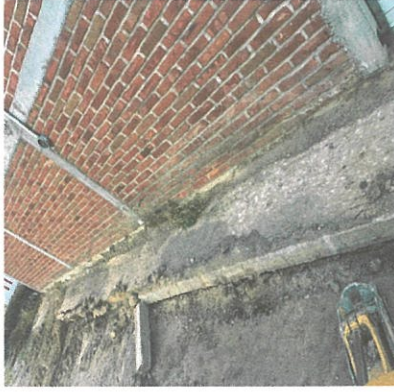

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGÉLICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

0125

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/07
 MONTO CONTRATADO: \$1,264,695.09

SERVICIOS MELENDREZ
 CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA

LOGO DE LA EMPRESA


HOMBRE DE LA OBRA: NOCHIS/FONDOIII/2024/07
 REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

FECHA DE CONTRATO :
 FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024
 PLAZO DE EJECUCION: 94 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 31 DE MAYO 2024

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 Corte de carpeta asfáltica de un espesor promedio de 5 cm con maquina de disco especial para este tipo de trabajos, incluye mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

CLAVE	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD	
003	EJE	E - F	CORTE	8.6				MIL	
	F	1 - 2	CORTE	6.7					
	G	B - C	CORTE	6.2					
								TOTAL	25.50

CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA
 LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 EST. No. 1
 HOJA: 3 DE 13
 PERIODO DE: 28/02/2024 A 31/05/2024
 NOTAS :
 CROQUIS

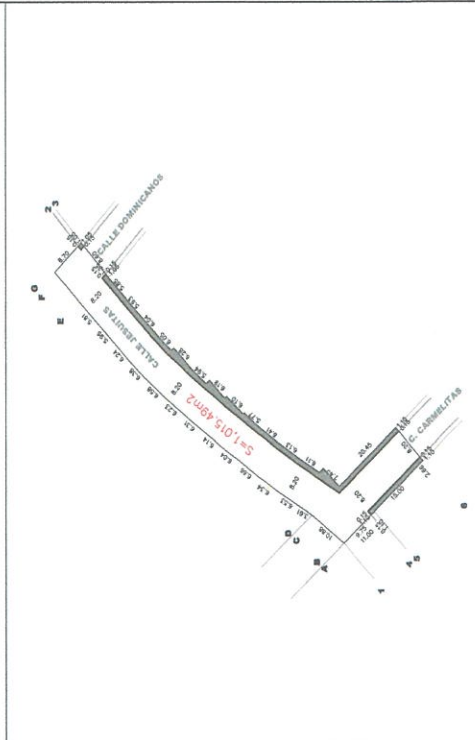

[Signature]
 C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

[Signature]
 ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

[Signature]
 ARR. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/07		CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA		PROGRAMA	
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA	
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 28 DE MAYO 2024 FECHA DE TERMINO: 31 DE MAYO 2024 PLAZO DE EJECUCION: 04 DIAS		EST. No.: 1		PERIODO DE: 3 DE: 13 A: 31/05/2024	
DESCRIPCION DE CONCEPTO: CLAVE 003		HOJA: 28/02/2024		NOTAS :	
MONTO CONTRATADO: \$1,264,695.09		LOGO DE LA EMPRESA			



Corte de carpeta asfáltica de un espesor promedio de 5 cm con maquina de disco especial para este tipo de trabajos. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

0127

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/07
 MONTO CONTRATADO: \$1,264,695.09

HOMBRE DE LA OBRA:
 REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

SERVICIOS MELENDREZ
 CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA


LOGO DE LA EMPRESA

FECHA DE CONTRATO :
 FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024
 PLAZO DE EJECUCION: 94 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 31 DE MAYO 2024

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 CLAVE 004 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con máquina.

LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD	
	E-D	ACARREO	80.11	1.07	24.72	0.25	M3	
	C-D	ACARREO	41.95	1.00	3.47	0.25		
	A-B	ACARREO	16.92		4.81			
TOTAL								32.00

CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA
 MUNICIPIO: LOCALIDAD:
 NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. NOCHISTLAN DE MEJIA
 EST. No. 1 HOJA: 4 DE: 13
 PERIODO DE: 28/02/2024 A 31/05/2024

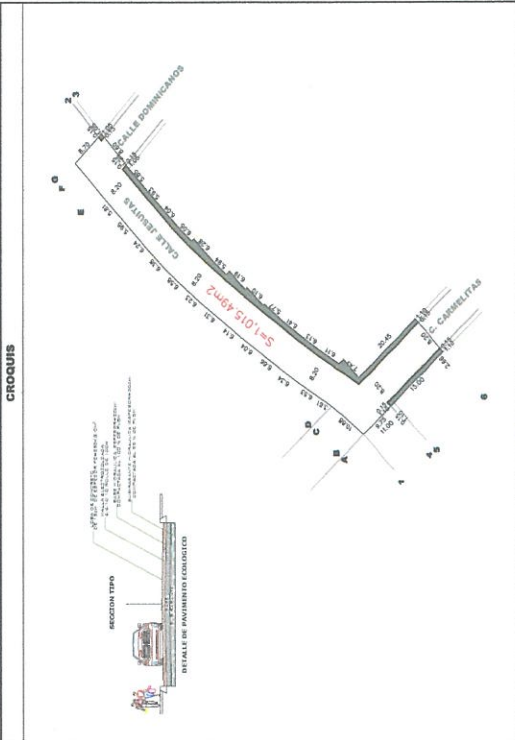

ING. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 20 24

0128

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/07		MONTO CONTRATADO: \$1,264,695.09		CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA		PROGRAMA	
HOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS				MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA	
FECHA DE CONTRATO :		FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024		EST. No.: 1		HOJAS: 4	
PLAZO DE EJECUCION: 94 DIAS		FECHA DE TERMINO: 31 DE MAYO 2024		PERIODO DE: A		DE: 13	
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		LOGO DE LA EMPRESA:		28/02/2024		31/05/2024	
CLAVE 004		NOTAS :					

Acarreo sobre camión de volitrío de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquinas.



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024


ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


ING. JOSE FRANCISCO CALERO DELGADILLO
SUPERVISOR


C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

GENERADORES

CONTRATO:	NOCHIS/FONDOIII/2024/07	MONTO CONTRATADO:	\$1,264,695.09
-----------	-------------------------	-------------------	----------------

SERVICIOS MELENDREZ
CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA

LOGO DE LA EMPRESA


REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

FECHA DE CONTRATO :
FECHA DE INICIO: 20 DE FEBRERO 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN: 94 DÍAS
FECHA DE TERMINO: 31 DE MAYO 2024

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
Acarreo sobre camión de volteo de 7 m³ de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se concideran (3 km)

CLAVE 005	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA(3 KM)	ALTO	UNIDAD	TOTAL
	EJE 2-3	E-D	ACARREO SUB	80-11	1.07	21.72	0.25	M3/KM	
	EJE 2-6	C-D	ACARREO SUB	21-15	1.00	2.07	0.25		
	EJE 4-6	A-B	ACARREO SUB	10-32	1.00	4.51	0.25		
									96.00
									TOTAL

CONTRATISTA:	C. ANGELICA RUANO AVILA	PROGRAMA	FAISM
MUNICIPIO:	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	PERIODO DE:	5 DE 13
EST. No.	1	HOJA:	5 DE 13
NOTAS :	28/02/2024	A	31/05/2024

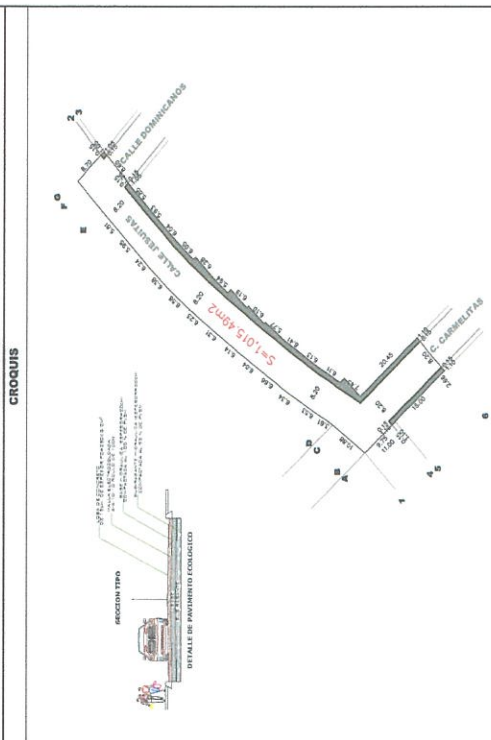

CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA

CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

0130

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/07		MONTO CONTRATADO: \$1,264,695.09	
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS			
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024 PLAZO DE EJECUCION: 94 DIAS FECHA DE TERMINO: 31 DE MAYO 2024		LOGO DE LA EMPRESA	
DESCRIPCION DE CONCEPTO: CLAVE 005			
CONTRATISTA: MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		PROGRAMA LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA EST. No. 1 HOJA: 5 PERIODO DE: 28/02/2024 A 31/05/2024	

Acarreo sobre camión de volteo de 7 m³ de material no utilizabla, kilómetros subsiguientes, se concideran (3 km)



OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 20 24


 C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA


 ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR


 ARC. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

0131

GENERADORES

CONTRATO:	NOCHIS/FONDOI/2024/07	MONTO CONTRATADO:	\$1,264,695.09
-----------	-----------------------	-------------------	----------------

SERVICIOS MELENDREZ
CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA

LOGO DE LA EMPRESA

REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS


FECHA DE CONTRATO :
FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024
PLAZO DE EJECUCION: 94 DIAS
FECHA DE TERMINO: 31 DE MAYO 2024

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniiveladora) conciderando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo al proyecto

LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD	
A-B	1-4	EXCAVACION	1.255	9.85	4.94	0.4	M3	
B-C	1-6	EXCAVACION	8.28	29.54	97.82	0.4		
C-D	1-2	EXCAVACION	1.285	8.59	4.41	0.4		
D-E	1-2	EXCAVACION	79.39	8.21	260.58	0.4		
E-F	1-3	EXCAVACION	8.6	9.79	33.66	0.4		
F-G	1-2	EXCAVACION	1.375	8.70	4.79	0.4		
TOTAL							406.20	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 24

CONTRATISTA:	C. ANGELICA RUANO AVILA	PROGRAMA	
MUNICIPIO:	LOCALIDAD:		
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	NOCHISTLAN DE MEJIA	FAISM	
EST. No.	HOJA:	PERIODO DE	DE: 13
1	28/02/2024	A	31/05/2024

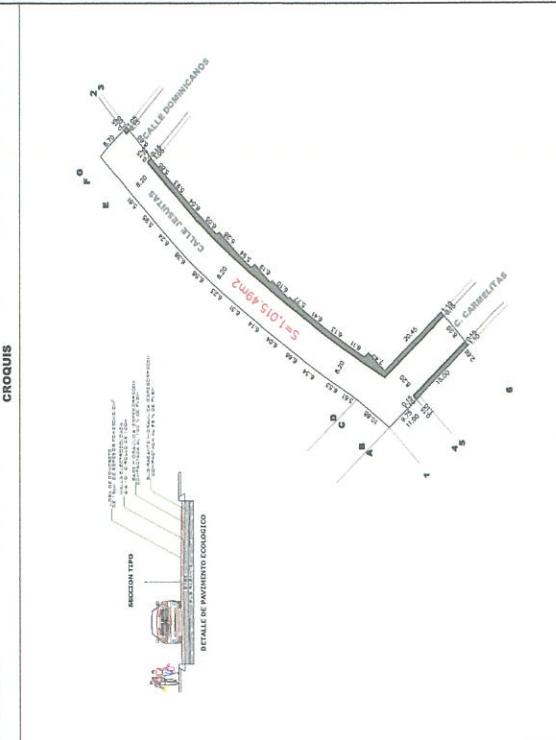

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/07		CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA		PROGRAMA	
HOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA	
MONTO CONTRATADO: \$1,264,695.09		EST. No.: 1		PERIODO DE: A	
FECHA DE CONTRATO :		HOJA: 28/02/2024		DE: 13	
FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024		PERIODO DE: A		31/05/2024	
PLAZO DE EJECUCION: 94 DIAS		NOTAS :			
DESCRIPCION DE CONCEPTO:					
CLAVE 006					



LOGO DE LA EMPRESA

Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniiveladora) conciderando afine de la superficie y dejando pendientes descuerdo al proyecto

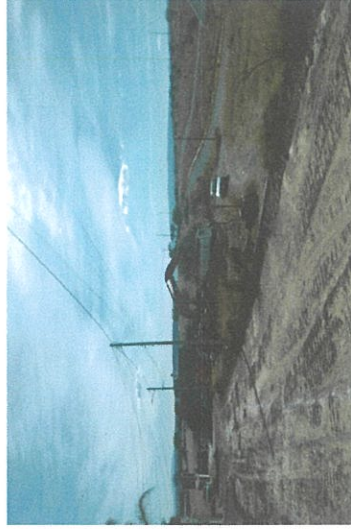

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR


C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

GENERADORES

<p>CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA</p>		<p>PROGRAMA</p>	
<p>MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.</p>		<p>FAISM</p>	
<p>EST. No. 1</p>		<p>PERIODO DE: 28/02/2024 A 31/05/2024</p>	
<p>NOTAS:</p>		<p>CROQUIS</p>	

<p>CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2024/07</p>		<p>MONTO CONTRATADO: \$1,264,695.09</p>	
<p>SERVICIOS MELENDRIZ CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA</p>			
<p>LOGO DE LA EMPRESA</p>			
<p>REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS</p>			
<p>FECHA DE CONTRATO : 31 DE FEBRERO 2024</p>			
<p>FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024</p>			
<p>PLAZO DE EJECUCION: 94 DIAS</p>			
<p>DESCRIPCION DE CONCEPTO:</p>			
<p>CLAVE 007 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.</p>			

LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD
A - B	1 - 4	ACARREOS	1.255	9.85	4.94	0.4	M3
B - C	1 - 6	ACARREOS	8.23	29.54	97.82	0.4	
C - D	1 - 2	ACARREOS	1.285	8.59	4.41	0.4	
D - E	1 - 2	ACARREOS	70.39	8.21	260.58	0.4	
E - F	1 - 3	ACARREOS	8.6	9.79	33.66	0.4	
F - G	1 - 2	ACARREOS	1.375	8.70	4.79	0.4	
TOTAL							406.20

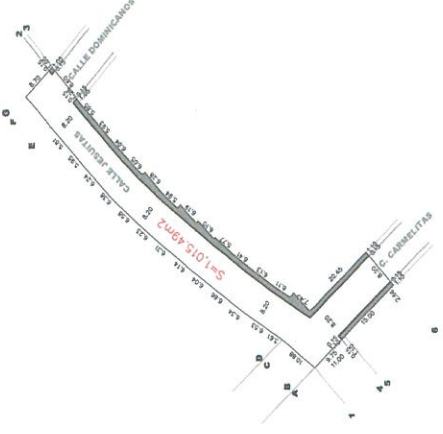

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 24

[Signature]
C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

[Signature]
ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

[Signature]
ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/07		CONTRATISTA: C. ANGÉLICA RUANO AVILA		PROGRAMA	
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA	
FECHA DE CONTRATO : 28 DE FEBRERO 2024		EST. N°. 1		PERIODO DE: 7 A	
PLAZO DE EJECUCION: 94 DIAS		HOJA: 28/02/2024		DE: 13	
FECHA DE TERMINO: 31 DE MAYO 2024		NOTAS :		31/05/2024	



LOGO DE LA EMPRESA

Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con máquina.

CLAVE 007



OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

C. ANGÉLICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

0135

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/07
 MONTO CONTRATADO: \$1,264,695.09

SERVICIOS MELENDREZ
 CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA

LOGO DE LA EMPRESA

CLAVE 008

DESCRIPCION DE CONCEPTO: Acarreo sobre camión de volteo de 7 m³ de material no utilizable, kilómetros subsucesentes, se concideran (3 km)


EJE	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA(3 KM)	ALTO	UNIDAD	TOTAL
A	B	1-4	ACARREO SUB	1.255	9.85	4.94	0.4		
B	C	1-6	ACARREO SUB	8.28	29.54	97.82	0.4		
C	D	1-2	ACARREO SUB	1.285	8.59	4.41	0.4		
D	E	1-2	ACARREO SUB	78.39	8.21	260.58	0.4		
E	F	1-3	ACARREO SUB	6.6	9.79	33.66	0.4		
F	G	1-2	ACARREO SUB	1.375	8.70	4.79	0.4		
TOTAL									1216.00

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

CONTRATISTA: C. ANGÉLICA RUANO AVILA
 LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 PROGRAMA: FAISM

EST. No. 1
 HOJAS: 8
 PERIODO DE: 28/02/2024 A 31/05/2024

NOTAS :

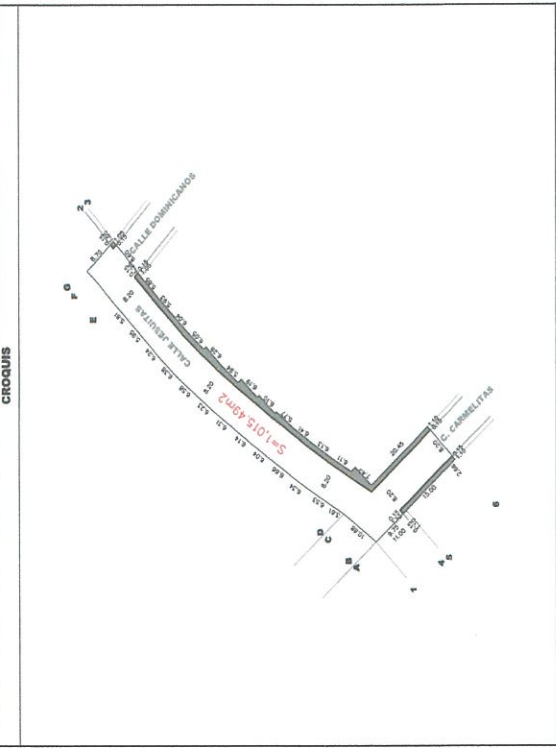

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

C. ANGÉLICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/07		CONTRATISTA: C. ANGELIVA RUANO AVILA		PROGRAMA	
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA	
FECHA DE CONTRATO :		EST. No. 1		HOJA: 8	
FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024		PERIODO DE: A		DE: 13	
PLAZO DE EJECUCION: 94 DIAS		28/02/2024		31/05/2024	
FECHA DE TERMINO: 31 DE MAYO 2024		NOTAS :			


MONTO CONTRATADO:

\$1,264,695.09



LOGO DE LA EMPRESA

Acarreo sobre camión de volteo de 7 m³ de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (3 km)

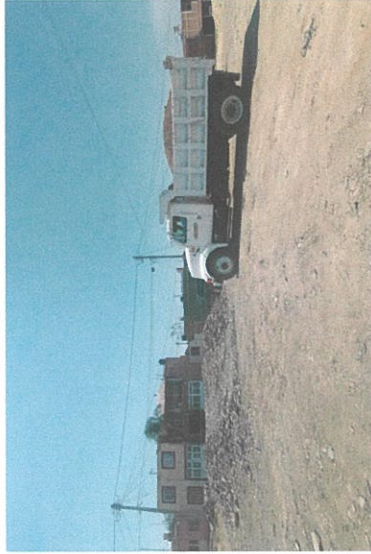

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

0137

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2024/07

MONTO CONTRATADO: \$1,264,695.09

SERVICIOS MELENDREZ
CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA

REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

FECHA DE CONTRATO : 28 DE FEBRERO 2024
PLAZO DE EJECUCION: 04 DIAS
FECHA DE TERMINO: 31 DE MAYO 2024

LOGO DE LA EMPRESA

DESCRIPCION DE CONCEPTO: Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base compactada al 100 %, utilizando material de banco y material petre (50%, material de banco - 50% material petre)

CLAVE 000	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD
	A - B	1 - 4	BASE	1.26	9.85	3.09	0.25	M3
	B - C	1 - 6	BASE	8.28	29.54	61.14	0.25	
	C - D	1 - 2	BASE	1.285	8.59	2.76	0.25	
	D - E	1 - 2	BASE	79.39	8.21	162.86	0.25	
	E - F	1 - 3	BASE	8.6	9.79	21.04	0.25	
	F - G	1 - 2	BASE	1.375	8.70	2.99	0.25	
								TOTAL
								253.87

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA

MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

PROGRAMA: FAISM

EST. No. 1


HOJA: 9 DE 13

PERIODO DE: A

28/02/2024

31/05/2024

NOTAS :

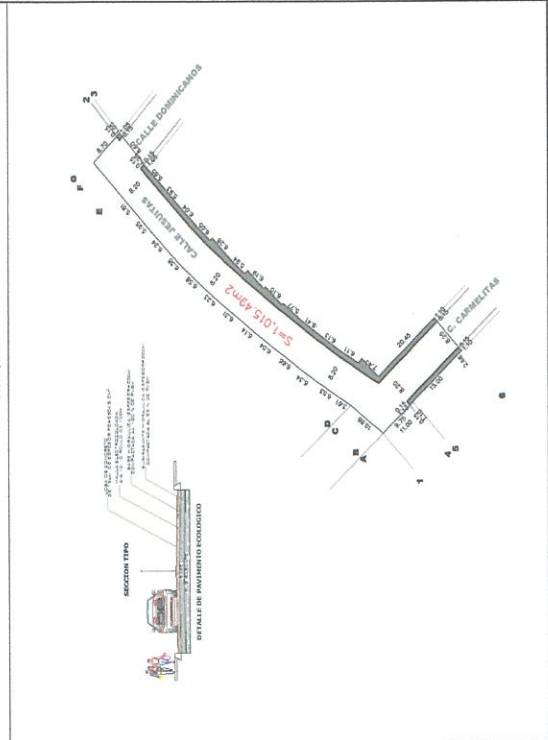

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

MEMORIA FOTOGRAFICA


CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2024/07		CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA		PROGRAMA	
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA	
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024 PLAZO DE EJECUCION: 94 DIAS		EST. No.: 1		PERIODO DE: HOJA: 9 DE 13 28/02/2024 A 31/05/2024	
DESCRIPCION DE CONCEPTO: CLAVE 000		NOTAS :			

SERVICIOS MELENDREZ
 CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA

MONTO CONTRATADO: \$1,264,695.09

LOGO DE LA EMPRESA

Mercado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (50% material de banco - 50% material petreo)

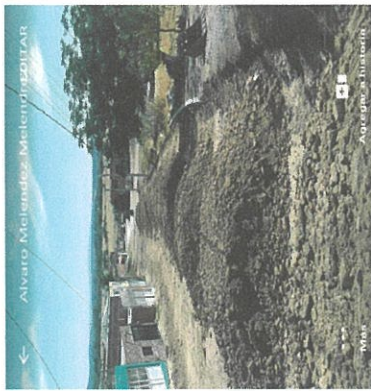

OPERADO
 FAISM (FII)
 EJERCICIO 2024


 ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


 ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR


 C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

0139

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2024/07		CONTRATISTA: C. ANGELIVA RUANO AVILA		PROGRAMA	
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA	
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024 PLAZO DE EJECUCION: 94 DIAS FECHA DE TERMINO: 31 DE MAYO 2024		EST. No. 1		HOJA: 28/02/2024	
DESCRIPCION DE CONCEPTO: Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base para banquetas compactada con ballarina al 100% utilizando material de banco (tepalcates)		PERIODO DE: A		DE: 13	
CLAVE 010		NOTAS :		FAISM	



LOGO DE LA EMPRESA



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR


C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA


MEMORIA FOTOGRAFICA


CONTRATO:		CONTRATISTA:	
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS		C. ANGELICA RUANO AVILA	
CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/07		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA	
MONTTO CONTRATADO: \$1,264,695.09		LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA	
		PROGRAMA FAISM	
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024 PLAZO DE EJECUCION: 94 DIAS FECHA DE TERMINO: 31 DE MAYO 2024		EST. No. : 1 HOJA: 11 DE: 13 PERIODO DE: 28/02/2024 A 31/05/2024	
NOTAS :			

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 CLAVE 011
 Guarnición de Concreto Fc=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm. , sección Trapesoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 4 usos, incluye: Pintura para tráfico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.

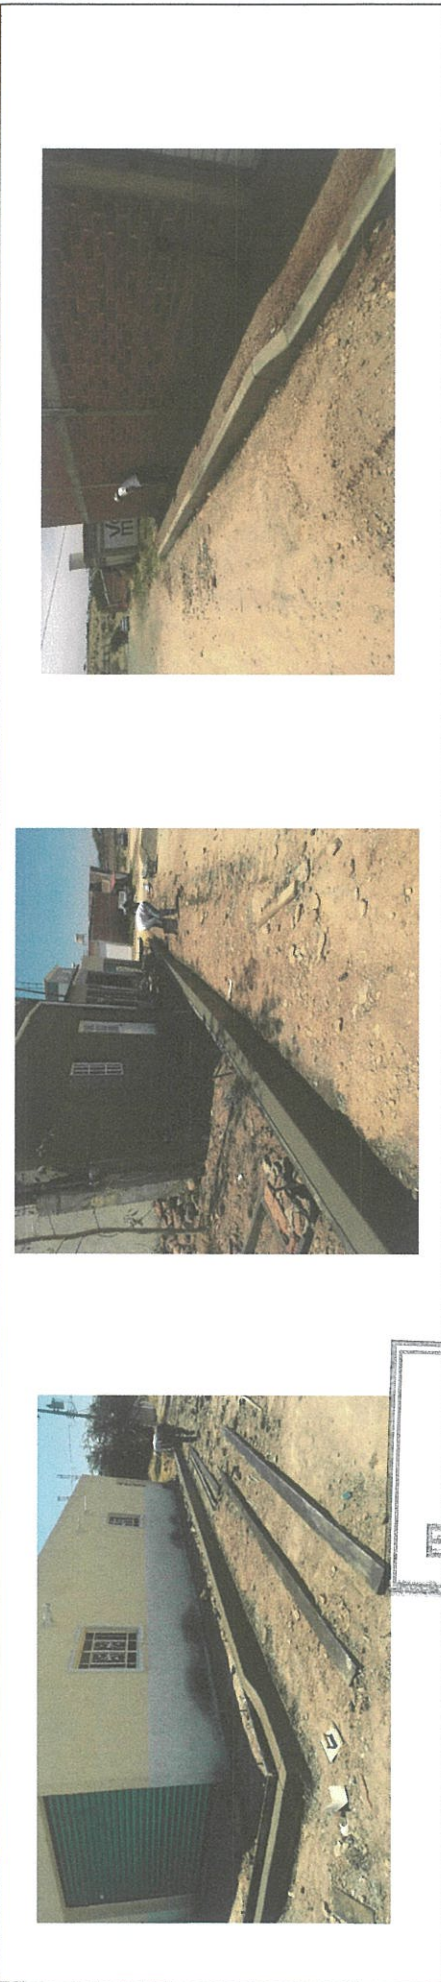


ING. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR


C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

0143

GENERADORES

CONTRATO:	NOCHIS/FONDOI/2024/07	MONTO CONTRATADO:	\$1,264,695.09
-----------	-----------------------	-------------------	----------------

SERVICIOS MELENDREZ
CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA

REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

LOGO DE LA EMPRESA


FECHA DE CONTRATO :
 FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024
 PLAZO DE EJECUCION: 94 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 31 DE MAYO 2024

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

Clave 012: Banqueta de Concreto Fc=Fc+150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm. de 0.05 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, incluye: cimbras con sus, mano de obra, herramienta menor.

LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD
EJE 2-3	E-D	BANQUETA	81.17	1.40	113.46		M2
EJE 2-6	C-D	BANQUETA	21.55	1.15	24.78		
EJE 4-6	A-B	BANQUETA	18.92	1.15	21.76		
TOTAL							160.00

CONTRATISTA:	C. ANGELICA RUANO AVILA	PROGRAMA
MUNICIPIO:	NOCHISTLAN DE MEJIA	FAISM
EST. No.	1	HOJA:
PERIODO DE:	A	DE:
NOTAS :	28/02/2024	31/05/2024

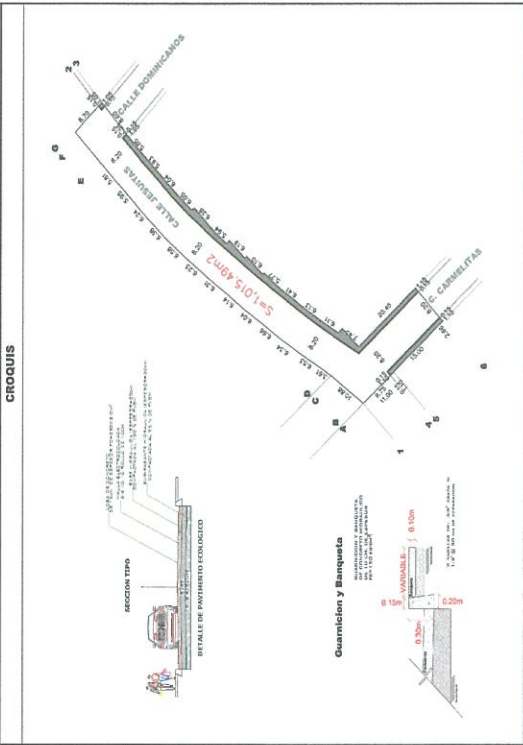

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 24


ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		MUNICIPIO:		PROGRAMA	
NOCHIS/FONDOI/2024/07		C. ANGELICA RUANO AVILA		FAISM	
MONTOS CONTRATADO:		LOCALIDAD:		NOCHISTLAN DE MEJIA	
\$1,264,695.09		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		EST. No. 1	
		HOJAS:		PERIODO DEL	
REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS		28/02/2024		A	
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024 PLAZO DE EJECUCION: 94 DIAS FECHA DE TERMINO: 31 DE MAYO 2024		NOTAS :		31/05/2024	
LOGO DE LA EMPRESA		Banqueta de Concreto Fc=Fc=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal reconstituido 8 a 10 cm, de 0.08 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 65-1010 rollo de 100 mts, Incluir chubra común, mano de obra, herramienta menor.			

LOGO DE LA EMPRESA

Banqueta de Concreto Fc=Fc=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal reconstituido 8 a 10 cm, de 0.08 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 65-1010 rollo de 100 mts, Incluir chubra común, mano de obra, herramienta menor.

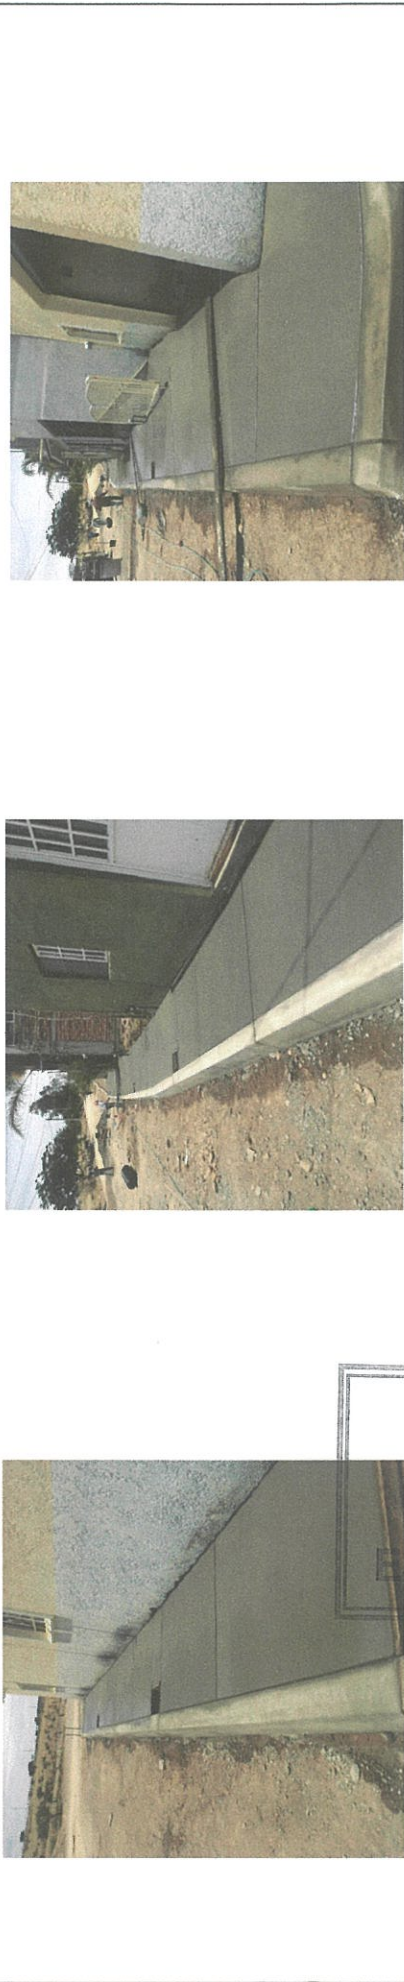

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 20 24


 ARO. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


 ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR


 C. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

GENERADORES

CONTRATO:	NOCHISFONDOIII/2024/07	MONTO CONTRATADO:	\$1,264,695.09
-----------	------------------------	-------------------	----------------

SERVICIOS MELENDREZ
CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA

REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

LOGO DE LA EMPRESA


FECHA DE CONTRATO :
 FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024
 PLAZO DE EJECUCION: 94 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 31 DE MAYO 2024

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

013 Pavimento de concreto f'c = 250 kg/cm2 agregado de 19 mm cemento normal revestimiento 8 a 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada de 6-6/10-10 rollo de 10 mts, incluye cimbra metalica, mano de obra y herramientas menores

LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD
A-B	1-4	PAVIMENTO	1.25	9.85	12.34		M2
B-C	1-6	PAVIMENTO	8.28	28.54	244.55		
C-D	1-2	PAVIMENTO	1.285	8.59	11.03		
D-E	1-2	PAVIMENTO	79.39	8.21	651.46		
E-F	1-3	PAVIMENTO	8.6	9.79	84.15		
F-G	1-2	PAVIMENTO	1.375	8.70	11.96		
TOTAL							1015.49

CONTRATISTA:	C. ANGELICA RUANO AVILA	PROGRAMA	
MUNICIPIO:	LOCALIDAD:		
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	NOCHISTLAN DE MEJIA	FAISM	
EST. No.	HOJA:	PERIODO DE:	DE 13
1	28/02/2024	A	31/05/2024
NOTAS :			
CROQUIS			

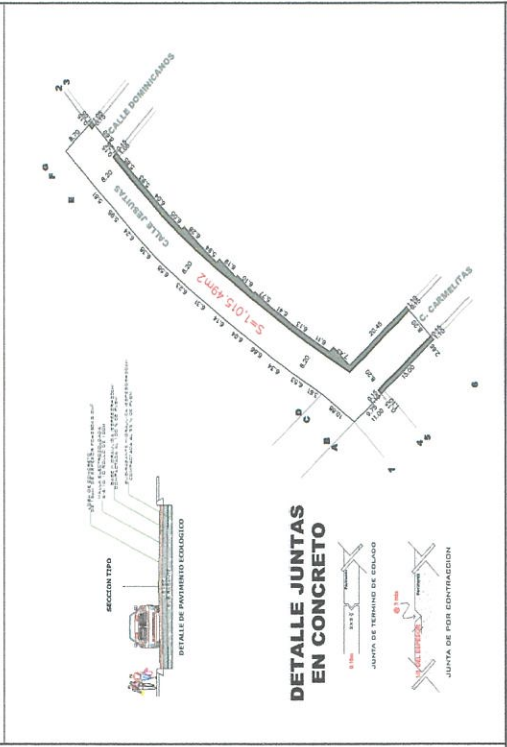

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 24

ARC. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

MEMORIA FOTOGRAFICA



CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/07		CONTRATISTA: C. ANGELICA RUANO AVILA		PROGRAMA	
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		FAISM	
MONTO CONTRATADO: \$1,264,695.09		LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		PERIODO DE: A	
FECHA DE CONTRATO : 28 DE FEBRERO 2024		EST. No. 1		HOJA: 13	
PLAZO DE EJECUCION: 94 DIAS		FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024		PERIODO DE: A	
FECHA DE TERMINO: 31 DE MAYO 2024		FECHA DE INICIO: 28/02/2024		DE: 13	
DESCRIPCION DE CONCEPTO: Pavimento de concreto f' c = 250 kg/cm2 agregado de 19 mm cemento normal revestimiento 8 a 10 cm de 15 cm de espesor, armado con malla electrosoldada de 6-#10-10 rollo de 10 mts, incluye cimbra metalica, mano de obra y herramientas menores		NOTAS :		31/05/2024	



LOGO DE LA EMPRESA

Pavimento de concreto f' c = 250 kg/cm2 agregado de 19 mm cemento normal revestimiento 8 a 10 cm de 15 cm de espesor, armado con malla electrosoldada de 6-#10-10 rollo de 10 mts, incluye cimbra metalica, mano de obra y herramientas menores

CLAVE
013

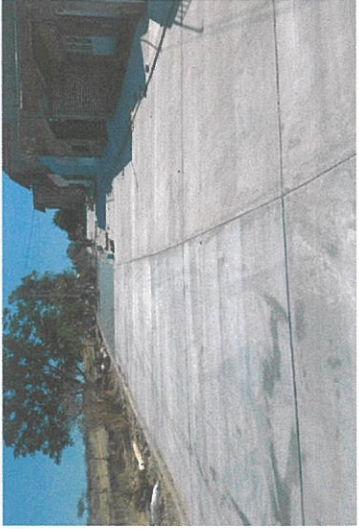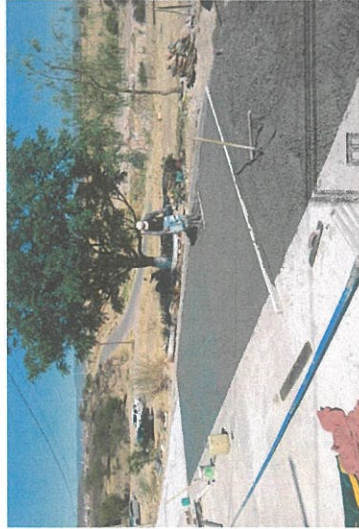

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 24

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

NOMBRE DE LA OBRA:		PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS	
NO. DE CONTRATO:		NOCHIS/FONDOI/2024/07	
UBICACION:		NOCHISTLAN DE MEJIA	
PERIODO:		28 DE FEB. A 31 DE MAY	
IMPORTE DE CONTRATO:		\$1,264,695.09	

UNIDAD	CONTRATO			ESTIMADO			POR ESTIMAR			
	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
M2	1175.49	\$12.67	\$14,893.46	1175.49	\$12.67	\$14,893.46	0.00	\$12.670	\$0.00	
M2	126.09	\$81.12	\$10,228.42	126.09	\$81.12	\$10,228.42	0.00	\$81.12	\$0.00	
ML	25.50	\$167.36	\$4,267.67	25.50	\$167.36	\$4,267.67	0.00	\$167.36	\$0.00	
M3	32.00	\$158.52	\$5,072.64	32.00	\$158.52	\$5,072.64	0.00	\$158.52	\$0.00	
M3/km	96.00	\$19.75	\$1,896.00	96.00	\$19.75	\$1,896.00	0.00	\$19.75	\$0.00	
M3	406.20	\$47.17	\$19,160.45	406.20	\$47.17	\$19,160.45	0.00	\$47.17	\$0.00	
M3	406.20	\$158.52	\$64,390.82	406.20	\$158.52	\$64,390.82	0.00	\$158.52	\$0.00	
M3/km	1218.60	\$19.75	\$24,067.35	1218.60	\$19.75	\$24,067.35	0.00	\$19.75	\$0.00	
M3	253.87	\$481.22	\$122,167.32	253.87	\$481.22	\$122,167.32	0.00	\$481.22	\$0.00	
M3	32.00	\$516.23	\$16,519.36	32.00	\$516.23	\$16,519.36	0.00	\$516.23	\$0.00	
M	127.00	\$430.83	\$54,715.41	127.00	\$430.83	\$54,715.41	0.00	\$430.83	\$0.00	
M2	160.00	\$422.96	\$67,673.60	160.00	\$422.96	\$67,673.60	0.00	\$422.96	\$0.00	
M2	1015.49	\$674.75	\$685,201.88	1015.49	\$674.75	\$685,201.88	0.00	\$674.75	\$0.00	
IMPORTE			\$1,090,254.39	IMPORTE			\$1,090,254.39	IMPORTE		
IVA			\$174,440.70	IVA			\$174,440.70	IVA		
TOTAL			\$1,264,695.09	TOTAL			\$1,264,695.09	TOTAL		

CLAVE DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
001	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2, incluye: topógrafo y cadenero, operador
002	Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspedeos
003	Corte de carpeta asfáltica de un espesor promedio de 5 cm con maquina de disco especial para este tipo de trabajos, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
004	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria. Carga con maquina.
005	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilometros subsuquentes, se consideran (3 km)
006	Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (monovieladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes deacuerdo al proyecto
007	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria. Carga con maquina.
008	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilometros subsuquentes, se consideran (3 km)
009	Mezclazo tendido y compactacion de la construccion de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (50% material de banco - 50% material petro)
010	Mezclazo tendido y compactacion de la construccion de base para banquetas compactada con ballarina al 100% utilizando material de banco (tepalcate)
011	Guarnición de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal Leveamiento 8 a 10 cm, sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbrado común a 4 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
012	Banqueta de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal Leveamiento 8 a 10 cm, sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbrado común a 4 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
013	Pavimento de concreto f'c = 250 kg/cm2 agregado de 19 mm cemento normal Leveamiento 8 a 10 cm de 15 cm de espesor, armado con malla electrosoldada de 6-6/10-10 rollo de 10 mts, incluye cimbra metálica, mano de obra y herramientas menores

PROF. RAFAEL AGUIRRE SALDIVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSE FRANCISCO CALERO DELGADILLO
SUPERVISOR

C. ANGELICA RUANO AVILA
CONTRATISTA

0148

EJERCICIO 2024

FAISM (FIII)

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE :	1
FECHA REPORTE :	15/03/2024

% AVANCES FÍSICO	REAL	PROGRAMADO
	15	30
% AVANCES FINANCIERO	REAL	PROGRAMADO
	0	0

DATOS DE LA OBRA	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DÍAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO												
	M E S E S																									
PARTIDAS												ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS						
REPERTE DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS																									\$14,893.46	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2. Incluye: Topografía y cadenero, operador
UBICACIÓN : NOCHISTLAN DE MEJIA																							\$10,228.42	Demolición de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecánicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaños	2	2.74
TIPO DE OBRA : NUEVA																							\$4,267.68	Corte de carpeta asfáltica de un espesor promedio de 5 cm con máquina de disco especial para este tipo de trabajos. Incluye: Manos de obra, herramienta y todo lo necesario	2	2.74
MODALIDAD EJEC.: CONTRATO																							\$5,072.64	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con máquina.	2	2.74
No. CONTRATO : NOCHISFOND011/2024/07																							\$1,896.00	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se considerará (3 km)	2	2.74
EMPRESA : C. ANGELICA RUANO AVILA																							\$19,160.45	Excavación en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecánicos (motoneledora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo al proyecto	2	2.74
MONTA CONTRATO : \$1,264,895.09																							\$64,390.82	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con máquina.	5	6.85
FECHA CONTRATO : 28 DE MARZO DE 2024																							\$24,067.35	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se considerará (3 km)	5	6.85
MONTA ANTICIPO : \$0.00																										
FECHA PAGO ANTICIPO : N/A																										
No. AMPL. DE CONTRATO : N/A																										
MONTA AMPL. CONTRATO : N/A																										
FECHA AMPL. CONTRATO : N/A																										
PERIODO DE EJECUCIÓN																										
INICIO																										
TERM.																										
FECHAS PROGRAMADAS:																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ES DECIR, AQUEL QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA DEL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										
FECHAS REALES:																										
FECHAS REPROGRAMADAS:																										
OBSERVACIONES																										

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE: 1
FECHA REPORTE: 15/03/2024

% AVANCES FISICO	REAL	PROGRAMADO
15	0	30
FINANCIERO	0	0

DATOS DE LA OBRA
 REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA,
 UBICACION: NOCHISTLAN DE MEJIA
 TIPO DE OBRA: NUEVA
 MODALIDAD EJEC.: CONTRATO
 No. CONTRATO: NOCHISIFONDIR/2024/07
 EMPRESA: C. ANGELICA RUANO AVILA

PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO									
Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petreo (50% material de banco - 50% material petreo)	\$122,167.32															10	13.70
Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base para banquetas compactadas con ballarina al 100% utilizando material de banco (tepetate)	\$16,519.36															7	9.59
Guarnición de Concreto f'c=150 Kg/cm ² agregado de 20 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm., sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 4 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	\$54,715.41															7	9.59
Banqueta de Concreto f'c=150 Kg/cm ² agregado de 20 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm. de 0.08 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	\$87,673.60															7	9.59
Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm ² agregado de 19 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	\$95,201.88															20	27.40
SUBTOTAL	\$1,090,254.39																
IVA	\$174,440.70																
TOTAL	\$1,264,695.09																

MONTO CONTRATO: \$1,264,695.09
 FECHA CONTRATO: 28 DE FEBRERO DE 2024
 MONTO ANTICIPO: \$0.00
 FECHA PAISO ANTICIPO: N/A
 No. AMPL. DE CONTRATO: N/A
 MONTO ANPL. CONTRATO: N/A
 FECHA AMPL. CONTRATO: N/A
 PERIODO DE EJECUCION INICIO TERM.
 28-feb-24 31-may-24
 FECHAS PROGRAMADAS:
 FECHAS REALES: 8-mar-24
 OBSERVACIONES:

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ES DECIR A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A UN PORCENTAJE QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.

RECIBIDO
FIRMADO (FIRM)
 EJERCICIO 2024

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

RESIDENTE DE SUPERVISION:
 ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO

0150



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



0151


REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN DE MEJIA
28 DE FEBRERO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024
15 DE MARZO DE 2024
15.00%

OPERATIVO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2024

INFORME FOTOGRÁFICO

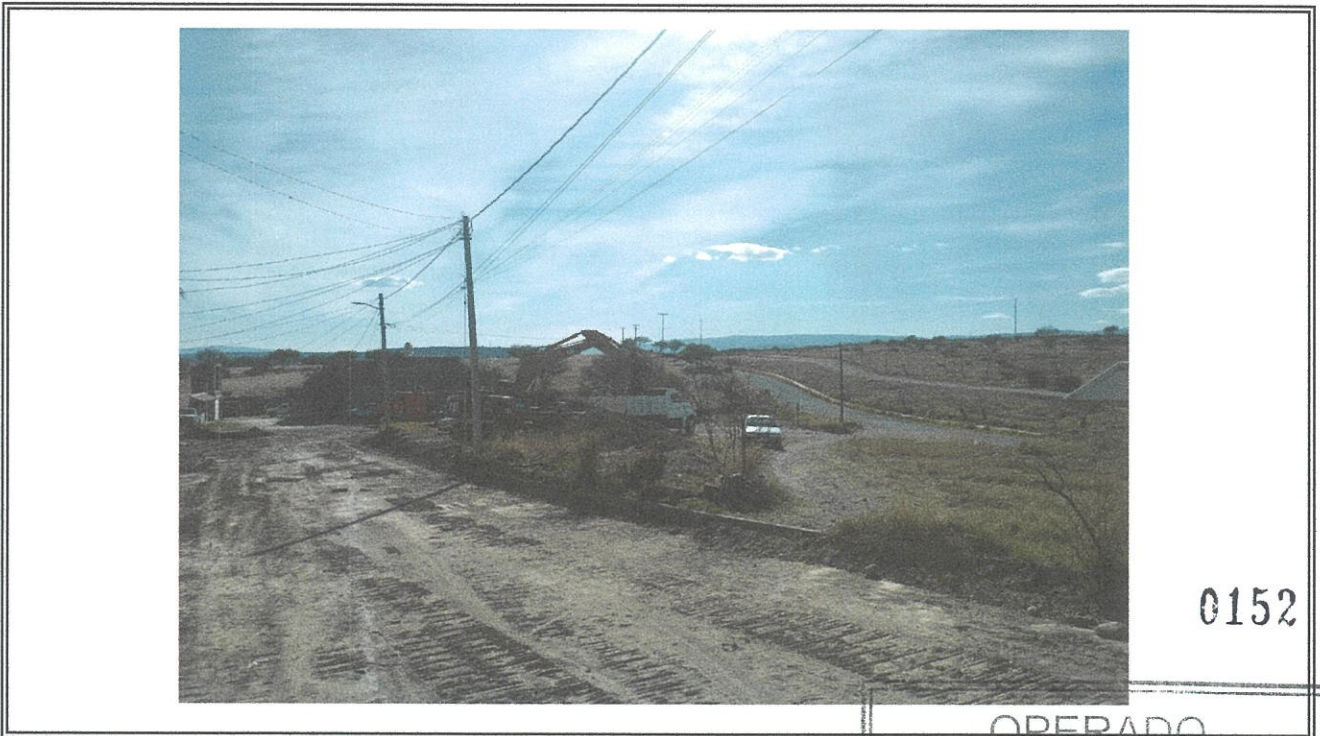

0152

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA

REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

NOCHISTLAN DE MEJIA
28 DE FEBRERO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024
15 DE MARZO DE 2024

OPERADO
EJERCICIO 2024

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE: 2
 FECHA REPORTE: 22/03/2024

% AVANCES FISICO	REAL	PROGRAMADO
	35	40
FINANCIERO	0	0

DATOS DE LA OBRA	PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO		
			M E S E S															
REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	TRazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2, incluye: Topografía y cadenero, operador	\$14,893.46	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO						2	2.74		
UBICACION: NOCHISTLAN DE MEJIA	Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y fraspaleos	\$10,228.42																
TIPO DE OBRA: NUEVA	Corte de carpeta asfáltica de un espesor promedio de 5 cm con maquina de disco especial para este tipo de trabajos. Incluye: manos de obra, herramienta y todo lo necesario	\$4,287.68																
MODALIDAD EJEC: CONTRATO	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	\$5,072.64																
No. CONTRATO: NOCHIS/FONDI/2024/07	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se consideraran (3 km)	\$1,896.00																
EMPRESA: C. ANGELICA RUANO AVILA	Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo al proyecto	\$19,160.45																
MONTO CONTRATO: \$1,264,695.09	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	\$64,390.82																
FECHA CONTRATO: 28 DE MARZO DE 2024	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se consideraran (3 km)	\$24,067.35																
MONTO ANTICIPO: \$0.00																		
FECHA PAGO ANTICIPO: N/A																		
No. AMPL. DE CONTRATO: N/A																		
MONTO AMPL. CONTRATO: N/A																		
FECHA AMPL. CONTRATO: N/A																		
PERIODO DE EJECUCION	INICIO	TERM.																
FECHAS PROGRAMADAS:	28-feb-24	31-may-24																
FECHAS REALES:	8-mar-23																	
FECHAS REPROGRAMADAS:																		
OBSERVACIONES:	EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, PERO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR POR LO QUE NO CONGIDE LA SUMA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.																	
			PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA															
			M E S E S															
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO						73	TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION		

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

RESIDENTE DE SUPERVISION:
 ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO

0153

EJERCICIO 2024

OCTUBRO

2024



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



0155


REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN DE MEJIA
28 DE FEBRERO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024
22 DE MARZO DE 2024
35.00%

ASPECTIVO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2024

INFORME FOTOGRÁFICO

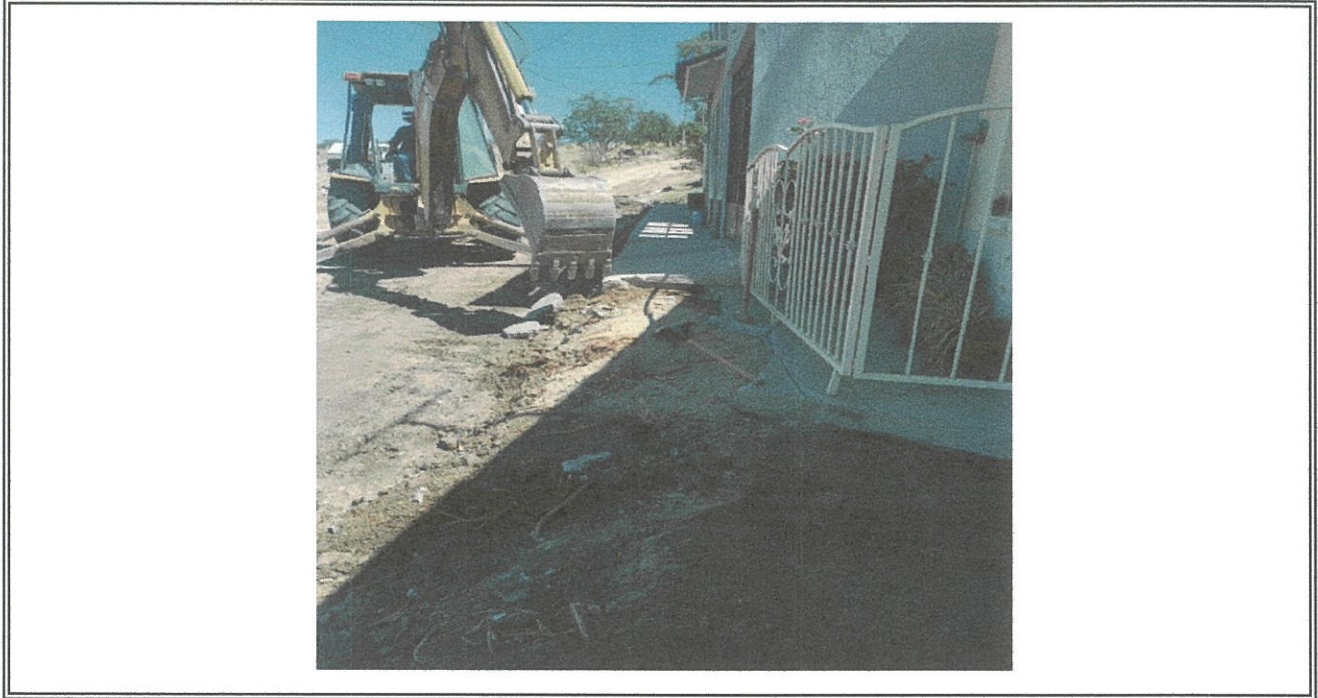

REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA

NOCHISTLAN DE MEJIA
28 DE FEBRERO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024
22 DE MARZO DE 2024

OPERADO
EJERCICIO 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE: 3
FECHA REPORTE: 29/03/2024

% AVANCES FISICO	REAL	PROGRAMADO
FINANCIERO	45	50
	0	0

DATOS DE LA OBRA		PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA													DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO	
REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA,		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	M E S E S								
UBICACION:	NOCHISTLAN DE MEJIA	PROGRAMA															
TIPO DE OBRA:	NUEVA	REAL															
MODALIDAD E.JEC.:	CONTRATO	PROGRAMADO															
No. CONTRATO:	NOCHISFONDOMI0202407	REAL															
EMPRESA:	C. ANGELICA RUANO AVILA	PROGRAMADO															
MONTO CONTRATO:	\$1,264,695.09	PROGRAMADO															
FECHA CONTRATO:	28 DE FEBRERO DE 2024	PROGRAMADO															
MONTO ANTICIPO:	\$0.00	PROGRAMADO															
FECHA PAGO ANTICIPO:	N/A	PROGRAMADO															
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A	PROGRAMADO															
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A	PROGRAMADO															
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A	PROGRAMADO															
PERIODO DE EJECUCION	INICIO	TERM.	PROGRAMADO														
FECHAS PROGRAMADAS:	28-feb-24	31-may-24	PROGRAMADO														
FECHAS REALES:	8-mar-24		PROGRAMADO														
FECHAS REPROGRAMADAS:			PROGRAMADO														
OBSERVACIONES:			PROGRAMADO														
EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ESO DEBIDA QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.		PROGRAMADO															
SUBTOTAL		PROGRAMADO															
IVA		PROGRAMADO															
TOTAL		PROGRAMADO															
TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION		PROGRAMADO													73		

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

RESIDENTE DE SUPERVISION:
ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO

EJERCICIO 2024

ERADO


ERADO (FIII)

0158



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


INFORME FOTOGRÁFICO

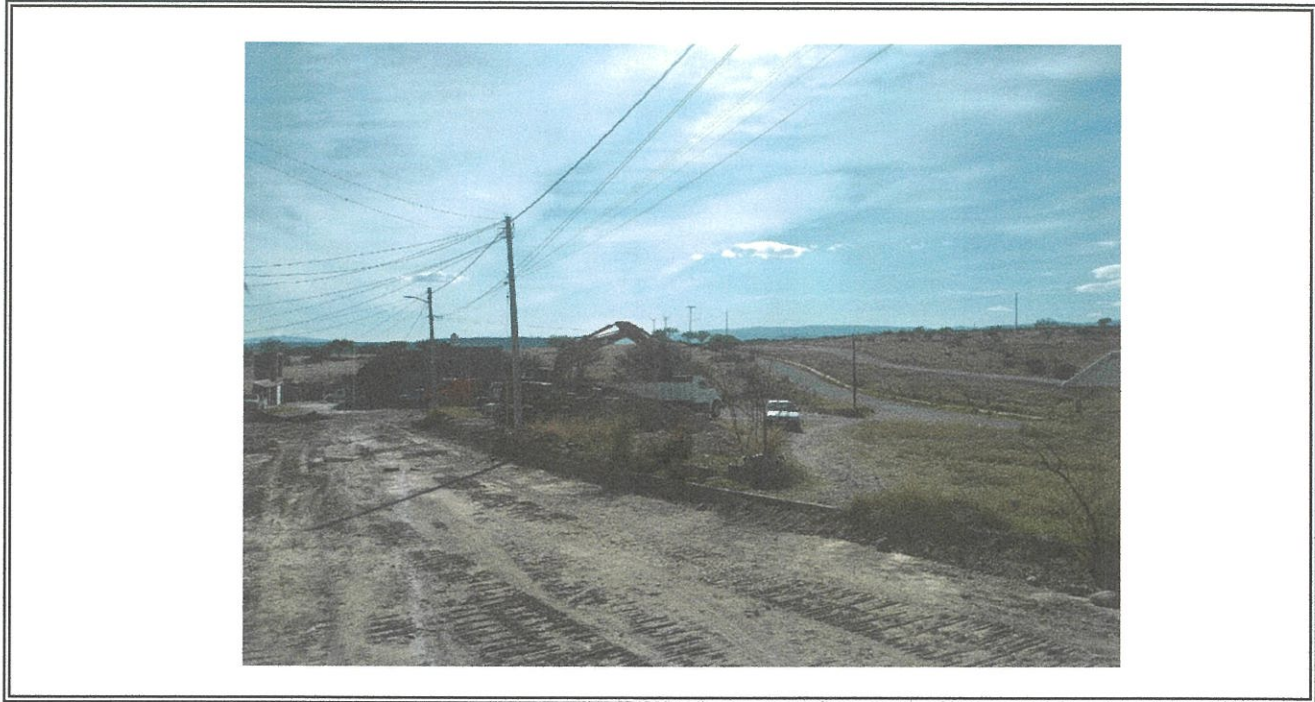

REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL
REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA,
ZACATECAS. EJERCICIO 2024
NOCHISTLAN DE MEJIA

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

28 DE FEBRERO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024
29 DE MARZO DE 2024
45.00%



INFORME FOTOGRÁFICO



0160

OPERADO
FAISM (FIM)
EJERCICIO 2024

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL
LOCALIDAD: REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA,
PERIODO DE EJECUCIÓN: ZACATECAS NOCHISTLAN DE MEJIA
FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024
29 DE MARZO DE 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE: 4
 FECHA REPORTE: 19/04/2024

% AVANCES		REAL		PROGRAMADO	
FISICO	55	55	75	75	0
FINANCIERO	30	30	0	0	0

DATOS DE LA OBRA	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO		
	PARTIDAS	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	MESES						
REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS. UBICACION: NOCHISTLAN DE MEJIA TIPO DE OBRA: NUEVA MODALIDAD EJEC.: CONTRATO No. CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/07 EMPRESA: C. ANGELICA RUANO AVILA MONTO CONTRATO: \$1,264,695.09 FECHA CONTRATO: 28 DE MARZO DE 2024 MONTO ANTICIPO: \$0.00 FECHA PAGO ANTICIPO: N/A No. AMPL. DE CONTRATO: N/A MONTO AMPL. CONTRATO: N/A FECHA AMPL. CONTRATO: N/A	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2. Incluye: Topografía y cadenero, operador Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaños Corte de carpeta asfáltica de un espesor promedio de 5 cm con maquina de disco especial para este tipo de trabajos. Incluye: manos de obra, herramienta y todo lo necesario Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina. Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se consideraran (3 Km) Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) conciderando afine de la superficie y dejando pendientes deacuerdo al proyecto Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina. Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se consideraran (3 Km)	\$14,893.46 \$10,228.42 \$4,267.68 \$5,072.64 \$1,896.00 \$19,160.45 \$64,398.82 \$24,067.35													2 2 2 2 2 2 5 5 73	2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 6.85 6.85 TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 28-feb-24, TERM. 31-may-24
 FECHAS PROGRAMADAS: 28-feb-24 a 31-may-24
 FECHAS REALES: 28-mar-23
 FECHAS REPROGRAMADAS: OBSERVACIONES

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ES DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO LA PAR FOR LO QUE NO COINCIDE LA QUINA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.

REPORTE
FA (FIII)
AGOSTO 2024

ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ARC. JUAN CARLOS ÁVELAR RAMIREZ

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
 ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO

0161

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE: 4
FECHA REPORTE: 19/06/2024

% AVANCES FÍSICO	REAL	PROGRAMADO
55	30	75
FINANCIERO	30	0

DATOS DE LA OBRA
REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA.

UBICACIÓN: NOCHISTLAN DE MEJIA
TIPO DE OBRA: NUEVA
MODALIDAD EJEC.: CONTRATO
No. CONTRATO: NOCHISFOND03II202407
EMPRESA: C. ANGELICA RUJANO AVILA

MONTO CONTRATO: \$1,264,695.09
FECHA CONTRATO: 28 DE FEBRERO DE 2024
MONTO ANTICIPO: \$0.00
FECHA PAGO ANTICIPO: N/A
No. AMPL. DE CONTRATO: N/A
MONTO AMPL. CONTRATO: N/A
FECHA AMPL. CONTRATO: N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 29-feb-24, TÉRMINO: 31-may-24
FECHAS REALES: 8-mar-24
FECHAS REPROGRAMADAS: OBSERVACIONES

RESERVA DE OBRA
EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA DEL TOTAL DE BMS QUE TIENE EL CONTRATO, REPROGRAMANDO A LA PAR POR LO QUE NO CONSIDERAR EN LA SUMA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE DE BASE TIEMPO.

RESERVA DE OBRA (FIII)

0162

PARTIDAS	IMPORTES	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DÍAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO								
Mixclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (50% material de banco -50% material petro)	\$122,167.32														10	13.70
Mixclado tendido y compactación de la construcción de base para banquetas compactada con ballarina al 100% utilizando material de banco (tepedato)	\$16,519.36														7	9.59
Guarnición de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm., sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 4 usos., incluye: Pintura para tráfico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts., materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	\$54,715.41														7	9.59
Banqueta de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm. de 0.08 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-10/10 rollo de 100 mts., incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	\$67,673.60														7	9.59
Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 66/10/10 rollo de 100 mts., incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	\$685,201.88														20	27.40
SUBTOTAL	\$1,090,254.39															
IVA	\$174,440.70															
TOTAL	\$1,264,695.09															

ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ



RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ING. JOSE FRANCISCO CALERO DELGADILLO






MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

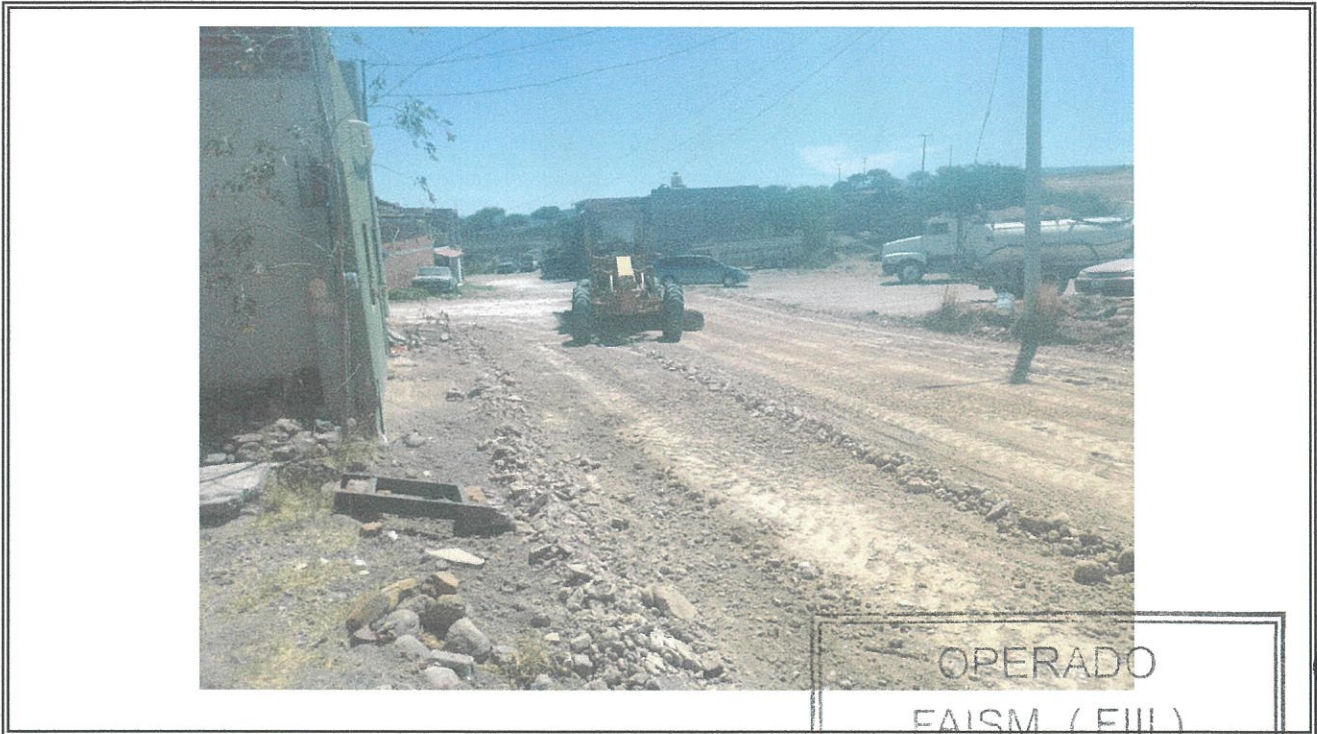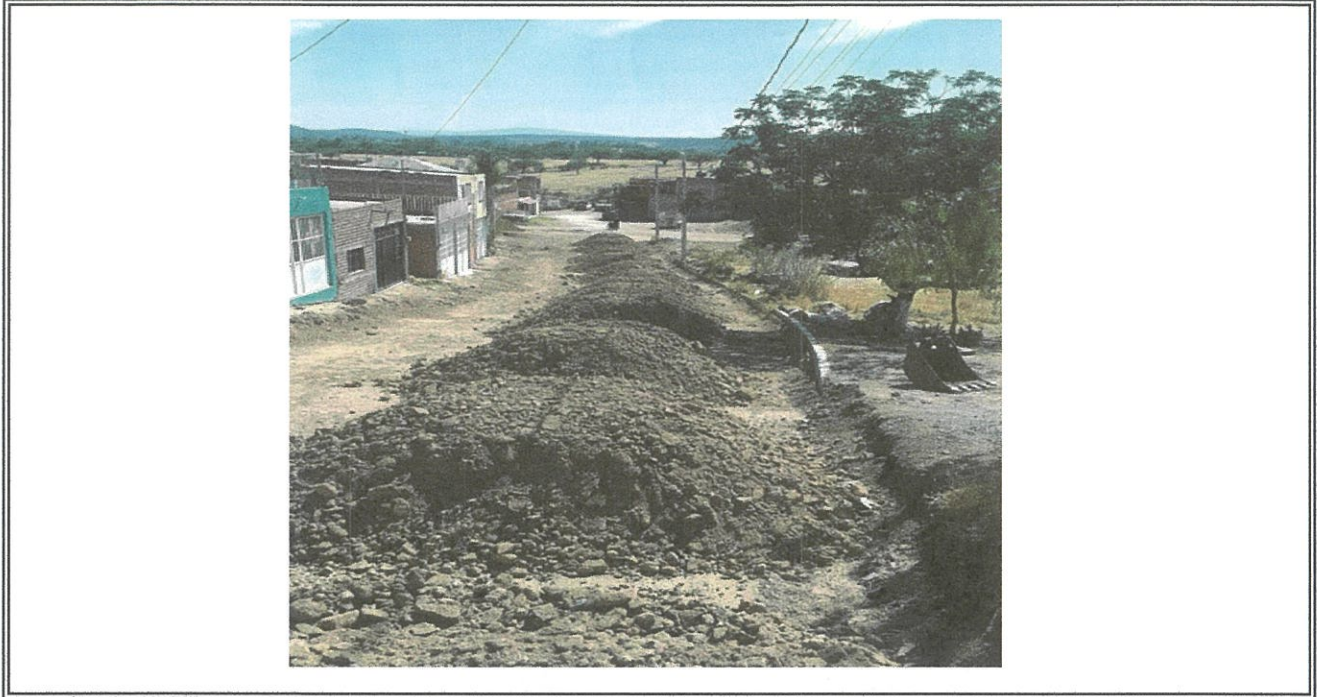

REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN DE MEJIA
28 DE FEBRERO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024
19 DE ABRIL DE 2024
55.00%

INFORME FOTOGRÁFICO



REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL
REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA,
ZACATECAS.

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA

NOCHISTLAN DE MEJIA
28 DE FEBRERO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024
19 DE ABRIL DE 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE: 5
FECHA REPORTE: 26/04/2024

% AVANCES		PROGRAMADO	
FISICO	FINANCIERO	REAL	PROGRAMADO
65	30	65	100
			0

DATOS DE LA OBRA	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO										
	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	UBICACION:	TIPO DE OBRA:	MODALIDAD EJEC:	No. CONTRATO:	EMPRESA:	MONTO CONTRATO:	FECHA CONTRATO:	MONTO ANTICIPO:	FECHA PAGO ANTICIPO:	No. AMPL. DE CONTRATO:	MONTO AMPL. CONTRATO:			FECHA AMPL. CONTRATO:	MESES								
PERIODO DE EJECUCION	INICIO	TERM.	FECHAS PROGRAMADAS:	FECHAS REALES:	FECHAS REPROGRAMADAS:	OBSERVACIONES	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO										
	28-feb-24	31-may-24					\$14,893.46									2	2.74							
	8-mar-23						\$10,228.42									2	2.74							
							\$4,267.68									2	2.74							
							\$5,072.64									2	2.74							
							\$1,896.00									2	2.74							
							\$19,160.45									2	2.74							
							\$64,390.82									5	6.85							
							\$24,067.35									5	6.85							
																73	TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION							

REPORTE DE OBRA

(FIII)

EJECUCION 2024

0165



ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ARO. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

RESIDENTE DE SUPERVISION:
ING. JOSE FRANCISCO CALERO DELGADILLO



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

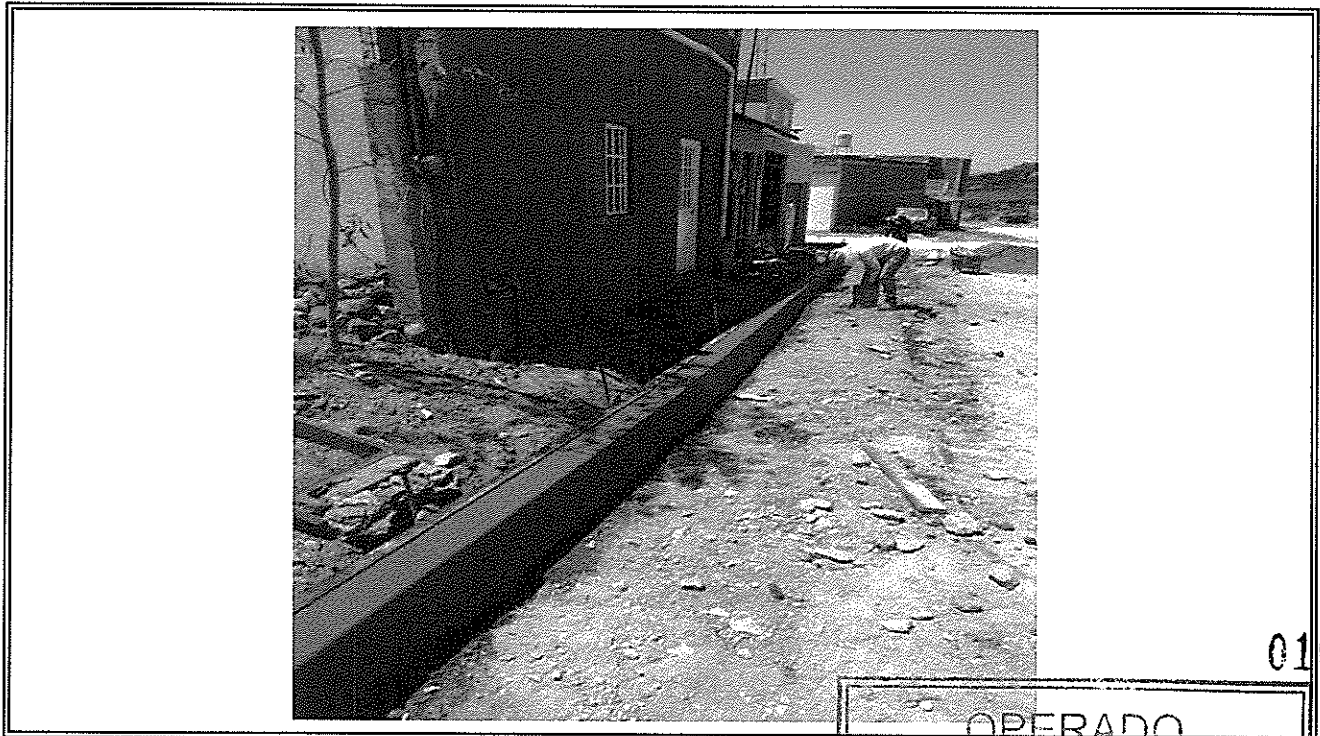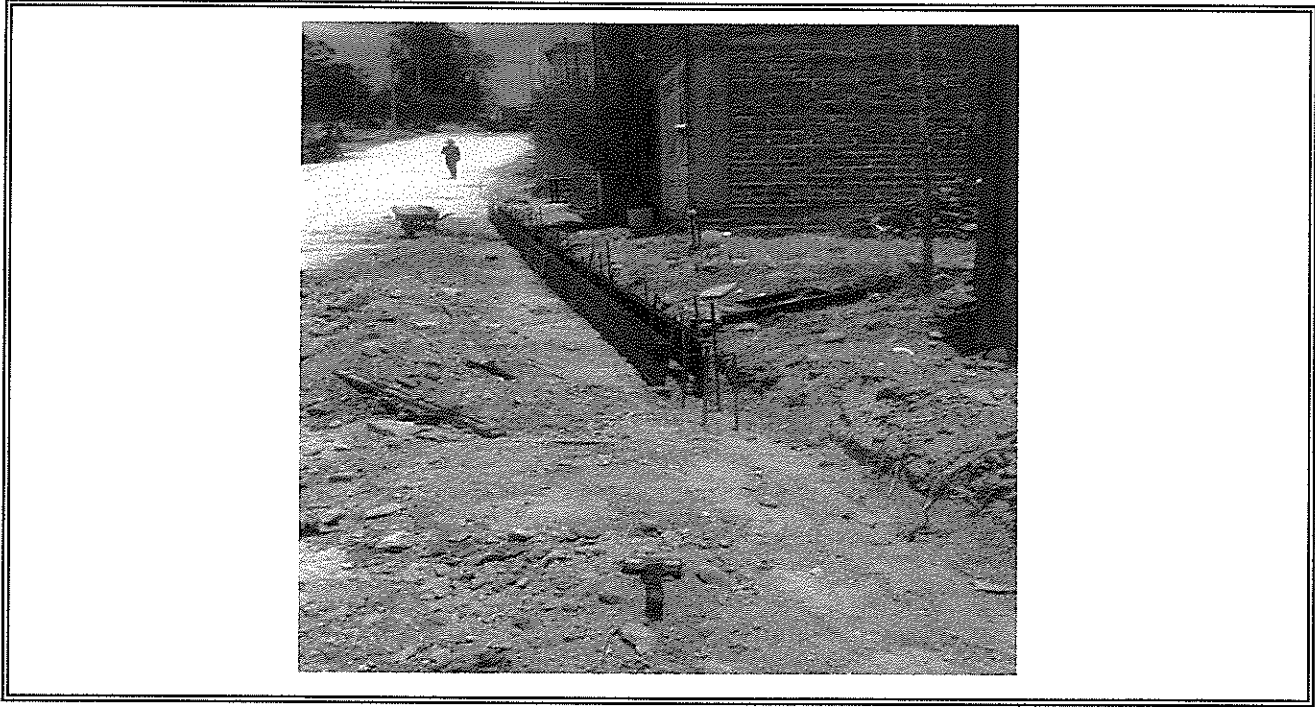

0167

OPERADO

REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

NOCHISTLAN DE MEJIA

PERIODO DE EJECUCIÓN 2024

28 DE FEBRERO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024

26 DE ABRIL DE 2024

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

65.00%

INFORME FOTOGRÁFICO



REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.


OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA

NOCHISTLAN DE MEJIA
28 DE FEBRERO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024
26 DE ABRIL DE 2024



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

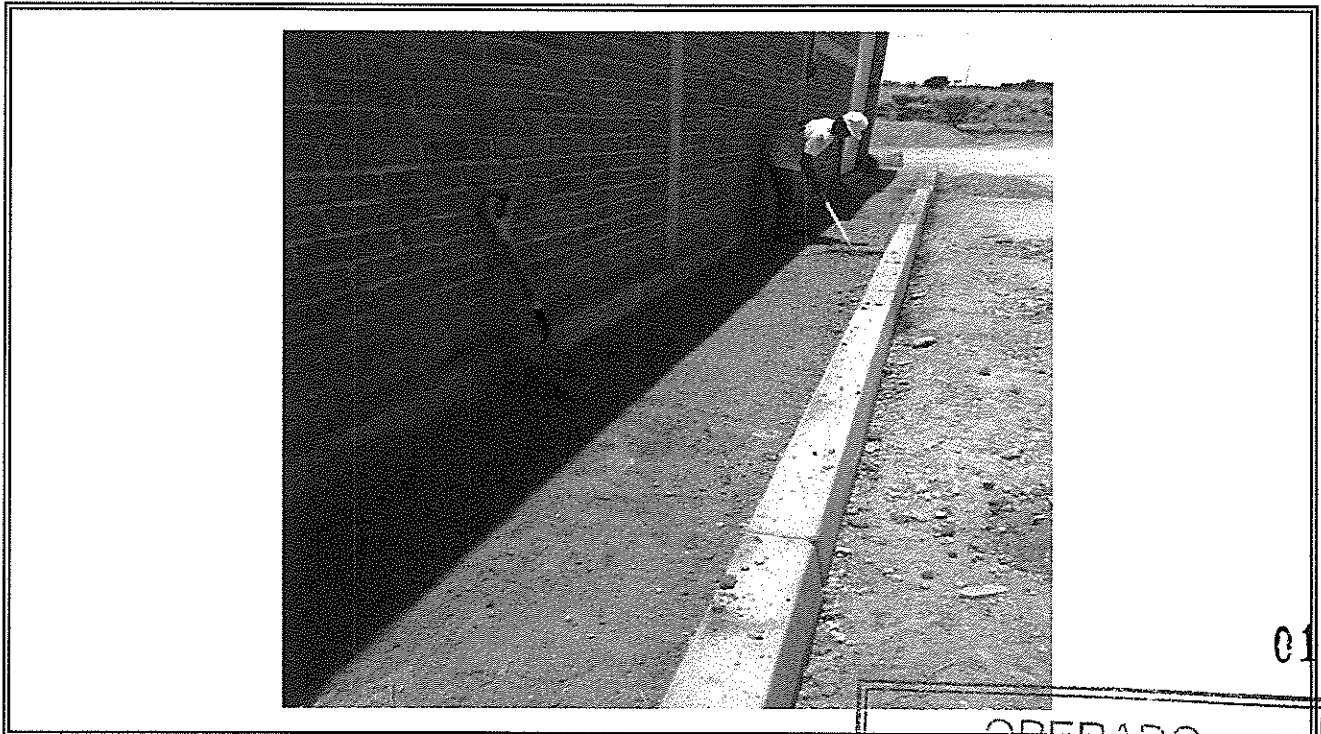

0171

REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

NOCHISTLAN DE MEJIA

28 DE FEBRERO DE 2024 31 DE MAYO DE 2024

03 DE MAYO DE 2024

80.00%

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

OPERADO
EJERCICIO 2024

INFORME FOTOGRÁFICO



0172

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2024

REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA

NOCHISTLAN DE MEJIA
28 DE FEBRERO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024
03 DE MAYO DE 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE: 7
 FECHA REPORTE: 10/05/2024

% AVANCES FÍSICO	REAL	PROGRAMADO
FINANCIERO	90	100
	30	0

DATOS DE LA OBRA	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO		
	M E S E S															
REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO								
PARTIDAS																
Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2. Incluye: Topografía y cadenero, operador	\$14,893.46														2	2.74
Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traslados	\$10,228.42														2	2.74
Corte de carpeta asfáltica de un espesor promedio de 5 cm con maquina de disco especial para este tipo de trabajos. Incluye: manos de obra, herramienta y todo lo necesario	\$4,267.68														2	2.74
Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilometro, sobre camino de herradura. Carga con maquina.	\$5,072.64														2	2.74
Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilometros subsiguientes, se consideraran (3 km)	\$1,896.00														2	2.74
Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo al proyecto	\$19,160.45														2	2.74
Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilometro, sobre camino de herradura. Carga con maquina.	\$64,390.82														5	6.85
Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilometros subsiguientes, se consideraran (3 km)	\$24,067.35														5	6.85
															73	TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

UBICACION: NOCHISTLAN DE MEJIA

TIPO DE OBRA: NUEVA

MODALIDAD EJEC.: CONTRATO

No. CONTRATO: NOCHIS/FONDI/2024/07

EMPRESA: C. ANGELICA RUANO AVILA

MONTO CONTRATO: \$1,264,695.09

FECHA CONTRATO: 28 DE MARZO DE 2024

MONTO ANTICIPO: \$0.00

FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCION: INICIO 28-feb-24, TERMINO 31-may-24

FECHAS PROGRAMADAS: 28-feb-24 a 31-may-24

FECHAS REALES: 8-mar-23

FECHAS REPROGRAMADAS: 8-mar-23

OBSERVACIONES:

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL CANTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ES OBTENIDO AL QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO PARA POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.

EJERCICIO 2024

ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

RESIDENTE DE SUPERVISION:
 ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO

0173



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



0175

REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

NOCHISTLAN DE MEJIA

28 DE FEBRERO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024

10 DE MAYO DE 2024

90.00%

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

OPERADO
EJERCICIO 2024

INFORME FOTOGRÁFICO



0176

OPERADO

REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA

NOCHISTLAN DE MEJIA
28 DE FEBRERO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024
10 DE MAYO DE 2024

EJERCICIO 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE: **8**
 FECHA REPORTE: **17/05/2024**

% AVANCES		PROGRAMADO	
FISICO	FINANCIERO	100	100
		30	0

DATOS DE LA OBRA	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO
	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	MESES					
UBICACION:	PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA											
NOCHISTLAN DE MEJIA	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2. Incluye: Topografía y cadenero, operador	\$14,893.46	[Gantt chart showing work progress from Feb to Mar]										2	2.74
TIPO DE OBRA:														
MODALIDAD EJEC.:														
NO. CONTRATO:	Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acople y traspaños	\$10,228.42	[Gantt chart showing work progress from Feb to Mar]										2	2.74
EMPRESA:	Corte de carpeta asfáltica de un espesor promedio de 5 cm con maquina de disco especial para este tipo de trabajos. Incluye: manos de obra, herramienta y todo lo necesario	\$4,267.68	[Gantt chart showing work progress from Feb to Mar]										2	2.74
MONTO CONTRATO:	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	\$5,072.64	[Gantt chart showing work progress from Feb to Mar]										2	2.74
FECHA CONTRATO:	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se consideraran (3 km)	\$1,896.00	[Gantt chart showing work progress from Feb to Mar]										2	2.74
MONTO ANTIPO:	Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo al proyecto	\$19,160.45	[Gantt chart showing work progress from Feb to Mar]										2	2.74
FECHA PAGO ANTIPO:														
No. AMPL. DE CONTRATO:														
MONTO AMPL. CONTRATO:														
FECHA AMPL. CONTRATO:														
PERIODO DE EJECUCION	INICIO	TERM.												
FECHAS PROGRAMADAS:	26-feb-24	31-may-24											5	6.85
FECHAS REALES:	8-mar-23	17-may-24											5	6.85
FECHAS REPROGRAMADAS:	OBSERVACIONES													
EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, EN SU DEBITO QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A PARTIR DE LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.													73	TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACION

ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:

ING. JOSE FRANCISCO CALERO DELGADILLO

0177

COMPLETADO
 (FIII)
 EJERCICIO 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE: **8**
FECHA REPORTE: **17/05/2024**

% AVANCES FISICO	REAL	PROGRAMADO
FINANCIERO	30	100
		0


DATOS DE LA OBRA		PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DÍAS PROGRAMADOS	% EN BASE TIEMPO	
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA,		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	M E S E S							
UBICACIÓN:	NOCHISTLAN DE MEJIA															
TIPO DE OBRA:	NUEVA															
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO															
No. CONTRATO:	NOCHISFOND0202407															
EMPRESA:	C. ANGELICA RUANO AVILA															
MONTO CONTRATO:	\$1,264,695.09															
FECHA CONTRATO:	28 DE FEBRERO DE 2024															
MONTO ANTICIPO:	\$0.00															
FECHA PAGO ANTICIPO:	N/A															
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A															
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A															
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A															
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERM.														
	28-feb-24	31-may-24														
FECHAS PROGRAMADAS:	FECHAS REALES:	FECHAS REPROGRAMADAS:														
	8-mar-24	17-may-24														
OBSERVACIONES																
EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DÍAS QUE TIENE EL CONTRATO, ES DECIR, DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LARGO, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100% DEL PORCENTAJE BASE TIEMPO.																
SUBTOTAL		\$1,090,254.39														
IVA		\$174,440.70														
TOTAL		\$1,264,695.09														
TOTAL DE DÍAS NATURALES EN BASE A LA PROGRAMACIÓN		73														

ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ARO, JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ING. JOSE FRANCISCO CAERO DELGADILLO



ERADO
EJERCICIO 2024

0178



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

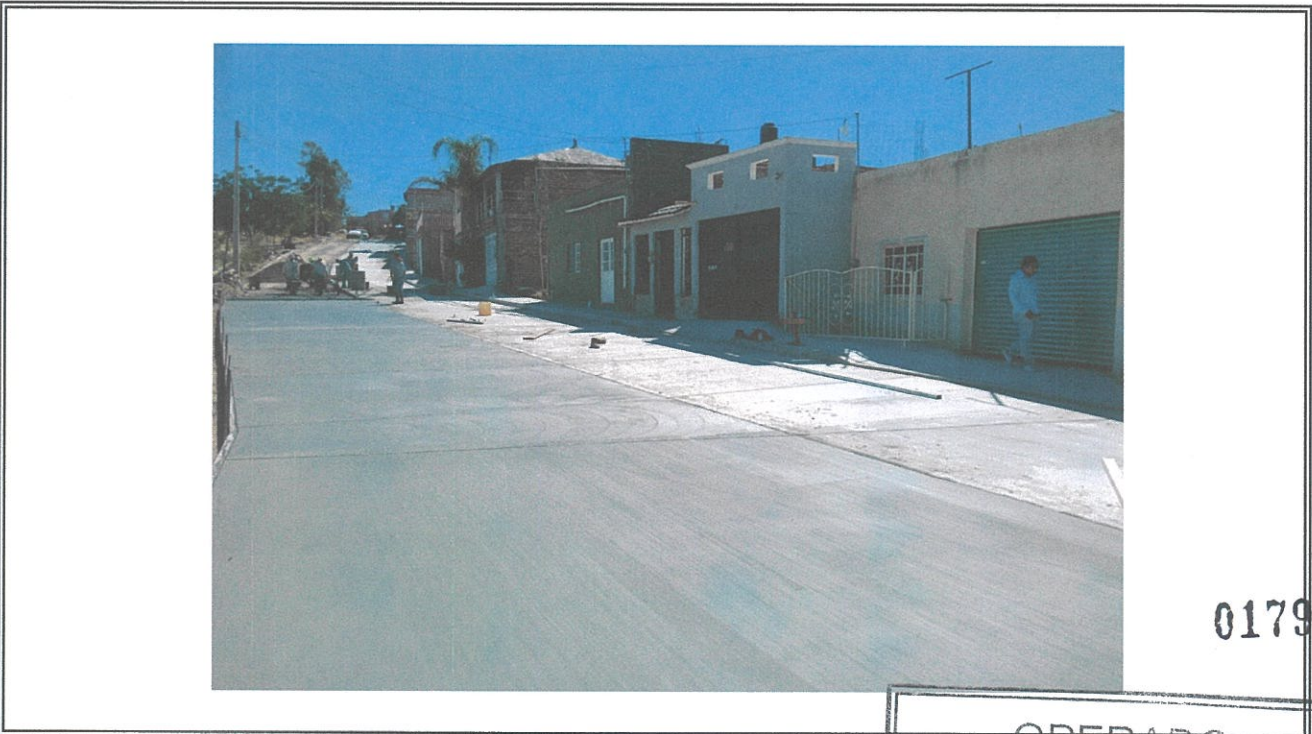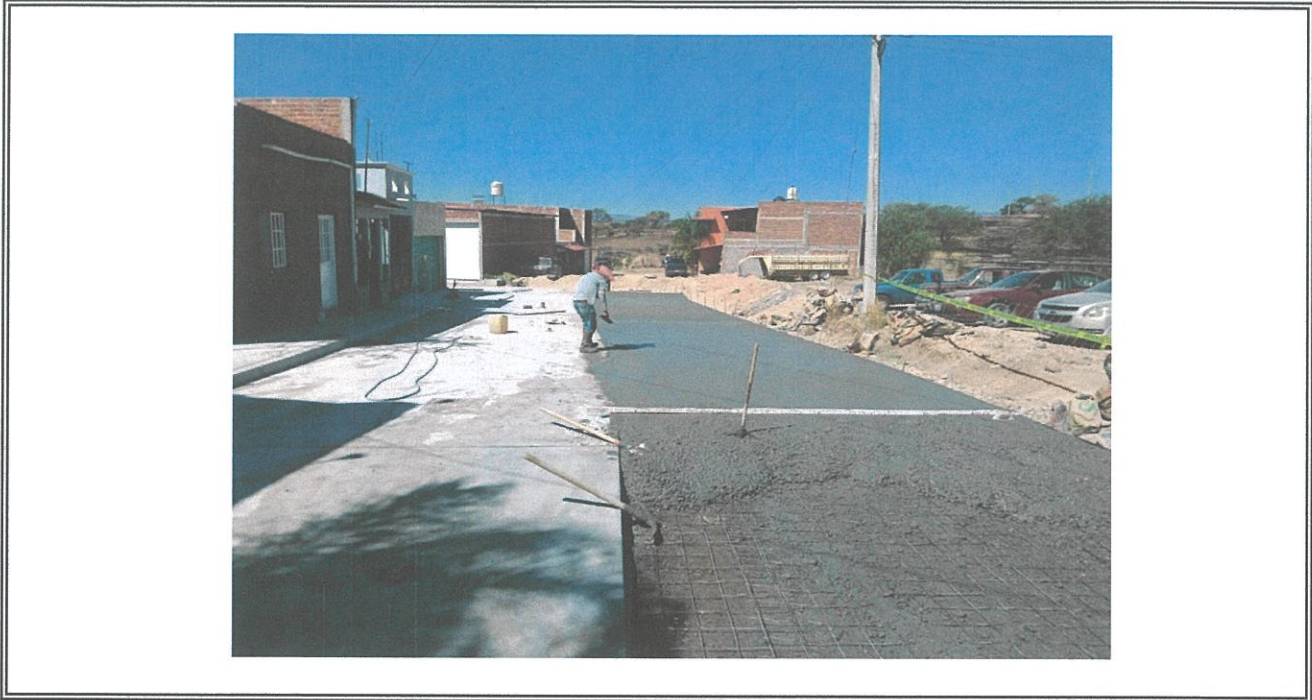

0179

REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

NOCHISTLAN DE MEJIA

28 DE FEBRERO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024

17 DE MAYO DE 2024

100.00%

OBRA:

LOCALIDAD:


PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

OPERADO
PAIS... (FIRMA)
EJERCICIO 2024

INFORME FOTOGRÁFICO

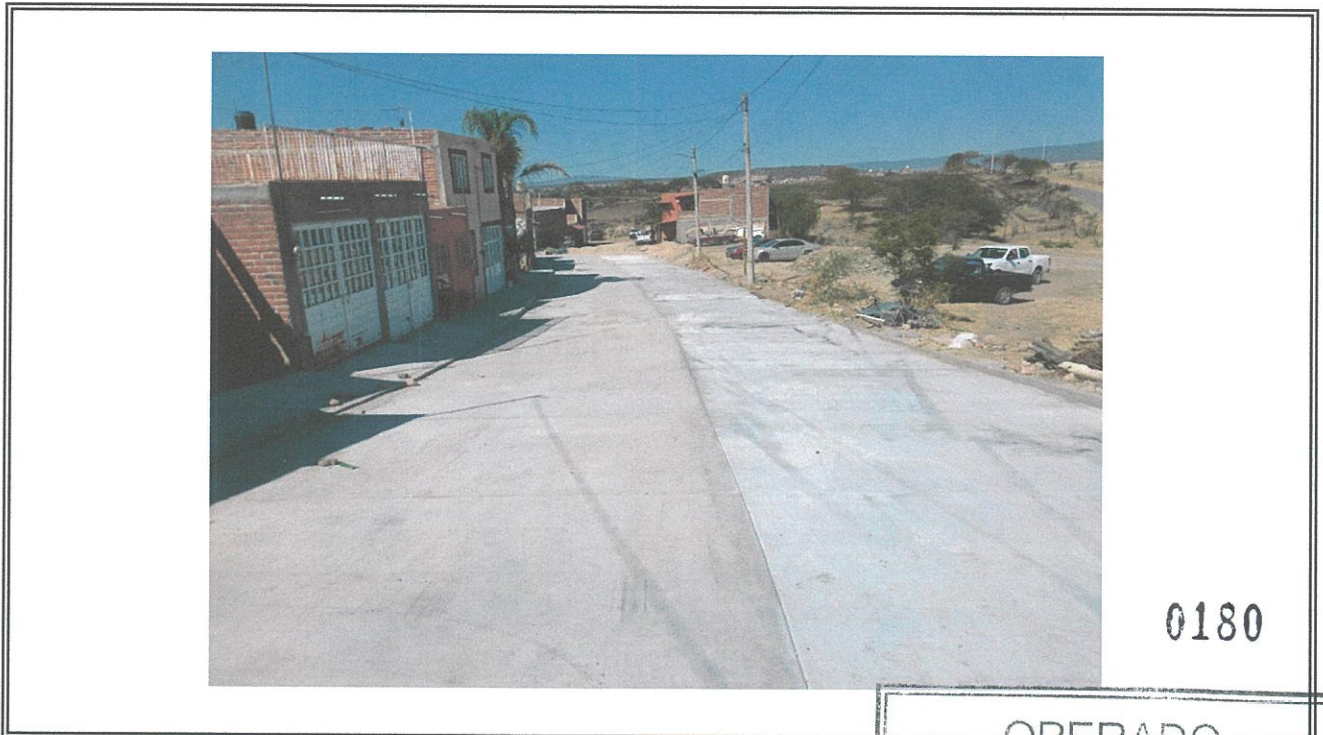

0180

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA

REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.



NOCHISTLAN DE MEJIA
28 DE FEBRERO DE 2024 - 31 DE MAYO DE 2024
17 DE MAYO DE 2024

OPERADO
EJERCICIO 2024




0181

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

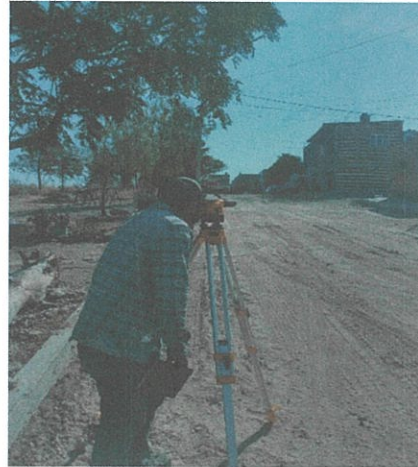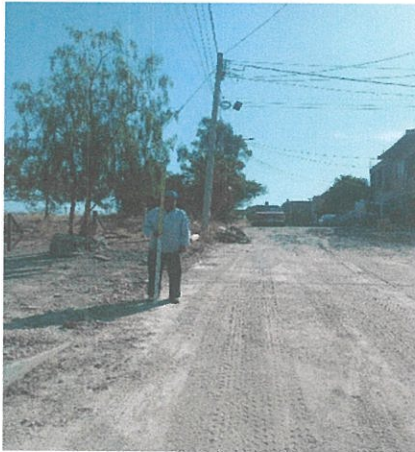


0182

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2021

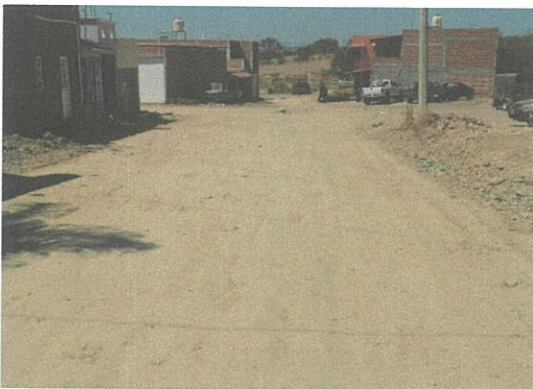


0183

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

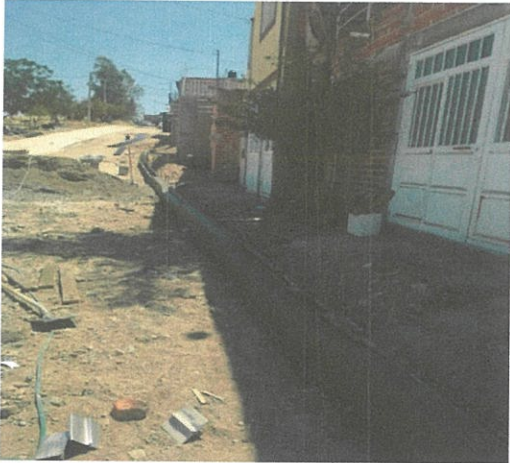




0184

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

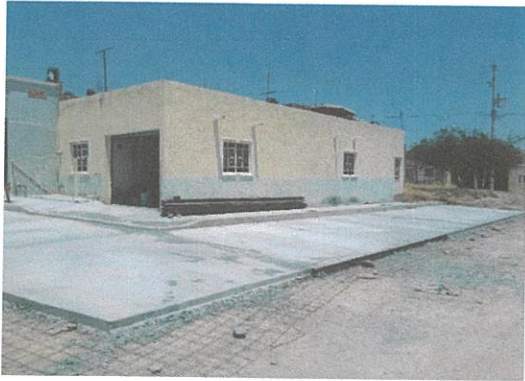

0185

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

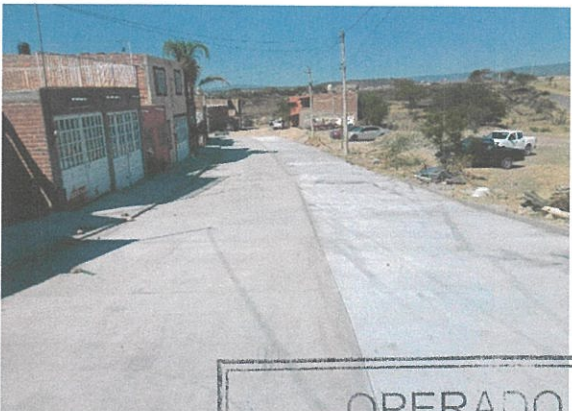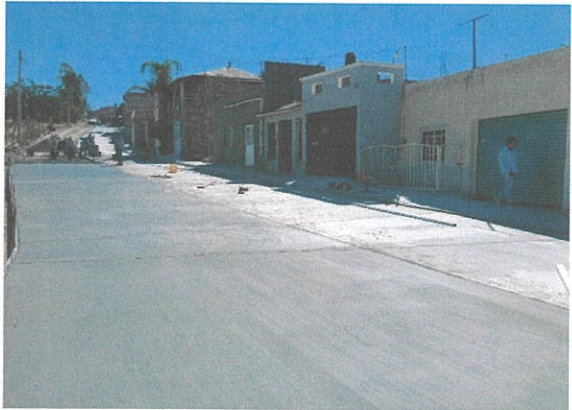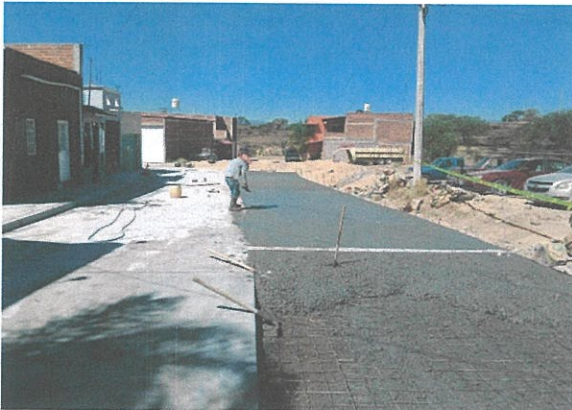

0186

OPERADO
FAISM (FIH)
EJERCICIO 2024



INFORME DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO Y COMPRESIÓN EN ESPECÍMENES CILINDRICOS DE CONCRETO ENDURECIDO (FT-011.1)

CLIENTE: SERVICIOS MELENDRES
 RESPONSABLE: SRA. ANGELA RUANO ÁVILA
 OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO
 DIRECCIÓN: MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS, MÉXICO

FECHA: 24-may-24
 HOJA: 1 de 1
 ARCHIVO: T00rehjesuitaY_01-24
 MUESTREO: A.J.V

Clave lab.	Revenimiento cm proyecto / obtenido	Temp. °C	Datos de muestreo				Datos de ensaye									
			Elemento, localización y proveedor	Fecha de colado	Edad Días	Concreto tipo	Fecha de ensaye	Diám. cm	Altura cm	Área cm²	Mesa kg	Fuerza kN	F _c MPa (kg/cm²)		% de f _c	Falla
													obtenido	Proyecto		
221-T	12 / 11	*	Elemento: Banqueta, localización: Frente a casa #40, hecho en obra	09-may-24	14	Normal	23-may-24	15.0	30.0	176.7	*	263.8	14.9 (152)	14.7 (150)	101%	2
222-T	12 / 11	*	Elemento: Banqueta, localización: Frente a casa #40, hecho en obra	09-may-24	14	Normal	23-may-24	15.0	30.0	176.7	*	264.2	15 (152)	14.7 (150)	102%	2
225-T	12 / 12	*	Elemento: Losa de rodamiento, localización: Frente a casa #31, hecho en obra	13-may-24	7	Normal	20-may-24	15.0	30.0	176.7	*	351.4	19.9 (203)	24.5 (250)	81%	2
229-T	12 / 11	*	Elemento: Losa de rodamiento, localización: Frente a casa #40, hecho en obra	18-may-24	7	Normal	23-may-24	15.0	30.0	176.7	*	353.8	20 (204)	24.5 (250)	82%	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* No se determinó

Referencias:

- NMX-C-161-ONNCCE-2013, Muestreo de concreto fresco
 - NMX-C-156-ONNCCE-2010, Determinación del revenimiento en concreto fresco
 - NMX-C-435-ONNCCE-2010, Determinación de la temperatura en concreto fresco
 - NMX-C-159-ONNCCE-2016, Elaboración, y curado de especímenes de concreto
 - NMX-C-109-ONNCCE-2013, Cabeceo de especímenes cilíndricos
 - NMX-C-083-ONNCCE-2014, Ensaye a compresión
 - NMX-C-155-ONNCCE-2014, Especificaciones
 - NMX-C-148-ONNCCE-2010, Gabinetes, cuartos húmedos y tanques de almacenamiento
 - NOM-008-SCOFI-2002, Sistema general de unidades de medida
- Las muestras fueron ensayadas en el laboratorio sucursal Tepatlilán

Gerardo Carrillo Gómez

- Ing. Esp. Álvaro Arrijo López
Director Técnico / Proyectos Geotécnicos
- Ing. Gerardo Carrillo Gómez
Responsable de Aseguramiento de Calidad
- M.I. José Alejandro Salcedo Becerra
Director General

[Signature]

- Ing. José Salcedo Zúñiga
Director Técnico / Control de Calidad
- Ing. María del Conzuelo Rodríguez Ramirez
Jefe Área de diseño
- Ing. Victor Manuel Gutierrez Barajas
Director de Residencia de Obras

0187

Este Informe no puede ser alterado, ni reproducido parcialmente. Los resultados se refieren única y exclusivamente a las muestras sometidas a prueba.



INFORME DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO Y COMPRESIÓN EN ESPECÍMENES CILINDRICOS DE CONCRETO ENDURECIDO (FT-011.1)

CLIENTE: SERVICIOS MELENDRES
RESPONSABLE: SRA. ANGELA RUANO ÁVILA

FECHA: 31-may-24
HOJA: 1 de 1

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO
DIRECCIÓN: MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS, MÉXICO

ARCHIVO: TcrehjesuitaY_02-24
MUESTREO: A.J.V

Clave lab.	Revenimiento cm proyecto / obtenido	Temp. °C	Datos de muestreo				Datos de ensayo									
			Elemento, localización y proveedor	Fecha de colado	Edad Días	Concreto tipo	Fecha de ensayo	Diám. cm	Altura cm	Área cm²	Masa kg	Fuerza kN	fc		% de fc	Falla
													MPa (kg/cm²) obtenido	MPa (kg/cm²) Proyecto		
226-T	12 / 12	*	Elemento: Losa de rodamiento, localización: Frente a casa #31, hecho en obra	13-may-24	14	Normal	27-may-24	15.0	30.0	176.7	*	394.1	22.3 (227)	24.5 (250)	91%	2
230-T	12 / 11	*	Elemento: Losa de rodamiento, localización: Frente a casa #40, hecho en obra	16-may-24	14	Normal	30-may-24	15.0	30.0	176.7	*	403.2	22.8 (233)	24.5 (250)	93%	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* No se determinó

Referencias:

- NMX-C-161-ONNCCE-2013, Muestreo de concreto fresco
 - NMX-C-156-ONNCCE-2010, Determinación del revenimiento en concreto fresco
 - NMX-C-435-ONNCCE-2010, Determinación de la temperatura en concreto fresco
 - NMX-C-159-ONNCCE-2016, Elaboración, y curado de especímenes de concreto
 - NMX-C-109-ONNCCE-2013, Cabecero de especímenes cilíndricos
 - NMX-C-083-ONNCCE-2014, Ensayo a compresión
 - NMX-C-155-ONNCCE-2014, Especificaciones
 - NMX-C-148-ONNCCE-2010, Gabinetes, cuartos húmedos y tanques de almacenamiento
 - NOM-008-SCOFI-2002, Sistema general de unidades de medida
- Las muestras fueron ensayadas en el laboratorio sucursal Tepatitlán

Gerardo Carrillo Gómez

- Ing. Esp. Álvaro Arriola López
Director Técnico / Proyectos Geotécnicos
- Ing. Gerardo Carrillo Gómez
Responsable de Aseguramiento de Calidad
- M.I. José Alejandro Saicedo Becerra
Director General

[Signature]

- Ing. José Saicedo Zúñiga
Director Técnico / Control de Calidad
- Ing. María del Conzuelo Rodríguez Ramirez
Jefe Área de diseño
- Ing. Victor Manuel Gutierrez Barajas
Director de Residencia de Obras

0188

Este informe no puede ser alterado, ni reproducido parcialmente.
Los resultados se refieren única y exclusivamente a las muestras sometidas a prueba.

MATRIZ

(33) 3335 1261 (33) 3055 1260
Calle Sienita 2049, Col. Mariano Otero,
CP 45067, Zapopan, Jalisco, Mexico.

SUCURSAL

(+52) 378 1123 613
Calle Santa Faustina Kowalska 171, Col. Sta. Bárbara,
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Mexico.

Alsaingenieria
contacto@alsaingenieria.com



INFORME DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO Y COMPRESIÓN EN ESPECÍMENES CILINDRICOS DE CONCRETO ENDURECIDO (FT-011.1)

CLIENTE: SERVICIOS MELENDRES
 RESPONSABLE: SRA. ANGELA RUANO ÁVILA
 OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO
 DIRECCIÓN: MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS, MÉXICO

FECHA: 07-jun-24
 HOJA: 1 de 1
 ARCHIVO: TocrehjesuitaY_03-24
 MUESTREO: A.J.V

Clave lab.	Revenimiento cm proyecto / obtenido	Temp. °C	Datos de muestreo				Datos de ensaye									
			Elemento, localización y proveedor	Fecha de colado	Edad Dias	Concreto tipo	Fecha de ensaye	Diám. cm	Altura cm	Área cm²	Masa kg	Fuerza kN	f _c MPa (kg/cm²)		% de f _c	Falla
													obtenido	Proyecto		
223-T	12 / 11	*	Elemento: Banqueta, localización: Frente a casa #40, hecho en obra	09-may-24	28	Normal	06-jun-24	15.0	30.0	176.7	*	319.6	18.1 (184)	14.7 (150)	123%	2
224-T	12 / 11	*	Elemento: Banqueta, localización: Frente a casa #40, hecho en obra	09-may-24	28	Normal	06-jun-24	15.0	30.0	176.7	*	320.4	18.1 (185)	14.7 (150)	123%	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* No se determinó

Referencias:

- NMX-C-161-ONNCCE-2013, Muestreo de concreto fresco
 - NMX-C-156-ONNCCE-2010, Determinación del revenimiento en concreto fresco
 - NMX-C-435-ONNCCE-2010, Determinación de la temperatura en concreto fresco
 - NMX-C-159-ONNCCE-2016, Elaboración, y curado de especímenes de concreto
 - NMX-C-109-ONNCCE-2013, Cabecao de especímenes cilíndricos
 - NMX-C-083-ONNCCE-2014, Ensaye a compresión
 - NMX-C-155-ONNCCE-2014, Especificaciones
 - NMX-C-148-ONNCCE-2010, Gabinetes, cuartos húmedos y tanques de almacenamiento
 - NOM-008-SCOFI-2002, Sistema general de unidades de medida
- Las muestras fueron ensayadas en el laboratorio sucursal Tepatitlán

Gerardo Carrillo Gómez

- Ing. Esp. Álvaro Arrijoa López
Director Técnico / Proyectos Geotécnicos
- Ing. Gerardo Carrillo Gómez
Responsable de Aseguramiento de Calidad
- M.I. José Alejandro Salcedo Becerra
Director General

[Signature]

- Ing. José Salcedo Zúñiga
Director Técnico / Control de Calidad
- Ing. María del Conzuelo Rodríguez Ramírez
Jefe Área de diseño
- Ing. Víctor Manuel Gutiérrez Barajas
Director de Residencia de Obras

0189

Este informe no puede ser alterado, ni reproducido parcialmente.
 Los resultados se refieren única y exclusivamente a las muestras sometidas a prueba.



INFORME DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO Y COMPRESIÓN EN ESPECÍMENES CILINDRICOS DE CONCRETO ENDURECIDO (FT-011.1)

CLIENTE: SERVICIOS MELENDRES
 RESPONSABLE: SRA. ANGELA RUANO ÁVILA
 OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO
 DIRECCIÓN: MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS, MÉXICO

FECHA: 14-jun-24
 H.Q.J.A: 1 de 1
 ARCHIVO: TccrehjesuitaY_04-24
 MUESTREÓ: A.J.V

Clave lab.	Revenimiento cm proyecto / obtenido	Temp. °C	Datos de muestreo				Datos de ensayo									
			Elemento, localización y proveedor	Fecha de colado	Edad Días	Concreto tipo	Fecha de ensayo	Diám. cm	Altura cm	Área cm²	Masa kg	Fuerza kN	f _c MPa (kg/cm²)		% de f _c	Falla
													obtenido	Proyecto		
227-T	12 / 12	*	Elemento: Losa de rodamiento, localización: Frente a casa #31, hecho en obra	13-may-24	28	Normal	10-jun-24	15.0	30.0	176.7	*	445.0	25.2 (257)	24.5 (250)	103%	2
228-T	12 / 12	*	Elemento: Losa de rodamiento, localización: Frente a casa #31, hecho en obra	13-may-24	28	Normal	10-jun-24	15.0	30.0	176.7	*	443.5	25.1 (256)	24.5 (250)	102%	2
231-T	12 / 11	*	Elemento: Losa de rodamiento, localización: Frente a casa #40, hecho en obra	16-may-24	28	Normal	13-jun-24	15.0	30.0	176.7	*	445.1	25.2 (257)	24.5 (250)	103%	2
232-T	12 / 11	*	Elemento: Losa de rodamiento, localización: Frente a casa #40, hecho en obra	16-may-24	28	Normal	13-jun-24	15.0	30.0	176.7	*	446.2	25.2 (257)	24.5 (250)	103%	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* No se determinó

Referencias:

- NMX-C-161-ONNCCE-2013, Muestreo de concreto fresco
 - NMX-C-156-ONNCCE-2010, Determinación del revenimiento en concreto fresco
 - NMX-C-435-ONNCCE-2010, Determinación de la temperatura en concreto fresco
 - NMX-C-159-ONNCCE-2016, Elaboración, y curado de especímenes de concreto
 - NMX-C-109-ONNCCE-2013, Cabecoo de especímenes cilíndricos
 - NMX-C-083-ONNCCE-2014, Ensayo a compresión
 - NMX-C-155-ONNCCE-2014, Especificaciones
 - NMX-C-148-ONNCCE-2010, Gabinetes, cuartos húmedos y tanques de almacenamiento
 - NOM-008-SCOFI-2002, Sistema general de unidades de medida
- Las muestras fueron ensayadas en el laboratorio sucursal Tepatlilán

Gerardo Carrillo Gómez

- Ing. Esp. Álvaro Arroja López
Director Técnico / Proyectos Geotécnicos
- Ing. Gerardo Carrillo Gómez
Responsable de Aseguramiento de Calidad
- M.I. José Alejandro Salcedo Becerra
Director General

[Handwritten signature]

- Ing. José Salcedo Zúñiga
Director Técnico / Control de Calidad
- Ing. María del Conzuelo Rodríguez Ramirez
Jefe Área de diseño
- Ing. Victor Manuel Gutierrez Barajas
Director de Residencia de Obras

0190

Este informe no puede ser alterado, ni reproducido parcialmente.
 Los resultados se refieren única y exclusivamente a las muestras sometidas a prueba.

MATRIZ

(33) 3335 1261 (33) 3055 1260
 Calle Sienita 2049, Col. Mariano Otero,
 CP 45067, Zapopan, Jalisco, México.

SUCURSAL

(+52) 378 1123 613
 Calle Santa Faustina Kowalska 171, Col. Sta. Bárbara,
 Tepatlilán de Morelos, Jalisco, México.

Alsaingenieria
 contacto@alsaingenieria.com



**(FT-107.1) INFORME DE RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE COMPACTACIÓN
MÉTODO DE LA TROMPA Y ARENA**

CLIENTE: SERVICIOS MELENDRES
RESPONSABLE: SRA. ANGELA RUANO ÁVILA

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO
DIRECCIÓN: MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS, MÉXICO

FECHA: 07-may-24
ARCHIVO: TCrehjesuitaY_01-24
HOJA: 1 de 1
TÉCNICO: A.J.V.
CAPTURÓ: Y.J.M.

Espesor de capa de proyecto: 25 cm **Grado de Compactación de Proyecto (%):** 100

Clave de laboratorio	1	2	3	-	-	-
Fecha de muestreo	06-may-24	06-may-24	06-may-24	-	-	-
Localización	Frente a casa #39 / Lado: Derecho / Capa: Base Hidráulica	Frente a casa #34 / Lado: Centro / Capa: Base Hidráulica	Frente a casa #29 / Lado: Izquierdo / Capa: Base Hidráulica	-	-	-
Prof. Capa (cm)	24	23	25	-	-	-
Tipo de MVSM	Porter	Porter	Porter	-	-	-
MVSM (kg/m ³)	1691	1691	1691	-	-	-
MVSL (kg/m ³)	1695	1694	1710	-	-	-
Contenido de Agua (%)	Óptima	17	17	-	-	-
	Lugar	17.0	15.0	16.0	-	-
Grado de Compactación (%)	100	100	101	-	-	-

REFERENCIAS:

- NMX-C-467-ONNCCE-VIGENTE Metodos de muestreo.
- NMX-C-475-ONNCCE-VIGENTE Determinación del contenido de agua mediante horno.
- NMX-C-476-ONNCCE-VIGENTE Compactación dinamica estandar y modificada.
- NMX-C-503-ONNCCE-VIGENTE Determinación de contenido de agua mediante secado rapido.
- NMX-C-507-ONNCCE-VIGENTE Masa volumétrica seca del lugar por el método de trompa y arena.
- NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida.

Observaciones:

El grado de compactación obtenido en la Capa de Base Hidráulica cumple con lo indicado en el proyecto.

Gerardo Carrillo Gomez

- Ing. Esp. Álvaro Arrijo López
Director Técnico / Proyectos Geotécnicos
- Ing. Gerardo Carrillo Gómez
Responsable de Aseguramiento de Calidad
- M.I. José Alejandro Salcedo Becerra
Director General

- Ing. José Salcedo Zuñiga
Director Técnico / Control de Calidad
- Ing. María del Conzuelo Rodríguez Ramírez
Jefe Área de diseño
- Ing. Victor Manuel Gutierrez Barajas
Director de Residencia de Obras

Este informe no puede ser alterado, ni reproducido parcialmente.
El informe de resultados se refiere única y exclusivamente a las muestras sometidas a prueba.

0191

MATRIZ

(33) 3335 1261 (33) 3055 1260
Calle Sienita 2049, Col. Mariano Otero,
CP 45067, Zapopan, Jalisco, México.

SUCURSAL

(+52) 378 1123 613
Calle Santa Faustina Kowalska 171, Col. Sta. Bárbara,
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México.

Alsaingenieria
contacto@alsaingenieria.com



INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA DE MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA (FT-103.1)

CLIENTE: SERVICIOS MELENDRES
RESPONSABLE: SRA. ANGELA RUANO ÁVILA

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO
PROCEDENCIA: MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS, MÉXICO
UTILIZADO COMO: CAPA DE BASE HIDRÁULICA

FECHA: 07-may-24

HOJA: 1 de 1

MUESTRA: TprehjesuitaY_01-24

MUESTREÓ: A.J.V.

CAPTURÓ: Y.J.M.

ENSAYO	MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA (kg/m ³)	CONTENIDO DE AGUA OPTIMO (%)
1	1,691	17.0

REFERENCIAS:

NMX-C-416-ONNCCE-VIGENTE Muestreo de Estructuras Terreas y Métodos de Prueba.

9. Masa volumétrica seca máxima y contenido de agua óptimo

NMX-C-467-ONNCCE-VIGENTE Metodos de muestreo.

NMX-C-475-ONNCCE-VIGENTE Determinación del contenido de agua mediante horno.

NMX-C-503-ONNCCE-VIGENTE Determinación de contenido de agua mediante secado rapido.

NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida.

Gerardo Carrillo Gómez

Ing. Esp. Álvaro Arrijoa López
Director Técnico / Proyectos Geotécnicos

Ing. Gerardo Carrillo Gómez
Responsable de Aseguramiento de Calidad

M.I. José Alejandro Salcedo Becerra
Director General

Ing. José Salcedo Zuñiga
Director Técnico / Control de Calidad

Ing. María del Conzuelo Rodríguez Ramírez
Jefe Área de diseño

Ing. Victor Manuel Gutierrez Barajas
Director de Residencia de Obras

Este informe no puede ser alterado, ni reproducido total ó parcialmente.

El informe de resultados se refiere única y exclusivamente a las muestras sometidas a prueba.

0192

MATRIZ

(33) 3335 1261 (33) 3055 1260
Calle Sienita 2049, Col. Mariano Otero,
CP 45067, Zapopan, Jalisco, México.

SUCURSAL

(+52) 378 1123 613
Calle Santa Faustina Kowalska 171, Col. Sta. Bárbara,
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México.

AlsaIngenieria
contacto@alsaingenieria.com

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESENTE

ASUNTO: TERMINO DE OBRA
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 17 DE MAYO DEL 2024

HAGO REFERENCIA AL CONTRATO NUMERO NOCHIS/FONDOIII/2024/13 RELATIVO A LA OBRA "REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS" CON UN IMPORTE DE \$ 1'264,695.09 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2024 CELEBRADO EN ESA DEPENDENCIA A SU DIGNO CARGO SE LE INFORMA QUE SE TERMINA EN TIEMPO Y FORMA LOS TRABAJOS DE DICHO CONTRATO EL 17 DE MAYO DEL 2024 DE LA OBRA DENOMINADA:

NOMBRE: "REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS"

MONTO DEL CONTRATO: \$ 1'264,695.09

PLAZO DE EJECUCION: DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2024

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO, DESEANDOLE ÉXITO Y PROSPERIDAD.

0193



C. ANGELICA RUANO AVILA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024



Angélica Ruano Avila

RUA8807105Q6

16 de Septiembre 166
Centro Localidad Daniel Camarena
Nochistlán de Mejía, Zac.
México C.P.99914



CEL. 346 101 2142



@_j_melendrez@hotmail.com

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA

- 1.- En toda póliza otorgada por la ASEGURADORA, sus derechos y obligaciones se encuentran regulados por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en adelante (LISF), en lo no previsto por la LISF, se aplicará la legislación mercantil y a falta de disposición expresa, el Código Civil Federal. (Art. 183 LISF); la póliza será numerada al igual que sus endosos debiendo contener, en su caso, indicaciones que administrativamente fijen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en adelante SHCP y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en adelante CNSF (Art.166 LISF).
- 2.- En caso de PERDIDA O EXTRAVÍO DE LA PÓLIZA DE FIANZA al ejercer su derecho de redacción de la fianza, deberá comprobar por escrito que la póliza fue otorgada, solicitando a la ASEGURADORA un duplicado de la póliza emitida a su favor. (Art.166 LISF).
- 3.- Se PRESUME LA EXTINCIÓN de obligación como fiadora cuando se hace la devolución de una póliza a la ASEGURADORA, salvo prueba en contrario. (Art.166 LISF).
- 4.- Las fianzas y los contratos, que en relación a la póliza de fianza se otorgan o se celebren, serán mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES, FIADAS, CONTRAFIADORAS u OBLIGADAS SOLIDARIAS, salvo de la garantía hipotecaria. (Art.32 LISF).
- 5.- La fianza suscrita en este folio será nula y sin efectos legales, si se garantizan operaciones de crédito, aun cuando en el texto de la misma se señale lo contrario, esta póliza no garantiza el pago de títulos de crédito, como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deban solventarse en dinero. Esta fianza no surtirá efectos, si se garantizan préstamos de dinero, mutuos, financiamientos en numerario o en especie, reestructuras de adeudos, renegociación de pasivos y cualquier otra operación no autorizada por la SHCP.
- 6.- La ASEGURADORA no goza de los beneficios de orden y excusión y deberá ser requerida en los términos que establece la LISF. (Art.178 LISF).
- 7.- La obligación de la ASEGURADORA se extinguirá en los siguientes casos: 7.1 Si el BENEFICIARIO concede al FIADO, prórroga o espera para el cumplimiento de la obligación afianzada sin el consentimiento previo y por escrito de la ASEGURADORA (Art. 179 LISF). 7.2 La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza, si la ASEGURADORA no da su consentimiento previo y por escrito para esa novación y para garantizar con la fianza la obligación novotada (Arts. 2220 y 2221 del Código Civil Federal en adelante CCF). 7.3 La quita o pago parcial de la obligación afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa la obligación principal afianzada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones (Art. 2847 del CCF). La ASEGURADORA tendrá derecho, a oponer todas las excepciones que le sean inherentes a la obligación principal, incluyendo todas las causas de liberación de la fianza. 7.4 Si en la póliza de fianza no se establece plazo de caducidad se estará a lo señalado en el Art.174 LISF y, caducará el derecho del beneficiario, para reclamar si la fianza no se reclama dentro del plazo señalado para tal efecto. 7.5 Prescribirá la obligación de la ASEGURADORA una vez transcurrido el plazo para que prescriba la obligación principal garantizada o el de 3 años, lo que resulte menor (Art.175 LISF), para interrumpir la prescripción deberá requerirse por escrito a la ASEGURADORA, en los términos del Art. 175 LISF.
- 8.- Para reclamar la fianza: 8.1 Presentar la reclamación directamente y por escrito, en el domicilio de la ASEGURADORA, en alguna de sus sucursales u oficinas de servicios, con la firma del BENEFICIARIO o de su APODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con que se ostenta y señalando: fecha de reclamación, número de póliza de fianza relacionada con la reclamación que se formula, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del FIADO, nombre o denominación del BENEFICIARIO y en su caso, de su Representante Legal debidamente acreditado, domicilio del BENEFICIARIO para oír y recibir notificaciones, descripción de la obligación garantizada, acompañando copia de la documentación en la que se basó la expedición de la fianza, referencia del contrato o documento fuente (fecha, número, etc.). Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación debiendo acompañar la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado y el importe reclamado como suerte principal, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza. (Circular Única de Seguros y Fianzas en adelante CUSF, Disposición 4.2.8, Frac. VIII y Art.279 primer párrafo Frac. I LISF). 8.2 Si la fianza garantiza obligaciones fiscales federales se apegará al Art. 143, del Código Fiscal de la Federación. 8.3 Las fianzas expedidas ante la Federación, Ciudad de México, Estados o Municipios se hará efectiva a elección del BENEFICIARIO, de acuerdo con el procedimiento señalado en los Arts. 279 o 282 LISF y en su reglamento. 8.4 Fianzas otorgadas ante autoridades judiciales, no penales, se harán efectivas, a elección del BENEFICIARIO, conforme procedimiento de los Arts. 279 y 280 LISF o por la vía de incidente en el juicio en que se hubieran otorgado (Código Federal de Procedimientos Civiles, Art. 281 LISF). 8.5 Las Fianzas Judiciales Penales otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal, se harán efectivas conforme al Art. 282 LISF. Para la presentación del FIADO, se le requerirá personalmente o por correo certificado, con acuse de recibo a la ASEGURADORA en sus oficinas principales o en el domicilio del APODERADO designado para ello, procediendo a la aplicación del Art. 291 LISF, en caso de la no presentación del FIADO en el plazo concedido. 8.6 Cuando la ASEGURADORA reciba la reclamación de la fianza, podrá hacerlo del conocimiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR, haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que presenten oportunamente los elementos y documentación necesaria para inconformarse en contra de la reclamación, y que expresen lo que a su derecho convenga. De igual forma, puede denunciar a dichos deudores juicio que en su contra promoviere el BENEFICIARIO para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del juicio, si se condenare a la ASEGURADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF). 8.7 Una vez integrada la reclamación en los términos de los Arts. 279 o 282 LISF, la ASEGURADORA tendrá un plazo hasta de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al BENEFICIARIO, las razones, causas o motivos de su improcedencia. 8.8 Si la ASEGURADORA no recibe los elementos y documentos citados en el punto 8.6, ésta podrá libremente decidir el pago de la reclamación, estando el FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR obligado a reembolsar a la ASEGURADORA lo que a ésta le corresponda, sin que pueda oponer a la ASEGURADORA las excepciones que el FIADO tuviera frente a su acreedor, incluyendo la de pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso los Arts. 2832 y 2833 del CCF (Art. 289 LISF). Sin embargo, el FIADO conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la ASEGURADORA. La ASEGURADORA, al ser requerida o demandada podrá denunciar el pleito al deudor principal para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del juicio, para el caso de que se llegare a condenar a la ASEGURADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF).
- 9.- En caso de que la ASEGURADORA rechazare la reclamación o no diera contestación en los plazos establecidos por la ley, el BENEFICIARIO podrá elegir, en la reclamación de su pago, el procedimiento señalado en el Art. 280 LISF o el 50 bis y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
- 10.- OTRAS DISPOSICIONES.- Existe obligación de las oficinas y autoridades dependientes de la

Federación, Ciudad de México, de los Estados o Municipios de proporcionar a la ASEGURADORA los datos sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de cualquier otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza. 10.1 La ASEGURADORA se considera de acreditada solvencia Art.16 párrafo primero LISF y Art.18 primer párrafo LISF. 10.2 Si la ASEGURADORA no cumple con la obligación garantizada en la póliza dentro de los plazos legales para su cumplimiento, deberá cubrir al acreedor indemnización por mora conforme al Art. 283 LISF. 10.3 Ninguna autoridad podrá fijar mayor importe para las fianzas que otorguen las AFIANZADORAS Y ASEGURADORAS, que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. La infracción de este precepto será causa de responsabilidad (Art. 18 LISF). Si las obligaciones garantizadas son de hacer o de dar, la ASEGURADORA podrá sustituirse al deudor principal en el cumplimiento de la obligación. En las fianzas en que se garantice el pago de una suma de dinero en parcialidades, la falta de pago de alguna de las parcialidades no da derecho a reclamar la fianza por la totalidad. (Art. 176 LISF). 10.4 El pago de la fianza al BENEFICIARIO, subroga a la ASEGURADORA, por ministerio de ley, en todos los derechos, acciones y privilegios que a favor del acreedor se derivan de la naturaleza de la obligación garantizada. La ASEGURADORA podrá liberarse total o parcialmente de sus obligaciones si por causas imputables al BENEFICIARIO de la póliza de fianza, el pago es impedido o le resulta imposible la subrogación. (Art. 177 LISF y 2830 y 2845 del CCF).

11.- FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA.- Para el caso de fianzas en moneda extranjera, la ASEGURADORA, el BENEFICIARIO, el FIADO y sus OBLIGADOS SOLIDARIOS se someten al Art. 173 LISF y Capítulo 19.2 CUSF.

Únicamente se podrán autorizar este tipo de operaciones, cuando se relacionen con el cumplimiento de obligaciones exigibles fuera del país, o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifique que su pago se convenga en moneda extranjera.

RECLAMACION.- Que el pago de la reclamación procedente por fianza expedida en moneda extranjera y que deba realizarse en el extranjero, se efectuará por conducto de instituciones de crédito mexicanas o filiales de estas, a través de sus oficinas del exterior, en el país donde debió cumplirse la obligación afianzada y en la moneda que se haya establecido en la póliza (Disposición 19.2.3, fracción II CUSF).

PRIMAS.- Las primas relacionadas con la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirán a la ASEGURADORA en la misma moneda de expedición de la póliza, conforme al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en Moneda Extranjera pagaderas en la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. (Disposición 19.2.3, fracción I CUSF).

CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a que se refiere la presente, serán competentes las autoridades mexicanas, en los términos LISF, de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales (Disposición 19.2.3, fracción III CUSF).

12.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), y cualesquiera otros coobligados, en su caso, así como tratándose de BENEFICIARIOS PARTICULARES, para efectos de interpretación, cumplimiento y ejecución de esta póliza, se someten de forma expresa a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales o del fuero común de la Ciudad de México, y/o Guadalajara, Jalisco y/o Monterrey, Nuevo León y/o Puebla, Puebla, a elección de la parte actora, renunciando de forma expresa e irrevocable a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, en el presente o futuro por concepto de su domicilio o vecindad; aplicándose en todo caso la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y su legislación supletoria. Las fianzas otorgadas a favor de la Federación, Ciudad de México, Estados y Municipios, se harán efectivas en los términos del Art. 282 de LISF. 13.- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O DE

CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA.- De conformidad con lo previsto en los Artículos 185 y 214 LISF las partes pactan que LA COMPAÑÍA ASEGURADORA podrá usar equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología en la celebración de sus operaciones y prestación de servicios, incluyendo la expedición electrónica o digital de sus pólizas de fianza, así como de sus documentos modificatorios, por lo que el uso de la firma digital, resultado de utilizar la Firma Electrónica sobre una fianza electrónica sustituye a la firma autógrafa y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes con el mismo valor probatorio; por tal motivo EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) expresan(n) su consentimiento para que LA COMPAÑÍA ASEGURADORA, emita las fianzas y los documentos modificatorios, en forma escrita o a través de medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología válida y no podrán objetar el uso de estos medios u oponerse a los mismos, por lo que en la interpretación y cumplimiento de este contrato se sujetan a lo dispuesto por el Título Segundo, Del Comercio Electrónico, Libro Segundo del Código de Comercio Vigente artículos 89 al 114 empleo de medios electrónicos en la celebración de actos de comercio, pactando al efecto:

I.- Que a través de estos medios se podrán emitir los recibos de cobro de primas, notas de crédito, emisión de pólizas de fianza, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a LA ASEGURADORA, así como, cualquier otro derivado de la prestación del servicio contratado, documentos electrónicos que podrán imprimirse en papel pero será la versión electrónica la que prevalezca si eventualmente existiera alguna diferencia entre ambas.

II.- Con el fin de establecer que la fianza electrónica fue generada por LA COMPAÑÍA ASEGURADORA, en términos del Artículo 90 Bis del Código de Comercio, las Partes pactan como Medio de Identificación del Usuario y Responsabilidad correspondientes a su uso, la validación de la póliza de fianza, a través de la Constancia de Consulta disponible en el Portal de Internet www.aserta.com.mx para fianzas emitidas por LA COMPAÑÍA ASEGURADORA.

Los firmantes declaran conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y Reglamentarias relativas a la celebración de actos jurídicos, mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología, por lo cual están dispuestos a operar a través de los mismos, ya que no les son ajenos.

III.- La Creación, Transmisión, Modificación y Extinción de derechos y obligaciones derivados de las pólizas de fianza electrónicas se soporta mediante una Firma Electrónica generada usando certificados digitales en términos del Título Segundo, del Comercio Electrónico, Capítulo I, De los Mensajes de Datos, Artículos 89 al 99 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio. En cual garantiza frente a terceros la identidad, autenticidad e integridad de las operaciones y servicios prestados a EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S). De igual forma, los firmantes de este instrumento podrán pactar los medios electrónicos idóneos para la transmisión y extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios señalados en la Fracción I de esta cláusula. Asimismo, LA COMPAÑÍA ASEGURADORA podrá solicitar y recibir documentación e información de los firmantes mediante medios electrónicos siempre y cuando EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) garantice(n) a satisfacción de la receptora los medios de creación, transmisión y modificación de dicha documentación y que le permitan asegurar la identidad, autenticidad e integridad de la documentación electrónica generada y transmitida.

POR MEDIO DEL PRESENTA, SE FORMULA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA REALIZADA POR MEDIO DEL PROGRAMA FONDO III. EFECTUADA POR C. ANGELICA RUANO AVILA, REUNIENDOSE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES PARTES QUE INTERVIENEN, Y FIRMANDO DE COMUN ACUERDO.

DATOS DE LA OBRA

OBRA: "REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS"

PROGRAMA: FONDO III

LOCALIDAD: LOMAS DEL REFUGIO

MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

FECHA DE INICIO (CONTRATO): 28 DE FEBRERO DEL 2024

FECHA DE TERMINO (CONTRATO): 31 DE MAYO DEL 2024

FECHA DE INICIO REAL: 08 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE TERMINO REAL: 17 DE MAYO DEL 2024

NUMERO DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/07


MONTO DEL CONTRATO: \$ 1'264,695.09 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.)

HABIENDO DADO UN RECORRIDO POR LA OBRA SE COMPROBO OBJETIVAMENTE LA TERMINACION DE LA MISMA, DE ACUERDO A LOS PROYECTOS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES APROBADAS POR LAS PARTES, POR LO CUAL SE RECIBE DE CONFORMIDAD CON ENTERA SATISFACCION LOS TRABAJOS REALIZADOS.

C. ANGELICA RUANO AVILA

Elizabeth Flores Valdez

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS 0196



Angélica Ruano Avila
RUA880710506
16 de Septiembre 166
Centro Localidad Daniel Camarena
Nochistlán de Mejía, Zac.
México C.P.99914

CEL. 346 101 2142

@ j_melendrez@hotmail.com

POR MEDIO DEL PRESENTA, SE FORMULA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA REALIZADA POR MEDIO DEL PROGRAMA FONDO III. EFECTUADA POR C. ANGELICA RUANO AVILA, REUNIENDOSE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES PARTES QUE INTERVIENEN, Y FIRMANDO DE COMUN ACUERDO.

DATOS DE LA OBRA

OBRA: "REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS"

PROGRAMA: FONDO III

LOCALIDAD: LOMAS DEL REFUGIO

MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

FECHA DE INICIO (CONTRATO): 28 DE FEBRERO DEL 2024

FECHA DE TERMINO (CONTRATO): 31 DE MAYO DEL 2024

FECHA DE INICIO REAL: 08 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE TERMINO REAL: 17 DE MAYO DEL 2024

NUMERO DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/07

MONTO DEL CONTRATO: \$ 1'264,695.09 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.)

HABIENDO DADO UN RECORRIDO POR LA OBRA SE COMPROBO OBJETIVAMENTE LA TERMINACION DE LA MISMA, DE ACUERDO CON EL PROYECTOS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES APROBADAS POR LAS PARTES, POR LO CUAL SE RECIBE DE CONFORMIDAD Y CON ENTERA SATISFACCION LOS TRABAJOS REALIZADOS.

ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO

SUPERVISOR

OPERADO

FAISM (FIIT)

EJERCICIO 2024

0197

C. ANGELICA RUANO AVILA

CONTRATSTA



Angélica Ruano Avila

RUA880710506

16 de Septiembre 166
Centro Localidad Daniel Camarena
Nochistlán de Mejía, Zac.
México C.P.99914



CEL. 346 101 2142



j_melendrez@hotmail.com

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

Ejercicio 2024

FECHA DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION:

31 DE MAYO 2024


DATOS GENERALES:

FONDO:	III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social Municipal.	NO. DE PROYECTO:	404005
ESTADO:	032 Zacatecas	PROGRAMA:	DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION
MUNICIPIO:	034: Nochistlán de Mejía	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA YO ACCIÓN:	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.
LOCALIDAD:	NOCHISTLAN DE MEJIA		
METAS CUMPLIDAS:			
FECHA REAL INICIO:		28 FEBRERO 2024	
FECHA REAL TERMINACION:		31 MAYO 2024	

Firmar al calce

Página 1

0198



Maria Parina Jimenez Duran

Go de V.

Chicablan rines valdez

POR EL MUNICIPIO
ENTREGAN:



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROF. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR,

RECIBEN LA OBRA:

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

VOCAL DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Elizabeth Flores Valdez


TESTIGOS:

Maria Corina Jimenez Doran Gilberto Avila V.

Firmar al calce




Página 3

0200



NÚMERO DE ESTIMACIÓN:		CONTRATO		ESTIMADO		POR ESTIMAR			
FINIQUITO		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
NOMBRE DE LA OBRA:		PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE						IMPORTE	0.00
NO. DE CONTRATO		MEJIA, ZACATECAS						IVA	0.00
UBICACIÓN:		NOCHISTLAN DE MEJIA						TOTAL	0.00
PERIODO:		28 DE FEB A. 31 DE MAY						IMPORTE	0.00
IMPORTE DE CONTRATO:		\$1,264,695.09						TOTAL	0.00

CLAVE DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
001	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2, incluye: Topografía y cadenero, operador	M2	1175.49	\$12.67	\$14,893.46	1175.49	\$12.67	\$14,893.46	0.00	\$12.670	\$0.00
002	Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspalets	M2	126.09	\$81.12	\$10,228.42	126.09	\$81.12	\$10,228.42	0.00	\$81.12	\$0.00
003	Corte de carpeta asfaltica de un espesor promedio de 5 cm con maquina de disco especial para este tipo de trabajos, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	25.50	\$167.36	\$4,267.67	25.50	\$167.36	\$4,267.67	0.00	\$167.36	\$0.00
004	Acarreo sobre camión de volleo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria. Carga con maquina.	M3	32.00	\$158.52	\$5,072.64	32.00	\$158.52	\$5,072.64	0.00	\$158.52	\$0.00
005	Acarreo sobre camión de volleo de 7 m3 de material no utilizable, kilometros subsucesientes, se consideraran (3 km)	M3/rm	96.00	\$19.75	\$1,896.00	96.00	\$19.75	\$1,896.00	0.00	\$19.75	\$0.00
006	Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando atine de la superficie y dejando pendientes deacuerdo al proyecto	M3	406.20	\$47.17	\$19,160.45	406.20	\$47.17	\$19,160.45	0.00	\$47.17	\$0.00
007	Acarreo sobre camión de volleo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria. Carga con maquina.	M3	406.20	\$158.52	\$64,390.82	406.20	\$158.52	\$64,390.82	0.00	\$158.52	\$0.00
008	Acarreo sobre camión de volleo de 7 m3 de material no utilizable, kilometros subsucesientes, se consideraran (3 km)	M3/rm	1218.60	\$19.75	\$24,067.35	1218.60	\$19.75	\$24,067.35	0.00	\$19.75	\$0.00
009	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (50% material de banco - 50% material petreo)	M3	253.87	\$481.22	\$122,167.32	253.87	\$481.22	\$122,167.32	0.00	\$481.22	\$0.00
010	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base para banquetas compactada con balaiama al 100% utilizando material de banco (tepalcate)	M3	32.00	\$516.23	\$16,519.36	32.00	\$516.23	\$16,519.36	0.00	\$516.23	\$0.00
011	Guarnicion de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm , seccion Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 10 cm, cimbra común a 4 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentacion de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo herramienta.	M	127.00	\$430.83	\$54,715.41	127.00	\$430.83	\$54,715.41	0.00	\$430.83	\$0.00
012	Banqueta de Concreto f'c=f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm, de 0.08 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	M2	160.00	\$422.96	\$67,673.60	160.00	\$422.96	\$67,673.60	0.00	\$422.96	\$0.00
013	Revestimiento de concreto f' c = 250 kg/cm2 agregado de 19 mm cemento normal revestimiento 8 a 10 cm de 15 cm de espesor, armado con malla electrosoldada de 6-6/10-10 rollo de 10 mts, incluye cimbra metalica, mano de obra y herramientas menores	M2	1015.49	\$674.75	\$685,201.88	1015.49	\$674.75	\$685,201.88	0.00	\$674.75	\$0.00
				IMPORTE	\$1,090,254.39	IMPORTE	\$1,090,254.39	IMPORTE	\$1,090,254.39	IMPORTE	0.00
				IVA	\$174,440.70	IVA	\$174,440.70	IVA	\$174,440.70	IVA	0.00
				TOTAL	\$1,264,695.09	TOTAL	\$1,264,695.09	TOTAL	\$1,264,695.09	TOTAL	0.00

PROF. RAFAEL AGUIRRE SALAZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 ENCARGADO DE DES. ECO. Y SOC.

ING. ANGELICA RUANO AVILA
 CONTRATISTA

0201

EJERCICIO 2024

ACTA DERECHOS Y OBLIGACIONES

Siendo las **9:00 horas** del día **31 de mayo de 2024**, en el espacio que ocupa la oficina de Desarrollo económico y social, Ubicado en el edificio de la presidencia Municipal marcado con el No. 1, de la calle Hidalgo, esquina con la Plaza Principal en Nochistlán, Zac. Las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, conforme a lo dispuesto en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece el artículo 64 de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas con el objeto de llevar a cabo el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones sobre los trabajos ejecutados al amparo del contrato No. **NOHIS/FONDOIII/2024/07** que suscribieron Desarrollo económico y social el contratista **C. Angelica Ruano Avila**.

ANTECEDENTES

Con fecha **28 febrero de 2024** las partes celebran contrato de Obra Pública con base a Precio Unitario y tiempo determinado identificado con el No. De Contrato: **NOHIS/FONDOIII/2024/07** para llevar a cabo los trabajos de obra: "**PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**" Con fecha de iniciación real de los trabajos el día **08 de marzo de 2024** y la fecha de terminación real el día **17 de mayo del 2024**.

Quedando un monto total contratado de **\$1'264,695.09** (un millón doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y cinco pesos 09/100M.N) Esta cantidad incluye el impuesto al valor agregado.

Durante del proceso de la obra se autorizaron un total de **1 anticipo y 1 (una)** estimación a precio unitario por trabajos ejecutados por un monto total de **\$1'264,695.09** (un millón doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y cinco pesos 09/100M.N) Esta cantidad incluye el impuesto al valor agregado.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprenden:

"PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS"

Operado: FONDO III

0202




RELACIÓN DE ESTIMACIONES PAGADAS POR TRABAJOS EJECUTADOS

Por lo anterior manifiestan las partes que no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

No. de Estimac.	Fecha	Importe Total	Deducciones	Anticipo (Amortización)
ANTICIPO	09 de abril de 2024	\$379,408.52	\$0.00	\$0.00
1	21 de mayo de 2024	\$885,286.56	\$0.00	\$0.00

Sin otro asunto que tratar, se cierra la presente Acta firmado de conformidad las personas que interviene en este acto.

RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA
ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO. 	C. ANGELICA RUANO AVILA. 
