



RENUNCIA AL ANTICIPO DE OBRA

NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS. A 18 DE JUNIO DE 2024

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESENTE:

HAGO REFERENCIA, A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS" Y DERIVADO DE LA INVITACION A PARTICIPAR EN LA MISMA, LA QUE SUSCRIBE MAGDALENA AMRTINEZ MELENDREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE "MELENDREZ CONSTRUCCIONES" Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

"RENUNCIO AL ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS. ASÍ MISMO SE ACLARA QUE LA OBRA SERA INICIADA CON RECURSOS PROPIOS, HASTA HACER EL COBRO DE LA PRIMERA ESTIMACION"

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN QUE SIRVA AL PRESENTE

ATENTAMENTE
Magdalena Martínez Melendrez
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.
REPRESENTANTE LEGAL



0086

POLIZA DE FIANZA
BENEFICIARIO

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	EXPEDICION
121,358.94	PESOS	2287277	0	18-06-2024
				ENDOSO
				0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 121,358.94 CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.

INICIO DE VIGENCIA: 18/06/2024

Por: MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
Dirección: LA CIENEGUITA 3-A, CONOCIDO, C.P. 99900, NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS

Ante: H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
Dirección: HIDALGO NO. 1, ZONA CENTRO, NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS

PARA GARANTIZAR POR CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE LE OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA CANTIDAD DE \$121,358.94 (CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.).


ANTE EL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. CON DOMICILIO EN CALLE HIDALGO No. 1, ZONA CENTRO, NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

PARA GARANTIZAR POR MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ, CON DOMICILIO EN LA CIENEGUITA 3-A, CONOCIDO, C.P. 99900, NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS, EL CUMPLIMIENTO, Y LOS VICIOS OCULTOS DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO NOCHIS/FONDOIII/2024/13, DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2024, CELEBRADO CON EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC., A TRAVES DE SUS TITULARES LOS C. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. LILIANA ROQUE GÓMEZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JOBONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS, SEGÚN DESCRIPCIÓN DE OBRA EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL REFERIDO CONTRATO, POR UN MONTO TOTAL DE \$1,213,589.41 (UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.) INCLUIDO EL IVA, LA PRESENTE GARANTIA SE CONSTITUYE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$121,358.94 (CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO Y TENDRA LA DURACION DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA EN LA QUE CONSTA FORMALMENTE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, AL TERMINO DEL CUAL DE NO HABER INCONFORMIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC., CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. PROCEDERA A SU CANCELACION, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS QUE SE GARANTIZAN CON LA PRESENTE FIANZA, SE COMUNICARA DE INMEDIATO A LA CONTRATISTA Y A CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., PARA LO CUAL LA VIGENCIA DE LA FIANZA SEGUIRA SUBSISTENTE DURANTE LA SUSTENTACION DE TODOS LOS RECURSOS Y JUICIOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CREDITO A QUE SE REFIERE, AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN. CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 279, 280, 282, 291, 283, 178 Y 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, ASIMISMO RENUNCIA AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTICULO 179 DE LA CITADA LEY. LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, INCLUYENDO LAS REFORMAS Y ADICIONES A DICHO ORDENAMIENTO, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.

----- FIN DE TEXTO -----

Expedido en: OFICINA: 00603; AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.



FRANCISCO JOSE BATTA DIEZ
BAD72031150

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO. LOS PAGOS DEBERAN HACERSE A TRAVES DE SUJERALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERA SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERA RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.



FIRMA DIGITAL

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 C102 D9

0087

R.F.C. FM0930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

Firma Digital: lP2C1ajlujbzgZdyPYpe4KsWBBRagycM8me3SSx04pmcs2WV2V15G4fLus4KPrzuzm0fcpDm0Gagv5CSAgredHk0t0ct0Nnyr6ACwv5ZVWpR2WYf0g01k0xSD0x01g0f0C0008W==



CÉDULA DE REGISTRO

C20243100002355

MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

PRESENTE:

Se expide la presente cédula con base en las facultades otorgadas por los Artículos 16, 17 y 30, fracción XXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; Título Cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios y Título Cuarto de su Reglamento, Título III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas y Título III de su Reglamento; Artículo 41, fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen los Lineamientos para el Registro Único de Proveedores y Contratistas Validados de Gobierno del Estado de Zacatecas, publicado el 12 de octubre de 2022, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

Cédula de Contratista

No. Cédula	DLC/C/101/2024		
Razón Social	MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ		
Dirección	LA CIENEGUITA 3 CONOCIDO	Teléfono	3467132929
Estado	Zacatecas	Municipio	NOCHISTLAN DE MEJIA
R.F.C.	MAMM880814NIA	Capital Contable	\$1,902,252.91

Especialidad

Porcentaje


Pavimentación.	25
Construcción y mantenimiento a obras complementarias al sistema de alcantarillado sanitario.	25
Construcción, rehabilitación y mantenimiento de los sistemas y obras complementarias de agua potable.	25
Construcción de caminos rurales.	25

Los datos registrados para la emisión de la presente cédula están sujetos a verificación y fiscalización por parte de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado. Esta cédula puede ser suspendida o cancelada de acuerdo a la normatividad vigente aplicable a la materia. La vigencia de ésta cédula es de 12 meses a partir de la fecha de validación

La vigencia de ésta cédula es de 12 meses a partir de la fecha de validación de la información presentada

Zacatecas, Zac. a 8 de marzo del 2024

La presente cédula será válida hasta el día 8 de marzo del 2025



Memorándum de Verificación

MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

PRESENTE:

Felicidades por haber realizado el trámite y obtenido la Cédula en el Registro Único de Proveedores y Contratistas Validados, a través de la plataforma electrónica RUPCOVA; trámite que forma parte de los programas de modernización que Gobierno del Estado implementa para brindar una mejor atención a las personas interesadas en realizarlo, facilitando la realización vía internet, sin tener que trasladarse a las oficinas de la Secretaría de la Función Pública.

Es nuestro objetivo establecer un efectivo control que permita brindar certeza de la capacidad técnica, jurídica, económica y material de las personas físicas y morales con las que el Gobierno del Estado celebre contratos de adquisiciones, servicios y obra pública.

Los datos proporcionados por los interesados en el trámite de inscripción o revalidación son recibidos de buena fe, por lo que la Secretaría de la Función Pública, podrá requerir en cualquier momento los documentos originales que acrediten la información proporcionada para su cotejo.

La Secretaría está facultada para cancelar la Cédula, sin perjuicio de accionar la vía legal correspondiente cuando la información proporcionada resulte falsa.

Asimismo, la Secretaría se reserva el derecho para efectuar visitas de verificación a los domicilios de las personas con registro para constatar la veracidad de la información asentada y documentación presentada en el trámite de registro; en caso de que el proveedor o contratista se niegue a dar las facilidades necesarias para que la Secretaría ejerza sus funciones de verificación, podrá suspender la cédula hasta por el término de doce meses.


Si durante la vigencia de la cédula existen modificaciones a los datos proporcionados en el registro, el proveedor o contratista tendrá la obligación de comunicarlo en un plazo no mayor a diez días hábiles a la fecha en que ocurrió la modificación a la Secretaría con la finalidad de mantener actualizada la información en el RUPCOVA, acreditando lo anterior con el documento respectivo.

Lo anterior, con base en las facultades otorgadas por los Artículos 16, 17 y 30, fracción XXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas: Título Cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios y Título Cuarto de su Reglamento, Título III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas y Título III de su Reglamento; Artículo 41, fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen los Lineamientos para el Registro Único de Proveedores y Contratistas Validados de Gobierno del Estado de Zacatecas, publicado el 12 de octubre de 2022, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

ATENTAMENTE.

M.A.G. MARIO ALBERTO BAÑUELOS MONTELLANO

Director de Contrataciones Públicas



DIRECCION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO

**C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
PRESENTE:**

Se expide la presente cédula con base en las facultades otorgadas por los artículos 30 fracción XXXV de la Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 33, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas, Título III de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios De Zacatecas.

El siguiente Registro Único de Proveedores y Contratistas del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas; está verificado y cumple con los requisitos que marcan la normativa vigente.

Cédula de Contratista

No. Cédula	Nochistlán/02/2024
Razón Social	MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
Dirección	LA CIENEGUITA NO 3
Teléfono	3467132929
Estado	ZACATECAS
Municipio	NOCHISTLAN DE MEJIA
RFC	MAMM880814NIA

La Vigencia de la presente cédula es hasta el 31 diciembre de 2024.


**ATENTAMENTE
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.**



ING. ANA GABRIELA TACHIQUIN RAMIREZ



**CONTRALORIA
MUNICIPAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2021-2024**



0090

Municipio de Nochistlán de Mejía Zacatecas
Dirección de Desarrollo Económico y Social

ACTA DE ENTREGA DEL ÁREA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha: 18 de junio del 2024

En relación con el contrato de obra pública, precios unitarios y tiempo determinado No. **NOCHIS/FONDOIII/2024/13**, Relativo de los trabajos: **CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

se reunieron en el lugar de los trabajos, por parte del Municipio, Ing. Ramon Salazar Luna residente de obra, por parte de la empresa el C. Magdalena Martínez Melendrez, Para poner a disposición del contratista el área donde habrá de ejecutarse los trabajos del contrato, el cual estará bajo su resguardo durante todo el tiempo que dure la obra, para lo cual debería tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden y la seguridad del inmueble, mismo que terminados los trabajos deberá entregar como mínimo en las condiciones que lo recibe a reserva de las áreas que se intervendrán para el: **CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presenta, firmando de conformidad, al calce de la hoja de la presente, a las 10:00 horas del día 18 de junio 2024 otorgando una copia a todos los presentes.

Por el municipio.


Por la empresa



Ing. Ramon Salazar Luna
RESIDENTE DE OBRA



C. Magdalena Martínez Melendrez
SUPERINTENDENTE DE OBRA



0091



INICIO DE OBRAS

NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS. A 19 DE JUNIO DE 2024

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESENTE:

HAGO REFERENCIA, AL CONTRATO NÚMERO NOCHIS/FONDDIII/2024/13 RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS" UN IMPORTE DE \$ 1,213,589.41 (UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.) DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024 CELEBRADO CON ESA DEPENDENCIA A SU DIGNO CARGO.

SE LE INFORMA QUE SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE OBRA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 DE LA OBRA DENOMINADA:

NOMBRE: "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS"

MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,213,589.41

PLAZO DE EJECUCIÓN: DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2024

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN QUE SIRVA AL PRESENTE

Magdalena Martinez Melendrez
ATENTAMENTE

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.
REPRESENTANTE LEGAL



C.C.P. C. J. MANUEL JIMENEZ FUENTES.

0092



NOCHISTLAN
De Mejia
PUEBLO MÁGICO

DIRECCIÓN: UNIDAD DE PLANEACIÓN

NO. DE OFICIO: 514

SECCION: 3

EXPEDIENTE: ADMVO. 2021-2024

ING. RAMON SALAZAR LUNA
PRESENTE.

Por este medio me dirijo a usted para designarlo como responsable de la supervisión de la siguiente **CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** con número de contrato **NOCHIS/FONDOIII/2024/13**, de la cual se le hace responsable de la recopilación revisión de la documentación para conformación del expediente técnico que requiere la dependencia ejecutora Dirección de Desarrollo Económico y Social. Dicha información se debe de entregar al responsable del fondo correspondiente.


Documentación a entregar:

- Oficio de invitación.
- Oficio de adjudicación.
- Presupuesto contratado.
- Tarjeta de precios unitarios.
- Permisos de construcción
- Factibilidad de la obra
- Calendario de ejecución del contratista.
- Asignación de residente.
- Oficio de inicio de obra.
- Programa de obra.
- Catálogo de conceptos contratados.
- Revisión y entrega de generadores y estimaciones de obra con fotografías.
- Memoria fotográfica global impresa y digital.
- Bitácora convencional y reporte fotográfico.
- Reporte de visita semanal (día de corte los días viernes).
- Pruebas de laboratorio (pavimentaciones o estructuras con concreto).
- Revisión y análisis correcto de generadores y estimaciones de obra.
- Acta de entrega recepción.
- Fianzas o garantías de obra.
- Finiquito.
- Convenio de ampliación de metas. (oficio de aprobación, proyecto y presupuesto).

Unidad de
Planeación
2021 - 2024
Nochistlan de Mejia, Zac.

UP

Sin más por el momento al respecto para enviar un cordial saludo, quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración.



ATENTAMENTE.
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 18 DE JUNIO DE 2024
UNIDAD DE PLANEACIÓN

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

Recibi
18/06/24
[Signature]

0093



DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS. A 19 DE JUNIO DE 2024

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESENTE:

HAGO REFERENCIA, AL CONTRATO NÚMERO NOCHIS/FONDOIII/2024/13 RELATIVO A "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS" DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024 CELEBRADO CON ESA DEPENDENCIA A SU DIGNO CARGO.

AL RESPECTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS, III Y II7 DE SU REGLAMENTO, LE INFORMO QUE CON ESTA FECHA SE NOMBRA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.

DATOS DEL SUPERINTENDENTE DE LOS TRABAJOS

NOMBRE: ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA
CURP: MALE850804HZSCDLD0
CEDULA PROFESIONAL: 5660932 U.A.A.
DOMICILIO: HIPOLITO PUENTES #9 FRACC. ARBOLEDAS II, NOCHISTLÁN ZACATECAS.C.P.99900
TELEFONO:3461008045

CABE SEÑALAR QUE EL SUPERINTENDENTE DESIGNADO CONOCE LA AMPLITUD DE LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTRO, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ASÍ MISMO ESTÁ FACULTADO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL Y GENERAL PARA LA TOMAS DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE REFERENCIA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN QUE SIRVA AL PRESENTE

Magdalena Martínez Melendrez
ATENTAMENTE
Magdalena Martínez Melendrez

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.
REPRESENTANTE LEGAL



0004

BITACORA

18/JUNIO/2024 AL 21/JUNIO/2024

Esta semana se da inicio con el trazo y nivelación y excavación en corte debajo de la subrasante con retroexcavadora.

24/JUNIO/2024 AL 28/JUNIO/2024

En esta semana se da inicio con la mampostería en cimiento de piedra braza.

Se continúa con la excavación en corte debajo de la subrasante y la excavación con roto martillo.

01/JULIO/2024 AL 05/JULIO/2024

Se continúa con los trabajos de mampostería en cimiento de piedra braza y se retira el empedrado con recuperación de material y con el acarreo de material.

08/JULIO/2024 AL 12/JULIO/2024

Se comienza con la formación de terraplenes Y bases con material de banco y material pétreo y se continúa con el acarreo de material producto de la excavación.


15/JULIO/2024 AL 19/JULIO/2024

Se termina con los trabajos relacionados con las preliminares, terracerías y bases. Y se realizan las pruebas de compactación.

Se da inicio en el primer tramo con la pavimentación de concreto $f_c=250\text{kg/cm}^2$ agregado de 19mm, revenimiento 8 a 10 con un espesor de 15 cm. Y se realizan las pruebas de control del concreto.

22/JULIO/2024 AL 26/JULIO/2024

Se continua con la pavimentación de concreto $f_c=250\text{kg/cm}^2$ agregado de 19mm, revenimiento 8 a 10 con un espesor de 15 cm.



Magdalena Martinez
Melendez

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

0005

29/JULIO/2024 AL 31/JULIO/2024

Se termina con la pavimentación y se concluyen al 100% los trabajos de pavimentación de 300m en la jabonera del municipio de Nochistlan de mejía, Zac.

Magdalena Martínez
Meléndrez
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
REPRESENTANTE LEGAL


ING. RAMÓN SALAZAR LUNA
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0006



Usu: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C02511 Del 12/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
10:32 a. m.
Página | 1

Concepto: 71BD - Obra Pública : 404006 - CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNIC.
GP Folio: 594

Beneficiario: **MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404006-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$1,213,589.41		FF:511, GP Folio: 594
0002	8260-511-404006-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$1,213,589.41	FF:511, GP Folio: 594
0003	2113-000616	MAGDALENA MARTINEZ	\$1,213,589.41		FF:511, GP Folio: 594
0004	1112-08-163	FONDO III 2024 1255080241		\$1,213,589.41	FF:511, GP Folio: 594
Sumas iguales =>			<u>2,427,178.82</u>	<u>2,427,178.82</u>	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0096-A



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P07321 Del 12/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024 10:31 a. m.
Página | 1

Concepto: 71BD - Obra Pública : 404006 - CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNIC.
GD Folio: 604

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-404006-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$1,213,589.41		FF:511, GD Folio: 604
0002	8240-511-404006-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$1,213,589.41	FF:511, GD Folio: 604
0003	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de	\$1,213,589.41		FF:511, GD Folio: 604
0004	2113-000616	MAGDALENA MARTINEZ		\$1,213,589.41	FF:511, GD Folio: 604
Sumas iguales =>			<u>2,427,178.82</u>	<u>2,427,178.82</u>	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte


BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

12/08/2024 15:12

Cuenta/ CLABE Ordenante	1255080241
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
RFC Ordenante	MNM850101AC3
Moneda	MXP
ID Tercero	323
Nombre del Beneficiario	MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0592391588
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
RFC Beneficiario	MAMM880814NIA
Importe a Transferir	\$1,213,589.41
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/08/2024
Número de Referencia	01
Propósito de la Transferencia	PAGO DE FACTURA NO 71BD
Clave de Rastreo	50
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha Captura	12/08/2024 03:11:41 p. m.
Ejecutó	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha de Ejecución	12/08/2024 03:12:05 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



ORDEN DE PAGO 2024

02-ago

MUNICIPIO: 034 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: RAMO 33 . PROGRAMAS FEDERALES
 SUB-PROGRAMA : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 (RAMO, FONDO O PROGRAMA) (FONDO III 2024)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING.DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 CARGO SOLICITANTE: ENCARGADO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
 FIRMA DEL SOLICITANTE: _____
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 2 de agosto de 2024
 CUENTA BANCARIA ORIGEN : 1255080241

No.	CLAVE PRESUPUESTARIA								NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE.	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO						
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	511	FONDO III RAMO 33	404006	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6141	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO	NOCHIS/FOND OIII/2024/13	MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ	71BD	31/07/2024	1,213,589.41	(UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 41/100 MN)


 AUTORIZA:

TESORERÍA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024
ROCÍO ROQUE GÓMEZ
 ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL
 FECHA : 02 DE AGOSTO DEL 2024


 AUTORIZA:

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024
DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 FECHA : 02 DE AGOSTO DEL 2024


 AUTORIZA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024
C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FECHA : 02 DE AGOSTO DEL 2024


 AUTORIZA:

SINDICATURA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024
LILIANA ROQUE GÓMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL
 FECHA : 02 DE AGOSTO DEL 2024

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..." - 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.

0098

RFC emisor: MAMM880814NIA **Folio fiscal:** 84B728B0-2995-4223-A442-4459AD9C71BD
Nombre emisor: MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ **No. de serie del CSD:** 00001000000512429097
Folio: 109 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 99900 2024-07-31 13:37:11
RFC receptor: MNM850101AC3 **Efecto de comprobante:** Ingreso
Nombre receptor: MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Código postal del receptor: 99900 **Exportación:** No aplica
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto	
721411C3		1.00	C42	Unidad de servicio	1,046,197.77	1,046,197.77		Si Objeto de impuesto.	
Descripción	PAGO DE LA PRIMERA Y UNICA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERAMUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS" CON NUM. DE CONTRATO NOCHIS/FONDOIII/2024/13				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	1,046,197.77	Traslado	16.00%	167,391.64
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,046,197.77
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 167,391.64
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,213,589.41

Sello digital del CFDI:

bYhvK11LjxDIs4gRe6GtI4wP76voQO+N3Pg5dINGN12nRqg559cUyJi7LaKNBZI+AEGMb+02rQKik+LBh+IhI+TZofzG9Oe7pvtThKJPodWB8Sa8AzeyPWdKCAj7qoAMzi7YeLMvse8+7DWB Tb1rOA85guJwZVo7Xk6d99qivtKIFEWvViwi0ydBNTYDXriS1C7EIAQm993hohdmvAWnWTrfM7aIBqmRvszDO3TWnZhb08QGFFgM+62YcFW7ysyB3W3a6ebY/IV+DW3vgsjwISGnU3+m lI6GQik7SMHV0wqHgJZJFwks+NoKMPm5xmjHemGBNAyV/80cKfmsJQ==

Sello digital del SAT:


csetwyER+nFqLn7wpeO0gRAHMoMMS82IIU5Ch9sDkWDpM6CqdX1ACIZTsgIT2UvhNm8nTOUZkPhSP3MiHeET5ErafHn5KqmFXnm3gAdd5tehGFz6oxT3hwMmGBUeGTIBOQyeh 0um+Ubjx4Tt4O2cyg52KyJTp4ke1kH1UoBh2teet+IFX+lu43WbnPA/0dSWOU6HVDi9/suU+lv3hDsjK5u92w/ApTKRqCbfiQbevrJ2OJ08T6UPCsj0wLgJaTbKDZCCRWXfQ80CCEesncWV Bumuz1gxeoTVUKI//69vzvR3Qm6cfZv5Mx7kIKn6EZ3Imna5SQkHDe8w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|84B728B0-2995-4223-A442-4459AD9C71BD|2024-07-31T13:37:54|SAT970701NN3|bYhvK11LjxDIs4gRe6GtI4wP76voQO+N3Pg5dINGN12nRqg55 9cUyJi7LaKNBZI+AEGMb+02rQKik+LBh+IhI+TZofzG9Oe7pvtThKJPodWB8Sa8AzeyPWdKCAj7qoAMzi7YeLMvse8+7DWB Tb1rOA85guJwZVo7Xk6d99 qivtKIFEWvViwi0ydBNTYDXriS1C7EIAQm993hohdmvAWnWTrfM7aIBqmRvszDO3TWnZhb08QGFFgM+62YcFW7ysyB3W3a6ebY/IV+DW3vgsjwISGn U3+mI6GQik7SMHV0wqHgJZJFwks+NoKMPm5xmjHemGBNAyV/80cKfmsJQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-07-31 13:37:54

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



0000



ENTREGA DE ESTIMACION OI ÚNICA

NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS. A 31 DE JULIO DE 2024

ING. RAMON SALAZAR LUNA
SUPERVISOR DE OBRA
PRESENTE:

HAGO REFERENCIA, AL CONTRATO NÚMERO NOCHIS/FONDOIII/2024/13 RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS" PARA REALIZAR LA ENTREGA, REVISION Y APROBACIÓN DE LA ESTIMACION OI ÚNICA CON UN IMPORTE DE \$ 1,213,589.41 (UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.) QUE AMPARAN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2024 COMO SE DESCRIBE EN LA CARATULA DE LA ESTIMACION.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN QUE SIRVA AL PRESENTE

ATENTAMENTE
Magdalena Martinez Melendrez
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.C.P. ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA



0100

MELENDREZ CONSTRUCCIONES



RESUMEN DE ESTIMACIÓN

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.
CONTRATISTA: MAGDALENA MARTINEZ MELEDREZ

*CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESIO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA,
MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS*

ESTIMACION	01	DEL 18/06/24 AL 31/07/24
HOJA	1	DE 1
MONTA CONTRATADO		\$ 1,213,589.41
No. DE CONTRATO		NOCHIS/FONDOIII/2024/13

HOJA	CLAVES DE CONCEPTOS	IMPORTE
1 Y 2.	010705, RETA-01, 010115, TEMP*3, MARTI-001, 010818, METAC-0002-1, 031202 Y 030504.	\$ 1,046,197.77

HISTORIAL	
ANTICIPO	\$0.00
ESTIMADO A LA FECHA	\$1,213,589.41
POR ESTIMAR	\$0.00

SUBTOTAL	\$1,046,197.77
I.V.A. 16 %	\$ 167,391.64
TOTAL DE LA FACTURA	\$1,213,589.41

TOTAL A RECIBIR \$1,213,589.41

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

SUPERVISOR

ING. RAMON SALAZAR LUNA

CONTRATISTA
Magdalena Martinez Meledrez

MAGDALENA MARTINEZ MELEDREZ

0101

MELENDREZ CONSTRUCCIÓN



ESTIMACION DI ÚNICA
 "CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD
 DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,
 ZACATECAS."

PERIODO: DEL 16 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024

CLAVE DE ESTIMACION: DI ÚNICA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN DE LA ESTIMACION	VOLUMEN POR EJECUTAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE TOTAL
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.								
PRELIMINARES								
D10706	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano	m2	1,050.00	1,050.00	0.00	\$8.03	\$8,431.50	\$8,431.50
RETA-D1	Retiro de empedrado con recuperación de material, incluye: almacenamiento a una distancia máxima de 20 mts.	m2	100.80	100.80	0.00	\$44.85	\$4,520.88	\$4,520.88
D10115	Formación de terraplenes con material de banco (tepetate-cascajo), incluye compactación al 90 % proctor, incluye incorporado de agua, extendido de material, compactado en capas de 20 cm., equipo, mano de obra.	m3	124.70	124.70	0.00	\$575.58	\$71,774.83	\$71,774.83
TERRACERIAS								
TEMP*3	Excavación en corte debajo de la subrasante con medios mecanicos (retroexcavadora) considerando afine de la superficie con motoniveladora y dejando pendientes de acuerdo a proyecto.	m3	261.23	261.23	0.00	\$151.71	\$39,631.20	\$39,631.20
MART1-001	Excavación con Rotomartillo en terreno tipo C (0.0% tierra, 0.0% tepetate, 100% piedra) incluye: operador y ayudante.	hora	15.00	15.00	0.00	\$1,370.44	\$20,556.60	\$20,556.60
D10818	Arrastre sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terrajería, carga con máquina.	m3	261.23	261.23	0.00	\$127.26	\$33,244.13	\$33,244.13

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

REPRESENTANTE LEGAL
Magdalena Martinez Melendez
 C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

MELENDREZ CONSTRUCCIÓN



ESTIMACION DI ÚNICA
 "CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD
 DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,
 ZACATECAS."

PERIODO: DEL 16 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024

CLAVE DE ESTIMACION: DI ÚNICA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN DE LA ESTIMACION	VOLUMEN POR EJECUTAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE TOTAL
SUB-BASE Y BASE								
METAC-0002-1	Formación de base para nivelación compactada al 100% , utilizando material de banco y material petreo (50% material de banco - 50% material petreo)	m3	142.19	142.19	0.00	\$593.12	\$84,335.73	\$84,335.73
CONCRETO								
031202	Mampostería en cimientto de piedra braza de 0.25 a 0.50 m3/ml junteado con mezcla cemento-arena 1:3	m3	18.50	18.50	0.00	\$1,925.40	\$35,619.90	\$35,619.90
030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electroscudada 561010 rollo de 100 mts. Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	1,050.00	1,050.00	0.00	\$712.46	\$748,083.00	\$748,083.00

SUB- TOTAL CAMINO DE ACCESO EN LA JABONERA= **\$1,046,197.77**


SUBTOTAL = \$1,046,197.77
 IVA 16 % = \$167,391.64
TOTAL = \$1,213,589.41

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

0103


REPRESENTANTE LEGAL
Margalena Martinez Melendrez
 C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

GENERADORES

CONTRATO:	NOCHIS/FONDOIII/2024/13	MONTO CONTRATADO:	1,213,569.41
NOMBRE DE LA OBRA:	"CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS."		
FECHA DE CONTRATO :			
FECHA DE INICIO: 18 DE JUNIO DE 2024			
PERIODO DE EJECUCION: 44 DIAS NATURALES			
FECHA DE TERMINO: 31 DE JULIO DE 2024			


CLAVE	DESCRIPCION DE CONCEPTO:	Trase y nivelacion con aparatos topograficos en terreno plano					UNIDAD	
		LOCALIZACION	TIPO	ANCHO	LARGO	AREA	VOL	TOTAL
010706								
		EJE	TRAMO					
		1						
		0+000	0+140	3.50	140.00	490		490.00
		2						
		0+250	0+300	3.50	50.00	175		665.00
		3						
		0+330	0+480	3.50	110.00	385		1050.00
								1050.00

CONTRATISTA:	MELENDEZ CONSTRUCCION		PROGRAMA
MUNICIPIO:	LA JABONERA		FONDO III
EST. No.	FECHA DE ESTIMACION:	HOJA:	DE: DE:
1	31/07/2024	1	JUNIO A JULIO

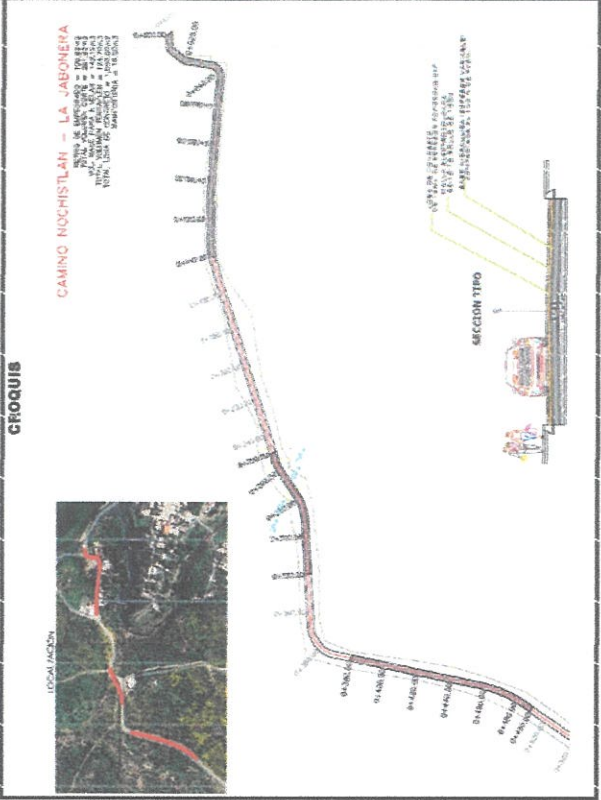


OPERADO
FAISM (FIII)

EJERCICIO 2024 0104



C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ



ING. RAMON SALAZAR LUNA

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:	MELENDREZ CONSTRUCCIÓN	PROGRAMA
MUNICIPIO:	LOCALIDAD:	
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	LA JABONERA	FONDO III
EST. No. 1	FECHA DE ESTIMACIÓN:	HOJA: 1
	31/07/2024	PERIODO DE: JUNIO A JULIO



CONTRATO:	MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	PROGRAMA
MONTO CONTRATADO:	1,213,589.41	
NOMBRE DE LA OBRA:	NOCHIS/FONDOIII/2024/13	
"CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS."		
FECHA DE CONTRATO:		
FECHA DE INICIO: 18 DE JUNIO DE 2024		
PERIODO DE EJECUCIÓN: 44 DIAS NATURALES		
FECHA DE TÉRMINO: 31 DE JULIO DE 2024		
DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO:		
CLAVE 010708	Trase y nivelacion con aparatos topograficos en terreno plano	UNIDAD MEZ



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

Magdalena Martinez Melendrez


C.MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

Ing. Ramon Salazar Luna

ING. RAMON SALAZAR LUNA

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:	MELENDEZ CONSTRUCCIÓN	PROGRAMA	
MUNICIPIO:	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	LOCALIDAD:	LA JABONERA
MONTO CONTRATADO:	1,213,589.41	EST. No.:	1
NOMBRE DE LA OBRA:	NOCHIS/FONDOIII/2024/13	FECHA DE ESTIMACION:	31/07/2024
DESCRIPCION DE CONCEPTO:	"CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS."	HOJA:	2
FECHA DE CONTRATO:		PERIODO DE:	DE: 09
FECHA DE INICIO:	18 DE JUNIO DE 2024	A:	JUNIO
PERIODO DE EJECUCION:	44 DIAS NATURALES	PERIODO DE:	A
FECHA DE TERMINO:	31 DE JULIO DE 2024	PERIODO DE:	JULIO
UNIDAD:	RET-A-01	FECHA DE ESTIMACION:	31/07/2024
DESCRIPCION DE CONCEPTO:	Retiro de empedrado con recuperacion de material, incluye almacenamiento a una distancia maxima de 20 mt.	HOJA:	2
UNIDAD:	M2	PERIODO DE:	A

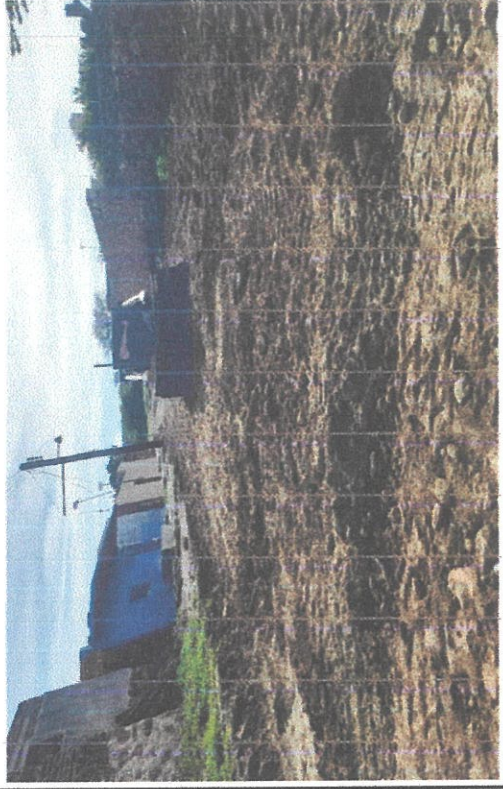

FOTOS

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024


Magdalena Martinez Melendez
C-MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ

ING. RAMON SALAZAR LUNA
ING. RAMON SALAZAR LUNA

GENERADORES

CONTRATISTA:		MELENDEZ CONSTRUCCIÓN		PROGRAMA	
MUNICIPIO:		LOCALIDAD:			
NOCHISTILAN DE MEJIA, ZAC.		LA JABONERA		FONDO III	
EST. No.	FECHA DE ESTIMACION:	HO-JA:	PERIODO DE:	DE:	DE:
1	31/07/2024	JUNIO	A	3	JULIO



CONTRATO:		MONTO CONTRATADO:	
NOCHIS/FONDOIII/2024/13		1,213,589.41	
			
NOMBRE DE LA OBRA:			
"CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTILAN DE MEJIA, ZACATECAS."			
FECHA DE CONTRATO:			
FECHA DE INICIO: 16 DE JUNIO DE 2024			
PERIODO DE EJECUCION: 44 DIAS NATURALES			
FECHA DE TERMINO: 31 DE JULIO DE 2024			
DESCRIPCION DE CONCEPTO:			




CLAVE	LOCALIZACION	TIPO	ANCHO	LARGO	PROF	VOL	UNIDAD	TOTAL
010115							M3	
	0+000	0+040	3.50	40.00	0.2	28.00		28.00
	0+040	0+080	3.50	40.00	0.2	28.00		56.00
	0+080	0+120	3.50	40.00	0.2	28.00		84.00
	0+120	0+140	3.50	20.00	0.2	14.00		98.00
	0+250	0+270	3.50	20.00	0.15	10.50		108.50
	0+270	0+290	3.50	20.00	0.15	10.50		119.00
	0+290	0+300	3.50	10.00	0.15	5.70		124.70
								124.70

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024


ING. RAMON SALAZAR LUNA


MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ

MEMORIA FOTOGRAFICA

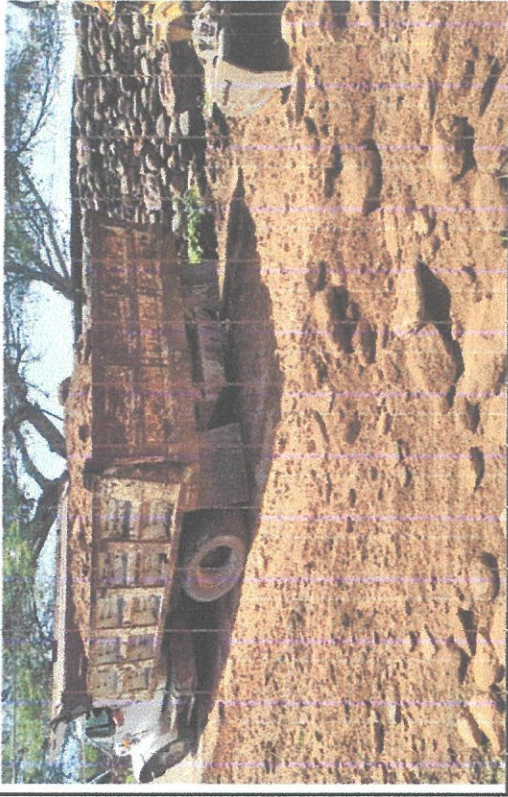CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/13	MONTO CONTRATADO: 1,213,589.41	CONTRATISTA: MELENDREZ CONSTRUCCIÓN	PROGRAMA
NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS."		LOCALIDAD: LA JABONERA	FONDO III
FECHA DE CONTRATO I		FECHA DE ESTIMACION: 31/07/2024	HOJA: 3
FECHA DE INICIO: 18 DE JUNIO DE 2024		PERIODO DE: JUNIO	DÍAS: 09
PERIODO DE EJECUCIÓN: 44 DÍAS NATURALES		A	JULIO
FECHA DE TÉRMINO: 31 DE JULIO DE 2024		FOTÓS	
DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO: Formación de terraplenes con material de banco (tejate-casajo), incluye compactación al 90 % proctor, incluye) incorporado de agua, extendido de material, compactado en cajas de 20 cm., equipo, mano de obra.			
CLAVE 010115	UNIDAD M3		

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 24

Magdalena Martinez Melendez


C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

Ing. Ramon Salazar Luna

ING. RAMÓN SALAZAR LUNA

GENERADORES

CONTRATO:		MELENDEZ CONSTRUCCIÓN		PROGRAMA	
MUNICIPIO:		LOCALIDAD:			
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.		LA JABONERA		FONDO III	
EST. No.	FECHA DE ESTIMACION:	HCJA:	PERIODO DE:		
1	31/07/2024	4	A		
		JUNIO	JULIO		

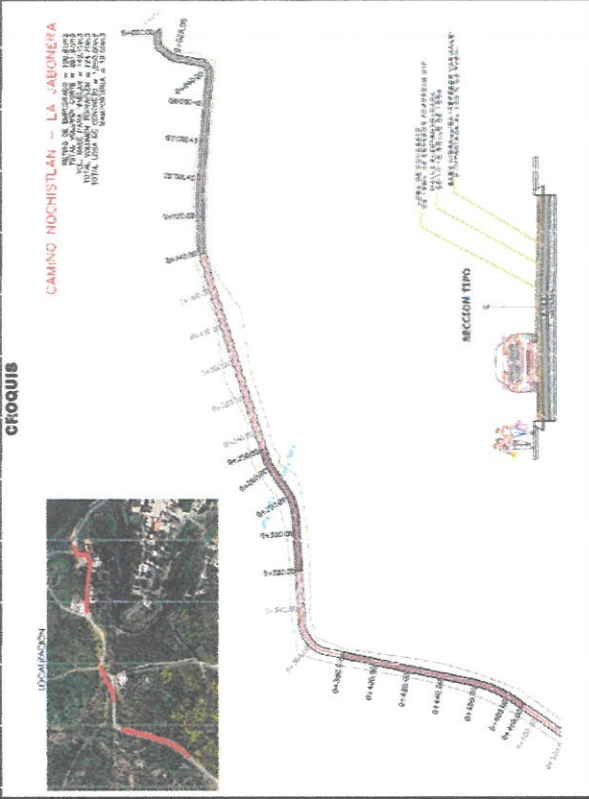

CONTRATO:		MONTO CONTRATADO:	
NOCHIS/FONDOIII/2024/13		1,213,589.41	
NOMBRE DE LA OBRA:			
"CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS."			
FECHA DE CONTRATO :			
FECHA DE INICIO:18 DE JUNIO DE 2024			
PERIODO DE EJECUCION:44 DIAS NATURALES			
FECHA DE TERMINO: 31 DE JULIO DE 2024			

CLAVE TEMP-3	LOCALIZACION	DESCRIPCION DE CONCEPTO:			UNIDAD	TOTAL		
		TRAMO	TIPO	ANCHO			LARGO	PROF
1	0+000	0+140		4.00	140.00	0.22	121.67	121.67
2	0+250	0+300		4.00	50.00	0.22	43.82	165.49
3	0+330	0+400		4.00	110.00	0.22	95.744	261.23
								261.23

OPERADO POR
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

Magdalena Martinez Melendez
C.MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ

Ing. Ramon Salazar Luna
ING. RAMON SALAZAR LUNA

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO.		MELENDREZ CONSTRUCCIÓN	
NOCHIS/FONDOIII/2024/13		PROGRAMA	
MONTO CONTRATADO:		LOCALIDAD:	
1,213,689.41		LA JABONERA	
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.			
FONDO III			
FECHA DE CONTRATO :		FECHA DE ESTIMACION:	
31 DE JUNIO DE 2024		31/07/2024	
PERIODO DE EJECUCION: 44 DIAS NATURALES		PERIODO DE:	
PERIODO DE EJECUCION: 31 DE JULIO DE 2024		JUNIO A JULIO	
DESCRIPCION DE CONCEPTO:			
CLAVE TEMP*3	Excavación en corto debajo de la subrasante con medios mecánicos (retroexcavadores) considerando afine de la superficie con motoniveladora y dejando pendientes de acuerdo a proyecto.	UNIDAD	
		m3	





OPERADO

FAISM (FIII)

EJERCICIO 2024

Magdalena Martinez Melendez

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

ING. RAMON SALAZAR LUNA

ING. RAMON SALAZAR LUNA

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO.		CONTRATISTA:		MELENDREZ CONSTRUCCIÓN		PROGRAMA	
NOCHIS/FONDOIII/2024/13		MUNICIPIO:		LOCALIDAD:		PROGRAMA	
1,213,589.41		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		LA JABONERA		FONDO III	
		EST. NG.		FECHA DE ESTIMACIÓN(I):		HOJA: 6 DE: 09	
FECHA DE CONTRATO : PERIODO DE EJECUCIÓN: 44 DIAS NATURALES FECHA DE TÉRMINO: 31 DE JULIO DE 2024		1		31/07/2024		PERIODO DE: JUNIO A JULIO	
DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO:		FOTOS					
CLAVE	Excavación con Rotomartillo en terreno tipo C (0-0% tierra, 0-0% espetate, 100% piedra) Incluye operador y ayudante.						
MARTI-001							
		UNIDAD HORA					

OPERADOR
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

Magdalena Martinez Melendrez


C. MAIDALENA MARTINEZ MELENDREZ

ING. RAMÓN SALAZAR LUNA

ING. RAMÓN SALAZAR LUNA


GENERADORES

CONTRATISTA:	MELENDEZ CONSTRUCCIÓN	PROGRAMA	PROGRAMA
MUNICIPIO:	LOCALIDAD:		
NOCHISTILAN DE MEJIA, ZAC.	LA JABONERA		FONDO III
EST. No. 1	FECHA DE ESTIMACION: 31/07/2024	HOJA: 6	DE: 09
		PERIODO DE: A	JULIO

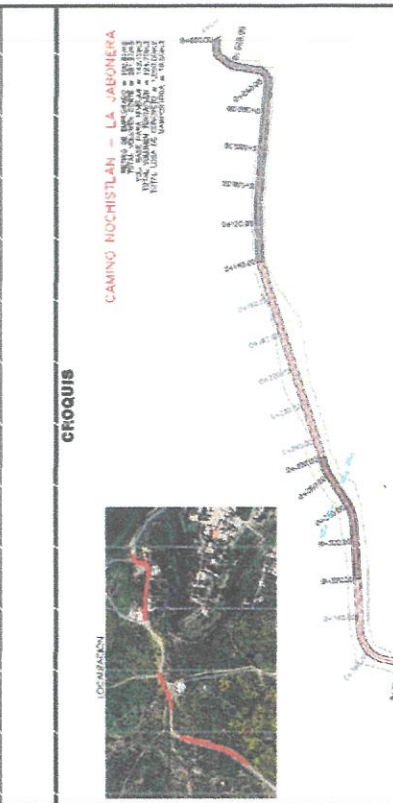


CAMINO NOCHISTILAN - LA JABONERA
 PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE LA COMUNIDAD LOCAL Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA LOCAL.

CROQUIS

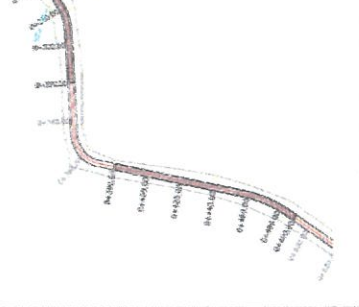

CONTRATO:	MONTO CONTRATADO:	
NOCHIS/FONDOIII/2024/13	1,213,589.41	
NOMBRE DE LA OBRA:		
"CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTILAN DE MEJIA, ZACATECAS."		
FECHA DE CONTRATO:		
FECHA DE INICIO: 18 DE JUNIO DE 2024		
PERIODO DE EJECUCION: 44 DIAS NATURALES		
FECHA DE TERMINO: 31 DE JULIO DE 2024		
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		



CLAVE	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	ANCHO	LARGO	AREA	VOL	UNIDAD
010818	1	0+000	4.00	140.00	0.22	121.87	121.87	M3
	2	0+250	4.00	50.00	0.22	43.52	165.49	
	3	0+330	4.00	110.00	0.22	95.744	261.23	
								261.23

OPERACION
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

Magdalena Martinez Melendez

C-MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ

ING. RAMON SALAZAR LUNA

CONTRATISTA:		MELENDREZ CONSTRUCCIÓN		PROGRAMA	
MUNICIPIO:		LOCALIDAD:			
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		LA JABONERA		FONDO III	
EST. No.:	FECHA DE ESTIMACIÓN:	HOJA:	PERIODO DE:	DÍ:	09
1	31/07/2024	6	JUNIO A JULIO		



CONTRATO:		MONTO CONTRATADO:	
NOCHIS/FONDOIII/2024/13		1,213,589.41	
NOMBRE DE LA OBRA:			
"CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS."			
FECHA DE CONTRATO:			
FECHA DE INICIO: 18 DE JUNIO DE 2024			
PERIODO DE EJECUCION: 44 DIAS NATURALES			
FECHA DE TERMINO: 31 DE JULIO DE 2024			
DESCRIPCION DE CONCEPTO:			
CLAVE	Descripción	UNIDAD	
010818	Asarrea sobre tamón de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga en máquina.	/M3	



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

Magdalena Martínez Meléndez
C. MAGDALENA MARTÍNEZ MELENDREZ

Ramon Salazar Luna
ING. RAMON SALAZAR LUNA

GENERADORES

CONTRATISTA:		MELENDREZ CONSTRUCCIÓN		PROGRAMA	
MUNICIPIO:		LOCALIDAD:			
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		LA JABONERA		FONDO III	
EST. No.	FECHA DE ESTIMACION:	HOJA:	PERIODO DE:		
1	31/07/2024	JUNIO	A	JULIO	

CONTRATO:		MONTO CONTRATADO:	
NOCHIS/FONDOIII/2024/13		1,213,569.41	
			
NOMBRE DE LA OBRA:			
"CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS."			
FECHA DE CONTRATO :			
FECHA DE INICIO:18 DE JUNIO DE 2024			
PERIODO DE EJECUCION:44 DIAS NATURALES			
FECHA DE TERMINO: 31 DE JULIO DE 2024			



LOCALIZACION		TIPO	ANCHO	LARGO	AREA	VOL	UNIDAD	
EJE	TRAMO						m ²	m ³
0+250	0+270		3.50	20.00	0.26	17.73		17.73
0+270	0+290		3.50	20.00	0.26	17.78		35.51
0+290	0+300		3.50	10.00	0.26	8.89		44.40
0+300	0+420		3.50	40.00	0.26	35.56		79.96
0+420	0+460		3.50	40.00	0.26	35.56		115.52
0+460	0+480		3.50	30.00	0.26	26.67		142.19
								142.19

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

CLAVE METAC-0002-1

Formación de base para nivelación compactada al 100 %, utilizando material de banco y material petreo (80% material de banco - 20% material petreo)

OPERADOR
FAISM (FTI)
EJERCICIO 2024

Magdalena Martinez Melendez

C.MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ


ING. RAISON SALAZAR LUNA

CONTRATISTA:		MELENDREZ CONSTRUCCIÓN		PROGRAMA	
MUNICIPIO:		LOCALIDAD:			
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.		LA JABONERA		FONDO III	
EST. No.	FECHA DE ESTIMACIÓN:	HOJA:	PERIODO DE:	DEL 00	JULIO
1	31/07/2024	JUNIO	A		



FOTOS

CONTRATO:		MONTO CONTRATADO:	
NOCHIS/FONDOIII/2024.13		1,213,589.41	
NOMBRE DE LA OBRA:			
"CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS."			
FECHA DE CONTRATO:			
18 DE JUNIO DE 2024			
PERIODO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)			
31 DE JULIO DE 2024			
DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO:			
CLAVE	UNIDAD		
0002-1	M3		

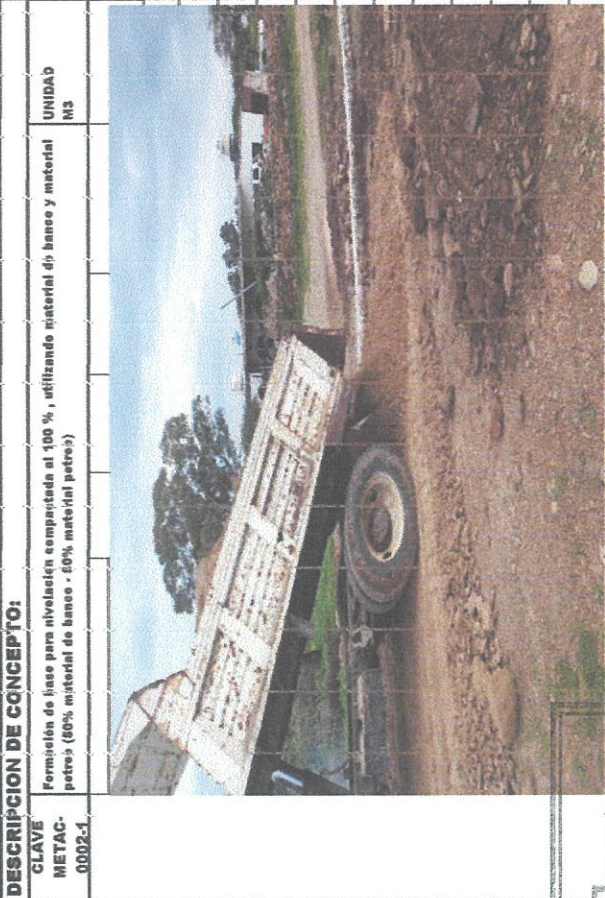

Fornición de flete para nivelación compactada al 100 %, utilizando material de banco y material petreo (60% material de banco - 40% material petreo)


OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 24

Magdalena Martinez
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

ING. RAIBÓN SALAZAR LUNA
ING. RAIBÓN SALAZAR LUNA

GENERADORES

CONTRATISTA:	MELENDREZ CONSTRUCCIÓN	P/PROGRAMA
MUNICIPIO:	LOCALIDAD:	
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	LA JABONERA	FONDO III
EST. N.º:	FECHA DE ESTIMACIÓN:	PERIODO DE:
1	31/07/2024	JUNIO A JULIO

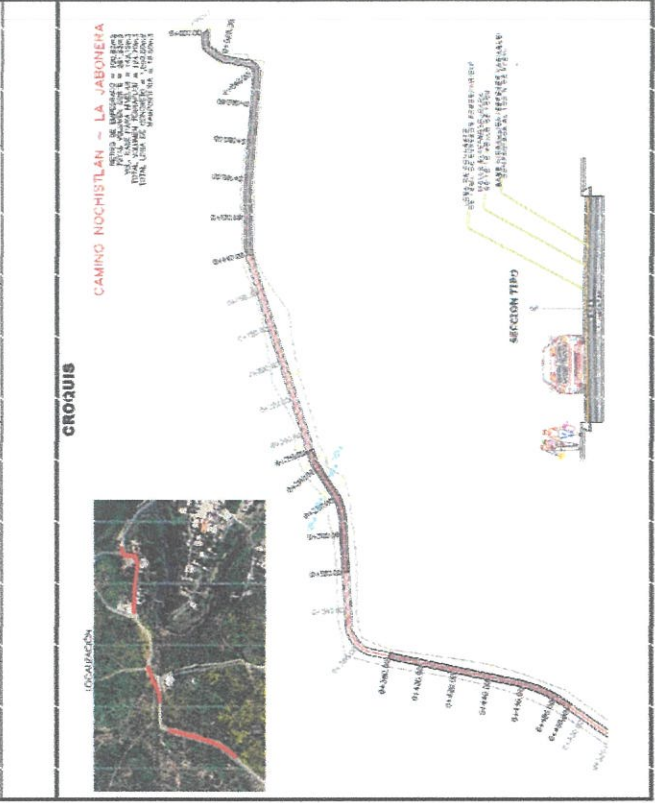

CONTRATO:	MONTO CONTRATADO:	
NOCHIS/FONDOIII/2024/13	1,213,589.41	
		
NOMBRE DE LA OBRA:		
"CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS."		
FECHA DE CONTRATO :		
FECHA DE INICIO: 18 DE JUNIO DE 2024		
PERIODO DE EJECUCION: 44 DIAS NATURALES		
FECHA DE TERMINO: 31 DE JULIO DE 2024		

CLAVE	LOCALIZACION	TIPO	MEDIDAS			UNIDAD	TOTAL
			ANCHO	LARGO	PROF		
031202	CLAYE	Mamposteria en cemento de piedra briza de 0.25 a 0.50 m3/m3 Justeado con mezcla cemento-arena				M3	
	ORIENTE		0.50	27.78	0.05		9.25
	PONIENTE		0.50	27.78	0.05		9.25
							18.50

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

Magdalena Martinez Melendrez

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

ING. RAMON SALAZAR LUNA

ING. RAMON SALAZAR LUNA

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATISTA:	MELENDREZ CONSTRUCCIÓN	PROGRAMA
MUNICIPIO:	LOCALIDAD:	
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	LA JASONERA	FONDO III
EST. No. 1	FECHA DE ESTIMACIÓN: 31/07/2024	PERIODO DE: 6 DE JUNIO A JULIO



CONTRATO:	MONTO CONTRATADO:	
NOCHIS/FONDOIII/2024/13	1,213,589.41	
NOMBRE DE LA OBRA:		
"CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JASONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS."		
FECHA DE CONTRATO :		
FECHA DE INICIO: 16 DE JUNIO DE 2024		
PERIODO DE EJECUCION: 44 DIAS NATURALES		
FECHA DE TERMINO: 31 DE JULIO DE 2024		
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		
CLAVE	UNIDAD	
031202	M3	
Mamposteria en elemento de piedra brasa de 0.28 a 0.60 m3/m2 Juntado con mezcla cemento-arena		

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

Magdalena Martinez Melendez

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

[Signature]

ING. RAJIB GALAZAR LUNA

GENERADORES


CONTRATO:	MONTO CONTRATADO:
NOCHIS/FONDOIII/2024/13	1,213,589.41

NOMBRE DE LA OBRA:	
"CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS."	
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 18 DE JUNIO DE 2024 PERIODO DE EJECUCION: 44 DIAS NATURALES FECHA DE TERMINO: 31 DE JULIO DE 2024	

CLAVE	LOCALIZACION				TIPO	ANCHO	LARGO	AREA	VOL	UNIDAD
	EJE	TRAMO								
030504	1	0+000	0+140		3.50	140.00	480.00	480.00		480.00
	2	0+250	0+300		3.50	50.00	175.00	175.00		685.00
	3	0+330	0+480		3.50	150.00	525.00	525.00		1050.00
										1050.00


DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 Pavimento de concreto f'c=280 Kg/cm² agregado de 19 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm, de 18 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 60x60 rollo de 100 mts. Incluye: cimbras metálicas, mano de obra y herramienta menor.

CROQUIS

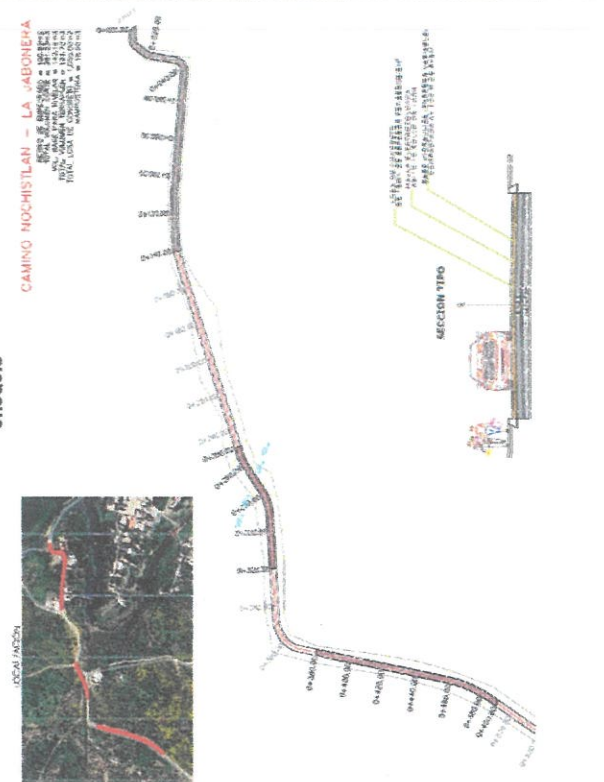


OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024


Magdalena Martinez Melendrez
 C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ



 ING. RAMON S. SAZAZAR LUNA

MEMORIA FOTOGRAFICA

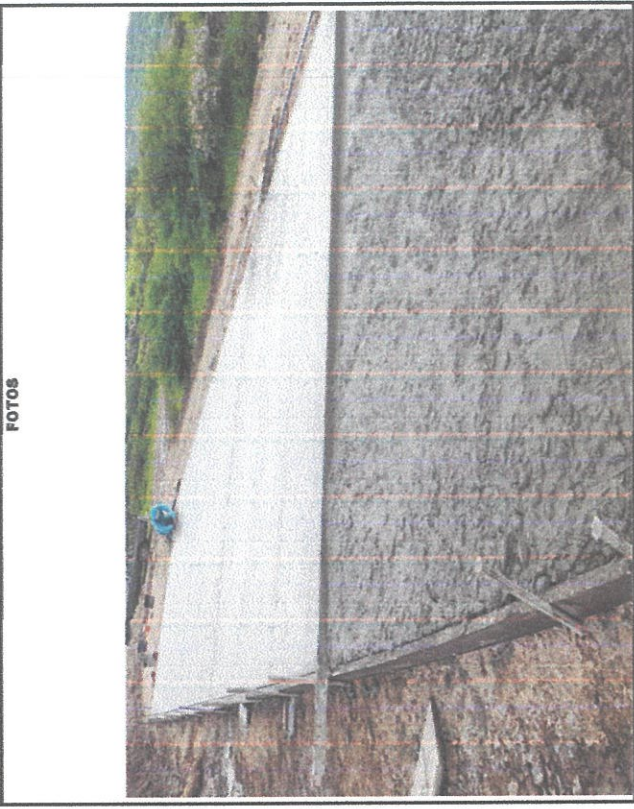CONTRATISTA:	MELENDREZ CONSTRUCCIÓN		PROGRAMA
MUNICIPIO:	LOCALIDAD:		
NOCHISTILAN DE MEJIA, ZAC.	LA JABONERA		FONDO III
EST. No. 1	FECHA DE ESTIMACION:	HOJA:	PERIODO DE:
	31/07/2024	JUNIO	A
			DEL 09
			JULIO



CONTRATO:	MONTO CONTRATADO:
NOCHIS/FONDOIII/2024/13	1,213,569.41
	
NOMBRE DE LA OBRA:	
"CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTILAN DE MEJIA, ZACATECAS."	
FECHA DE CONTRATO :	
FECHA DE INICIO: 18 DE JUNIO DE 2024	
PERIODO DE EJECUCION: 44 DIAS NATURALES	
FECHA DE TERMINO: 31 DE JULIO DE 2024	

DESCRIPCION DE CONCEPTO:	UNIDAD
Pavimento de concreto Fc=250 Kg/cm ² agregado de 19 mm, cemento normal revenimentado 8 a 10 cm. de 18 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 400 mts, intefuys: cimbras metálicas, mano de obra y herramienta menor.	m ²
	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024


 C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ


 ING. RAMON SALAZAR LUNA

MELENDREZ CONSTRUCCIÓN



ACUMULADO DE ESTIMACIONES
 "CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD
 DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,
 ZACATECAS."

PERIODO: DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE JUNIO DE 2024

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN DE LA ESTIMACION 01	ESRIMACIONES ANTERIORES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE TOTAL ACUMULADO
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.								
PRELIMINARES								
010706	Traza y nivelación con aparatos topograficos en terreno plano	m2	1,050.00	1,050.00	0.00	\$8.03	\$8,431.50	\$8,431.50
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperacion de material, incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.	m2	100.80	100.80	0.00	\$44.85	\$4,520.88	\$4,520.88
010115	Formación de terraplenas con material de banco (tepate-cascajo), incluye compactación al 90 % proctor, incluye incorporado de agua, extendido de material, compactado en capas de 20 cm., equipo, mano de obra.	m3	124.70	124.70	0.00	\$575.58	\$71,774.83	\$71,774.83
TERRAJERIAS								
TEMP*3	Excavación en corte debajo de la subrasante con medios mecanicos (retroexcavadora) considerando afine de la superficie con motoniveladora y dejando pendientes de acuerdo a proyecto.	m3	261.23	261.23	0.00	\$151.75	\$39,641.65	\$39,641.65
MARTE*001	Excavación con Rotomartillo en terreno tipo C (0.0% tierra, 0.0% tepetate, 100% piedra) incluye: operador y ayudante.	hora	15.00	15.00	0.00	\$1,370.44	\$20,556.60	\$20,556.60
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria, carga con máquina.	m3	261.23	261.23	0.00	\$127.26	\$33,244.13	\$33,244.13
SUB-BASE Y BASE								
ME*AC*0002*1	Formación de base para nivelación compactada al 100 % , utilizando material de banco y material petreo (50% material de banco - 50% material petreo)	m3	142.19	142.19	0.00	\$593.12	\$84,335.73	\$84,335.73
CONCRETO								
03202	Mampostería en cimiento de piedra braza de 0.25 a 0.50 m3/ml juntado con mezcla cemento-arena 1:3	m3	18.50	18.50	0.00	\$1,925.40	\$35,619.90	\$35,619.90

TEMP*3
 MARTE*001
 010818
 ME*AC*0002*1
 03202

REPRESENTANTE LEGAL
Magdalena Martinez Melendez
 C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

MELENDREZ CONSTRUCCIÓN



ACUMULADO DE ESTIMACIONES
 "CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD
 DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA,
 ZACATECAS."

PERIODO: DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN DE LA ESTIMACION OI	ESRIMACIONES ANTERIORES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE TOTAL ACUMULADO
030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm ² agregado de 19 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m ²	1,050.00	1,050.00	0.00	\$712.46	\$748,083.00	\$748,083.00

SUB-TOTAL ESTIMACIONES = **\$1,046,197.77**

SUBTOTAL = \$1,046,197.77
 IVA 16 % = \$167,391.64
 TOTAL = \$1,213,589.41

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

0123

REPRESENTANTE LEGAL
Magdalena Martinez Melendrez
 C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

REAL PROGRAMADO	
% AVANCES FÍSICO	3
FINANCIERO	10
	0

No. REPORTE :	1
FECHA REPORTE :	21/06/2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS	LOCALIDAD LA JABONERA NUEVA
UBICACION :	CONTRATO
TIPO DE OBRA :	
MODALIDAD E-EC.:	
No. CONTRATO :	NOCHIS/FOND0III/2024/13
EMPRESA :	MELENDREZ CONSTRUCCIONES
MONTO CONTRATO :	\$1,213,589.41
FECHA CONTRATO :	18 DE JUNIO DE 2024
MONTO ANTICIPO :	N/A
FECHA PAGO ANTICIPO :	N/A
No. AMPL. DE CONTRATO :	N/A
MONTO AMPL. CONTRATO :	N/A
FECHA AMPL. CONTRATO :	N/A
PERIODO DE EJECUCION INICIO	18-Jun-24
TERM.	31-Jul-24
FECHAS PROGRAMADAS:	18-Jun-24
FECHAS REALES:	18-Jun-24
FECHAS REPROGRAMADAS:	
OBSERVACIONES:	

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ES DECIR, DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO

PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO		
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE									
PRELIMINARES	\$84,727.21	█	█													2	5.26
TERRACERIA	\$93,431.93	█	█													15	39.47
SUB-BASE Y BASE	\$84,335.73	█	█													6	15.79
CONCRETO HIDRAULICO	\$783,702.90	█	█													15	39.47
SUB-TOTAL	\$1,046,197.77																
16% I.V.A.	\$167,391.64																
TOTAL	\$1,213,589.41															38	

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL :
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ING. RAMON SALAZAR LUVA

0124



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN ZAC.

NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
18 DE JUNIO DE 2024 - 21 DE JUNIO DE 2024

21 DE JUNIO DE 2024

3.00%

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2024

0195

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Nº. REPORTE: 2
FECHA REPORTE: 28/06/2024

% AVANCES	REAL		PROGRAMADO	
	FISICO	15	25	0
FINANCIERO	0	0	0	0

PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO	
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	M E S E S							
PRELIMINARES	\$84,727.21	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	2	5.26
TERRACERIA	\$83,431.93	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	15	39.47
SUB-BASE Y BASE	\$84,336.73	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	6	15.79
CONCRETO HIDRAULICO	\$783,702.90	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	[Gantt chart]	15	39.47
SUB-TOTAL	\$1,046,197.77															
16% I.V.A.	\$167,391.64															
TOTAL	\$1,213,589.41															

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

UBICACION: LOCALIDAD LA JABONERA NUEVA

TIPO DE OBRA: CONTRATO

MODALIDAD EJEC.: NOCHISFONDOIII/2024/13

Nº. CONTRATO: MELENDEZ CONSTRUCCIONES

EMPRESA: \$1,213,589.41

MONTO CONTRATO: 18 DE JUNIO DE 2024

FECHA CONTRATO: N/A

MONTO ANTICIPO: N/A

FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

Nº. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCION INICIO TERM.


FECHAS PROGRAMADAS: 18-jun-24 31-jul-24

FECHAS REALES: 18-jun-24

FECHAS REPROGRAMADAS:

OBSERVACIONES

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ESO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO




RESIDENTE DE SUPERVISOR:
ING. RAMON SUAREZ LUNA

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:
ING. DIEGO ALVARADO MERCADO



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

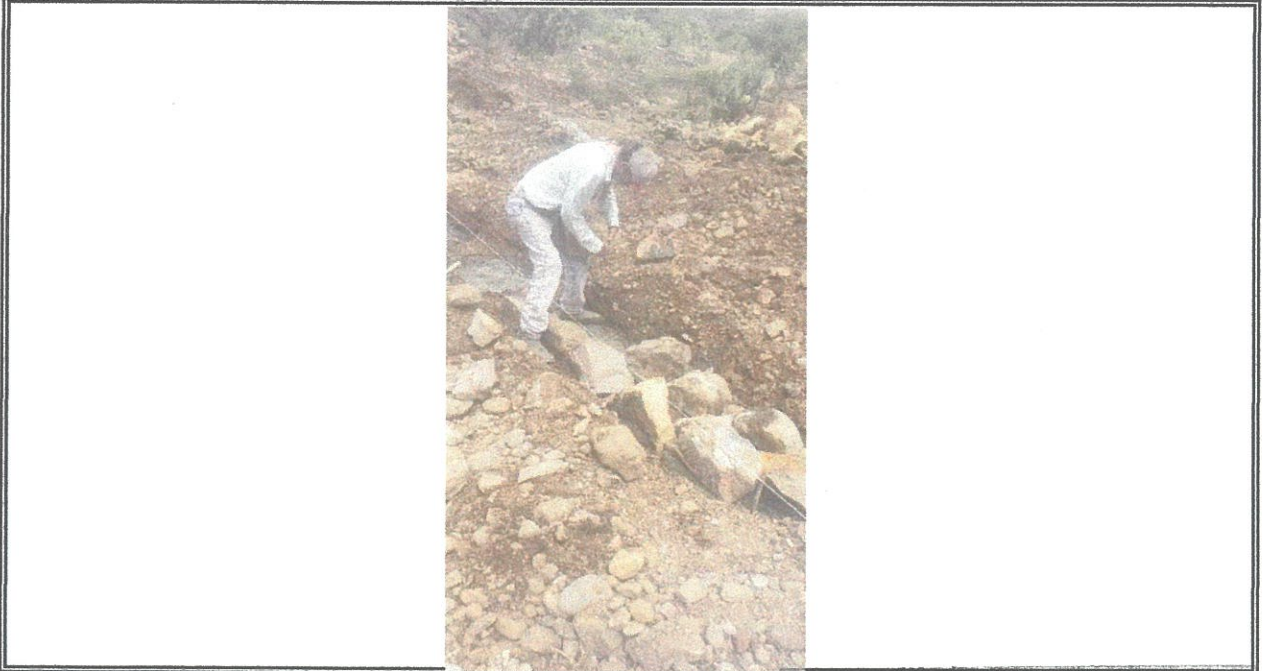

CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN ZAC.

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
24 DE JUNIO DE 2024 - 28 DE JUNIO DE 2024

28 DE JUNIO DE 2024

15.00%

OPERADO
EASM (FIII)
EJERCICIO 2024

0127

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE: 3
FECHA REPORTE: 06/07/2024

REAL	PROGRAMADO	
	% AVANCES FISICO	25
REAL	PROGRAMADO	
	% AVANCES FINANCIERO	0

PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO	
		MESES														
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
PRELIMINARES	\$84,727.21	[Bar chart]	[Bar chart]												2	5.26
TERRACERIA	\$93,431.93	[Bar chart]	[Bar chart]												15	39.47
SUB-BASE Y BASE	\$84,335.73	[Bar chart]	[Bar chart]												6	15.79
CONCRETO HIDRAULICO	\$783,702.90	[Bar chart]	[Bar chart]												15	39.47
SUB-TOTAL	\$1,046,197.77															
16% I.V.A.	\$167,391.64															
TOTAL	\$1,213,589.41														33	

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

UBICACION: LOCALIDAD LA JABONERA
TIPO DE OBRA: NUEVA

MODALIDAD EJEC.: CONTRATO

No. CONTRATO: NOCHISFONDOIII/2024/13

EMPRESA: MELENDREZ CONSTRUCCIONES

MONTO CONTRATO: \$1,213,589.41

FECHA CONTRATO: 18 DE JUNIO DE 2024

MONTO ANTICIPO: N/A

FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCION: INICIO 18-Jun-24, TERM. 31-Jul-24

FECHAS PROGRAMADAS: 18-Jun-24, 31-Jul-24

FECHAS REALES: 18-Jun-24

FECHAS REPROGRAMADAS:

OPERADO
INSTRUMENTO (FII)
PERIODO 2024

OBSERVACIONES

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO. ESO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A CAPIR, POR LO QUE NO LOGRAN LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO


DR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO

RESIDENTE DE SUPERVISION:
ING. RAMON SUZAR LUNA



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

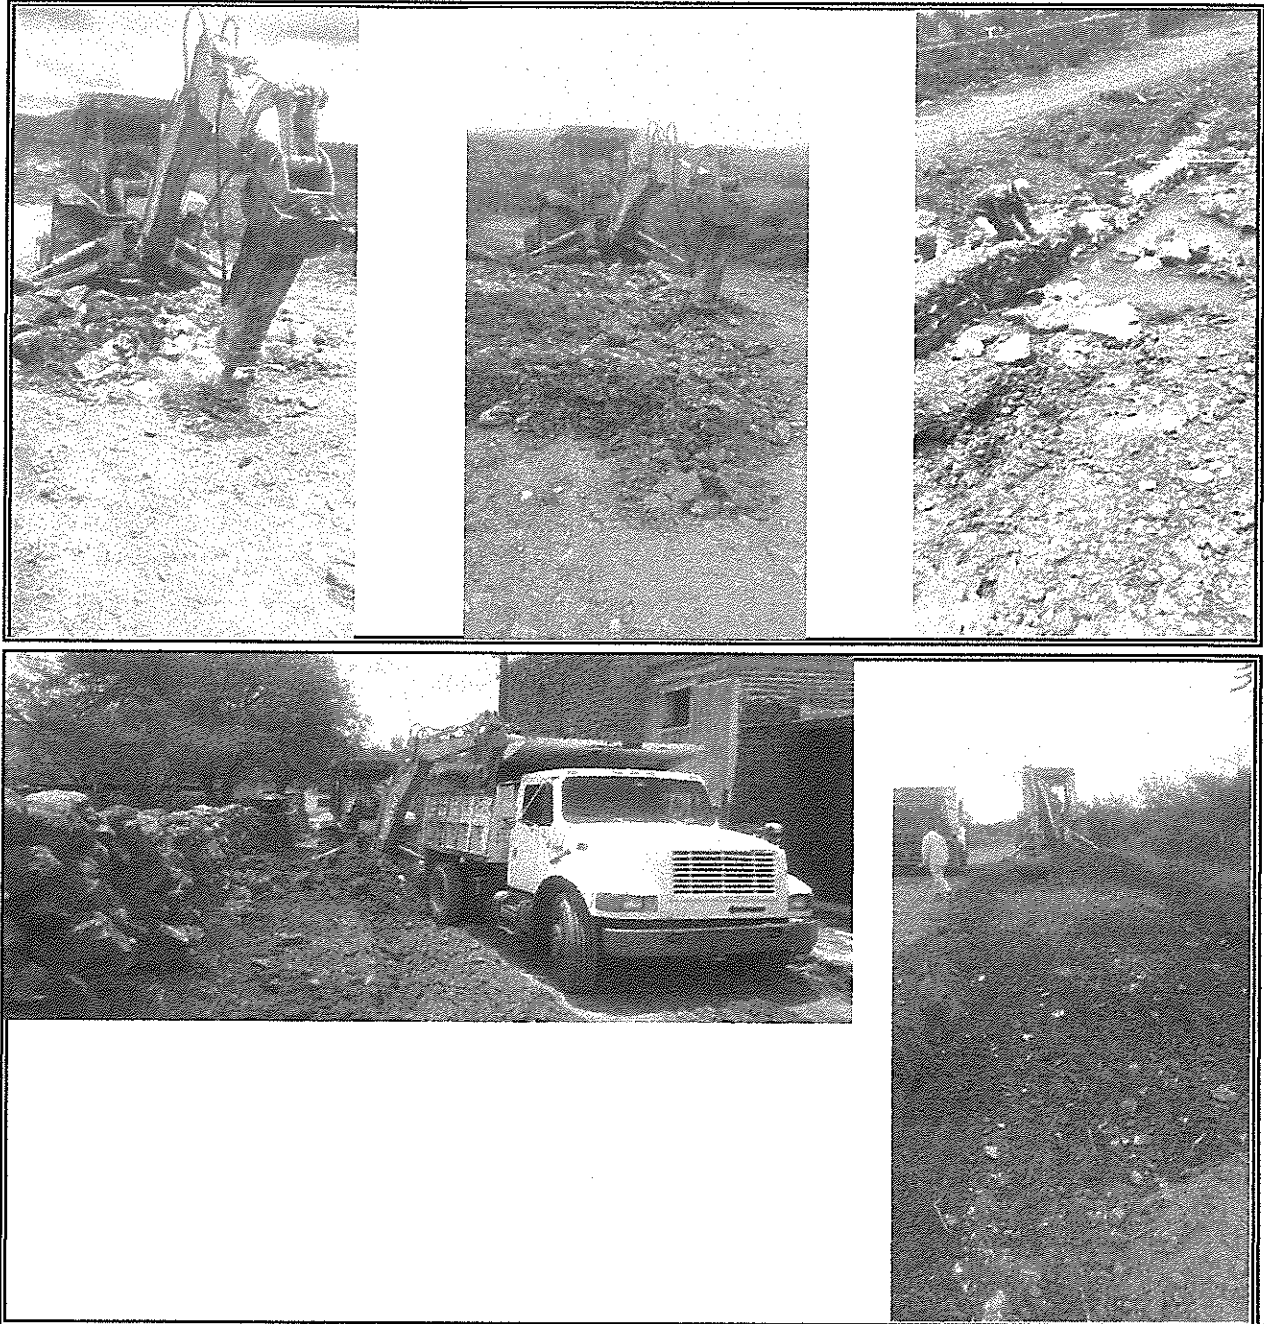

CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN ZAC. OPERADO
LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 DE JULIO DE 2024 - 05 DE JULIO DE 2024
FECHA: 05 DE JULIO DE 2024
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 25.00%

EJERCICIO 2024
0129

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE: 4	FECHA REPORTE: 12/07/2024	REAL	PROGRAMADO
		% AVANCES FISICO	45
		FINANCIERO	0
		50	0

PARTIDAS	IMPORTES	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO	
		M E S E S														
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
PRELIMINARES	\$64,727.21	█	█												2	5.26
TERRACERA	\$93,431.93	█	█												15	39.47
SUB-BASE Y BASE	\$64,335.73	█	█												6	15.79
CONCRETO HIDRAULICO	\$783,702.90	█	█												15	39.47
SUB-TOTAL	\$1,046,197.77															
16% I.V.A.	\$167,391.64															
TOTAL	\$1,213,589.41															

DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE:	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS
UBICACION:	LOCALIDAD LA JABONERA NUEVA
TIPO DE OBRA:	CONTRATO
MODALIDAD EJEC.:	NOCHISFONDOIII/2024/13
No. CONTRATO:	MELENDREZ CONSTRUCCIONES
EMPRESA:	\$1,213,589.41
MONTO CONTRATO:	18 DE JUNIO DE 2024
FECHA CONTRATO:	N/A
MONTO ANTICIPO:	N/A
FECHA PAGO ANTICIPO:	N/A
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A
PERIODO DE EJECUCION	INICIO TERM.
FECHAS PROGRAMADAS:	18-Jun-24 31-Jul-24
FECHAS REALES:	18-Jun-24
FECHAS REPROGRAMADAS:	

OBSERVACIONES

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO. ESO SIGNIFICA QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A PARTIR POR LO QUE NO CONSIDERAR SUMA TOTAL AL 100 PORCENTAJE

RESIDENTE DE SUPERVISION:
ING. RAMON SALAZAR LUNA

OPERADO

INSTRUMENTO (FIII)

EJECUCION 2024

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO

0130



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN ZAC.
NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
08 DE JULIO DE 2024 - 12 DE JULIO DE 2024
12 DE JULIO DE 2024
45.00%

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0131

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

% AVANCES FISICO	REAL	PROGRAMADO
	70	70
% AVANCES FINANCIERO	0	0

No. REPORTE: 5
FECHA REPORTE: 19/07/2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

LUBRICACION: LOCALIDAD LA JABONERA NUEVA

TIPO DE OBRA: CONTRATO

MODALIDAD EJEC.: CONTRATO

No. CONTRATO: NOCHISFONDOIII/2024/13

EMPRESA: MELENDREZ CONSTRUCCIONES

MONTO CONTRATO: \$1,213,589.41

FECHA CONTRATO: 18 DE JUNIO DE 2024

MONTO ANTICIPO: N/A

FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCION INICIO TERM.

FECHAS PROGRAMADAS: 18-Jun-24 31-Jul-24

FECHAS REALES: 18-Jun-24

FECHAS REPROGRAMADAS:

OBSERVACIONES

EJECUCION PERADO
ISM (FIII)
JUNIO 2024

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ESO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR POR LO QUE NO CONCIERDE LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO

PARTIDAS	IMPORTES	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO	
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
PRELIMINARES	\$54,727.21														2	5.26
TERRACERIA	\$93,431.93														15	39.47
SUB-BASE Y BASE	\$94,335.73														6	15.79
CONCRETO HIDRAULICO	\$783,702.90														15	39.47
SUB-TOTAL	\$1,046,197.77															
16% I.V.A.	\$167,391.64															
TOTAL	\$1,213,589.41															

RESIDENTE DE SUPERVISION
ING. RAMON SALASAR-LUNA

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO

0132



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN ZAC.
NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
15 DE JULIO DE 2024 - 19 DE JULIO DE 2024
19 DE JULIO DE 2024
70.00%

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0133

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

% AVANCES	REAL		PROGRAMADO	
	FISICO	90	FISICO	90
	FINANCIERO	0	FINANCIERO	0

No. REPORTE:	6
FECHA REPORTE:	26/07/2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

UBICACIÓN: LOCALIDAD LA JABONERA NUEVA

MODALIDAD EJEC.: CONTRATO

No. CONTRATO: NOCHIS/FONDO/II/2024/13

EMPRESA: MELENDEZ CONSTRUCCIONES

MONTO CONTRATO: \$1,213,589.41

FECHA CONTRATO: 18 DE JUNIO DE 2024

MONTO ANTICIPO: N/A

FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCION INICIO: 18-Jun-24 TERMINA: 31-Jul-24

FECHAS PROGRAMADAS: 18-Jun-24

FECHAS REALES: 18-Jun-24

PARTIDAS	IMPORTES	M E S E S												DIAS	% EN BASE TIEMPO	
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE								
PRELIMINARES	\$84,727.21	█	█												2	5.26
TERRACERIA	\$93,431.03	█	█												15	39.47
SUB-BASE Y BASE	\$84,335.73	█	█												6	15.79
CONCRETO HIDRAULICO	\$783,702.90	█	█												15	39.47
SUB-TOTAL	\$1,046,197.77															
TOTAL	\$1,213,589.41															

OBSERVACIONES

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ES DECIR, DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO

PERADO
ISM (FII)
EJECUCION 2024


RESIDENTE DE SUPERVISION:
ING. RAMON SUAREZ LUNA

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

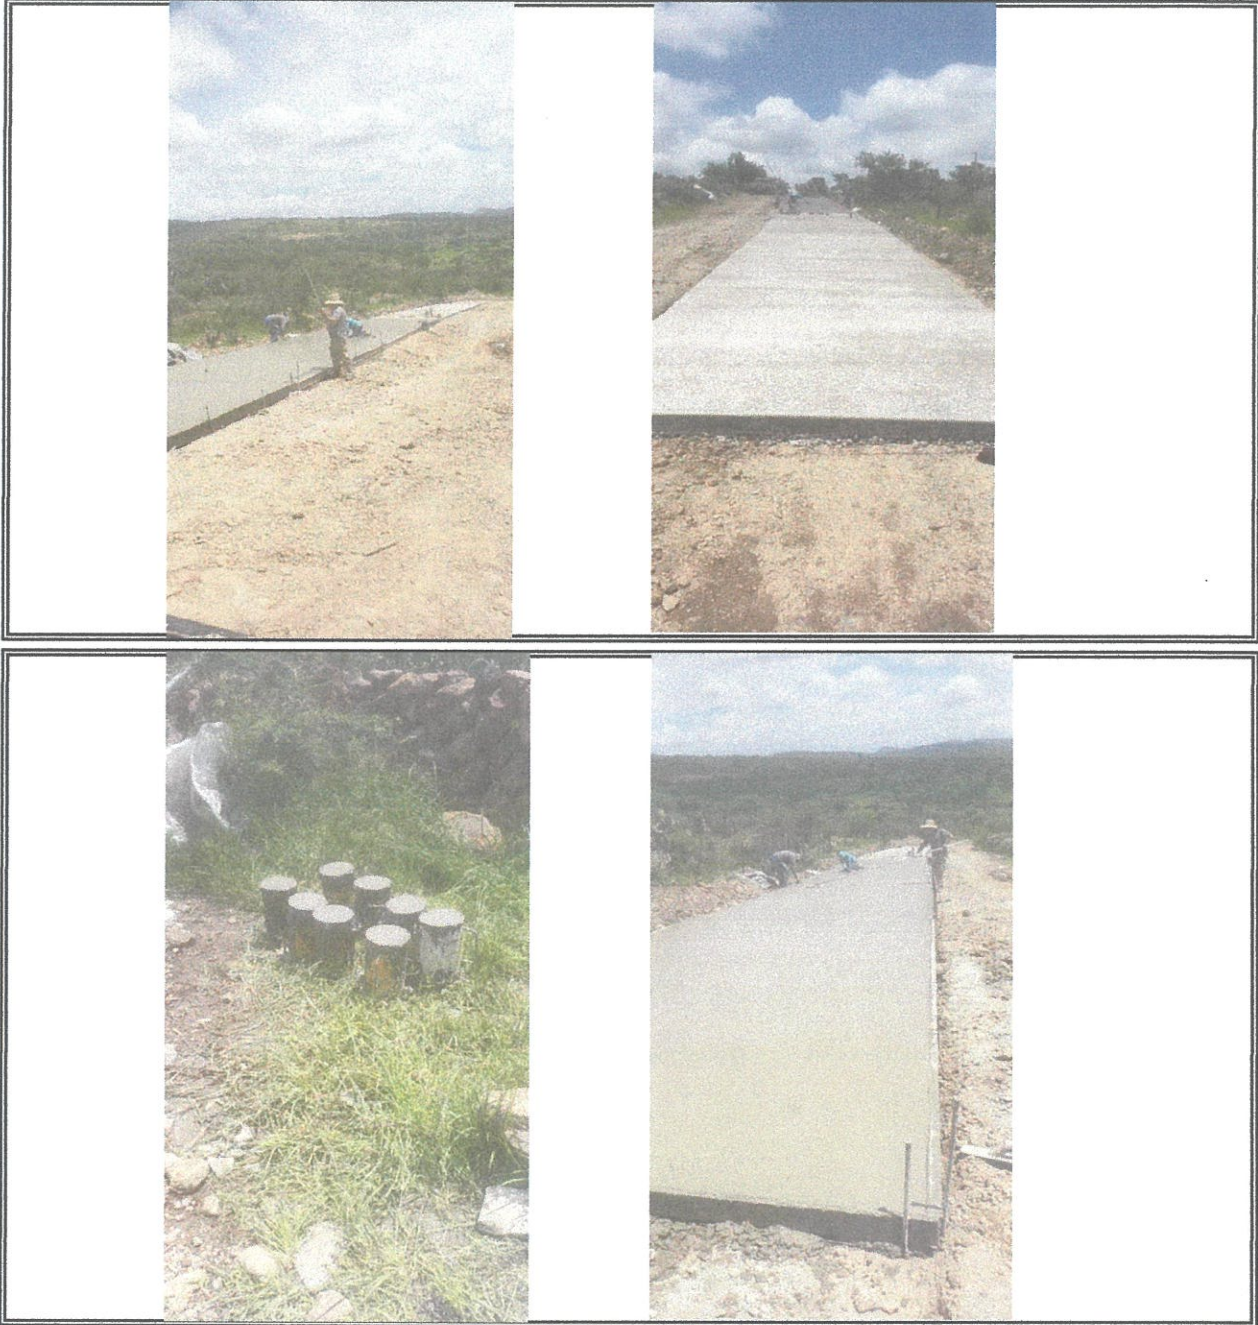

CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN ZAC.

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA


PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

22 DE JULIO DE 2024 - 26 DE JULIO DE 2024

26 DE JULIO DE 2024

90.00%



INFORME DE SUPERVISION DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Nº. REPORTE: 7
FECHA REPORTE: 30/07/2024

% AVANCES	REAL	PROGRAMADO
	FISICO	100
FINANCIERO	0	0

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

LUBICACION: LOCALIDAD LA JABONERA
TIPO DE OBRA: NUEVA

MODALIDAD EJEC.: CONTRATO

Nº. CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/13

EMPRESA: MELENDREZ CONSTRUCCIONES

MONTO CONTRATO: \$1,213,569.41

FECHA CONTRATO: 18 DE JUNIO DE 2024

MONTO ANTICIPO: N/A

FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

Nº. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO TERM.
18-jun-24 31-jul-24

FECHAS PROGRAMADAS: 18-jun-24

FECHAS REALES: 18-jun-24

FECHAS REPROGRAMADAS:


OBSERVACIONES

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ES DECIR, A LA PARTIDA QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR POR LO QUE NO CONCIERDE LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO

PARTIDAS	IMPORTES	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO		
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	M E S E S								
PRELIMINARES	\$84,727.21	█	█													2	5.26
TERRACERIA	\$93,431.93	█	█													15	39.47
SUB-BASE Y BASE	\$84,335.73	█	█													6	15.79
CONCRETO HIDRAULICO	\$783,702.90	█	█													15	39.47
SUB-TOTAL	\$1,046,197.77																
16% I.V.A.	\$167,391.64																
TOTAL	\$1,213,569.41																38

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO


RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN:
ING. RAMON SANCHEZ LUINA





**MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**

INFORME FOTOGRÁFICO

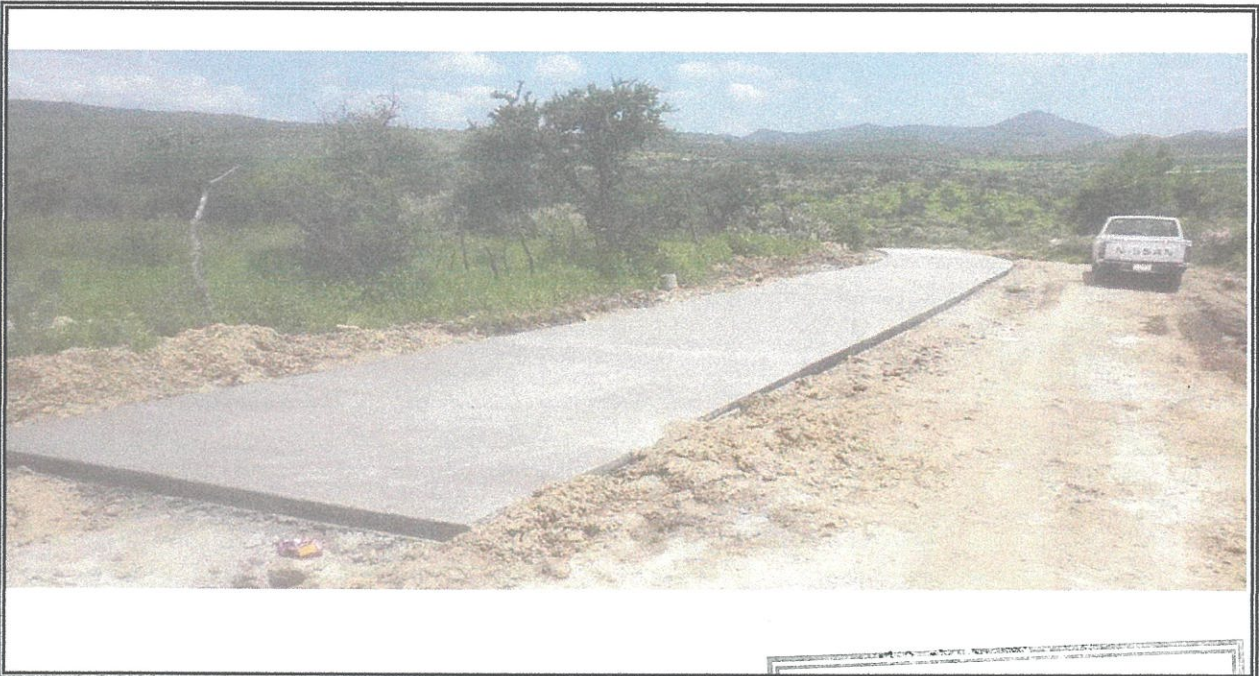

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN ZAC.
NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
26 DE JULIO DE 2024 - 30 DE JULIO DE 2024
30 DE JULIO DE 2024
100.00%


OPERADO
ENASM (FIII)
EJERCICIO 2024

0137

ARCHIVO FOTOGRAFICO: "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS" "




EJERCICIO 20 24 0138

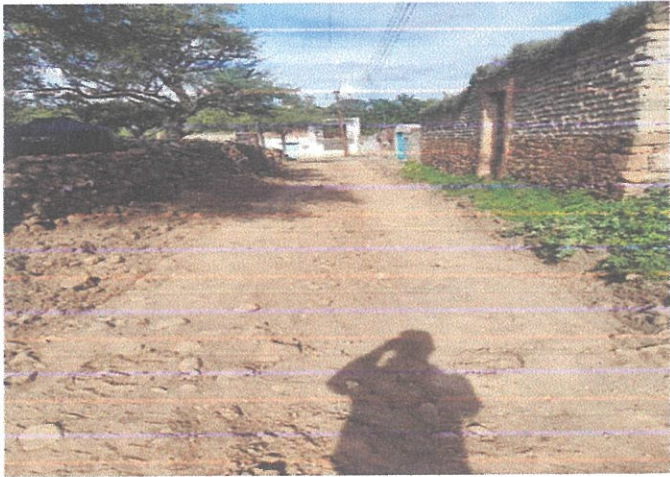



OPERADO
NISM (FIII)
EJERCICIO 20 24

0140

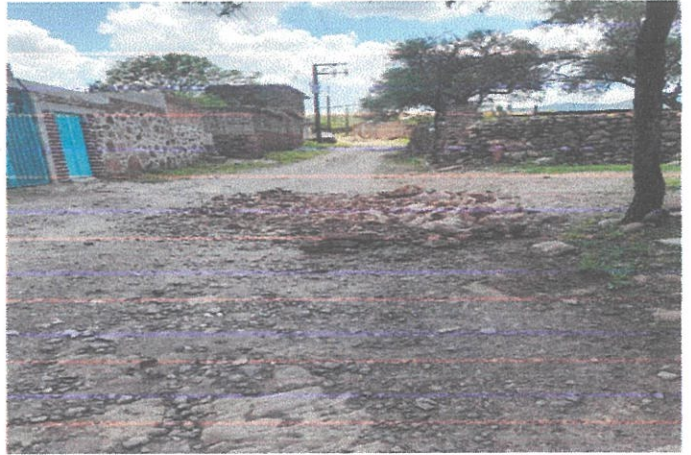

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 20 24

0141



RAJO
FALSO (FIR)
EJERCICIO 2024

0142



EXPEDIENTE 001COMP - (001)

FECHA DE RECIBO 15-Julio-2024

NO. DE OBRA 062/2024

FECHA DE INFORME 18-Julio-2024

OBRA	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA
LOCALIZACIÓN	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS
COMPAÑIA	MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

INFORME DE COMPACTACIONES

TRAMO ANALIZADO TRAMO No. 1 PRIMEROS 100 M.
CAPA REPORTADA BASE

PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE P.V.S.M.
COMPACTACIÓN ESTÁTICA PORTER

GRADO DE COMPACTACIÓN DE PROYECTO
100 % DE SU P.V.S.M.

PRUEBA No.	UBICACIÓN		ESPESOR (cm)		ANCHO CAPA (mts)	PESO VOLUMETRICO (KG/M3)		HUMEDAD (%)		% DE COMPACTACION
	ESTACION	LADO	PROBADA	PROYECTO		MAXIMO	DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR	
001		CENTRO	20.00	20.00	4.00	1705	1706	15.21	12.61	100.00

FUENTE NORMATIVA: SCT M-MMP-1-01/03

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El tramo analizado CUMPLE con el grado de compactacion minimo (100 % de su P.V.S.M.)

LABORATORISTA
Victor Alfonso Acosta Lamas

GERENTE GENERAL
Ing. Jorge H. Parada Chavez
EJERCICIO 2024
0143



EXPEDIENTE 001MAX - 062/2024

FECHA DE RECIBO 15-Julio-2024

NO. DE OBRA 062/2024

FECHA DE INFORME 17-Julio-2024

OBRA	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA
LOCALIZACIÓN	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS
COMPAÑIA	MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

COMPACTACIÓN POR CARGA ESTÁTICA PORTER.

ENSAYE No. 290

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

Material producto de calas capa de base tramo No. 1.

MOLDE No. 12

PESO HUMEDO	3990.00	grs.
ALTURA MOLDE	12.53	cm
ALTURA FALTANTE	2.08	cm
ALTURA MATERIAL	10.45	cm
AREA MOLDE	194.33	cm ²
VOLUMEN DEL MATERIAL	2030.26	cm ³

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD ÓPTIMA

PESO HÚMEDO	300.00	grs.
PESO SECO	260.40	grs.
DIFERENCIA	39.60	grs.
HUMEDAD ÓPTIMA W_o	15.21	(%)

PESO ESPECÍFICO HÚMEDO γ_m 1,965.26 Kg/m³PESO ESPECÍFICO SECO MÁXIMO $\gamma_{dm\acute{a}x}$ 1,705.85 Kg/m³

LECTURAS DEL MATERIAL COMPACTO

1	2.08	cm
2	2.09	cm
3	2.07	cm
4	2.09	cm
PROMEDIO	2.08	cm


 VICTOR ALFONSO ACOSTA LAMAS
 LABORATORISTA CAMPO


 ING. JÓRGE H. PARADA CHAVEZ

GERENTE GENERAL

 OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

0144

EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA A LOS OBJETOS SOMETIDOS A PRUEBA

EL PRESENTE INFORME SOLO AMPARA LAS PRUEBAS REALIZADAS DEL MATERIAL MUESTREADO

ESTE REPORTE NO PODRÁ SER REPRODUCIDO SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE ESTE LABORATORIO

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
 Localización: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS
 Compañía: MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

INFORME DE PRUEBAS DE CONTROL DE CONCRETO HIDRAULICO

COLADO DE PAVIMENTO

Tomada de:						LABORATORIO DEPENDENCIA	<input type="checkbox"/> NO	LABORATORIO CONCRETERA	<input type="checkbox"/> NO
Expediente No.	2	Familia No.		36407					
Muestra No.	958	959	960	961					

DATOS DE PROPORCIONAMIENTO DE LA MUESTRA


DOSIFICACION: HECHO EN OBRA 2 : 45 (BOTE : PALAS) (CEMENTO : ARENA / GRAVA)
 REVENIMIENTO DE PROYECTO (cms): **10 +/- 2.5**
 RESISTENCIA DEL PROYECTO (Kg/cm2): **250**
 ADITIVO, MARCA, FINALIDAD Y CANTIDAD: R. 28 / NO INDICA EN REMISIÓN

DATOS DE LA MEZCLA EN OBRA

EQUIPO DE MEZCLADO	REVOLVEDORA DE 1/2 SACO	No. Remision	S/N	HORA SALIDA	11:00	HORA DE VACIADO	12:00
SISTEMA DE VIBRADO	MECANICO						
CEMENTO, MARCA, TIPO	FORTALEZA	CPC-30R					
TEMPERATURA CONCRETO FRESCO (°c)	28.1 °C						
REVENIMIENTO OBTENIDO (cms)	12						

DATOS DE LOS ESPECIMENES


No. Cilindro	958	959	960	961
metro (cms):	14.95	14.95		
Peso Volumétrico antes de ruptura (kg / m3):	2214	2271		
Fecha de colado:	30-jul-24	30-jul-24		
Fecha de ruptura:	06-ago-24	13-ago-24		
Edad (días):	7	14		
Carga de ruptura (kg) :	33,640	40,380		
Area (cm2):	175.53	175.53		
Resistencia obtenida (kg/cm2):	191.65	230.05		
% Resistencia proyecto:	76.66	92.02		

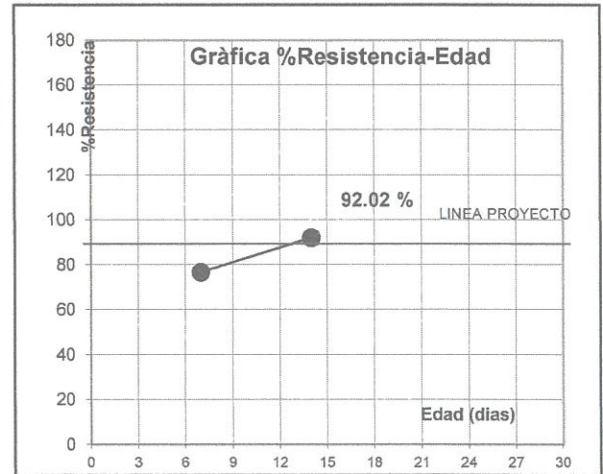

NORMAS DE REFERENCIA: ELABORACION DE CILINDROS (NMX-C-161-2013 -ONNCCCE vs ASTM-C-31); REVENIMIENTO (NMX-C-156-ONNCCCE-2010 vs ASTM-C-143; RESISTENCIA A LA COMPRESION (NMX-C-83-ONNCCCE-2014 vs ASTM-C-39; NMX-C-435-ONNCCCE-2010) TEMPERATURA CONCRETO; CABECEO DE ESPECIMENES CILINDRICOS (NMX-C-109-ONNCCCE-2013) GABINETES, CUARTOS HUMEDOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONDICIONES DE DISEÑO Y OPERACION (NMX-C-148-ONNCCCE-2010); ASTM C-51-11 (2007).

EL RESULTADO DE PRUEBA INFORMADO SOLO AMPARA EL MATERIAL ANALIZADO
 ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE ESTE LABORATORIO

TIPOS DE FALLA PRESENTADOS EN EL ESPECIMEN



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONCRETO ENSAYADO A LA EDAD DE 14 DIAS EVOLUCIONA DE ACUERDO A PROYECTO PARA UN CONCRETO NORMAL, (90% DE SU FC)

INFORME DE ENSAYE RECIENTE, LOS INFORMES DE ENSAYES ANTERIORES FUERON REPORTADOS POR ESTE LABORATORIO EN SU MOMENTO

VICTOR ALFONSO ACOSTA LAMAS
 LABORATORISTA

OPERADO
 FAISM (FIN)
 ING. JORGE H. PARADA CHAVEZ
 GERENTE GENERAL
 EJERCICIO 2024
 0145

Localización: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
 NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS
 Compañía: MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

INFORME DE PRUEBAS DE CONTROL DE CONCRETO HIDRAULICO

COLADO DE PAVIMENTO

Tomada de: Expediente No. 1 Familia No. 36406 LABORATORIO DEPENDENCIA NO LABORATORIO CONCRETERA NO
 Muestra No. 954 955 956 957

DATOS DE PROPORCIONAMIENTO DE LA MUESTRA


DOSIFICACION: HECHO EN OBRA 2 : 46 (BOTE : PALAS) (CEMENTO : ARENA / GRAVA)
 REVENIMIENTO DE PROYECTO (cms): 10 +/- 2.5
 RESISTENCIA DEL PROYECTO (Kg/cm2): 250
 ADITIVO, MARCA, FINALIDAD Y CANTIDAD: R. 28 / NO INDICA EN REMISIÓN

DATOS DE LA MEZCLA EN OBRA

EQUIPO DE MEZCLADO: REVOLVEDORA DE 1/2 SACO No. Remision: S/N HORA SALIDA: 9:30 HORA DE VACIADO: 10:25
 SISTEMA DE VIBRADO: MECANICO
 CEMENTO, MARCA, TIPO: FORTALEZA CPC-30R
 TEMPERATURA CONCRETO FRESCO (°c): 27.8 °C
 REVENIMIENTO OBTENIDO (cms): 10

DATOS DE LOS ESPECIMENES


No. Cilindro	954	955	956	957
Diámetro (cms):	14.90	15.00		
Peso Volumétrico antes de ruptura (kg / m3):	2256	2267		
Fecha de colado:	30-jul-24	30-jul-24		
Fecha de ruptura:	06-ago-24	13-ago-24		
Edad (días):	7	14		
Carga de ruptura (kg) :	43,400	46,180		
Area (cm2):	174.36	176.70		
Resistencia obtenida (kg/cm2):	248.92	261.34		
% Resistencia proyecto:	99.57	104.54		

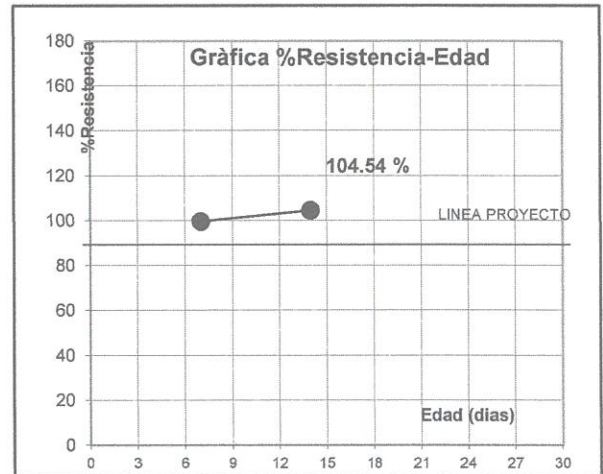

NORMAS DE REFERENCIA: ELABORACION DE CILINDROS (NMX-C-161-2013 -ONNCCCE vs ASTM-C-31); REVENIMIENTO (NMX-C-156-ONNCCCE-2010 vs ASTM-C-143); RESISTENCIA A LA COMPRESION (NMX-C-83-ONNCCCE-2014 vs ASTM-C-39; NMX-C-435-ONNCCCE-2010) TEMPERATURA CONCRETO; CABECEOS DE ESPECIMENES CILINDRICOS (NMX-C-109-ONNCCCE-2013) GABINETES, CUARTOS HUMEDOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONDICIONES DE DISEÑO Y OPERACION (NMX-C-148-ONNCCCE-2010); ASTM C-51-11 (2007).

EL RESULTADO DE PRUEBA INFORMADO SOLO AMPARA EL MATERIAL ANALIZADO
 ESTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE ESTE LABORATORIO

TIPOS DE FALLA PRESENTADOS EN EL ESPECIMEN



OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONCRETO ENSAYADO A LA EDAD DE 14 DIAS HA CUMPLIDO CON RESISTENCIA DE PROYECTO, (100% FC)

INFORME DE ENSAYE RECIENTE, LOS INFORMES DE ENSAYES ANTERIORES FUERON REPORTADOS POR ESTE LABORATORIO EN SU MOMENTO

VICTOR ALFONSO ACOSTA LAMAS
 LABORATORISTA

ING. JORGE H. PARADA CHAVEZ
 GERENTE GENERAL

0146



TÉRMINO DE OBRA

NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS. A 31 DE JULIO DE 2024

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESENTE:

HAGO REFERENCIA AL CONTRATO NÚMERO NOCHIS/FONDOIII/2024/13 RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS" CON UN IMPORTE DE \$ 1,213,589.41 (UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.) DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024 CELEBRADO CON ESA DEPENDENCIA A SU DIGNO CARGO.

SE LE INFORMA QUE SE TERMINAN EN TIEMPO Y FORMA LOS TRABAJOS DE DICHO CONTRATO EL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 DE LA OBRA DENOMINADA:

NOMBRE: "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS"
MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,213,589.41
PLAZO DE EJECUCIÓN: DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2024

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN QUE SIRVA AL PRESENTE

Magdalena Martinez Melendrez
ATENTAMENTE
Magdalena Martinez Melendrez
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.
REPRESENTANTE LEGAL



C.C.P. C. J. MANUEL JIMENEZ FUENTES.

0147

POLIZA DE FIANZA
BENEFICIARIO

EXPEDICION
18-06-2024
ENDOSO
0000

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION
121,358.94	PESOS	2287277	0

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 121,358.94 CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.

INICIO DE VIGENCIA: 18/06/2024

Por: MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
Dirección: LA CIENEGUITA 3-A, CONOCIDO, C.P. 99900, NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS

Ante: H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
Dirección: HIDALGO NO. 1, ZONA CENTRO, NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS

PARA GARANTIZAR POR CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE LE OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA CANTIDAD DE \$121,358.94 (CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.).

ANTE EL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. CON DOMICILIO EN CALLE HIDALGO No. 1, ZONA CENTRO, NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

PARA GARANTIZAR POR MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ, CON DOMICILIO EN LA CIENEGUITA 3-A, CONOCIDO, C.P. 99900, NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS, EL CUMPLIMIENTO Y LOS VICIOS OCULTOS DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO NOCHIS/FONDOI/2024/13, DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2024, CELEBRADO CON EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC., A TRAVES DE SUS TITULARES LOS C. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. LILIANA ROQUE GÓMEZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JOBONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS, SEGÚN DESCRIPCIÓN DE OBRA EN LA CLAUDSULA PRIMERA DEL REFERIDO CONTRATO, POR UN MONTO TOTAL DE \$1,213,589.41 (UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.) INCLUIDO EL IVA, LA PRESENTE GARANTIA SE CONSTITUYE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$121,358.94 (CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO Y TENDRA LA DURACION DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA EN LA QUE CONSTA FORMALMENTE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, AL TERMINO DEL CUAL DE NO HABER INCONFORMIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC., CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. PROCEDERA A SU CANCELACION, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS QUE SE GARANTIZAN CON LA PRESENTE FIANZA, SE COMUNICARA DE INMEDIATO A LA CONTRATISTA Y A CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., PARA LO CUAL LA VIGENCIA DE LA FIANZA SEGUIRA SUBSISTENTE DURANTE LA SUSTENTACION DE TODOS LOS RECURSOS Y JUICIOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CREDITO A QUE SE REFIERE, AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN. CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 279, 280, 282, 291, 283, 178 Y 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, ASIMISMO RENUNCIA AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTICULO 179 DE LA CITADA LEY. LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, INCLUYENDO LAS REFORMAS Y ADICIONES A DICHO ORDENAMIENTO, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.

----- FIN DE TEXTO -----

Expedido en: OFICINA: 00603; AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

FRANCISCO JOSE BATA DIEZ
BAD728311159

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERAN HACERSE A TRAVES DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERA SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERA RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024



FIRMA DIGITAL

Firma Digital: <http://www.chubbfianzasmonterrey.com>

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDADURAS.

Consulta nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 C102 D9

0148

Página 1 de 2

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.



NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC. 31 DE JULIO DE 2024.

ACTA ENTREGA-RECEPCION BENEFICIARIOS

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESENTE

HAGO REFERENCIA AL CONTRATO NOCHIS/FONDOIII/2024/13 RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS" DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024 CELEBRADO CON ESA DEPENDENCIA A SU DIGNO CARGO.

DATOS DE LA OBRA.


MONTO: \$ 1,213,589.41
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.
CONTRATISTA: C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.
UBICACIÓN DE LA OBRA: NOCHISTLAN.
FECHA DE INICIO: 18 DE JUNIO DE 2024.
FECHA DE TÉRMINO: 31 DE JULIO DE 2024.
NO. DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/13
PROGRAMA: FONDOIII 2024


CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA EN MENCIÓN POR PARTE DEL C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS, PARA LO CUAL SE HA REALIZADO LA SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE POR AMBAS PARTES CONSTATANDO QUE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRATADO HAN SIDO EJECUTADOS, ASÍ MISMO QUE LOS MATERIALES UTILIZADOS Y LOS TRABAJOS EN GENERAL SON DE BUENA CALIDAD.

POR LO ANTERIORMENTE CITADO FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTANCIAS PARTICIPANTES CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS FINES QUE HAYA A LUGAR.


C. JOSÉ MANUEL JIMENEZ FUENTES.
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. PRESIDENTE DEL COMITÉ
BENEFICIARIOS DE OBRA


C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ



c.c.p. ARCHIVO

MELENDREZ CONSTRUCCIONES



NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC. 31 DE JULIO DE 2024.

ACTA ENTREGA-RECEPCION MUNICIPIO

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESENTE


HAGO REFERENCIA AL CONTRATO NOCHIS/FONDOIII/2024/13 RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS" DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024 CELEBRADO CON ESA DEPENDENCIA A SU DIGNO CARGO.

DATOS DE LA OBRA.


MONTO: \$ 1,213,589.41
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.
CONTRATISTA: C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.
UBICACIÓN DE LA OBRA: NOCHISTLAN.
FECHA DE INICIO: 18 DE JUNIO DE 2024.
FECHA DE TÉRMINO: 31 DE JULIO DE 2024.
NO. DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/13
PROGRAMA: FONDOIII 2024

CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA EN MENCIÓN POR PARTE DEL C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS, PARA LO CUAL SE HA REALIZADO LA SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE POR AMBAS PARTES CONSTATANDO QUE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRATADO HAN SIDO EJECUTADOS, ASÍ MISMO QUE LOS MATERIALES UTILIZADOS Y LOS TRABAJOS EN GENERAL SON DE BUENA CALIDAD.

POR LO ANTERIORMENTE CITADO FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTANCIAS PARTICIPANTES CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS FINES QUE HAYA A LUGAR.


C. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ FUENTES.
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO


C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

c.c.p. ARCHIVO





ENTREGA DE FINIQUITO DE OBRA

NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS. A 31 DE JULIO DE 2024

ING. RAMON SALAZAR LUNA
SUPERVISOR DE OBRA
PRESENTE:


HAGO REFERENCIA, AL CONTRATO NÚMERO NOCHIS/FONDQIII/2024/13 RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS" PARA REALIZAR LA ENTREGA, REVISION Y APROBACIÓN DEL FINIQUITO DE OBRA CON UN IMPORTE EJECUTADO DE \$ 1,213,589.41 (UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.) QUE AMPARAN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2024 COMO SE DESCRIBE EN LA CARATULA DEL FINIQUITO DE OBRA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN QUE SIRVA AL PRESENTE

ATENTAMENTE
Magdalena Martinez Melendrez

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.C.P. ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.



0151

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL


Ejercicio 2024

FECHA DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION:
31 DE JULIO 2024

DATOS GENERALES:

FONDO:	III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social Municipal.	NO. DE PROYECTO:	404006
ESTADO:	032 Zacatecas	PROGRAMA:	DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION
MUNICIPIO:	034: Nochistlán de Mejía	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA YO ACCIÓN:	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.
LOCALIDAD:	NOCHISTLAN DE MEJIA		
METAS CUMPLIDAS:			
FECHA REAL INICIO:		18 JUNIO 2024	
FECHA REAL TERMINACION:		31 JULIO 2024	

Firmar al calce



MaCleotilde Ledezma
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Jose Reyes
Jazmin Nocio's

ESTRUCTURA FINANCIERA:

	TOTAL	F.I.S.M.	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
INVERSIÓN APROBADA	\$401,083.97	\$401,083.97	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA	\$401,083.97	\$401,083.97	0.00	0.00	0.00

MODALIDAD DE EJECUCION: C(X) AC () AM () AD () M() EQ()

En el municipio de: **NOCHISTLAN DE MEJIA** siendo las 12 :00 HRS. Del día: **31 DE JULIO DEL 2024**

los **C. MANUEL JIMENEZ FUENTES** PRESIDENTE MUNICIPAL; **LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ**, SINDICA MUNICIPAL, **ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA**, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, **LIC. ARMANADO AGUIRRE GOMEZ** SECRETARIO DE GOBIERNO, **C. SERGIO HINOJOZA PEREZ** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, y representantes de las diferentes dependencias que intervienen para efectuar y dar constancia de la **entrega-recepción de la obra**, descrita en la parte superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la ley de adquisiciones y obras públicas y 49 de su reglamento.


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente trizada y operando de acuerdo a la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto, en condiciones de ser recibida por la unidad de su operación (comité o dependencia que se encargará en lo sucesivo de su conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime al ejecutor de la obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en ella y se obliga por la presente a corregir la deficiencia detectada sin costo para la federación.

El H. Ayuntamiento representado por el **C, MANUEL JIMENEZ FUENTES** por este medio y este momento hace la entrega a los **Integrantes del Comité de obra**, quien será la entidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quienes reciben de conformidad los que en ella intervienen firmando al calce.

Firmar al calce

Página 2



0153

MANUEL JIMENEZ FUENTES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jose Reyes Jarmin Macias

POR EL MUNICIPIO
ENTREGAN:

Manuel Jimenez

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MANUEL JIMENEZ FUENTES

RECIBEN LA OBRA:

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

VOCAL DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Jose Reyes

[Firma]


TESTIGOS:

Jazmin Macias

Macleotilde Ledezma

Firmar al calce

Página 3



0154

MELENDREZ CONSTRUCCIONES



FINIQUITO DE OBRA
 MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.
 CONTRATISTA: MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

"CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABINERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS"

FINIQUITO ESTIMACION	DEL 18/06/24 AL 31/07/24
HOJA	1 DE 1
MONTO CONTRATADO	\$ 1,213,589.41
No. DE CONTRATO	NOCHIS/FONDOIII/2024/13

HOJA	CLAVES DE CONCEPTOS	IMPORTE
------	---------------------	---------

1 Y 2.	010705, RETA-D1, 010115, TEMP*3, MARTI-001, 010818, METAC-0002-1, 03-202 Y 030504.	\$ 0.00
--------	--	---------

HISTORIAL	\$0.00
ANTICIPO ESTIMADO A LA FECHA POR ESTIMAR	\$ 1,213,589.41
	\$0.00

SUBTOTAL	\$ 0.00
I.V.A. 16 %	\$ 0.00
TOTAL DE LA FACTURA	\$ 0.00
5 AL MILLAR	\$ 0.00

TOTAL A RECIBIR	\$ 0.00
-----------------	---------

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

SUPERVISOR

 ING. RAMON SALAZAR-LUNA

CONTRATISTA

 MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

0155

MELENDREZ CONSTRUCCIÓN



FINQUITO

"CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NICHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS."

PERIODO: DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN DE LA ESTIMACION OI	VOLUMEN POR EJECUTAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE POR EJECUTAR
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NICHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.								
PRELIMINARES								
010706	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano	m2	1,050.00	1,050.00	0.00	\$8.03	\$8,431.50	0.00
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperación de material. incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.	m2	100.80	100.80	0.00	\$44.85	\$4,520.88	0.00
010115	Formación de terraplenes con material de banco (tepetate-cascajo), incluye compactación al 90 % proctor, incluye incorporado de agua, extendido de material, compactado en capas de 20 cm., equipo, mano de obra.	m3	124.70	124.70	0.00	\$575.58	\$71,774.83	0.00
TERRALERIAS								
TEMP*3	Excavación en corte debajo de la subrasante con medios mecanicos (retroexcavadora) considerando afina de la superficie con motoniveladora y dejando pendientes de acuerdo a proyecto.	m3	261.23	261.23	0.00	\$151.75	\$39,641.65	0.00
MARTI-001	Excavación con Rotomartillo en terreno tipo C (0.0% tierra, 0.0% tepetate, 100% piedra) incluye: operador y ayudante.	hora	15.00	15.00	0.00	\$1,370.44	\$20,556.60	0.00
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria, carga con máquina.	m3	261.23	261.23	0.00	\$127.26	\$33,244.13	0.00
SUB-BASE Y BASE								
META-0002-1	Formación de base para nivelación compactada al 100 % , utilizando material de banco y material petreo (50% material de banco - 50% material petreo)	m3	142.19	142.19	0.00	\$593.12	\$84,835.73	0.00
CONCRETO								
031202	Mampostería en cimiento de piedra braza de 0.25 a 0.50 m3/ml juntoado con mezcla cemento-arena 1:3	m3	18.50	18.50	0.00	\$1,925.40	\$35,619.90	0.00

FAISM (FII)
EJERCICIO 2024

REPRESANTANTE LEGAL
Magdalena Martinez Melendez
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

MELENDREZ CONSTRUCCIÓN



FINIBUITO

"CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JARDONERA, MUNICIPIO DE NUCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS."

PERIODO: DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN DE LA ESTIMACION OI.	VOLUMEN POR EJECUTAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE POR EJECUTAR
030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010, rollo de 100 mts, incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	1,050.00	1,050.00	0.00	\$712.46	\$748,083.00	0.00

SUB-TOTAL = 0.00

SUBTOTAL = 0.00
 IVA 16 % = 0.00
 TOTAL = 0.00

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

0157

REPRESENTANTE LEGAL
Magdalena Martinez Melendrez
 C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

ACTA DERECHOS Y OBLIGACIONES

Siendo las **9:00 horas** del día **31 de julio de 2024**, en el espacio que ocupa la oficina de Desarrollo económico y social, Ubicado en el edificio de la presidencia Municipal marcado con el No. 1, de la calle Hidalgo, esquina con la Plaza Principal en Nochistlán, Zac. Las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, conforme a lo dispuesto en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece el artículo 64 de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas con el objeto de llevar a cabo el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones sobre los trabajos ejecutados al amparo del contrato No. **NOHIS/FONDOIII/2024/13** que suscribieron Desarrollo económico y social el contratista **C. MADGALENA MARTINEZ MELENDREZ**.

ANTECEDENTES

Con fecha **18 junio de 2024** las partes celebran contrato de Obra Pública con base a Precio Unitario y tiempo determinado identificado con el No. De Contrato: **NOHIS/FONDOIII/2024/13** para llevar a cabo los trabajos de obra: **CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**. Con fecha de iniciación real de los trabajos el día **18 JUNIO de 2024** y la fecha de terminación real el día **31 de JULIO del 2024**.

Quedando un monto total contratado de **\$1'213,589.41** (un millón doscientos trece mil quinientos ochenta y nueve pesos 41/100M.N) Esta cantidad incluye el impuesto al valor agregado.


Durante del proceso de la obra se autorizaron un total de 1 (**una**) estimación a precio unitario por trabajos ejecutados por un monto total de **\$1'213,589.41** (un millón doscientos trece mil quinientos ochenta y nueve pesos 41/100M.N) Esta cantidad incluye el impuesto al valor agregado.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprenden:

CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

Operado: FONDO III




RELACIÓN DE ESTIMACIONES PAGADAS POR TRABAJOS EJECUTADOS

Por lo anterior manifiestan las partes que no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

No. de Estimac.	Fecha	Importe Total	Deducciones	Anticipo (Amortización)
1	12 de agosto de 2024	\$1'213,589.41	\$0.00	\$0.00

Sin otro asunto que tratar, se cierra la presente Acta firmado de conformidad las personas que interviene en este acto.

RESIDENTE DE OBRA 	CONTRATISTA Magdalena Martinez Melendrez
ING. RAMON SALAZAR LUNA	C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

