
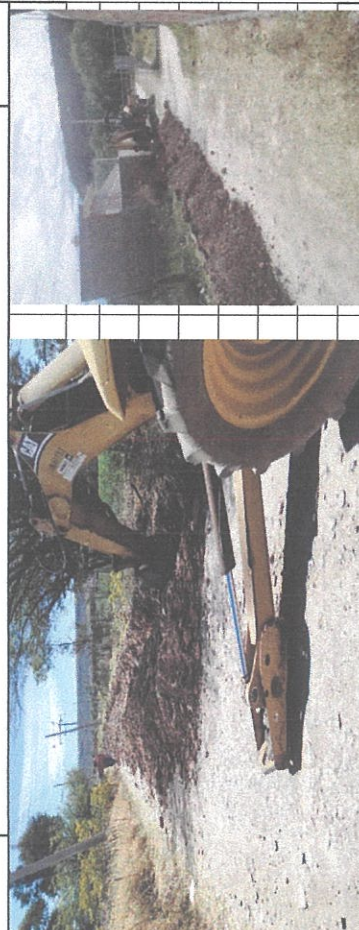



ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONTRATO.	NOCHIS/FONDOIII/2024/04	MONTO CONTRATADO:	\$ 145,284.43	CONTRATISTA:	ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	PROGRAMA	
NOMBRE DE LA OBRA:	NOCHIS/FONDOIII/2024/04			MUNICIPIO:	LOCALIDAD:	FONDO III	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.				NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.			
FECHA DE CONTRATO :	28 DE FEBRERO DE 2024			EST. No.	1	FECHA DE ESTIMACION:	28 DE MARZO DE 2024
FECHA DE INICIO:	28 DE FEBRERO DE 2024			HOJA:	2	PERIODO DE:	DE: 25
PERIODO DE EJECUCION:	30 DIAS NATURALES			FEBRERO	A	MARZO	
FECHA DE TERMINO:	28 DE MARZO DE 2024						
DESCRIPCION DE CONCEPTO:	20251 Excavación por medios mecánicos de terreno en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts. no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo, y herramientas.						
UNIDAD m3	CROQUIS						
							





OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024


 ING. JOSÉ MARCÓS BARBA PÉREZ


 ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIÉRREZ

0167

ARCHIVO FOTOGRAFICO


CONTRATO.	NOCHIS/FONDOIII/2024/04	CONTRATADO:	ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	PROGRAMA	
NOMBRE DE LA OBRA:	NOCHIS/FONDOIII/2024/04	MONTO CONTRATADO:	\$ 145,284.43		
OBRA:	CONSTRUCCION DE RED O DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.	 INFRAESTRUCTURA & CONSTRUCCIÓN Cimientos sólidos para un futuro mejor			
FECHA DE CONTRATO :	28 DE FEBRERO DE 2024				
FECHA DE INICIO:	28 DE FEBRERO DE 2024				
PERIODO DE EJECUCION:	30 DIAS NATURALES				
FECHA DE TERMINO:	28 DE MARZO DE 2024				
DESCRIPCION DE CONCEPTO:					
AFI-01	Aline de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo I				
EST. No.	1	FECHA DE ESTIMACION:	28 DE MARZO DE 2024	UNIDAD	M2
MUNICIPIO:	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	HOJA:	3	PERIODO DE:	DE: 25
		FEBRERO	A	MARZO	
					

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024


 ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ



 ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIÉRREZ

ARCHIVO FOTOGRAFICO

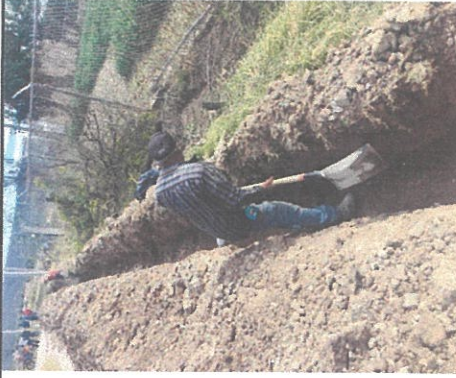CONTRATO.	NOCHIS/FONDOIII/2024/04	MONTO CONTRATADO:	\$ 145,284.43	CONTRATISTA:	ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	PROGRAMA	
NOMBRE DE LA OBRA:	NOCHIS/FONDOIII/2024/04			MUNICIPIO:	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	FONDO III	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.			FECHA DE ESTIMACION:	HOJA: 4	PERIODO DE:	DE: 25
FECHA DE CONTRATO :	28 DE FEBRERO DE 2024			28 DE MARZO DE 2024	FEBRERO	A	MARZO
FECHA DE INICIO:	28 DE FEBRERO DE 2024			EST. No.	1		
PERIODO DE EJECUCION:	30 DIAS NATURALES						
FECHA DE TERMINO:	28 DE MARZO DE 2024						
DESCRIPCION DE CONCEPTO:	Cama de tepalcate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías. Incluye material, mano de obra y herramientas.						
4	UNIDAD	M3					





OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024


 ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ



 ARC. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

ARCHIVO FOTOGRAFICO


CONTRATO.	NOCHIS/FONDOIII/2024/04	CONTRATISTA:	ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ
NOMBRE DE LA OBRA:	NOCHIS/FONDOIII/2024/04	MUNICIPIO:	LOCALIDAD:
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.	 INFRAESTRUCTURA & CONSTRUCCIÓN Climientos sólidos para un futuro mejor	PROGRAMA	
FECHA DE CONTRATO : 28 DE FEBRERO DE 2024		EST. No.	6
FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO DE 2024		FECHA DE ESTIMACION:	HOJA: 6 DE: 25
PERIODO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES		28 DE MARZO DE 2024	PERIODO DE:
FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO DE 2024		FEBRERO	A
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		FONDO III	

ACAR-02	DESCRIPCION DE CONCEPTO:	UNIDAD
	Acarreo sobre camion de volteo de 7 m3 de material no utilizabale en obra, kilometros subsecuentes se consideran 3 km.	m3/km
		
		

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024




 ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ



 ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIÉRREZ

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONTRATO.	MONTO CONTRATADO:	CONTRATISTA:	PROGRAMA
NOCHIS/FONDOIII/2024/04	\$ 145,284.43	ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	FONDO III
NOMBRE DE LA OBRA: OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.		LOCALIDAD:	
FECHA DE CONTRATO : 28 DE FEBRERO DE 2024 FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO DE 2024 PERIODO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO DE 2024		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		EST. No.	PERIODO DE:
Coplo de reparación diámetro (2 1/2") pvc, incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.		1	FEBRERO A MARZO
UNIDAD PZA			






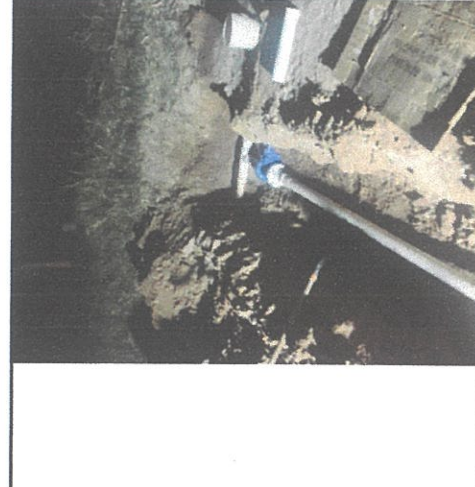

 ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ


 ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

0173

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONTRATO.	ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	CONTRATISTA:	ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ
NOMBRE DE LA OBRA:	NOCHIS/FONDOIII/2024/04	MUNICIPIO:	LOCALIDAD:
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.	EST. No.	9
FECHA DE CONTRATO :	28 DE FEBRERO DE 2024	FECHA DE ESTIMACION:	DE: 25
FECHA DE INICIO:	28 DE FEBRERO DE 2024	PERIODO DE:	FEBRERO A MARZO
PERIODO DE EJECUCION:	30 DIAS NATURALES	PROGRAMA	
FECHA DE TERMINO:	28 DE MARZO DE 2024		
DESCRIPCION DE CONCEPTO:	<div style="text-align: center;">  <p>INFRAESTRUCTURA & CONSTRUCCIÓN Cimientos sólidos para un futuro mejor</p> </div>		
80807	Tee - Pvc Hid. Cad 40 - Cementar (Hhh) 2 1/2" Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución del p.u.o.t.	UNIDAD PZA	
			
			


 ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ


 ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

0174

**OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024**

ARCHIVO FOTOGRAFICO


CONTRATO.	NOCHIS/FONDOIII/2024/04	MONTO CONTRATADO:	\$ 145,284.43	CONTRATISTA:	ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	PROGRAMA	
NOMBRE DE LA OBRA:	NOCHIS/FONDOIII/2024/04			MUNICIPIO:	LOCALIDAD:	FONDO III	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.						
FECHA DE CONTRATO :	28 DE FEBRERO DE 2024			FECHA DE ESTIMACION:	HOJA:		
PERIODO DE EJECUCION:	30 DIAS NATURALES			28 DE MARZO DE 2024		10	DE: 25
FECHA DE TERMINO:	28 DE MARZO DE 2024					FEBRERO	A
DESCRIPCION DE CONCEPTO:							
63	Tapen campana (2' 1/2"), Incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta colocación.			UNIDAD PZA			



**OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024**






 ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ



 ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

0175

ARCHIVO FOTOGRAFICO





CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2024/04	MONTO CONTRATADO: \$ 145,284.43	<div style="text-align: center;">  <p>INFRAESTRUCTURA & CONSTRUCCIÓN Cimientos sólidos para un futuro mejor</p> </div>
NOMBRE DE LA OBRA: OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.	CONTRATISTA: ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	LOCALIDAD: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
FECHA DE CONTRATO : 28 DE FEBRERO DE 2024 FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO DE 2024 PERIODO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NATURALES FECHA DE TÉRMINO: 28 DE MARZO DE 2024	FECHA DE ESTIMACIÓN: 28 DE MARZO DE 2024	HOJA: 11 DE: 25 PERIODO DE: FEBRERO A MARZO
DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO: 123 Entrada de Seccionamiento de FO.FO. diámetro (2 1/2") incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.		
UNIDAD PZA		


 ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ



 ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/04	MONTO CONTRATADO: \$ 145,284.43	CONTRATISTA: ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ
NOMBRE DE LA OBRA: OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
FECHA DE CONTRATO : 28 DE FEBRERO DE 2024		FECHA DE ESTIMACION: HOJA: 12 DE: 25
FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO DE 2024		PERIODO DE: FEBRERO A MARZO
PERIODO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES		
FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO DE 2024		
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		
AP-11	Valvula de admisión y expulsión de aire de 3/4" de diametro, Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo para su colocación.	UNIDAD PZA
		




OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024



ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ



ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

0177

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONTRATO. NOCHIS/FONDOI/2024/04		CONTRATADO: MONTO CONTRATADO: \$ 145,284.43	
NOMBRE DE LA OBRA: OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.		 INFRAESTRUCTURA & CONSTRUCCIÓN Cimientos sólidos para un futuro mejor	
FECHA DE CONTRATO : 28 DE FEBRERO DE 2024		CONTRATISTA: ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	
FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO DE 2024		LOCALIDAD: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.	
PERIODO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NATURALES		EST. No. 1	
FECHA DE TÉRMINO: 28 DE MARZO DE 2024		FECHA DE ESTIMACIÓN: 28 DE MARZO DE 2024	
DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO: Extremidad campana de PVC 2 1/2" de diámetro. Incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.		HOJA: 13	
		PERIODO DE: FEBRERO A MARZO	
		PROGRAMA	
		FONDO III	
			
94			


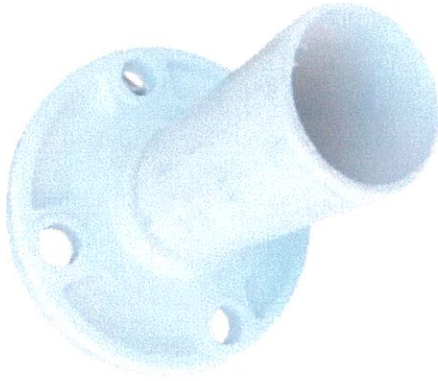

ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ


ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ


OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0178

ARCHIVO FOTOGRAFICO




CONTRATO.	ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	CONTRATISTA:	ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	PROGRAMA
	NOCHIS/FONDOIII/2024/04	MUNICIPIO:	LOCALIDAD:	FONDO III
NOMBRE DE LA OBRA:	NOCHIS/FONDOIII/2024/04			
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.			
FECHA DE INICIO:	28 DE FEBRERO DE 2024	FECHA DE ESTIMACION:	HOJA: 14	PERIODO DE: 28 DE MARZO DE 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN:	30 DIAS NATURALES	FECHA DE TERMINO:	FEBRERO	A
FECHA DE TERMINO:	28 DE MARZO DE 2024			
DESCRIPCION DE CONCEPTO:	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>INFRAESTRUCTURA & CONSTRUCCIÓN</p> <p>Cimientos sólidos para un futuro mejor</p> </div> </div>			
TEMP*6				UNIDAD PZA
	<p>Extremidad espiga pvc 2 1/2" incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta colocación.</p>			
				


 ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ



 ARC. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONTRATO. NOCHIS/FONDOIII/2024/04	MONTO CONTRATADO: \$ 145,284.43	CONTRATISTA: ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	PROGRAMA FONDO III
NOMBRE DE LA OBRA: OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZACATECAS.	 INFRAESTRUCTURA & CONSTRUCCIÓN Cimientos sólidos para un futuro mejor	EST. No. 1	FECHA DE ESTIMACIÓN: 28 DE MARZO DE 2024
FECHA DE CONTRATO : 28 DE FEBRERO DE 2024 FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO DE 2024 PERIODO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NATURALES FECHA DE TÉRMINO: 28 DE MARZO DE 2024	HOJA: 15 DE: 25 PERIODO DE: FEBRERO A MARZO		
DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO:			
96	Empaque de neopreno (2 1/2") Incluye: suministro y colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.		UNIDAD PZA

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024






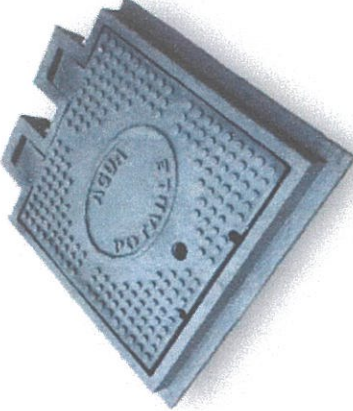
ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ




ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

0180

ARCHIVO FOTOGRAFICO



CONTRATO.	ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	CONTRATISTA:	ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	PROGRAMA
	NOCHIS/FONDOIII/2024/04	MUNICIPIO:	LOCALIDAD:	FONDO III
NOMBRE DE LA OBRA:	NOCHIS/FONDOIII/2024/04	MONTO CONTRATADO:		
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.	\$	145,284.43	
FECHA DE CONTRATO :	28 DE FEBRERO DE 2024	 <p>INFRAESTRUCTURA & CONSTRUCCIÓN Cimientos sólidos para un futuro mejor</p>		
FECHA DE INICIO:	28 DE FEBRERO DE 2024			
PERIODO DE EJECUCIÓN:	30 DIAS NATURALES			
FECHA DE TERMINO:	28 DE MARZO DE 2024			
DESCRIPCION DE CONCEPTO:				
170323	Registro de 60x60x100 cm para Valvulas, de tabique rojo rececido 8 x 14 x 37 cms, Juntando con mezcla cemento arena 1:1:2 acabado pulido en el interior, sobre base de plantilla de concreto de 5 y cadena de seccion 10 x 12 cm de concreto 100 kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, Incluye: marco c/ tapa fote, contramuro fote, excavaciones, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	UNIDAD	PZA	
				
				

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024



 ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ

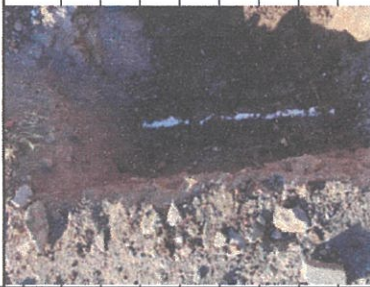

 ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONTRATO:	NOCHIS/FONDOIII/2024/04	MONTO CONTRATADO:	\$ 145,284.43	CONTRATISTA:	ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	PROGRAMA	
NOMBRE DE LA OBRA:	NOCHIS/FONDOIII/2024/04			MUNICIPIO:	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	FONDO III	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.			FECHA DE ESTIMACION:	HOJA: 17 DE: 25		
FECHA DE INICIO:	28 DE FEBRERO DE 2024			PERIODO DE:	FEBRERO A		
PERIODO DE EJECUCION:	30 DIAS NATURALES			EST. No.	1		
FECHA DE TERMINO:	28 DE MARZO DE 2024			FECHA DE MARZO DE 2024			
DESCRIPCION DE CONCEPTO:				FEBRERO			
10							
	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de distancia.			UNIDAD	M3		


**OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024**





 ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ



 ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONTRATO.	CONTRATISTA: ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	PROGRAMA
NOMBRE DE LA OBRA: NOCHIS/FONDOIII/2024/04	LOCALIDAD:	FONDO III
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.	FECHA DE ESTIMACION: 28 DE MARZO DE 2024	
FECHA DE CONTRATO : 28 DE FEBRERO DE 2024	HOJA: 18	
FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO DE 2024	PERIODO DE: FEBRERO	
PERIODO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NATURALES	A	
FECHA DE TÉRMINO: 28 DE MARZO DE 2024	MARZO	

MONTO CONTRATADO: \$ 145,284.43	 <p>INFRAESTRUCTURA & CONSTRUCCIÓN Cimientos sólidos para un futuro mejor</p>
---	---




DESCRIPCION DE CONCEPTO:	UNIDAD	m3
301116 Relleno con material producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.		
		
		
		


 ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ



 ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONTRATO:	ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	CONTRATISTA:	ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	PROGRAMA
MUNICIPIO:	NOCHIS/FONDOIII/2024/04	LOCALIDAD:	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	FONDO III
NOMBRE DE LA OBRA:	NOCHIS/FONDOIII/2024/04	EST. No.	1	FECHA DE ESTIMACION:
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	FECHA DE INICIO:	28 DE FEBRERO DE 2024	PERIODO DE:
FECHA DE CONTRATO :	28 DE FEBRERO DE 2024	PERIODO DE EJECUCIÓN:	30 DIAS NATURALES	FEBRERO
FECHA DE INICIO:	28 DE FEBRERO DE 2024	FECHA DE TERMINO:	28 DE MARZO DE 2024	MARZO
PERIODO DE EJECUCIÓN:	30 DIAS NATURALES	DESCRIPCION DE CONCEPTO:		
20251	Excavación por medios mecánicos de terreno en ceps, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts. no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo, y herramienta.	 <p>INFRAESTRUCTURA & CONSTRUCCIÓN Cimientos sólidos para un futuro mejor</p>		
UNIDAD	m3	 		


OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024


 ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ


 ARG. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

ARCHIVO FOTOGRAFICO


CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/04	ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	PROGRAMA	
MONTO CONTRATADO: \$ 145,284.43	LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	FONDO III	
NOMBRE DE LA OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	FECHA DE ESTIMACION: 28 DE MARZO DE 2024	HOJA: 20	DE: 25
FECHA DE CONTRATO : 28 DE FEBRERO DE 2024	EST. No. 1	PERIODO DE: FEBRERO	A MARZO
FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO DE 2024			
PERIODO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES			
FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO DE 2024			

UNIDAD	M3	DESCRIPCION DE CONCEPTO:	FOTOGRAFIA
4		Cama de topetate de 10 cm de espesor en copas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	





INFRAESTRUCTURA & CONSTRUCCIÓN
Cimientos sólidos para un futuro mejor

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024



ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ


ARG. ALMA DELIA RUÑOZ GUTIERREZ

ARCHIVO FOTOGRAFICO





CONTRATO.	ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	CONTRATISTA:	ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ
CONTRATO.	NOCHIS/FONDOIII/2024/04	MUNICIPIO:	LOCALIDAD:
MONTO CONTRATADO:	\$ 145,284.43	PROGRAMA	
NOMBRE DE LA OBRA:	NOCHIS/FONDOIII/2024/04		
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.			
FECHA DE CONTRATO :	28 DE FEBRERO DE 2024	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	FONDO III
FECHA DE INICIO:	28 DE FEBRERO DE 2024	EST. No.	21
PERIODO DE EJECUCIÓN:	30 DIAS NATURALES	FECHA DE ESTIMACION:	HOJA: 21
FECHA DE TERMINO:	28 DE MARZO DE 2024	28 DE MARZO DE 2024	PERIODO DE: A
DESCRIPCION DE CONCEPTO:	10818 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, producto de la excavación sobre camino de terracería, cargar con máquina.		
UNIDAD M3			
UNIDAD M3			

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024



 ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ


 ARG. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

ARCHIVO FOTOGRAFICO




<p>NOMBRE DE LA OBRA: OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.</p> <p>FECHA DE CONTRATO : 28 DE FEBRERO DE 2024</p> <p>FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO DE 2024</p> <p>PERIODO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES</p> <p>FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO DE 2024</p>	<p>CONTRATO. NOCHIS/FONDOIII/2024/04</p> <p>MONTO CONTRATADO: \$ 145,284.43</p>	<p>CONTRATISTA: ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ</p> <p>MUNICIPIO: LOCALIDAD:</p>	<p>PROGRAMA FONDO III</p>
<p>DESCRIPCION DE CONCEPTO:</p> <p>ACAR-02 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en obra, kilómetros subsecuentes se consideran 3 km.</p>	<p>UNIDAD m³/km</p>	<p>EST. No. 1</p> <p>FECHA DE ESTIMACION: 28 DE MARZO DE 2024</p> <p>HOJA: 22</p> <p>PERIODO DE: FEBRERO A MARZO</p>	<p>NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.</p>
			
			

**OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024**


 ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ



 ARG. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONTRATO.	NOCHIS/FONDOIII/2024/04	MONTO CONTRATADO:	\$ 145,284.43	CONTRATISTA:	ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	PROGRAMA		
NOMBRE DE LA OBRA:	NOCHIS/FONDOIII/2024/04			MUNICIPIO:	LOCALIDAD:			
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.			NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.				
FECHA DE CONTRATO :	28 DE FEBRERO DE 2024			EST. No.	28 DE MARZO DE 2024			
FECHA DE INICIO:	28 DE FEBRERO DE 2024			HOJA:	23	DE:	25	
PERIODO DE EJECUCION:	30 DIAS NATURALES			FEBRERO	A	PERIODO DE:	MARZO	
FECHA DE TERMINO:	28 DE MARZO DE 2024							
DESCRIPCION DE CONCEPTO:	<div style="text-align: center;">  <p>INFRAESTRUCTURA & CONSTRUCCIÓN Cimientos sólidos para un futuro mejor</p> </div>							
10							UNIDAD	M3
Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de distancia.								





OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024


 ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ


 ARG. ANNA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

ARCHIVO FOTOGRAFICO

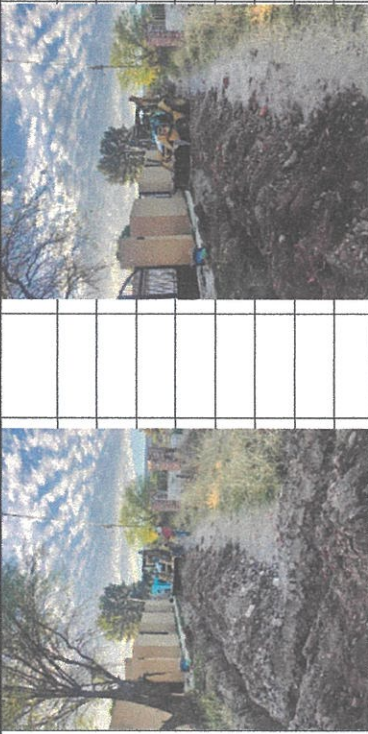CONTRATO.	ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	CONTRATISTA:	ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	PROGRAMA
MONTO CONTRATADO:	\$ 145,284.43	MUNICIPIO:	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
NOMBRE DE LA OBRA:	NOCHIS/FONDOIII/2024/04			
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZACATECAS.			
FECHA DE CONTRATO :	28 DE FEBRERO DE 2024			
FECHA DE INICIO:	28 DE FEBRERO DE 2024			
PERIODO DE EJECUCIÓN:	30 DIAS NATURALES			
FECHA DE TERMINO:	28 DE MARZO DE 2024			
DESCRIPCION DE CONCEPTO:	Relleno con material producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.			
301116	UNIDAD M3			
		EST. No. 1 FECHA DE ESTIMACION: 28 DE MARZO DE 2024 HOJA: 24 DE: 25 PERIODO DE: FEBRERO A MARZO		


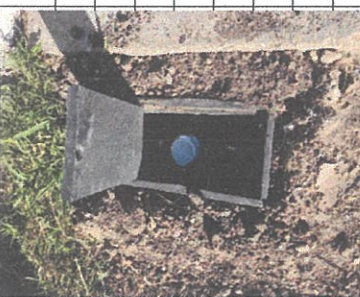
OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024


 ARC. ALIMA BELIA MUÑOZ GUTIERREZ


 ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/04	CONTRATADO: MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	CONTRATISTA: ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ	PROGRAMA
NOMBRE DE LA OBRA: OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	MONTO CONTRATADO: \$ 145,284.43	LOCALIDAD:	FONDO III
FECHA DE CONTRATO : 28 DE FEBRERO DE 2024	 <p>INFRAESTRUCTURA & CONSTRUCCIÓN Cimientos sólidos para un futuro mejor</p>	FECHA DE ESTIMACION: 28 DE MARZO DE 2024	PERIODO DE: 25
FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO DE 2024		HOJA:	DIAS: 25
PERIODO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NATURALES		FEBRERO	A
FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO DE 2024			MARZO

DESCRIPCION DE CONCEPTO:	UNIDAD	PZA
<p>TOMD-01</p> <p>Suministro y colocación de medidor de agua potable, incluye: manguera de alta densidad (5 ml promedio), ensamblado de poliducto naranja de 1", abrazadera omega de 2 1/2" con salida a 1/2", 1 llave de inserción, 1 válvula limitadora, niple galvanizado de 1/2", 1 niple cuerda corrida de 1/2", llave de paso de 1/2" de esfera, 1 niple galvanizado de 70 cm, registro para medidor de poliducto, medidor de chorro múltiple de 1/2", conexiones a domicilio con tubo plus-mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>		
		

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024


 ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ


 ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ



**INFRAESTRUCTURA
& CONSTRUCCIÓN**
Cimientos sólidos para un futuro mejor

José Marcos Barba Pérez
Ingeniero Civil
3467006482
bbinfraconstruccion@gmail.com

ACUMULADO DE ESTIMACIONES			
MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.			
CONTRATISTA: ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ.			
ESTIMACIONES	01	DEL 28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2024	
			"OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174", EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS."
HOJA	1	DE	1
MONTO CONTRATADO		\$145,284.43	
No. DE CONTRATO		NOCHIS/FONDO III/2024/04	

HOJA	CLAVES DE CONCEPTOS	IMPORTE
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 Y 25.	010418, 020251, AFI-01, 04, 010818, ACAR-02, 080415, COPL-R-212", 080807, 83, 000123, AP-11, 94, TEMP"6, 96, 170323, 10, 301116, 020251,04, 010818, ACARR-02, 10, 301116, TOMD-01.	\$125,245.20

HISTORIAL	
ANTICIPO	\$0.00
ESTIMADO A LA FECHA	\$145,284.43
POR ESTIMAR	\$0.00

SUBTOTAL	\$125,245.20
I.V.A. 16 %	\$ 20,039.23
TOTAL DE LA FACTURA	\$145,284.43
TOTAL A RECIBIR	\$145,284.43



CONTRATISTA

ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

0191



ACUMULADO DE ESTIMACIONES
OBRA:CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA
LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,
ZACATECAS.

CLAVE: ACUMULADO DE ESTIMACIÓN

PERIODO: DEL 28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2024

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN DE LA ESTIMACION	VOLUMEN POR EJECUTAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE ACUMULADO
	OBRA:CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.							
	PRELIMINARES							
010418	Trazo y nivelación de terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	242.00	242.00	0.00	\$8.97	\$2,170.74	\$2,170.74
	TERRACERIAS							
020251	Excavación por medios mecánicos de terreno en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts. no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo, y herramienta.	M3	77.44	77.44	0.00	\$59.87	\$4,636.33	\$4,636.33
AFI-01	Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo I	M2	121.00	121.00	0.00	\$17.23	\$2,084.83	\$2,084.83
	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye: material, mano de obra y herramienta.	M3	9.68	9.68	0.00	\$293.93	\$2,845.24	\$2,845.24
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	M3	29.04	29.04	0.00	\$83.98	\$2,438.78	\$2,438.78
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsiguientes se consideran (2 km).	M3/KM	58.08	58.08	0.00	\$17.24	\$1,001.30	\$1,001.30
	MATERIALES							
080415	Tubo Pvc Hid. Rd-26- Tramo de 6 Mts. 2 1/2" incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	242.00	242.00	0.00	\$146.50	\$35,453.00	\$35,453.00
COPL-R-212"	Cople de reparación diametro (2 1/2") pvc, incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	2.00	2.00	0.00	\$283.01	\$566.02	\$566.02
080807	Tee - Pvc Hid. Ced 40 - Cementar (Hhh) 2 1/2" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución del p.u.o.t.	PZA	2.00	2.00	0.00	\$277.01	\$554.02	\$554.02
83	Tapon campana (2 1/2"), Incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	2.00	2.00	0.00	\$408.43	\$816.86	\$816.86
000123	Valvula de Seccionamiento de FO.FO. diametro (2 1/2") incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	1.00	0.00	\$4,140.00	\$4,140.00	\$4,140.00
AP-11	Valvula de admisión y expulsión de aire de 3/4" de diametro, incluye:materiales, mano de obra, herramienta y equipo para su colocación.	PZA	1.00	1.00	0.00	\$1,893.59	\$1,893.59	\$1,893.59
94	Extremidad campana de PVC 2 1/2" de diametro incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	1.00	0.00	\$443.66	\$443.66	\$443.66
TEMP*6	Extremidad espiga pvc 2 1/2" incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	1.00	0.00	\$452.17	\$452.17	\$452.17



0192



**INFRAESTRUCTURA
& CONSTRUCCIÓN**

Cimientos sólidos para un futuro mejor

José Marcos Barba Pérez
Ingeniero Civil
3467006482
bbinfraconstruccion@gmail.com

96	Empaque de neopreno (2 1/2") incluye: suministro y colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	2.00	2.00	0.00	\$206.37	\$412.74	\$412.74
170323	Registro de 60x60x100 cm para Valvulas. de tabique rojo recocido 8 x 14 x 37 cms. juntado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, sobre base de plantilla de concreto de 5 y cadena de seccion 10 x 12 cm de concreto 100 kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal , incluye: marco c/ tapa fofo, contramarco fofo, excvaciones, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00	0.00	\$9,021.11	\$18,042.22	\$18,042.22
RELLENOS								
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pisón de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de distancia.	M3	19.36	19.36	0.00	\$270.52	\$5,237.27	\$5,237.27
301116	Relleno con máterial producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	13.56	13.56	0.00	\$65.54	\$888.72	\$888.72
TOMAS DOMICILIARIAS								
020251	Excavación por medios mecánicos de terreno en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts. no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo, y herramienta.	M3	18.48	18.48	0.00	\$59.87	\$1,106.40	\$1,106.40
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye: material, mano de obra y herramienta.	M3	2.64	2.64	0.00	\$293.93	\$775.98	\$775.98
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	M3	7.92	7.92	0.00	\$83.98	\$665.12	\$665.12
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsecuentes se consideran (2 km).	M3/KM	15.84	15.84	0.00	\$17.24	\$273.08	\$273.08
RELLENOS								
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pisón de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de distancia.	M3	5.28	5.28	0.00	\$270.52	\$1,428.35	\$1,428.35
301116	Relleno con máterial producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	13.56	13.56	0.00	\$65.54	\$888.72	\$888.72
TOMAS								
TOMD-01	Suministro y colocación de medidor de agua potable, incluye: manguera de alta densidad (5 ml promedio), encamisado de poliducto naranja de 1", abarazadera omega de 2 1/2" con salida a 1/2", 1 llave de inserción, 1 valvula limitadora, niple galvanizado de 1/2", 1 niple cuerda corrida de 1/2", llave de paso de 1/2" de esfera, 1 niple galvanizado de 70 cm, registro para medidor de polietileno, medidor de chorro multiple de 1/2", conexiones a domicilio con tubo plus,mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	11.00	11.00	0.00	\$3,275.46	\$36,030.06	\$36,030.06

0193

SUB- TOTAL 01 = \$125,245.20


ATENTAMENTE
ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ

SUBTOTAL = \$125,245.20
IVA 16% = \$20,039.23
TOTAL = \$145,284.43
OPERADO FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE:	1
FECHA REPORTE:	08/03/2024

REAL PROGRAMADO	
% AVANCES FISICO	20
FINANCIERO	0
	25
	0

PARTIDAS	IMPORTES	MESES												DIAS	% EN BASE TIEMPO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO								
PRELIMINARES	\$2,170.74														1	16.67
TERRACERIAS	\$13,006.48														5	16.67
MATERIALES	\$62,774.28														5	16.67
RELLENOS	\$6,125.99														5	16.67
TOMAS DOMICILIARIAS																
TERRACERIAS	\$2,820.58														5	
RELLENOS	\$2,317.07														5	
TOMAS	\$36,030.06														4	
SUB-TOTAL	\$125,245.20															
18% I.V.A.	\$20,039.23															
TOTAL	\$145,284.43														30	

DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE:	CONSTRUCCION DE RED O DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
UBICACION:	NOCHISTLAN
TIPO DE OBRA:	CONSTRUCCION
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO
No. CONTRATO:	NOCHIS/FONDOMI/202404
EMPRESA:	ING. JOSE MARCOS BARBA PEREZ
MONTO CONTRATO:	\$145,284.43
FECHA CONTRATO:	28 DE FEBRERO DE 2024
MONTO ANTICIPO:	S/A
FECHA PAGO ANTICIPO:	N/A
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A
PERIODO DE EJECUCION	INICIO TERM.
FECHAS PROGRAMADAS:	28-feb-24 28-mar-24
FECHAS REALES:	4-mar-24
FECHAS REPROGRAMADAS:	
OBSERVACIONES:	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

Alma Delia Muñoz Gutierrez
RESIDENTE DE SUPERVISION:
ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

Diego Alejandro Mercado Q.
INGENIERO DE LA DIRECCION:
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO Q.

0194



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



0195

OPERADO

Y LAS HUERAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN

28 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE MARZO DE 2024

viernes, 8 de marzo de 2024

20.00%

EJERCICIO 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE:	2
FECHA REPORTE:	15/03/2024

% AVANCES FÍSICO	40	PROGRAMADO 45
	0	
	0	

PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO								
PRELIMINARES	\$2,170.74	■													1	16.67
TERRACERIAS	\$13,006.48		■												5	16.67
MATERIALES	\$62,774.20		■	■											5	16.67
RELLENOS	\$6,125.99		■	■											5	16.67
TOMAS DOMICILIARIAS																
TERRACERIAS	\$2,820.59			■											5	
RELLENOS	\$2,317.07			■											5	
TOMAS	\$36,030.06														4	
SUB-TOTAL	\$125,245.20															
16% I.V.A.	\$20,039.23															
TOTAL	\$145,284.43														30	

DATOS DE LA OBRA	
CONSTRUCCION DE RED O DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
UBICACION:	NOCHISTLAN CONSTRUCCION
TIPO DE OBRA:	CONTRATO
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO
No. CONTRATO:	NOCHISIFONDOMI/2024/04
EMPRESA:	ING. JOSE MARCOS BARBA PEREZ
MONTO CONTRATO:	\$145,284.43
FECHA CONTRATO:	28 DE FEBRERO DE 2024
MONTO ANTICIPO:	S/A
FECHA PAGO ANTICIPO:	N/A
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A
PERIODO DE EJECUCION	INICIO TERM.
FECHAS PROGRAMADAS:	28-feb-24 28-mar-24
FECHAS REALES:	4-mar-24
FECHAS REPROGRAMADAS:	
OBSERVACIONES:	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

Alma Delia Muñoz Gutierrez
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ



Diego Alejandro Mercado Q.
ENCARGADO DE LA DIRECCION:
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO Q.

0196



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

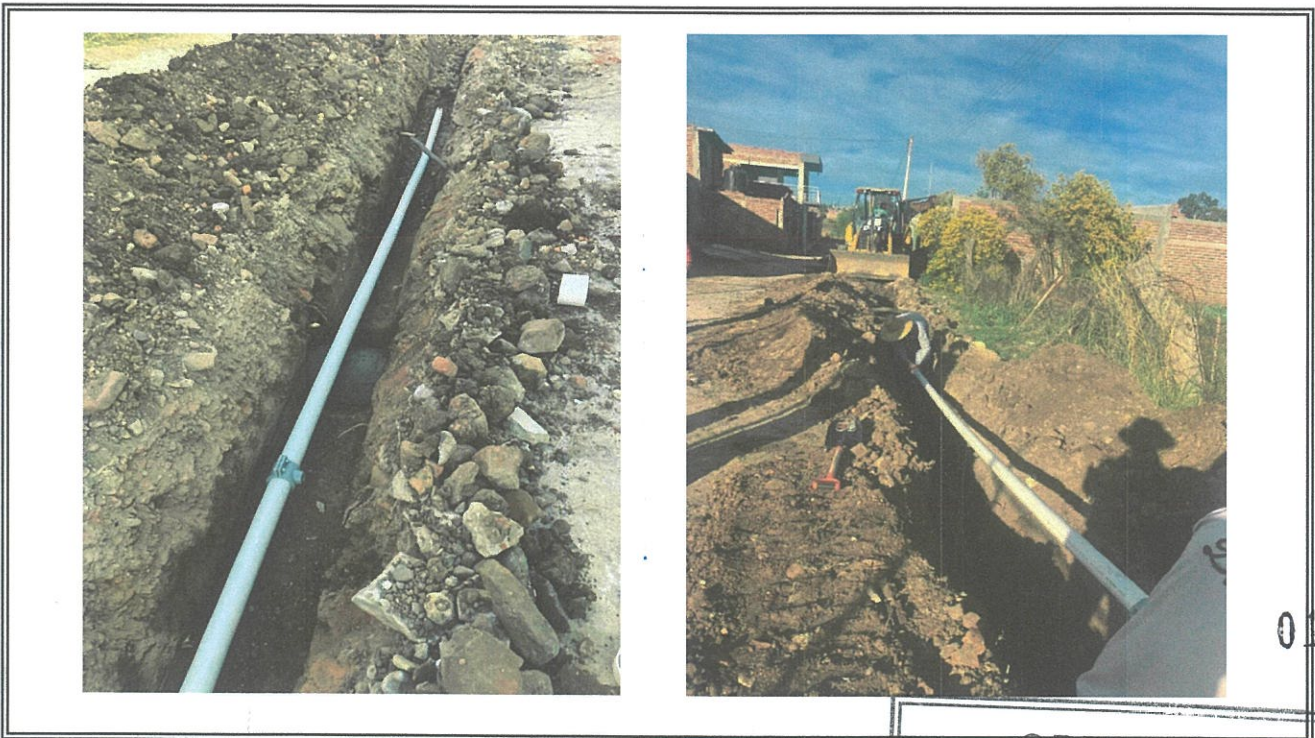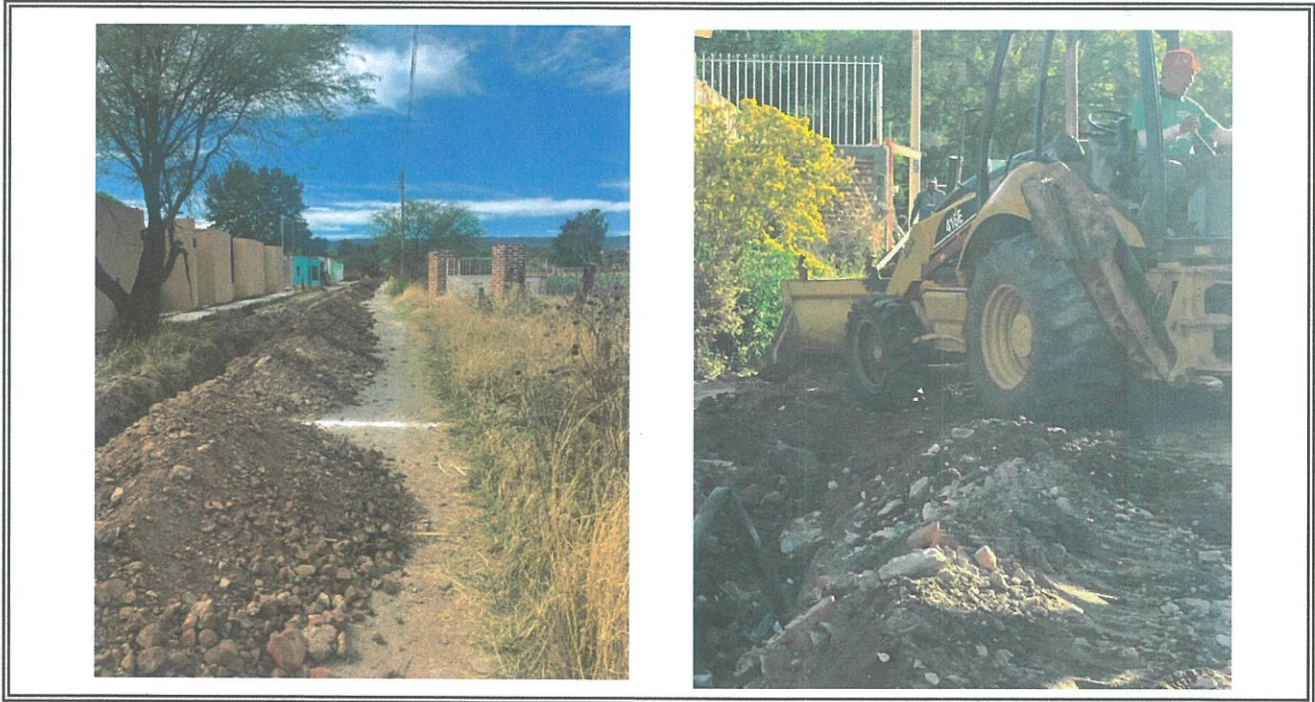

0197

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

Y LAS HUERAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
NOCHISTLAN
28 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE MARZO DE 2024
viernes, 15 de marzo de 2024
40.00%

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

REAL	PROGRAMADO
% AVANCES FISICO	65
FINANCIERO	0
70	0

No. REPORTE:	3
FECHA REPORTE:	22/03/2024

PARTIDAS	IMPORTES	MESES												DIAS	% EN BASE TIEMPO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO							
PRELIMINARES	\$2,170.74													1	16.67
TERRACERIAS	\$13,006.48													5	16.67
MATERIALES	\$62,774.28													5	16.67
RELLENOS	\$6,125.99													5	16.67
TOMAS DOMICILIARIAS															
TERRACERIAS	\$2,820.58													5	
RELLENOS	\$2,317.07													5	
TOMAS	\$36,030.06													4	
SUB-TOTAL	\$125,245.20														
18% I.V.A.	\$20,036.23														
TOTAL	\$145,284.43														30

DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE:	CONSTRUCCION DE RED O DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
UBICACION:	NOCHISTLAN
TIPO DE OBRA:	CONSTRUCCION
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO
No. CONTRATO:	NOCHIS/FONDOMI/2024/04
EMPRESA:	ING. JOSE MARCOS BARBA PEREZ
MONTO CONTRATO:	\$145,284.43
FECHA CONTRATO:	28 DE FEBRERO DE 2024
MONTO ANTICIPO:	S/A
FECHA PAGO ANTICIPO:	N/A
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A
PERIODO DE EJECUCION	INICIO TERM.
FECHAS PROGRAMADAS:	28-feb-24 28-mar-24
FECHAS REALES:	4-mar-24
FECHAS REPROGRAMADAS:	
OBSERVACIONES:	

OPERADO

FAISM (FIII)

EJERCICIO 2024

[Signature]
RESIDENTE DE SUPERVISION:
ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

[Signature]
ENCARGADO DE LA DIRECCION:
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO Q.

0198



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



0199

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

Y LAS HUERAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

NOCHISTLAN
28 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE MARZO DE 2024

viernes, 22 de marzo de 2024

65.00%

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE : 4	29/03/2024
FECHA REPORTE :	

REAL	PROGRAMADO
% AVANCES FÍSICO	100
FINANCIERO	0
100	0

PARTIDAS	IMPORTES	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO		
		MESES															
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO									
PRELIMINARES	\$2,170.74															1	3.33
TERRACERIAS	\$13,006.48															5	16.67
MATERIALES	\$62,774.28															5	16.67
RELLENOS	\$6,125.99															5	16.67
TOMAS DOMICILIARIAS																	
TERRACERIAS	\$2,820.58															5	16.67
RELLENOS	\$2,317.07															5	16.67
TOMAS	\$36,030.06															4	13.33
SUB-TOTAL	\$125,245.20																
16% I.V.A.	\$20,039.23																
TOTAL	\$145,284.43															30	


DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE: CONSTRUCCION DE RED O DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	UBICACION: NOCHISTLAN TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION MODALIDAD EJEC.: CONTRATO No. CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/04 EMPRESA: ING. JOSE MARCOS BARBA PEREZ MONTO CONTRATO: \$145,284.43 FECHA CONTRATO: 28 DE FEBRERO DE 2024 MONTO ANTICIPO: S/A FECHA PAGO ANTICIPO: N/A No. AMPL. DE CONTRATO: N/A MONTO AMPL. CONTRATO: N/A FECHA AMPL. CONTRATO: N/A
PERIODO DE EJECUCION: INICIO TERM. 28-feb-24 28-mar-24 FECHAS REALES: 4-mar-24 29-mar-24 FECHAS REPROGRAMADAS: OBSERVACIONES	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024


 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
 ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ


 ENCARGADO DE LA DIRECCION:
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO C.

0200



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



0201

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

Y LAS HUERAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

NOCHISTLAN
28 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE MARZO DE 2024
viernes, 29 de marzo de 2024

100.00%

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2024



**INFRAESTRUCTURA
& CONSTRUCCIÓN**
Cimientos sólidos para un futuro mejor

José Marcos Barba Pérez
Ingeniero Civil
3467006482
bbinfraconstruccion@gmail.com

MEMORIA FOTOGRAFICA



OPERADO
FAISM (FIII)

0202

1/2 hojas.

EJERCICIO 2024



OPERADO
FAISM (FII)

EJERCICIO 2024

0203

2/2 hojas.



**INFRAESTRUCTURA
& CONSTRUCCIÓN**

Cimientos sólidos para un futuro mejor

José Marcos Barba Pérez
Ingeniero Civil
3467006482
bbinfraconstruccion@gmail.com

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL
MPIO. DE NOCHISTLAN, DE MEJIA ZACATECAS.

Presente:

Por este medio, tengo a bien comunicarle que la obra denominada: **“CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174”** en la localidad de Nochistlán, Municipio de Nochistlán de Mejía Zac. bajo el número de contrato NOCHIS/FONDOIII/2024/04, ha quedado concluida y terminada en tiempo y forma en fecha 28 de marzo del año dos mil veinticuatro.

Sin otro particular de momento, le envió un saludo y me reitero a sus órdenes, para atender cualquier duda, comentario u aclaración.

Atte.


Ing. José Marcos Barba Pérez.

Nochistlán de Mejía, Zacatecas, a 28 de marzo de 2024.

0204

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024



Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1
AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

POLIZA DE FIANZA

Lugar: AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES A 28 DE FEBRERO DE 2024	Fianza No. 2358755-0000
Fiado: JOSE MARCOS BARBA PEREZ *****	
Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA CUMPLIMIENTO	Monto: \$14,528.44

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Catorce Mil Quinientos Veintiocho Pesos 44/100 M.N.


FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 28 DE FEBRERO DE 2024
DOMICILIO DEL FIADO: PEÑOL NO. 7, COL. CENTRO, C.P. 99900, EN NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS
BENEFICIARIO: H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS
DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: HIDALGO NO. 1, ZONA CENTRO, NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS

PARA GARANTIZAR POR LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V., EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE LE OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA CANTIDAD DE \$14,528.44 (CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 44/100 M.N.).


ANTE EL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. CON DOMICILIO EN CALLE HIDALGO No. 1, ZONA CENTRO, NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

PARA GARANTIZAR POR JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ, CON DOMICILIO EN CALLE PEÑOL No. 7, COL. CENTRO, C.P. 99900, EN NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS, EL CUMPLIMIENTO Y LOS VICIOS OCULTOS DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO NOCHIS/FONDOIII/2024/04, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2024, CELEBRADO CON EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC., A TRAVES DE SUS TITULARES LOS C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ, SÍNDICO MUNICIPAL, ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS, SEGÚN DESCRIPCIÓN DE OBRA EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL REFERIDO CONTRATO, POR UN MONTO TOTAL DE \$145,284.43 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.) INCLUIDO EL IVA, LA PRESENTE GARANTIA SE CONSTITUYE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$14,528.44 (CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 44/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO Y TENDRA UNA VIGENCIA HASTA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, AL TERMINO DEL CUAL DE NO HABER INCONFORMIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC., LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. PROCEDERA A SU CANCELACION, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS QUE SE GARANTIZAN CON LA PRESENTE FIANZA, SE COMUNICARA DE INMEDIATO A LA CONTRATISTA Y A LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V., PARA LO CUAL LA VIGENCIA DE LA FIANZA SEGUIRA SUBSISTENTE DURANTE LA SUSTENTACION DE TODOS LOS RECURSOS Y JUICIOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V., ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CREDITO A QUE SE REFIERE, AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN. LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 279, 280, 282, 291, 283, 178 Y 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, ASIMISMO RENUNCIA AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTICULO 179 DE LA CITADA LEY. LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, INCLUYENDO LAS REFORMAS Y ADICIONES A DICHO ORDENAMIENTO, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.

0205



MA. REBECA MARTINEZ VALADEZ
Director Comercial Div. Occte.
Autorizado Bajo el Oficio No. 366-III-0978/14 de la SHCP



OPERADO
FAISM (FII14dC9dNDd)
EJERCICIO 2024

LÍNEA DE VALIDACIÓN
Página 1/1



**INFRAESTRUCTURA
& CONSTRUCCIÓN**
Cimientos sólidos para un futuro mejor

José Marcos Barba Pérez
Ingeniero Civil
3467006482
bbinfraconstruccion@gmail.com

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS

EN LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, ESPECIFICAMENTE EN LA ESQUINA DE LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DEL PROPIO MUNICIPIO, Y EN CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE OBRA NÚMERO NOCHIS/FONDOIII/2024/04, Y REUNIDOS EN LUGAR DONDE SE LOCALIZA LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174", PARA FORMALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO SE PROCEDE FORMALMENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA CON LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y TERMINADOS, EN TIEMPO Y FORMA COMO SE ESTABLECIO EN EL CONTRATO, Y DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS, RECIBE EL COMITÉ DE OBRA, CUYO MONTO DEL CONTRATO FUE POR LA CANTIDAD DE **\$145,284.43** (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.) DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE DIO INICIO EN LA FECHA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, PARA CONCLUIR CONTRACTUALMENTE EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

POR LO CUAL Y COMO CONSTACIA DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, ENSEGUIDA SE PROCEDE A DAR UN RECORRIDO Y UNA ÚLTIMA SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS MENCIONADOS VERIFICANDO EN SU CABALIDAD QUE LOS MATERIALES SEAN DE BUENA CALIDAD, ASI COMO LA CORRECTA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS.

POR ÚLTIMO SE PROCEDE A FIRMAR DE CONFORMIDAD QUIENES ASISTIERON AL ACTO Y QUISIERON HACERLO.

SE FIRMA LA PRESENTE EN FECHA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN LAS ESQUINAS DE LA CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS, LUGAR DE UBIACION DE LA OBRA, EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS.


CONTRATISTA

ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ

BENEFICIARIOS

Olivia Parra C

0206





**INFRAESTRUCTURA
& CONSTRUCCIÓN**
Cimientos sólidos para un futuro mejor

José Marcos Barba Pérez
Ingeniero Civil
3467006482
bbinfraconstruccion@gmail.com


ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CON EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

EN LA ESQUINA DE LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS, DENTRO DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DIA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE OBRA NÚMERO NOCHIS/FONDOIII/2024/04, Y REUNIDOS EN LUGAR DONDE SE LOCALIZA LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174", PARA FORMALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO SE PROCEDE FORMALMENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA CON LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y TERMINADOS, EN TIEMPO Y FORMA, TAL Y COMO SE ESTABLECIO EN EL CONTRATO, Y DE PARTE DEL MUNICIPIO, RECIBE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. SINDICA MUNICIPAL, Y EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO, TODOS DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS; EL MONTO DEL CONTRATO FUE POR LA CANTIDAD DE **\$145,284.43** (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.) DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE DIERON INICIO EN LA FECHA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, PARA CONCLUIR CONTRACTUALMENTE EL DIA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO QUE CORRE.

POR LO CUAL Y COMO CONSTACIA DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, Y LUEGO DE DAR UN RECORRIDO Y UNA ÚLTIMA SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS MENCIONADOS VERIFICANDO EN SU CABALIDAD QUE LOS MATERIALES SEAN DE BUENA CALIDAD, ASI COMO LA CORRECTA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS, SE PROCEDE A FIRMAR DE CONFORMIDAD QUIENES ASISTIERON AL ACTO Y QUISIERON HACERLO.


SE FIRMA LA PRESENTE EN FECHA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN LA LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS.

CONTRATISTA


C. ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.


PROFR. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LIC. LILIANA ROQUE GÓMEZ
SINDICA MUNICIPAL


C. ARQ. JUAN CARLOS AVELLAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (FIII)

EJERCICIO 2024

0207

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

Ejercicio 2024

FECHA DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION:
28 DE MARZO 2024


DATOS GENERALES:

FONDO:	III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social Municipal.	NO. DE PROYECTO:	401001
ESTADO:	032 Zacatecas	PROGRAMA:	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD
MUNICIPIO:	034: Nochistlán de Mejía	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA YO ACCIÓN:	CONSTRUCCION DE RED O DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
LOCALIDAD:	NOCHISTLAN		
METAS CUMPLIDAS:			
FECHA REAL INICIO:		28 FEBRERO 2024	
FECHA REAL TERMINACION:		28 MARZO 2024	

Firmar al calce

Página 1

0208



Misael García Ortiz

Maribel García C.

Olivia García O.

Mario García O.

ESTRUCTURA FINANCIERA:

	TOTAL	F.I.S.M.	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
INVERSIÓN APROBADA	\$145,284.43	\$145,284.43	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA	\$145,284.43	\$145,284.43	0.00	0.00	0.00

MODALIDAD DE EJECUCION: C(X) AC () AM () AD () M () EQ ()

En el municipio de: **NOCHISTLAN DE MEJIA** siendo las 12 :00 HRS. Del día: **28 DE MARZO DEL 2024**

los **PROF. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR**, PRESIDENTE MUNICIPAL; **LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ**, SINDICA MUNICIPAL, **ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA**, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; **LIC. ARMANADO AGUIRRE GOMEZ** SECRETARIO DE GOBIERNO, **C. SERGIO HINOJOZA PEREZ** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, y representantes de las diferentes dependencias que intervienen para efectuar y dar constancia de la **entrega-recepción de la obra**, descrita en la parte superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la ley de adquisiciones y obras públicas y 49 de su reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente trizada y operando de acuerdo a la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto, en condiciones de ser recibida por la unidad de su operación (comité o dependencia que se encargará en lo sucesivo de su conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime al ejecutor de la obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en ella y se obliga por la presente a corregir la deficiencia detectada sin costo para la federación.

El H. Ayuntamiento representado por el **PROF. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR**, por este medio y este momento hace la entrega a los **Integrantes del Comité de obra**, quien será la entidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quienes reciben de conformidad los que en ella intervienen firmando al calce.

Misael García Ortiz


Maribel García C.

Olivia García O.

María García Ortiz


Firmar al calce

Página 2



0209

POR EL MUNICIPIO
ENTREGAN:



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROF, RAFAEL AGUAYO SALDIVAR

RECIBEN LA OBRA:

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

VOCAL DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Olivia Garcia o

Miguel Garcia Ortiz


TESTIGOS:

Mario Garcia Ortiz

Firmar al calce

Página 3

0210





**INFRAESTRUCTURA
& CONSTRUCCIÓN**
Cimientos sólidos para un futuro mejor

José Marcos Barba Pérez
Ingeniero Civil
3467006482
bbinfraconstruccion@gmail.com

FINIQUITO DE OBRA
OBRA:CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA
LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE
MEJÍA, ZACATECAS.

CLAVE: FINIQUITO DE OBRA

PERIODO: DEL 28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2024

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATADO	P.U. CONTRATADO	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMEN EJECUTADO	P.U. EJECUTADO	IMPORTE EJECUTADO
	OBRA:CONSTRUCCIÓN DE RED O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.							
	PRELIMINARES							
O10418	Trazo y nivelación de terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	242.00	\$8.97	2,170.74	\$242.00	\$8.97	\$2,170.74
	TERRACERIAS							\$-
O20251	Excavación por medios mecánicos de terreno en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts. no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo, y herramienta.	M3	77.44	\$59.87	4,636.33	\$77.44	\$59.87	\$4,636.33
AFI-01	Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo I	M2	121.00	\$17.23	2,084.83	\$121.00	\$17.23	\$2,084.83
	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye: material, mano de obra y herramienta.	M3	9.68	\$293.93	2,845.24	\$9.68	\$293.93	\$2,845.24
O10818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	M3	29.04	\$83.98	2,438.78	\$29.04	\$83.98	\$2,438.78
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsiguientes se consideran (2 km).	M3/KM	58.08	\$17.24	1,001.30	\$58.08	\$17.24	\$1,001.30
	MATERIALES							\$-
O80415	Tubo Pvc Hid. Rd-26- Tramo de 6 Mts. 2 1/2" incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	242.00	\$146.50	35,453.00	\$242.00	\$146.50	\$35,453.00
COPL-R-212"	Cople de reparación diámetro (2 1/2") pvc, incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	2.00	\$283.01	566.02	\$2.00	\$283.01	\$566.02
O80807	Tee - Pvc Hid. Ced 40 - Cementar (Hhh) 2 1/2" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución del p.u.o.t.	PZA	2.00	\$277.01	554.02	\$2.00	\$277.01	\$554.02
83	Tapon campana (2 1/2"), Incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	2.00	\$408.43	816.86	\$2.00	\$408.43	\$816.86
O00123	Valvula de Seccionamiento de FO.FO. diámetro (2 1/2") incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	\$4,140.00	4,140.00	\$1.00	\$4,140.00	\$4,140.00
AP-11	Valvula de admisión y expulsión de aire de 3/4" de diámetro, incluye:materiales, mano de obra, herramienta y equipo para su colocación.	PZA	1.00	\$1,893.59	1,893.59	\$1.00	\$1,893.59	\$1,893.59
94	Extremidad campana de PVC 2 1/2" de diámetro incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	\$443.66	443.66	\$1.00	\$443.66	\$443.66
TEMP*6	Extremidad espiga pvc 2 1/2" incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	\$452.17	452.17	\$1.00	\$452.17	\$452.17

OPERADO
FAISM (EJ)
EJERCICIO 2024



**INFRAESTRUCTURA
& CONSTRUCCIÓN**
Cimientos sólidos para un futuro mejor

José Marcos Barba Pérez
Ingeniero Civil
3467006482
bbinfraconstruccion@gmail.com

96	Empaque de neopreno (2 1/2") incluye: suministro y colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	2.00	\$206.37	412.74	\$2.00	\$206.37	\$412.74
170323	Registro de 60x60x100 cm para Valvulas. de tabique rojo recocido 8 x 14 x 37 cms. juntado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, sobre base de plantilla de concreto de 5 y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye: marco c/ tapa fofo, contramarco fofo, excvaciones, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	\$9,021.11	18,042.22	\$2.00	\$9,021.11	\$18,042.22
	RELLENOS							\$-
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pisón de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de distancia.	M3	19.36	\$270.52	5,237.27	\$19.36	\$270.52	\$5,237.27
301116	Relleno con material producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de	M3	13.56	\$65.54	888.72	\$13.56	\$65.54	\$888.72
	TOMAS DOMICILIARIAS							\$-
020251	Excavación por medios mecánicos de terreno en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts. no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo, y herramienta.	M3	18.48	\$59.87	1,106.40	\$18.48	\$59.87	\$1,106.40
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye: material, mano de obra y herramienta.	M3	2.64	\$293.93	775.98	\$2.64	\$293.93	\$775.98
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	M3	7.92	\$83.98	665.12	\$7.92	\$83.98	\$665.12
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsecuentes se consideran (2 km).	M3/KM	15.84	\$17.24	273.08	\$15.84	\$17.24	\$273.08
	RELLENOS							\$-
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pisón de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de distancia.	M3	5.28	\$270.52	1,428.35	\$5.28	\$270.52	\$1,428.35
301116	Relleno con material producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	13.56	\$65.54	888.72	\$13.56	\$65.54	\$888.72
	TOMAS							
TOMD-01	Suministro y colocación de medidor de agua potable, incluye: manguera de alta densidad (5 ml promedio), encamisado de poliducto naranja de 1", abarazadera omega de 2 1/2" con salida a 1/2", 1 llave de inserción, 1 valvula limitadora, niple galvanizado de 1/2", 1 niple cuerda corrida de 1/2", llave de paso de 1/2" de esfera, 1 niple galvanizado de 70 cm, registro para medidor de polietileno, medidor de chorro multiple de 1/2", conexiones a domicilio con tubo plus, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	11.00	\$3,275.46	36,030.06	\$11.00	\$3,275.46	\$36,030.06

SUB- TOTAL CONTRATADO = **\$125,245.20** - SUB- TOTAL EJECUTADO = **\$125,245.20**


ATENTAMENTE
ING. JOSÉ MARCOS BARBA PÉREZ

SUBTOTAL =	0.00
IVA 16 % =	0.00
TOTAL =	0.00

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

ACTA DERECHOS Y OBLIGACIONES

Siendo las **10:00 horas** del día **28 de febrero de 2024**, en el espacio que ocupa la oficina de Desarrollo económico y social, Ubicado en el edificio de la presidencia Municipal marcado con el No. 1, de la calle Hidalgo, esquina con la Plaza Principal en Nochistlán, Zac. Las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, conforme a lo dispuesto en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece el artículo 64 de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas con el objeto de llevar a cabo el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones sobre los trabajos ejecutados al amparo del contrato No. **NOHIS/FONDOIII/2024/04** que suscribieron Desarrollo económico y social el contratista **Ing. Marcos Barba Pérez**.

ANTECEDENTES

Con fecha **28 de febrero de 2024** las partes celebran contrato de Obra Pública con base a Precio Unitario y tiempo determinado identificado con el No. De Contrato: **NOHIS/FONDOIII/2024/04** para llevar a cabo los trabajos de obra: **CONSTRUCCION DE RED O DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS** Con fecha de iniciación real de los trabajos el día **28 de febrero de 2024** y la fecha de terminación real el día **28 de marzo del 2024**.

Quedando un monto total contratado de **\$145,284.43** (ciento cuarenta y cinco mil doscientos ochenta y cuatro pesos 43/100M.N) Esta cantidad incluye el impuesto al valor agregado.


Durante del proceso de la obra se autorizaron un total de 1 (**UNA**) estimaciones a precio unitario por trabajos ejecutados por un monto total de **\$145,284.43** (ciento cuarenta y cinco mil doscientos ochenta y cuatro pesos 43/100M.N) Esta cantidad incluye el impuesto al valor agregado.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprenden:

CONSTRUCCION DE RED O DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Operado: FONDO III





RELACIÓN DE ESTIMACIONES PAGADAS POR TRABAJOS EJECUTADOS

Por lo anterior manifiestan las partes que no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

No. de Estimac.	Fecha	Importe Total	Deducciones	Anticipo (Amortización)
1	02 de mayo 2024	\$145,284.43	\$0.00	\$0.00

Sin otro asunto que tratar, se cierra la presente Acta firmado de conformidad las personas que interviene en este acto.

RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA
 Arq. Alma Delfa Muñoz Gutiérrez	 Ing. Marcos Barba Pérez.



0214
