



CONSTRUCCIONES "RAMIREZ"

PLANOS, AVALUOS, PERITAJES, MEDICION DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA.
PRESENTE.

NOCHISTLÁN, ZAC. A 15 DE MAYO DEL 2025

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO A USTED QUE EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2025 INICIE CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA **CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS, DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC."**

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

0106

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

DIRECCIÓN: UNIDAD DE PLANEACIÓN

NO. DE OFICIO: 225

SECCION: 1

EXPEDIENTE: ADMVO. 2024-2027

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ
PRESENTE.

Por este medio me dirijo a usted para designarlo como responsable de la supervisión de la siguiente **CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AUTONOMIA Y FILOSOFOS, DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.** con número de contrato **NOCHIS/FONDOIII/2025/10**, de la cual se le hace responsable de la recopilación revisión de la documentación para conformación del expediente técnico que requiere la dependencia ejecutora Dirección de Desarrollo Económico y Social. Dicha información se debe de entregar al responsable del fondo correspondiente.

Documentación a entregar:

- Oficio de invitación.
- Oficio de adjudicación.
- Presupuesto contratado.
- Tarjeta de precios unitarios.
- Permisos de construcción
- Factibilidad de la obra
- Calendario de ejecución del contratista.
- Asignación de residente.
- Oficio de inicio de obra.
- Programa de obra.
- Catálogo de conceptos contratados.
- Revisión y entrega de generadores y estimaciones de obra con fotografías.
- Memoria fotográfica global impresa y digital.
- Bitácora convencional y reporte fotográfico.
- Reporte de visita semanal (día de corte los días viernes).
- Pruebas de laboratorio (pavimentaciones o estructuras con concreto).
- Revisión y análisis correcto de generadores y estimaciones de obra.
- Acta de entrega recepción.
- Fianzas o garantías de obra.
- Finiquito.
- Convenio de ampliación de metas. (oficio de aprobación, proyecto y presupuesto).

Sin más por el momento aprovecho para enviar un cordial saludo, quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración.

Unidad de Planeación
2024-2027
Nochistlán de Mejía, Zac.
UP
TE AMENTE.
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 15 DE MAYO DE 2025
UNIDAD DE PLANEACIÓN
ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

0107

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

Recibi
15/ MAYO / 2025
[Firma]



CONSTRUCCIONES "RAMIREZ"

PLANOS, AVALUOS, PERITAJES, MEDICION DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA.
PRESENTE.

NOCHISTLÁN, ZAC. A 15 DE MAYO DEL 2025

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO A USTED QUE EL
RESIDENTE DE LA OBRA DENOMINADA **"CONSTRUCCION DE LA LINEA DE
DRENAJE SANITARIO EN LA CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS, DE LA ZAP 0155
DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC."** SERA EL ING LUIS DAVID
RAMIREZ VILLEGAS

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES
ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

0108





BITÁCORA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLES AUTONOMÍA Y FILÓSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

24/Mayo/2025

Este día se realizó la limpia trazo y nivelación del terreno. También se realizo con la excavación de la línea principal de 12"

27/MAYO/2025

Se coloco la tubería sanitaria de 12" poniendo la cama de tepetate para el acostillamiento del mismo y se realizo el relleno del mismo así como las descargas domiciliarias que van conectado a este tubo.

29/mayo/2025


Se coloco la tubería de 8 pulgadas así como las descargas domiciliarias que van a descargar a este tubo.

2/junio/2025

se realizó la conexión del tubo sanitario de 8" y el tubo de cemento que existía y se realizo el pozo de visita.

5/junio/20225

Se colocaron los brocales a los pozos de visita. Además se realizó el retiro de material producto de excavación y se da por terminada la obra.





Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C01850 Del 16/06/2025


Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2025
09:26 a. m.
Página | 1

Concepto: A194 - Obra Pública : 402005 - CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLES AUTONOMIA.
GP Folio: 377

Beneficiario: MA MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402005-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$278,659.83		FF-511, GP Folio: 377
0002	8260-511-402005-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$278,659.83	FF-511, GP Folio: 377
0003	1112-08-172	FONDO III 2025 01304738879		\$278,659.83	FF-511, GP Folio: 377
0004	2113-000871	MA MERCEDES RODRIGUEZ	\$278,659.83		FF-511, GP Folio: 377
Sumas iguales =>			557,319.66	557,319.66	

0110





Usu: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS


Póliza: P04958 Del 16/06/2025

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2025 09:25 a. m.
Página 1

Concepto: A194 - Obra Pública : 402005 - CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLES AUTONOMIA.
GD Folio: 366

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-402005-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$278,659.83		FF:511, GD Folio: 366
0002	8240-511-402005-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$278,659.83	FF:511, GD Folio: 366
0003	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de	\$278,659.83		FF:511, GD Folio: 366
0004	2113-000871	MA MERCEDES RODRIGUEZ		\$278,659.83	FF:511, GD Folio: 366
Sumas iguales =>			557,319.66	557,319.66	

0111





Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/06/2025 09:15


Cuenta/ CLABE Ordenante	1304738879
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
RFC o CURP del Ordenante	MNM850101AC3
Moneda	MXP
ID Tercero	89
Nombre del Beneficiario	MA MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
Cuenta/CLABE/Celular	012946001012626536
RFC Beneficiario	ROFM8508199I7
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$278,659.83
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/06/2025
Referencia numérica	01
Propósito de la Transferencia	PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA
Clave de Rastreo	8846APR2202506164163099102
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
Fecha Captura	16/06/2025 09:14:39 a. m.
Ejecutó	JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
Fecha de Ejecución	16/06/2025 09:15:01 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

0112

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01-800-226 6788



ORDEN DE PAGO 2025

12-jun

MUNICIPIO: 034 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
REA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROGRAMA DE GOBIERNO: RAMO 33 . PROGRAMAS FEDERALES
SUB-PROGRAMA : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PROGRAMA, FONDO O PROGRAMA) (FONDO III 2025)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
FIRMA DEL SOLICITANTE:
FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 12 de junio de 2025
CUENTA BANCARIA ORIGEN : 1304738879

No.	CLAVE PRESUPUESTARIA								NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE.	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO						
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	511	FONDO III RAMO 33	402005	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS, DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6141	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO.	NOCHIS/FOND OIII/2025/10	MA.MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	A 194	11/06/2025	278,659.83	(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.)

AUTORIZA:  L.C. ROSIO ROCIO GOMEZ.
ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2024 - 2027

AUTORIZA:  ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DESA...
ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2024 - 2027

AUTORIZA:  C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA:  EL ROCIO SANDOVAL AVELAR.
SÍNDICO MUNICIPAL

UNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS JUNTAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA Estricta, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL MUNICIPIO, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.

TESORERÍA MUNICIPAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2024 - 2027

0113

Factura A 194

MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

RFC: ROFM850819917

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000701763159

Folio Fiscal: 570feb1a-a7da-4c90-8326-3633e380badf

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

RFC: MNM850101AC3

Uso CFDi: I01 - Construcciones

Domicilio: 99900 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP:99900

Fecha y hora de emisión: 2025-06-11T11:31:59

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - pago	20141301 - PAGO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, LA CANTIDAD DE \$278,659.83 (DOSCIENTOS SETENA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE UNICA ESTIMACION Y FINIQUITDO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSODOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACTECAS." CORRESPONDIETE AL CONTRATO NOCHIS/FONDOIII/2025/10	240,223.99	02 - Sí objeto de impuesto 002 - IVA: 38435.84	240,223.99

SubTotal \$ 240,223.99
+IVA 16% \$ 38,435.84
=TOTAL \$ 278,659.83

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS SETENA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 83/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 03 - Transferencia electrónica de fondos

FECHA TIMBRADO : 2025-06-11T11:34:00

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000714740116

Sello Digital del CFDi

kpnUUWw3F2RniV73qVKVz4VxxGUntrinsX5Dp+UQ3gO+MvZePgagXOI071IKTOAxEVHnhTkjQKYCeJEW1Mdl/6ex+MgoDas6VnqU5
tLkMzH3T2PJEL8+rO7Ebi8E5lbXtlvj3WWYFGYvQ0uEPIgPOL+VIOK9JWBrbach8rc4EfYnqfOycdMCFJozkmRr0pk01hXDyr/rUymx6h
vOLBDSAnS9licLcISYW0GdsVt/c2U0LDZYrLEdpK4caV7oMUIRFs0ybOdfoZ+ssvIFKv0gCmf+RxaobXpDPWVARx1E+wYZRENJhpw
Qho5NcuWvel23Yxxc6+JbSt/fv649x9g==

Sello Digital del SAT

Ob0kt+Tx0wURXg1jq7whetTAUUCISXGm+Owi/nSq6guwgTNayOuj5jhVaCtdmliYihvYFjoF1hSg7EGFg8TDe4fk2IKOspxhhawUjDWB3
6HVA4gCyAOMFMI9x3ZER+O5AVzqenQPnzTFqCEEvX7RlyF2u/IGpIU92QYnJC0kUAp2Q/7C3w0xMudbalycnZsPv5qf+xSeLyUsTWp
4f8Zg8ruU8Y/O9nBQ7ySVIBFYwyv15WXhXvcX1LU0lcEtKqJC+rbf6g1NiRjG7oBrLXiqRZnjivRBW/CeYgvPoh30cXL6Z0JLsUwLdaE
/pd3u+/LmHQatUellzVLmT+MHMyQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|570feb1a-a7da-4c90-8326-3633e380badf|2025-06-

11T11:34:00|CAD100607RY8|kpnUUWw3F2RniV73qVKVz4VxxGUntrinsX5Dp+UQ3gO+MvZePgagXOI071IKTOAxEVHnhTkjQKYCeJEW1Mdl/6ex+MgoDas6VnqU5tLkMzH3T2PJEL8+rO7Ebi8E5lbXtlvj3WWYFGYvQ0uEPIgPOL+VIOK9JWBrbach8rc4EfYnqfOycdMCFJozkmRr0pk01hXDyr/rUymx6h
vOLBDSAnS9licLcISYW0GdsVt/c2U0LDZYrLEdpK4caV7oMUIRFs0ybOdfoZ+ssvIFKv0gCmf+RxaobXpDPWVARx1E+wYZRENJhpwQho5NcuWvel23Yxxc6+JbSt/fv649x9g==00001000000714740116|



FASIM (FIR)

EJERCICIO 2025

0114



PLANOS, ANÁLISIS, PERITAJES, MEDICIÓN DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ESTIMACION

NÚMERO DE ESTIMACIÓN:
1

NOMBRE DE LA OBRA:
NO. DE CONTRATO:
UBICACIÓN:
PERIODO:
IMPORTE DE CONTRATO:

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
NOCHISTLAN DE MEJIA
15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO
\$278,659.83

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

CLAVE DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
PRELIMINARES	
001	TRAZO Y NIVELACION CON APARATO INCLUYE: TOPOGRAFO Y CADENERO, OPERADOR
002	CORTE DE FIRME DE CONCRETO CON SIERRA, HASTA UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 2.5 CM
003	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE ACOPIO Y TRASPALCOS
004	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO C, PRIMER KILOMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA
005	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE, KILOMETROS SUBSECUENTES, SE CONCIERDAN (1 KM).
TERRACERIAS	
006	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO C EN CEPAL, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
007	CAMA DE TEPEPATE DE 0.10 MTS DE ESPESOR EN CEPAL PARA TENDIDO DE TUBERIAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS
008	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO C, PRIMER KILOMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA
009	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE, KILOMETROS SUBSECUENTES, SE CONCIERDAN (1 KM).
MATERIALES	
010	TUBO FR PVC SERIE 25 DE 12" EN TRAMOS DE 9M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T
011	TUBO PVC SANITARIO DE 10" EN TRAMOS DE 6 MTRS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.
012	TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO RD-25 DE 8" DE DIAMETRO, JUNTA HERMETICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA
013	TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" EN TRAMOS DE 6 MTS. NORMA CEMENTAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T
014	CODO DE 45° PVC SANITARIO CEMENTAR (H95) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE P.U.O.T
015	SILLETA DE PVC SANITARIO SERIE 25 DE 12" A 6". INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION

CONTRATO				ESTIMADO				POR ESTIMAR			
UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
ML	137.00	\$21.12	\$2,893.44	137	\$21.12	\$2,893.44	0.00	\$21.12	\$0.00	0.00	\$0.00
ML	26.00	\$183.99	\$4,783.74	26	\$183.99	\$4,783.74	0.00	\$183.99	\$0.00	0.00	\$0.00
M2	10.40	\$163.19	\$1,697.18	10.4	\$163.19	\$1,697.18	0.00	\$163.19	\$0.00	0.00	\$0.00
M3	1.56	\$86.09	\$134.30	1.56	\$86.09	\$134.30	0.00	\$86.09	\$0.00	0.00	\$0.00
M3/KM	1.56	\$8.04	\$12.54	1.56	\$8.04	\$12.54	0.00	\$8.04	\$0.00	0.00	\$0.00
M3	169.00	\$67.68	\$11,437.92	169	\$67.68	\$11,437.92	0.00	\$67.68	\$0.00	0.00	\$0.00
M3	16.90	\$272.69	\$4,608.46	16.9	\$272.69	\$4,608.46	0.00	\$272.69	\$0.00	0.00	\$0.00
M3	67.60	\$86.09	\$5,819.68	67.6	\$86.09	\$5,819.68	0.00	\$86.09	\$0.00	0.00	\$0.00
M3/KM	67.60	\$8.04	\$543.50	67.6	\$8.04	\$543.50	0.00	\$8.04	\$0.00	0.00	\$0.00
M	51.00	\$823.61	\$42,004.11	51	\$823.61	\$42,004.11	0.00	\$823.61	\$0.00	0.00	\$0.00
M	5.00	\$636.77	\$3,183.85	5	\$636.77	\$3,183.85	0.00	\$636.77	\$0.00	0.00	\$0.00
ML	81.00	\$352.86	\$28,581.66	81	\$352.86	\$28,581.66	0.00	\$352.86	\$0.00	0.00	\$0.00
ML	114.00	\$220.72	\$25,162.08	114	\$220.72	\$25,162.08	0.00	\$220.72	\$0.00	0.00	\$0.00
PIEZA	19.00	\$123.54	\$2,347.26	19	\$123.54	\$2,347.26	0.00	\$123.54	\$0.00	0.00	\$0.00
PIEZA	13.00	\$487.55	\$6,338.15	13	\$487.55	\$6,338.15	0.00	\$487.55	\$0.00	0.00	\$0.00

0115

ADO
(FIII)

2025

016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA SERE 25 DE 8" A 6" PIEZA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.
017	RELLENOS RELLENO PARA COSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO CON PISON DE MADERA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL CON CARRETILLA
018	RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
019	OBRA CONEXAS POZO DE VISITA PARA BROCLA DE 0.90X1.40 MTS DE PROFUNDIDAD, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 8X14X37 CM DE ESPESOR COLOCADO A TIZON DESPLANTADO DOBLE FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:4 SIN EXCAVACION,
020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACION
021	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADA AL 95% UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PETREO (50% MATERIAL DE BANCO Y 50% MATERIAL PETREO)
022	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE LA BASE COMPACTADA AL 100%, UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PETREO (50% MATERIAL DE BANCO Y 50% MATERIAL PETREO)
023	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 AGREGADO DE 19 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6-10-10 ROLLO DE 100 MTS, INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENORES
024	REGISTRO DE 40X40X60CM. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 8X14X37 C.M.S. JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO PULIDO EN INTERIOR, SOBRE BASE DE PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 Y CADENA DE SECCION 10X12 CM DE CONCRETO 100 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL, INCLUYE: TAPA DE NEOPRENO, EXCAVACION, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
025	DESCARGAS DOMICILIARIAS EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS DE TERRENO EN CEPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.4-2.00 MTS. NO INCLUYE BOMBEO DE AGUIQUE, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
026	CAMA DE TEPETATE DE 0.10 MTS DE ESPESOR EN CEPA PARA TENDIDO DE TUBERIAS, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS
027	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO C, PRIMER KILOMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA
028	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE, KILOMETROS SUBSECUENTES, SE CONCIERAN (1 KM).
029	RELLENO PARA AGOSTILLADO DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL EN CARRETILLA 30 MTS DE DISTANCIA
030	RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

ING. DIEGO ALEJANDRO MURGAÑO QUEZADA
DIRECTOR DE DES. ECO. Y SOC.


ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C.M.C. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTABILISTA

0116

PIEZA	6.00	\$346.98	\$2,081.88	6	\$346.98	\$2,081.88	0.00	\$346.98	\$0.00
M3	50.70	\$282.14	\$14,304.50	50.7	\$282.14	\$14,304.50	0.00	\$282.14	\$0.00
M3	101.40	\$85.71	\$8,690.99	101.4	\$85.71	\$8,690.99	0.00	\$85.71	\$0.00
PIEZA	1.00	\$8,039.09	\$8,039.09	1	\$8,039.09	\$8,039.09	0.00	\$8,039.09	\$0.00
PIEZA	3.00	\$2,117.39	\$6,352.17	3	\$2,117.39	\$6,352.17	0.00	\$2,117.39	\$0.00
M3	3.12	\$318.25	\$992.94	3.12	\$318.25	\$992.94	0.00	\$318.25	\$0.00
M3	2.08	\$449.05	\$934.02	2.08	\$449.05	\$934.02	0.00	\$449.05	\$0.00
M2	10.40	\$619.83	\$6,446.23	10.4	\$619.83	\$6,446.23	0.00	\$619.83	\$0.00
PIEZA	1.00	\$3,736.57	\$3,736.57	1	\$3,736.57	\$3,736.57	0.00	\$3,736.57	\$0.00
M3	109.00	\$211.22	\$23,022.98	109	\$211.22	\$23,022.98	0.00	\$211.22	\$0.00
M3	10.90	\$272.69	\$2,972.32	10.9	\$272.69	\$2,972.32	0.00	\$272.69	\$0.00
M3	43.60	\$86.09	\$3,753.52	43.6	\$86.09	\$3,753.52	0.00	\$86.09	\$0.00
M3/KM	43.60	\$8.04	\$350.54	43.6	\$8.04	\$350.54	0.00	\$8.04	\$0.00
M3	32.70	\$295.29	\$9,655.98	32.7	\$295.29	\$9,655.98	0.00	\$295.29	\$0.00
M3	109.00	\$85.71	\$9,342.39	109	\$85.71	\$9,342.39	0.00	\$85.71	\$0.00
				IMPORTE		\$240,223.99	IMPORTE		\$0.00
				IVA		\$38,435.84	IVA		\$0.00
				TOTAL		\$278,659.83	TOTAL		\$0.00





RESUMEN DE ESTIMACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE LINEA DE DREANJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
NO. DE CONTRATO	NOCHIS/FONDOIII/2025/10
UBICACIÓN:	NOCHISTLAN DE MEJIA
PERIODO:	15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO
IMPORTE DE CONTRATO:	\$278,659.83

HOJA	CLAVES DE CONCEPTOS CONTENIDOS	IMPORTE
1	001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008 - 009 - 010 - 011 - 012 - 013 - 014 - 015 - 016 - 017 - 018 - 019 - 020 - 021 - 022 - 023 - 024 - 025 - 026 - 027 - 028 - 029 - 030	\$ 240,223.99

HISTORIAL

MONTO DEL CONTRATO	\$278,659.83
ANTICIPO	\$0.00
(-) DEDUCCIÓN 5 AL M.	\$0.00
ESTIMADO A LA FECHA	\$0.00
TOTAL POR ESTIMAR	\$278,659.83

SUBTOTAL	\$ 240,223.99
AMORTIZACION 0%	\$ -
SUBTOTAL	\$ 240,223.99

IVA 16%	\$ 38,435.84
TOTAL DE LA FACTURA	\$ 278,659.83
DEDUCCION 5 A MILLAR	\$ -
IMPORTE A RECIBIR	\$278,659.83

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

MANUEL JIMENEZ FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C.M.A. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

0117

CONTRATO.		CONTRATISTA:	
NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO:	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANTARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
MONTOS:		LOCALIDAD:	
MONTOS CONTRATADO:		NOCHISTLAN DE MEJIA	
\$278,659.83		FAISM	
FECHA DE CONTRATO :		EST. No.	
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025		1	
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS		HOJA:	
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025		1	
DESCRIPTON DE CONCEPTO:		PERIODO DE:	
TRAZO Y NIVELACION CON APARATO INCLUTE: TOPOGRAFIA Y CABLEJERO, OPERADOR		15/05/2025	
CLAVE 001		A	
LOCALIZACION		15/06/2025	
TRAZO Y NIVELACION CON APARATO INCLUTE: TOPOGRAFIA Y CABLEJERO, OPERADOR		NOTAS :	
EJE		CROQUIS	
TRAMO		CROQUIS	
1 - 2		CROQUIS	
2 - 5		CROQUIS	
5 - 6		CROQUIS	
6 - 8		CROQUIS	
8 - 9		CROQUIS	
9 - 10		CROQUIS	
10 - 11		CROQUIS	
11 - 12		CROQUIS	
12 - 13		CROQUIS	
13 - 14		CROQUIS	
14 - 15		CROQUIS	
15 - 16		CROQUIS	
16 - 17		CROQUIS	
17 - 18		CROQUIS	
18 - 19		CROQUIS	
19 - 20		CROQUIS	
20 - 21		CROQUIS	
21 - 22		CROQUIS	
22 - 23		CROQUIS	
23 - 24		CROQUIS	
24 - 25		CROQUIS	
25 - 26		CROQUIS	
26 - 27		CROQUIS	
27 - 28		CROQUIS	
28 - 29		CROQUIS	
29 - 30		CROQUIS	
30 - 31		CROQUIS	
31 - 32		CROQUIS	
32 - 33		CROQUIS	
33 - 34		CROQUIS	
34 - 35		CROQUIS	
35 - 36		CROQUIS	
36 - 37		CROQUIS	
37 - 38		CROQUIS	
38 - 39		CROQUIS	
39 - 40		CROQUIS	
40 - 41		CROQUIS	
41 - 42		CROQUIS	
42 - 43		CROQUIS	
43 - 44		CROQUIS	
44 - 45		CROQUIS	
45 - 46		CROQUIS	
46 - 47		CROQUIS	
47 - 48		CROQUIS	
48 - 49		CROQUIS	
49 - 50		CROQUIS	
50 - 51		CROQUIS	
51 - 52		CROQUIS	
52 - 53		CROQUIS	
53 - 54		CROQUIS	
54 - 55		CROQUIS	
55 - 56		CROQUIS	
56 - 57		CROQUIS	
57 - 58		CROQUIS	
58 - 59		CROQUIS	
59 - 60		CROQUIS	
60 - 61		CROQUIS	
61 - 62		CROQUIS	
62 - 63		CROQUIS	
63 - 64		CROQUIS	
64 - 65		CROQUIS	
65 - 66		CROQUIS	
66 - 67		CROQUIS	
67 - 68		CROQUIS	
68 - 69		CROQUIS	
69 - 70		CROQUIS	
70 - 71		CROQUIS	
71 - 72		CROQUIS	
72 - 73		CROQUIS	
73 - 74		CROQUIS	
74 - 75		CROQUIS	
75 - 76		CROQUIS	
76 - 77		CROQUIS	
77 - 78		CROQUIS	
78 - 79		CROQUIS	
79 - 80		CROQUIS	
80 - 81		CROQUIS	
81 - 82		CROQUIS	
82 - 83		CROQUIS	
83 - 84		CROQUIS	
84 - 85		CROQUIS	
85 - 86		CROQUIS	
86 - 87		CROQUIS	
87 - 88		CROQUIS	
88 - 89		CROQUIS	
89 - 90		CROQUIS	
90 - 91		CROQUIS	
91 - 92		CROQUIS	
92 - 93		CROQUIS	
93 - 94		CROQUIS	
94 - 95		CROQUIS	
95 - 96		CROQUIS	
96 - 97		CROQUIS	
97 - 98		CROQUIS	
98 - 99		CROQUIS	
99 - 100		CROQUIS	
100 - 101		CROQUIS	
101 - 102		CROQUIS	
102 - 103		CROQUIS	
103 - 1			



0118

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO.		CONTRATISTA:	
NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO:	
NOCHISTLAN/2025/10		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
MONTOS CONTRATADO:		LOCALIDAD:	
\$278,659.83		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		PROGRAMA	
FECHA DE CONTRATO :		FAISM	
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025		EST. No. 1	
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS		HOJA: 1	
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025		PERIODO DE: 15/05/2025 A 15/06/2025	
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		NOTAS :	
CLAVE 001		TRAZO Y NIVELACION CON APARATO INCLUTE, TOPOGRAFICO Y CARENMENTO, OPERACION	



LOGO DE LA EMPRESA

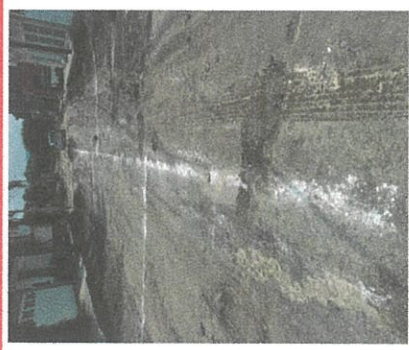

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MILENDEZ
SUPERVISOR


C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		CONTRATISTA:	
NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO:	
NOCHIS/FONDOIII/2025/10		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
MONTOS CONTRATADO:		LOCALIDAD:	
\$278,659.83		NOCHISTLAN DE MEJIA	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP 0135 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		PROGRAMA	
FECHA DE CONTRATO :		FAISM	
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025		EST. No. 1	
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS		HOJA: 2	
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025		PERIODO DE: A	
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		15/05/2025	
CLAVE 002		DE: 30	
COSTO DE FOMENTO CON SERIDA, HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 2.5 CM		15/06/2025	
NOTAS :			



LOGO DE LA EMPRESA



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

0121

CONTRATO:

NOCHIS/FONDOIII/2025/10

MONTO CONTRATADO:

\$278,659.83

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZAP OTIS DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

FECHA DE CONTRATO :

FECHA DE INICIO: 10 DE MAYO 2025
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE ACARRIO DE MATERIAL AL SITIO DE ACOPPIO Y TRASPALEOS

CLAVE

003

LOCALIZACION

EJE

TRAMO

1 - 1'

TIPO

DEMOLICION

LARGO

13

ANCHO PROMEDIO

0.80

AREA

10.40

ALTO

UNIDAD

M2

TOTAL

10.40

CONTRATISTA:

MUNICIPIO:

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

LOCALIDAD:

NOCHISTLAN DE MEJIA

PROGRAMA

FAISM

EST. No.

1

HOJA:

3

PERIODO DE:

15/06/2025

DE:

30

15/06/2025

NOTAS :

A

CROQUIS

ING. DIEGO ALEJANDRO MECHADO QUEZADA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ

SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

CONTRATISTA

OPERADO

FAISM (FIII)

EJERCICIO 2025

0122

MEMORIA FOTOGRAFICA			
CONTRATO.	CONTRATADO:	CONTRATISTA:	PROGRAMA
NOCHIS/FONDOIII/2025/10	\$279,659.83	MUNICIPIO:	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREANJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. CONSTRUCCIONES PLANETZ	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	LOCALIDAD:	FAISM
	NOCHISTLAN DE MEJIA		
	FECHA DE CONTRATO :	EST. No.	HOJAS:
FECHA DE INICIO 15 DE MAYO 2025	1	3	PERIODO DE:
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS			14/05/2025
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025			A
NOTAS :			
PLANCAS, PAVIMENTOS, PINTAS, MEXCON DE TIENDAS Y CONSTRUCCIONES GENERALES LOGO DE LA EMPRESA			

CLAVE
D02
DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MEDIO MECANICO INCLUYE ACARREO DE MATERIAL AL LITIO DE ACOPIO Y TRASPALEOS




ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
ERCICIO 2025


0123

[illegible]

0124

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO.		MONTO CONTRATADO:	
NOMBRE DE LA OBRA:		\$278,659.83	
NOCHISTLAN/2025/10			
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.			
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025			
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025			
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS			
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025			
DESCRIPCION DE CONCEPTO:			
ACARCEO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO C, PRIMER KILOMETRO, SOBRE CAMINO DE TOLERANCIA, CARGA CON BALCONA.			
CONTRATISTA:		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
MUNICIPIO:		LOCALIDAD:	
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA	
EST. No.		HOJA:	
1		1505/2025	
NOTAS :		PERIODO DE: 4 DE: 30	
		A 15/06/2025	



ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MILENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

GENERADORES									
CONTRATO:		CONTRATISTA:		PROGRAMA					
NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO:		LOCALIDAD:					
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA					
FECHA DE CONTRATO :		EST. No.		FAISM					
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025		1		5					
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS		15/05/2025		PERIODO DE: A					
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025		15/06/2025		DE: 30					
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		NOTAS :		CROQUIS					
CLAVE 005		ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE, KILOMETROS SUBSECUENTES, SE CONSIDERAN (1 KM)							
LOCALIZACION									
EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD		
	1 - 1'	ACARREOS SUB	13	0.80	1.56	0.15	M2/KM		
							TOTAL	1.56	

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADERE GUTIERREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

0126

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

MEMORIA FOTOGRAFICA			
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO:	MONTO CONTRATADO:	PROGRAMA
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	NOCHIS/FONDOIII/2025/10	\$278,659.83	FAISM
FECHA DE CONTRATO :	CONTRATISTA:		
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025	MUNICIPIO:		
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS	LOCALIDAD:		
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		
DESCRIPCION DE CONCEPTO:	EST. No. 1		
CLAVE 905	HOJA: 5		
DESCRIPCION DE CONCEPTO:	PERIODO DE: A		
DESCRIPCION DE CONCEPTO:	15/05/2025		
DESCRIPCION DE CONCEPTO:	NOTAS :		



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO SUZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA


0127

[illegible]

MEMORIA FOTOGRAFICA			
CONTRATO:		MONTO CONTRATADO:	
NOMBRE DE LA OBRA:		\$278,659.83	
CONTRATISTA:		MUNICIPIO:	
C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
LOCALIDAD:		PROGRAMA	
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		FAISM	
EST. No.		HOJA:	
1		6	
NOTAS :		PERIODO DE:	
		A	
		15/05/2025	
		15/06/2025	

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

EXCAVACION POR MEJORES MECANICOS EN TERRENO TIPO C EN CIFA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 8 A 12.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y ASESORAMIENTOS

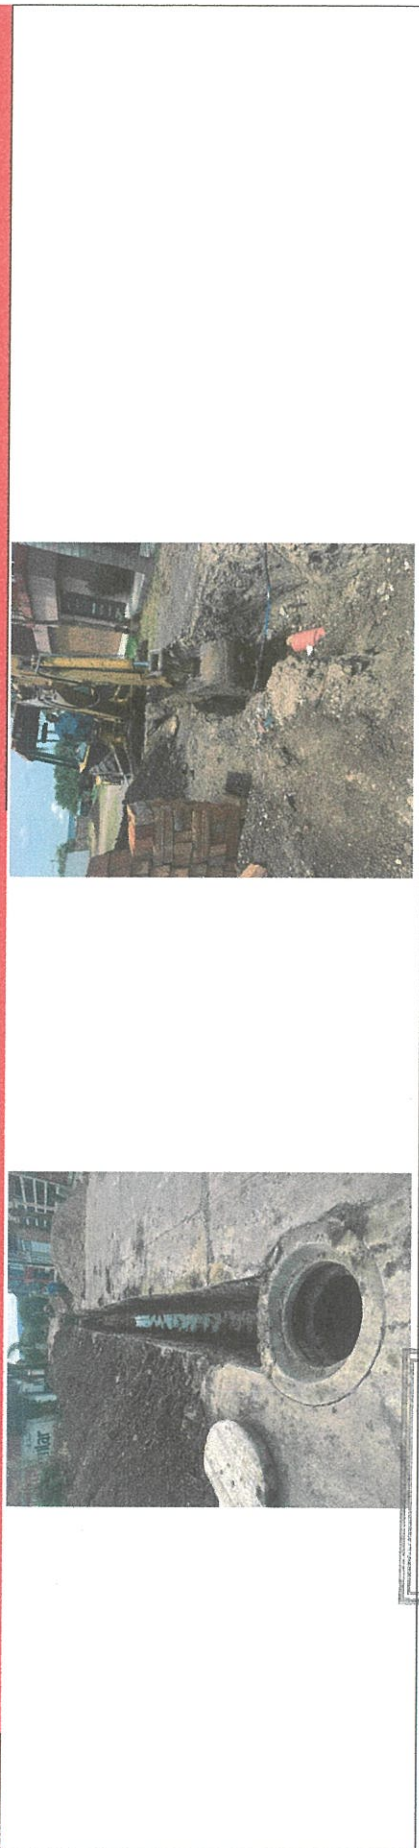

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO GUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

0129

GENERADORES		CONTRATO. NOCHIS/FONDOIII/2025/10		MONTO CONTRATADO: \$278,659.83	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.					
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025 PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS FECHA DE TÉRMINO: 15 DE JUNIO 2025		DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO: CAMA DE TRAFETATE DE 6 A 10 MTs DE SUPERIOR EN CUBA PARA TENEDOR DE TUBERÍAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS			
CLAVE 907		LOCALIZACIÓN CAMA DE TRAFETATE DE 6 A 10 MTs DE SUPERIOR EN CUBA PARA TENEDOR DE TUBERÍAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS			
EJE 1 - 2 2 - 5 2 - 6 2 - 7 3 - 4		TIPO CAMA DE CAMA DE CAMA DE CAMA DE CAMA DE		LARGO 41 5 20 20 28	
ANCHO PROMEDIO 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80		ÁREA (10%) 5.06 0.62 4.93 4.93 3.46		ALTO 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54	
UNIDAD M3		TOTAL 16.90			

OPERADOR
FAISM (FI)
EJERCICIO 20

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

CONTRATISTA:
 C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

MUNICIPIO:
 NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

EST. No.:
 1

NOTAS :

PROGRAMA
 FAISM

HOJA:
 7


PERIODO DE:
 15/05/2025 A 15/06/2025

CROQUIS

DETAJE DE ZANJA
 ANCHO DE ZANJAS
 1.00 M
 2.00 M
 3.00 M
 4.00 M
 5.00 M

0130

MEMORIA FOTOGRAFICA			
CONTRATO:		MUNICIPIO:	
NOMBRE DE LA OBRA:		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
NOCHIS/FONDOIII/2025/10		LOCALIDAD:	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREANJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA	
MONTOS CONTRATADOS:		PROGRAMA	
\$278,659.83		FAISM	
FECHA DE CONTRATO :		EST. No.	
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025		1	
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS		HOJA:	
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025		7	
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		PERIODO DE:	
CLAVE 007		A	
CANA DE TEPETATE DE 6.18 MTS DE ESPESOR EN CENA PARA TENDIDO DE TUBERIA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS		15/05/2025	
LUGAR DE LA ENTREGA		15/06/2025	



ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

0131

[illegible]

0132

MEMORIA FOTOGRAFICA

NOMBRE DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP 0159 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

FECHA DE CONTRATO :
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS

FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025

CONTRATO:
NOCHIS/FONDOH/2025/10

MONTO CONTRATADO:
\$278,659.83

CONSTRUCCIONES PANDEZ
PAVOS, ANALLOS, PUNTAS, MEDIDAS DE TENDIDO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL

LOGO DE LA EMPRESA

CONTRATISTA:
MUNICIPIO:
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

LOCALIDAD:
NOCHISTLAN DE MEJIA

EST. No.
1

HOJA:
8

PERIODO DE:
A
15/05/2025

DE:
30
15/06/2025

PROGRAMA
FAISM

NOTAS :

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 2 E3 DE MATERIAL TIPO C, PRIMERA KILOMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, CARGA CON MAZODIA

CLAVE
008

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO GUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

0133

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		MONTO CONTRATADO:	
NOCHIS/FONDOIII/2025/10		\$278,659.83	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANTIAGO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.			
CONTRATISTA: MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.			
LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA			
EST. No. 1			
HOJA: 9 DE: 30			
PERIODO DE: 15/05/2025 A 15/06/2025			
NOTAS :			



LOGO DE LA EMPRESA

FECHA DE CONTRATO :

FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS

FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

CLAVE 009 ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 A3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE, KILOMETROS SUBSECUENTES, DE CONCORDANCIAS 1 Y 249



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUIRÓGA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MILENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 25

0135

CONTRATO.		MONTO CONTRATADO:	
NOCHISIFONDOIII/2025/10		\$278,659.83	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DREANJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZAP 0125 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.			
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025 PLAZO DE EJECUCION: 30 DÍAS FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025			

CONTRATISTA:		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES		PROGRAMA	
MUNICIPIO:		LOCALIDAD:			
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA		FAISM	
EST. No.	HOJA:	10	DE: 30		
1		PERIODO DE:			
		15/05/2025		A	15/06/2025
NOTAS :					

LOGO DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA OBRA:	NOCHIS/FONDOIII/2025/10
--------------------	-------------------------

FECHA DE CONTRATO :

FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025

PLAZO DE EJECUCION: 30 DÍAS

FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

CLAVE
040

CLAVE
040

OPERADO
FAISM (FIH)
EJERCICIO 2025

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIERECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
COMBATISTA

0137

CONTRATO:

NOCHIS/FONDOIII/2025/10

MONTO CONTRATADO:

\$278,659.83

HOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILLOSOTOS DE LA ZAP 0165 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

FECHA DE CONTRATO :

FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

TUBO PVC SANITARIO DE 10" EN TRAMOS DE 5 METROS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO O RECAERNO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

CLAVE

611

LOCALIZACION

EJE TRAMO
2 - 5

TIPO

TUBO PVC 10"

LARGO

5

ANCHO PROMEDIO

AREA

ALTO

UNIDAD

M

TOTAL

5.00

GENERADORES

CONTRATISTA:

MUNICIPIO:

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

EST. No.

1

NOTAS :

LOCALIDAD:

NOCHISTLAN DE MEJIA

HOJA:

11

PERIODO DE:

A

DE:

15/05/2025

15/06/2025

PROGRAMA

FAISM

CROQUIS

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADERO QUIZANA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ

SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

CONTRATISTA

OPERADO

FAISM (FIII)

EJERCICIO 2025

0138

CONTRATO.		CONTRATISTA:		PROGRAMA	
NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO:		LOCALIDAD:	
NOCHISTLAN/FONDOH/2025/10		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA	
MONTOS CONTRATADOS:		EST. No.		PERIODO DE:	
\$278,659.83		1		A	
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025		HOJA:		DE: 30	
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS		15/05/2025		15/06/2025	
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025		NOTAS:			

CONSTRUCCIONES TAMPAC
RANOS, AVILAUS, PERALES, MEXICANOS DE TERNOS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL

LOGO DE LA EMPRESA

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

CLAVE 011

TUBO PVC SANITARIO DE 10" AN TRAMOS DE 6 FTES INCLUIDO MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTES Y TUDO O NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.L.O.T.



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

0139

CONTRATO.									
NOMBRE DE LA OBRA:	NOCHIS/FONDOIII/2025/10								
MONTOS CONTRATADOS:	\$276,659.83								
CONSTRUCCIONES FUENTES FUENTES, AMULCAS, PINTURAS, MEDICION DE TRABAJOS CONSTRUCCIONES EN GENERAL									
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025 PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025									
DESCRIPCION DE CONCEPTO:									
CLAVE 042	TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO RD-23 DE 8" DE DIAMETRO, JUNTA HERMETICA, INCLUYE: MATERIALES, ACABADOS, CORTES, SUSPENSIONES, INSTALACION, MANO DE OBRAPUNTERIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA								
LOCALIZACION	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD	
		1 - 2	TUBO PVC 8"	41				M	
		2 - 6	TUBO PVC 8"	40					
								TOTAL	81.00

OPERADO FAISM (FII)

EJERCICIO 202

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		CONTRATISTA:	
NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO:	
NOCHIS/FONDOH/2025/10		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
MONTTO CONTRATADO:		LOCALIDAD:	
\$278,659.83		NOCHISTLAN DE MEJIA	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		PROGRAMA	
FECHA DE CONTRATO :		FAISM	
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025		EST. No. 1	
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS		HOJA: 12	
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025		PERIODO DE: A	
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		15/05/2025	
TUBERIA DE PVC ALCAANTARILLADO RA-25 DE 8" DE DIAMETRO, JUNTA HERMETICA, INCLUIDO MATERIALES, ACABADOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACION, MANO DE OBRAS, PROTECCION, EQUIPO Y MANTENIMIENTO		15/06/2025	
CLAVE 012		NOTAS :	



LOGO DE LA EMPRESA



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO GUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

0141

GENERADORES									
CONTRATO:		MONTO CONTRATADO:							
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZAP-9153 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		\$278,659.83							
 CONSTRUCCIONES PUENTES PANCA, ANALUIS, ESPINAS, MEDICION DE TIEMPO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL									
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025 PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025									
DESCRIPCION DE CONCEPTO:									
TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" ON TRAMOS DE 6 MTS. NORMA CEMENTARIA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.Y									
CLAVE	EJE	LOCALIZACION	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD	TOTAL
913	1 - 2	A	TUBO PVC 6"	6				M	
		B	TUBO PVC 6"	6					
		C	TUBO PVC 6"	6					
		D	TUBO PVC 6"	6					
		E	TUBO PVC 6"	6					
	2 - 6	F	TUBO PVC 6"	6					
		G	TUBO PVC 6"	6					
		H	TUBO PVC 6"	6					
		I	TUBO PVC 6"	6					
		J	TUBO PVC 6"	6					
	3 - 4	K	TUBO PVC 6"	6					
		L	TUBO PVC 6"	6					
		M	TUBO PVC 6"	6					
		N	TUBO PVC 6"	6					
		O	TUBO PVC 6"	6					
		P	TUBO PVC 6"	6					
		Q	TUBO PVC 6"	6					
		R	TUBO PVC 6"	6					
		S	TUBO PVC 6"	6					
								TOTAL	114.00

OPERADOR
FAISM (FI...)
EJERCICIO 20...

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADERO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RIVALLCABA MELÉNDEZ
SUPERVISOR

CONTRATISTA:		PROGRAMA	
MUNICIPIO:		LOCALIDAD:	
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA	
EST. No. 1		HOJA: 13	
NOTAS :		PERIODO DE: 15/05/2025 A 15/06/2025	

CROQUIS

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ PUENTES
CONTRATISTA

0142

MEMORIA FOTOGRAFICA			
CONTRATO:		MUNICIPIO:	
NOMBRE DE LA OBRA:		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
NOCHIS/FONDOIII/2025/10		LOCALIDAD:	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP 0125 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA	
MONTTO CONTRATADO:		PROGRAMA	
\$278,659.83		FAISM	
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025		EST. No. 1	
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS		HOJA: 13	
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025		PERIODO DE: A	
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		NOTAS :	
 CONSTRUCCIONES FUENTES PLANOS, MANUOS, PERALTES, MEDICION DE TIEMPO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL LUJO DE LA EMPRESA			
CLAVE 013 TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" EN TRAMOS DE 8 MTS. NORMA CEMENTAR INCLITE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.L.O.T			



ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

0143

GENERADORES

CONTRATO:		MONTOS CONTRATADOS:	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP 0135 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		\$278,659.83	
 PLACA ANUNCIOS RETALES, MEDIDAS DE TENDIDO CONSTRUCCIONES EN GENERAL.			
FECHA DE CONTRATO :			
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2023			
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS			
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2023			
DESCRIPCION DE CONCEPTO:			
CODO DE 45° PVC SANITARIO CEMENTAR (H90°) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE P.I.O.T			

LOCALIZACION		TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD
EJE	TRAMO						
1-2	A	CODO 45	1				PZA
	B	CODO 45	1				
	C	CODO 45	1				
	D	CODO 45	1				
	E	CODO 45	1				
2-6	F	CODO 45	1				
	G	CODO 45	1				
	H	CODO 45	1				
	I	CODO 45	1				
	J	CODO 45	1				
3-4	K	CODO 45	1				
	L	CODO 45	1				
	M	CODO 45	1				
	N	CODO 45	1				
	O	CODO 45	1				
	P	CODO 45	1				
	Q	CODO 45	1				
	R	CODO 45	1				
	S	CODO 45	1				
TOTAL							19.00

GENERADO
14/05/2025 (FIII)
EJECUCION 2025

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

0144

CONTRATISTA:		PROGRAMA	
MUNICIPIO:		LOCALIDAD:	
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA	
EST. No. 1		HOJA: 14	DE: 30
NOTAS :		PERIODO DE: A	15/05/2025
CROQUIS			



MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		CONTRATISTA:		PROGRAMA	
NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO:		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
NOCHIS/FONDOIII/2025/10		LOCALIDAD:		FAISM	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTODROMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA			
FECHA DE CONTRATO :		EST. No.		HOJA:	
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025		1		14	
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS				PERIODO DE:	
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025				A	
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		NOTAS :		15/05/2025	
CLAVE 014				15/06/2025	

MONTO CONTRATADO:


\$278,659.83



PLANOS, ANÁLISIS, PERFILES, MEDICIONES, TENDIDO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL

LUGAR DE LA OBRA:


TRAMO DE PVC SANITARIO DE 6" EN TRAMOS DE 4 MTS. NORMA CORTESAS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRAS, DESMAMBLANTE DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.L.O.T

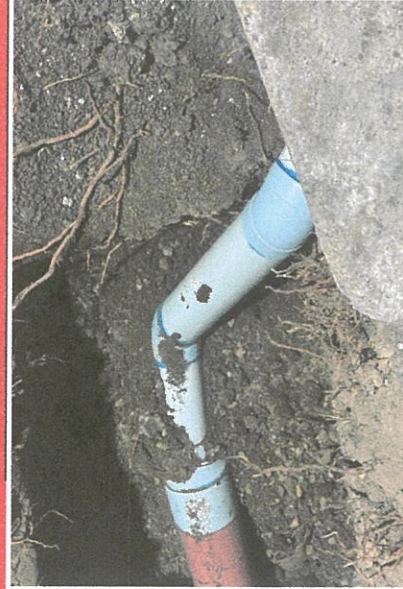

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA



0145

GENERADORES									
CONTRATO.		CONTRATADO:		MUNICIPIO:		PROGRAMA		EST. No.	
NOMBRE DE LA OBRA:		MONTOS CONTRATADOS:		LOCALIDAD:		MUNICIPIO:		PERIODO DEL	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILLOSOFOS DE LA ZAP-0153 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		\$276,659.83		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA		15 DE: 30	
FECHA DE CONTRATO :				HOJA:		FAISM		PERIODO DEL	
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025				15/05/2025				A	
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS				1				15/06/2025	
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025				NOTAS :					
DESCRIPCION DE CONCEPTO:									
CLAVE 015 SILLETA DE PVC SANITARIO SERIE 37 DE 12" A 6", INCLUYE: MANO DE OBRERA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION									
LOS DE LA EMPRESA									
PLANOS, ANÁLISIS, PERFILES, MEDICIÓN DE TIEMPO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL									
CROQUIS									
TOTAL 13.00									

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

ING. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

0146

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		MONTO CONTRATADO:		PROGRAMA	
NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO:		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
NOCHIS/FONDOIII/2025/10		LOCALIDAD:		NOCHISTLAN DE MEJIA	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP 0156 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		EST. No.		15	
		1		DE: 30	
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025		HOJA:		PERIODO DE:	
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS		15/05/2025		A	
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025		NOTAS :		15/06/2025	




PLANOS, ANÁLISIS, PERFILES, MEDICIÓN DE TIEMPO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL

LOGO DE LA EMPRESA

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

CLAVE 015 SILETA DE PVC SANITARIO SERIE 35" DE 12" A 6", INCLUYE MANDO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION

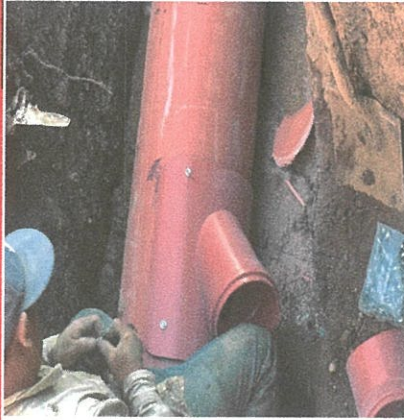

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MILENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA


OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

0147

[illegible]

0148

MEMORIA FOTOGRAFICA	
CONTRATO: NOCHISTLAN/2025/10	MONTO CONTRATADO: \$278,659.83
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZAP D185 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
	
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025 PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025	
DESCRIPCION DE CONCEPTO: CLAVE 016 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BILLYTA SERIE 25 DE 8" P"Z. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PAGO.	
CONTRATISTA: MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA
EST. No. 1	HOJA: 16 DE: 30 PERIODO DE: 15/05/2025 A 15/06/2025
NOTAS :	

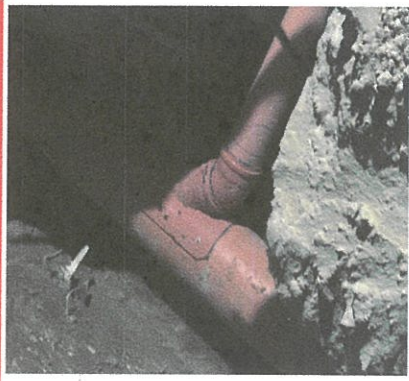

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2025

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

0149

MEMORIA FOTOGRAFICA	
CONTRATO: NOCHISTLAN/NOCHISTLAN/2025/10	MONTO CONTRATADO: \$278,659.83
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
LOGO DE LA EMPRESA: 	
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025 PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025	
DESCRIPCION DE CONCEPTO: BELLERIO PARA COSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO (TERRETE), COMPACTADO CON PISO DE BARRERA, INCLUYE: ACABADO DE MATERIAL CON CURETILLA	
CONTRATISTA: MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA
EST. No. 1	HOJA: 17 DE: 30
PERIODO DE: A 15/06/2025	
NOTAS :	



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

ING. DIEGO ALTAMIRANO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENOREZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

0151

GENERADORES		CONTRATISTA:		PROGRAMA	
CONTRATO:		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES		LOCALIDAD:	
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA		FAISM	
MONTO CONTRATADO:		EST. No.		PERIODO DE:	
\$278,659.83		1		15/05/2025 A 15/06/2025	
FECHA DE CONTRATO:		NOTAS:		CROQUIS	
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025		1		15/05/2025	
FECHA DE EJECUCION: 30 DIAS		1		15/05/2025	
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025		1		15/06/2025	
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		1		15/06/2025	
CLAVE 018		1		15/06/2025	
RELLENO EN ZANJAS A VOLTES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION		1		15/06/2025	
LOCALIZACION		1		15/06/2025	
EJE		1		15/06/2025	
TRAMO		1		15/06/2025	
TIPO		1		15/06/2025	
LARGO		1		15/06/2025	
ANCHO PROMEDIO		1		15/06/2025	
AREA		1		15/06/2025	
ALTO		1		15/06/2025	
UNIDAD		1		15/06/2025	
1		1		15/06/2025	
2		1		15/06/2025	
3		1		15/06/2025	
4		1		15/06/2025	
5		1		15/06/2025	
6		1		15/06/2025	
7		1		15/06/2025	
8		1		15/06/2025	
9		1		15/06/2025	
10		1		15/06/2025	
11		1		15/06/2025	
12		1		15/06/2025	
13		1		15/06/2025	
14		1		15/06/2025	
15		1		15/06/2025	
16		1		15/06/2025	
17		1		15/06/2025	
18		1		15/06/2025	
19		1		15/06/2025	
20		1		15/06/2025	
21		1		15/06/2025	
22		1		15/06/2025	
23		1		15/06/2025	
24		1		15/06/2025	
25		1		15/06/2025	
26		1		15/06/2025	
27		1		15/06/2025	
28		1		15/06/2025	
29		1		15/06/2025	
30		1		15/06/2025	
31		1		15/06/2025	
32		1		15/06/2025	
33		1		15/06/2025	
34		1		15/06/2025	
35		1		15/06/2025	
36		1		15/06/2025	
37		1		15/06/2025	
38		1		15/06/2025	
39		1		15/06/2025	
40		1		15/06/2025	
41		1		15/06/2025	
42		1		15/06/2025	
43		1		15/06/2025	
44		1		15/06/2025	
45		1		15/06/2025	
46		1		15/06/2025	
47		1		15/06/2025	
48		1		15/06/2025	
49		1		15/06/2025	
50		1		15/06/2025	
51		1		15/06/2025	
52		1		15/06/2025	
53		1		15/06/2025	
54		1		15/06/2025	
55		1		15/06/2025	
56		1		15/06/2025	
57		1		15/06/2025	
58		1		15/06/2025	
59		1		15/06/2025	
60		1		15/06/2025	
61		1		15/06/2025	
62		1		15/06/2025	
63		1		15/06/2025	
64		1		15/06/2025	
65		1		15/06/2025	
66		1		15/06/2025	
67		1		15/06/2025	
68		1		15/06/2025	
69		1		15/06/2025	
70		1		15/06/2025	
71		1		15/06/2025	
72		1		15/06/2025	
73		1		15/06/2025	
74		1		15/06/2025	
75		1		15/06/2025	
76		1		15/06/2025	
77		1		15/06/2025	
78		1		15/06/2025	
79		1		15/06/2025	
80		1		15/06/2025	
81		1		15/06/2025	
82		1		15/06/2025	
83		1		15/06/2025	
84		1		15/06/2025	
85		1		15/06/2025	
86		1		15/06/2025	
87		1		15/06/2025	
88		1		15/06/2025	
89		1		15/06/2025	
90		1		15/06/2025	
91		1		15/06/2025	
92		1		15/06/2025	
93		1		15/06/2025	
94		1		15/06/2025	
95		1		15/06/2025	
96		1		15/06/2025	
97		1		15/06/2025	
98		1		15/06/2025	
99		1		15/06/2025	
100		1		15/06/2025	
101		1		15/06/2025	
102		1		15/06/2025	
103		1		15/06/2025	
104		1		15/06/2025	
105		1		15/06/2025	
106		1		15/06/2025	
107		1		15/06/2025	
108		1		15/06/2025	
109		1		15/06/2025	
110		1		15/06/2025	
111		1		15/06/2025	
112		1		15/06/2025	
113		1		15/06/2025	
114		1		15/06/2025	
115		1		15/06/2025	
116		1		15/06/2025	
117		1		15/06/2025	
118		1		15/06/2025	
119		1		15/06/2025	
120		1		15/06/2025	
121		1		15/06/2025	
122		1		15/06/2025	
123		1		15/06/2025	
124		1		15/06/2025	
125		1		15/06/2025	
126		1		15/06/2025	
127		1		15/06/2025	
128		1		15/06/2025	
129		1		15/06/2025	
130		1		15/06/2025	
131		1		15/06/2025	
132		1		15/06/2025	
133		1		15/06/2025	
134		1		15/06/2025	
135		1		15/06/2025	
136		1		15/06/2025	
137		1		15/06/2025	
138		1		15/06/2025	
139		1		15/06/2025	
140		1		15/06/2025	
141		1		15/06/2025	
142		1		15/06/2025	
143		1		15/06/2025	
144		1		15/06/2025	
145		1		15/06/2025	
146		1		15/06/2025	
147		1		15/06/2025	
148		1		15/06/2025	
149		1		15/06/2025	
150		1		15/06/2025	
151		1		15/06/2025	
152		1		15/06/2025	
153		1		15/06/2025	
154		1		15/06/2025	
155		1		15/06/2025	
156		1		15/06/2025	
157		1		15/06/2025	
158		1		15/06/2025	
159		1		15/06/2025	
160		1		15/06/2025	
161		1		15/06/2025	
162		1		15/06/2025	
163		1		15/06/2025	
164		1		15/06/2025	
165		1		15/06/2025	
166		1		15/06/2025	
167		1		15/06/2025	
168		1		15/06/2025	
169		1		15/06/2025	
170		1		15/06/2025	
171		1		15/06/2025	
172		1		15/06/2025	
173		1		15/06/2025	
174		1		15/06/2025	
175		1		15/06/2025	
176		1		15/06/2025	
177		1		15/06/2025	
178		1		15/06/2025	
179		1		15/06/2025	
180		1		15/06/2025	
181		1		15/06/2025	
182		1		15/06/2025	
183		1		15/06/2025	
184		1		15/06/2025	
185		1		15/06/2025	
186		1		15/06/2025	
187		1		15/06/2025	
188		1		15/06/2025	
189		1		15/06/2025	
190		1		15/06/2025	
191		1		15/06/2025	
192		1		15/06/2025	
193		1		15/06/2025	
194		1		15/06/2025	
195		1		15/06/2025	
196		1		15/06/2025	
197		1		15/06/2025	
198		1		15/06/2025	
199		1		15/06/2025	
200		1		15/06/2025	
201		1		15/06/2025	
202		1		15/06/2025	
203		1		15/06/2025	
204		1		15/06/2025	
205		1		15/06/2025	
206		1		15/06/2025	
207		1		15/06/2025	
208		1		15/06/2025	
209		1</			

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		MONTO CONTRATADO:	
NOMBRE DE LA OBRA:		\$278,659.83	
NOCHIS/FONDOIII/2025/10			
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP 0153 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.			
 CONSTRUCCIONES RAMIREZ PLANOS, MAQUIS, PERALES, MENCION DE TENDIDOS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL			
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025 PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025			
DESCRIPCION DE CONCEPTO:			
CLAVE 015			
SELLADO EN ZANJAS A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION			
CONTRATISTA:		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
MUNICIPIO:		LOCALIDAD:	
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA	
EST. No.		HOJA:	
1		1505/2025	
NOTAS :		PERIODO DE: A	
		15/06/2025	
		DIE: 30	
		PROGRAMA	
		FAISM	



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

0153

GENERADORES

CONTRATO:		MONTO CONTRATADO:	
NOMBRE DE LA OBRA:		\$278,659.83	
NOCHISTLAN/2025/10			
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.			
FECHA DE CONTRATO :			
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025			
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS			
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025			
DESCRIPCION DE CONCEPTO:			
POZO DE VISITA PARA BROCA DE 40X140 MTS DE PROFUNDIDAD, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 6X14X127 CM DE ESPESOR COLOCADO A TIZON DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON MONTERO 1/4 SIN EXCAVACION.			
1000 DE LA EMPRESA			

CONTRATISTA:		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
MUNICIPIO:		LOCALIDAD:	
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA	
EST. No.		HOJA:	
1		19	
NOTAS :		PERIODO DE:	
		A	
		15/05/2025	
		DE: 30	
		15/06/2025	
CROQUIS			



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO		ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ SUPERVISOR		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES CONTRATISTA	
---	--	--	--	--	--

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

0154

MEMORIA FOTOGRAFICA	
CONTRATO.	CONTRATISTA:
NOMBRE DE LA OBRA:	MUNICIPIO:
NOCHIS/FONDOIII/2025/10	LOCALIDAD:
MONTO CONTRATADO:	PROGRAMA
\$278,659.83	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILSOFOS DE LA ZAP 0158 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	NOCHISTLAN DE MEJIA
FECHA DE CONTRATO :	EST. No.
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025	1
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS	HOJA:
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025	19
DESCRIPCION DE CONCEPTO:	PERIODO DE:
	15/05/2025
	A
	DE: 30
	15/06/2025
	NOTAS :

CLAVE 619 POSTO DE VISITA PARA REDCCLA DE 6.80X1.46 MTS DE PROFUNDIDAD, CON MURO DE TABIQUE PISO DE EXTERIOR CAS DE ESPESOR CON ACABADO A TOLON INFLANTADO SOBRE FRASE DE CONCRETO F4-1500 BACCES JUNTADOR Y PLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:4 SIN EXCAVACION.



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE HUVALCABA WELANDREZ
SUPERVISOR

C. MA-MERCEDES RODRIGUEZ-PUENTES
CONTRATISTA

0155

GENERADORES		CONTRATO. NOCHIS/FONDOIII/2025/10		MONTO CONTRATADO: \$278,859.83																																													
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.																																																	
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025 PLAZO DE EJECUCION: 30 DÍAS FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025		DESCRIPCION DE CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION																																															
CLAVE 020	LOCALIZACION <table border="1"> <thead> <tr> <th>EJE</th> <th>TRAMO</th> <th>TIPO</th> <th>PZA</th> <th>ANCHO PROMEDIO</th> <th>AREA</th> <th>ALTO</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>BROCAL</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PZA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>BROCAL</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>BROCAL</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table>	EJE	TRAMO	TIPO	PZA	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD		2	BROCAL	1				PZA		3	BROCAL	1						6	BROCAL	1												TOTAL								3.00
EJE	TRAMO	TIPO	PZA	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD																																										
	2	BROCAL	1				PZA																																										
	3	BROCAL	1																																														
	6	BROCAL	1																																														
							TOTAL																																										
							3.00																																										


ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

OPERADO
FAISM (FIII
EJERCICIO 202

0156

MEMORIA FOTOGRAFICA			
CONTRATO:		MUNICIPIO:	
NOMBRE DE LA OBRA:		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
NOCHISTLAN/2025/10		LOCALIDAD:	
CONTRATADO:		PROGRAMA	
\$278,659.83		FAISM	
CONSTRUCCIONES PAREZ			
PLANOS, ANÁLISIS, PERTAXES, MEDICIONES, TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL			
FECHA DE CONTRATO :			
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025			
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS			
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025			
DESCRIPCION DE CONCEPTO:			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDAL CON TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION			
CLAVE			
020			
NOTAS :			
EST. No. 1			
HOJA: 20			
PERIODO DE: 15/05/2025 A 15/06/2025			
MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.			
LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA			

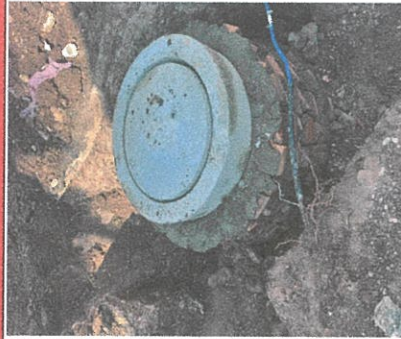

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


ING. JOSE GUADALUPE HUVALCABA WELANDREZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

0157

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		CONTRATISTA:	
NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO:	
NOCHISTLAN/2025/10		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
MONTOS CONTRATADOS:		LOCALIDAD:	
\$278,659.83		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		PROGRAMA	
FECHA DE CONTRATO :		NOCHISTLAN DE MEJIA	
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025		EST. No. 1	
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS		HOJA: 21	
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025		PERIODO DE: A	
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		NOTAS :	
CLAVE 021		15/05/2025	
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE CAPA SUBSOLANTE COMPACTADA AL 95% UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PETREO 100% MATERIAL DE BANCO YUSU MATERIAL PETREO		DE: 30	
		15/06/2025	



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MILENDEZ
SUPERVISOR


C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

0159

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		MUNICIPIO:		CONTRATISTA:	
NOCHIS/FONDOIII/2025/HO		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
NOMBRE DE LA OBRA:		LOCALIDAD:		PROGRAMA	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP OTIS DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA		FAISM	
MONTOS CONTRATADOS:		EST. No.		HOJA:	
\$278,659.83		1		22	
		NOTAS :		PERIODO DE:	
				A	
				DE: 30	
				15/06/2025	

CLAVE 025 MEZCALDO, TEBIDO Y COMPTACION DE LA CONSTRUCCION DE LA BASE COMPACTADA AL 100%, UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PETRO (80% MATERIAL DE BANCO Y 20% MATERIAL PETRO).

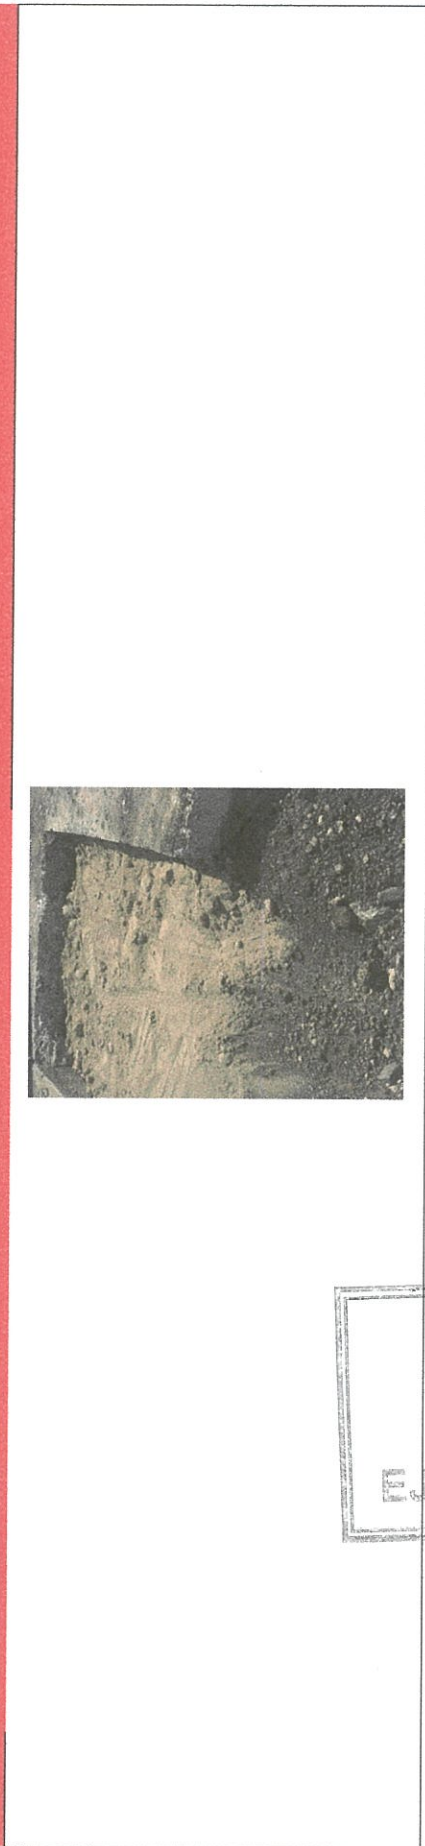

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

0161

CONTRATO.		CONTRATISTA:		PROGRAMA	
NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO:		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
NOCHIS/FONDOIII/2025/10		LOCALIDAD:		FAISM	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA	
FECHA DE CONTRATO :		EST. No.		HOJA:	
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025		1		23	
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS		PERIODO DE:		DE: 30	
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025		A		15/06/2025	
NOTAS :					


MONTO CONTRATADO: \$278,659.83

CONSTRUCCIONES TUNIZET
PLANOS, MANUOS, PERALTES, MEDICION DE TIEMPO Y CONSUMOS EN GENERAL.

LOGO DE LA EMPRESA

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

CLAVE 023 PAVIMENTO DE CONCRETO P.C. 225 MAGREZ ADESGADO DE 15 MM. CAMBIO NORMAL. DESVIAMIENTO 8 A 10 CM. DE 15 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTRODOLABA 6.5-10-16 BOLLO DE 108 KTS. INCLUYE CIERRE METALICA, BARRO DE OBRA Y MEDICIONALES MENORES

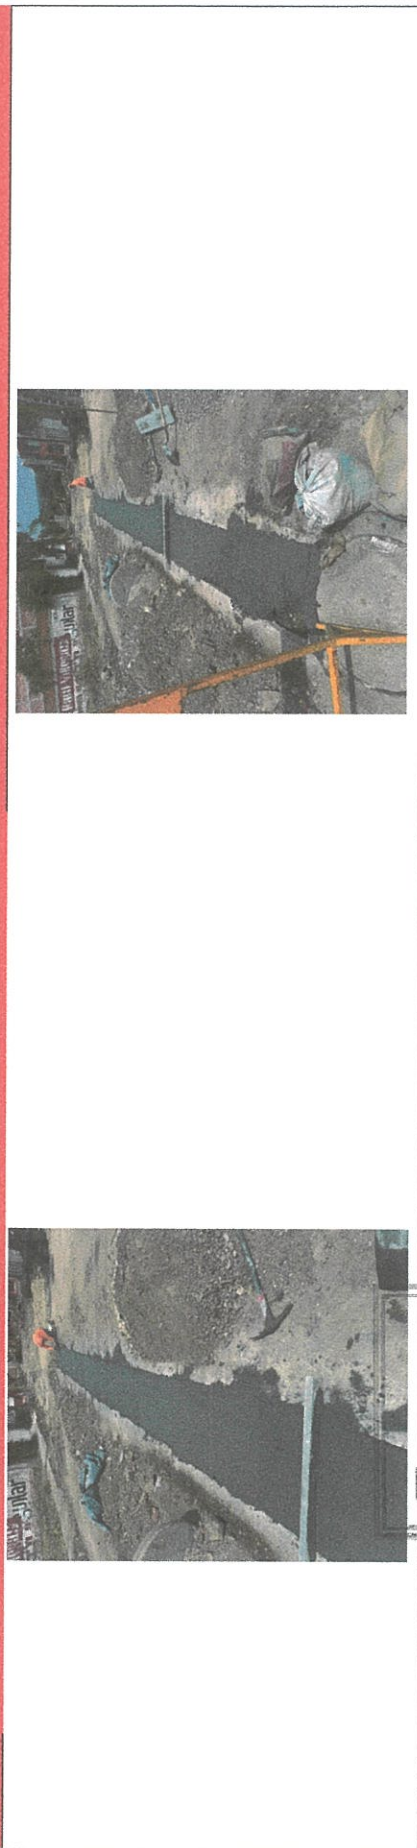

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

0163

CONTRATO:

NOCHIS/FONDOIII/2025/10

MONTO CONTRATADO:

\$278,659.83

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DREANJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZAP 0135 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

FECHA DE CONTRATO :

FECHA DE INICIO: 15 DE MAR-0 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS
FECHA DE TÉRMINO: 15 DE JUNIO 2025

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

REGISTRO DE ANEXOS DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN CON REGISTRO DE LINEA DE DREANJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZAP 0135 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. SOBRE BASE DE PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 Y CACHIRA DE SECCION 10X12 CM DE CONCRETO 10X12 CM AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE TUBA DE RESUPLEN, EXCAVACION, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y MANTENIMIENTO.

CLAVE

024

LOCALIZACION

EJE TRAMO 4

TIPO

REGISTRO

PZA

1

ANCHO PROMEDIO

AREA

ALTO

UNIDAD

PZA

TOTAL

1.00

CONTRATISTA:

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

MUNICIPIO:

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

EST. No.

1

HOJA:

24

PERIODO DE:

15/05/2025 A 15/06/2025

NOTAS :

PROGRAMA

FAISM

CRQUIS

ING. DIEGO ALVARO MERCADO QUEZADA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ

SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

CONTRATISTA

OPERADO

FAISM (FIII)

EJERCICIO 2025

0164

MEMORIA FOTOGRAFICA	
CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2025/10	
MONTOS CONTRATADO: \$278,659.83	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
FECHA DE CONTRATO : 15 DE MAYO 2025	
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025	
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS	
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025	
DESCRIPCION DE CONCEPTO: REGISTRO DE 4564666666 DE TAMBOR BLAO PEGADO EN LA CUBIERTA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
CONTRATISTA: C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA	
EST. No. 1	
HOJAS: 24	
PERIODO DE: 15/05/2025 A 15/06/2025	
NOTAS :	



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

0165

GENERADORES									
CONTRATO:		MONTO CONTRATADO:							
NOMBRE DE LA OBRA:									
NOMBRE DE LA OBRA:		NOCHEIS/FONDOIII/2025/10		\$278,559.83					
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FLORES DE LA ZAR 015 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.				 CONSTRUCCIONES RAMIREZ PLANOS, ANILLOS, PERALES, MOCION DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES GENERALES					
FECHA DE CONTRATO :									
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025									
FECHA DE EJECUCION: 30 DIAS									
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025									
DESCRIPCION DE CONCEPTO:									
EXCAVACION POR MEDIO MECANICOS DE TIERRA EN CEPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTS, NO INCLUYE SOMBOS DE AGUIQUE, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS									
CLAVE 025									
LOCALIZACION									
EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD		
1 - 2	A	EXCAVACION	6	0.80	5.74	1.20	M3		
	B	EXCAVACION	6	0.80	5.74	1.20			
	C	EXCAVACION	6	0.80	5.74	1.20			
	D	EXCAVACION	6	0.80	5.74	1.20			
2 - 6	E	EXCAVACION	6	0.80	5.74	1.20			
	F	EXCAVACION	6	0.80	5.74	1.20			
	G	EXCAVACION	6	0.80	5.74	1.20			
	H	EXCAVACION	6	0.80	5.74	1.20			
3 - 4	I	EXCAVACION	6	0.80	5.74	1.20			
	J	EXCAVACION	6	0.80	5.74	1.20			
	K	EXCAVACION	6	0.80	5.74	1.20			
	L	EXCAVACION	6	0.80	5.74	1.20			
	M	EXCAVACION	6	0.80	5.74	1.20			
	N	EXCAVACION	6	0.80	5.74	1.20			
	O	EXCAVACION	6	0.80	5.74	1.20			
	P	EXCAVACION	6	0.80	5.74	1.20			
S	Q	EXCAVACION	6	0.80	5.74	1.20			
	R	EXCAVACION	6	0.80	5.74	1.20			
TOTAL							109.00		

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

ING. C. M. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTABILISTA

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		MUNICIPIO:		CONTRATISTA:	
NOMBRE DE LA OBRA:		LOCALIDAD:		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
NOCHISTLAN/ONDODI/2025/10		NOCHISTLAN DE MEJIA		PROGRAMA	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP D155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		FAISM	
FECHA DE CONTRATO :		EST. No.		HOJA:	
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025		1		25	
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS				PERIODO DE:	
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025				A	
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		NOTAS :		15/05/2025	
ELEVACION POR MEDIO MECANICO DE TERRENO EN CEP, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4 A 2.50 MTS, NO INCLUYE BOMBEO DE AGUAS, INCLUYE / MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS				15/06/2025	

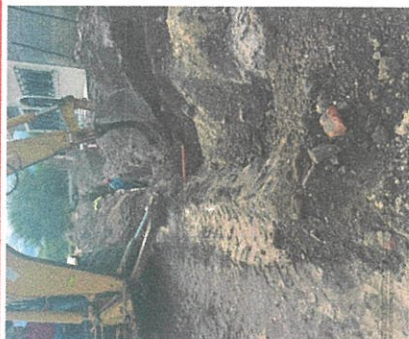

OFERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

0167

GENERADORES									
CONTRATO.			CONTRATISTA:		PROGRAMA				
NOMBRE DE LA OBRA:			C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES		LOCALIDAD:				
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZAP 6125 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.			MUNICIPIO:		NOCHISTLAN DE MEJIA		FAISM		
FECHA DE CONTRATO :			EST. No.		HOJA:		DE: 30		
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025			1		15/05/2025		PERIODO DEL A 15/06/2025		
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS									
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025									
DESCRIPCION DE CONCEPTO:									
CAMA DE TERRETE DE 0.10 MTS DE ESPESOR EN CEPÁ PARA TENDIDO DE TUBERIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS									
CLAVE GEN	LOCALIZACION	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA (10%)	ALTO	UNIDAD		
	1 - 2	A	6	0.80	0.57	1.20	M3		
		B	6	0.80	0.57	1.20			
		C	6	0.80	0.57	1.20			
		D	6	0.80	0.57	1.20			
		E	6	0.80	0.57	1.20			
		F	6	0.80	0.57	1.20			
		G	6	0.80	0.57	1.20			
		H	6	0.80	0.57	1.20			
		I	6	0.80	0.57	1.20			
		J	6	0.80	0.57	1.20			
		K	6	0.80	0.57	1.20			
		L	6	0.80	0.57	1.20			
		M	6	0.80	0.57	1.20			
		N	6	0.80	0.57	1.20			
		O	6	0.80	0.57	1.20			
		P	6	0.80	0.57	1.20			
		Q	6	0.80	0.57	1.20			
		R	6	0.80	0.57	1.20			
		S	6	0.80	0.57	1.20			
							TOTAL	10.90	

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

0168

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2025

NOTAS :
CROQUIS

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		MUNICIPIO:		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES		PROGRAMA	
NOMBRE DE LA OBRA:		MONTRO CONTRATADO:		LOCALIDAD:		FAISM	
NOCHIS/FONDOIII/2025/10		\$278,659.83		NOCHISTLAN DE MEJIA			
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		 CONSTRUCCIONES PANTEL PANOS, MANCOS, PIEDRAS, MEXICON DE TERNADO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL		NOCHISTLAN DE MEJIA			
FECHA DE CONTRATO :		EST. No.		HOJA:		28 DE 30	
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025		1		15/05/2025		PERIODO DE: A	
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS						15/06/2025	
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025							
DESCRIPCION DE CONCEPTO:							
CLAVE 829							
CAMA DE TERRETE DE 0.40 MTS DE ESPESOR EN CIPA PARA TENDIDO DE TUBERIAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS							



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

0169

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO.		MUNICIPIO:		PROGRAMA	
NOMBRE DE LA OBRA:		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES			
NOCHIS/FONDOIII/2025/10		LOCALIDAD:			
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		FAISM	
MONTTO CONTRATADO:		EST. No.		HOJA:	
\$278,659.83		1		27 DE 30	
LOGO DE LA EMPRESA:		PERIODO DE:		A	
 CONSTRUCCIONES RAMIREZ RAMOS, JUAJOS, PRIMAS, MEDICION DE TIEMPO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL		15/05/2025		15/06/2025	
FECHA DE CONTRATO :		NOTAS :			
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025					
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS					
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025					
DESCRIPCION DE CONCEPTO:					
CLAVE 027					

ACCESADO SOBRE CAMION DE VOL. TIO DE 7 TIO DE MATERIAL 1940 C, YOMER ELAMETIO, SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, CARRER CON MAHORES



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO GUEZAMA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA


0171

GENERADORES

CONTRATO:		MONTOS CONTRATADO:	
NOMBRE DE LA OBRA:		\$278,659.83	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZAP-0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.			
FECHA DE CONTRATO :			
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025			
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS			
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025			
DESCRIPCION DE CONCEPTO:			
ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE, KILOMETROS SUBSECUENTES, SE CONSIDERAN (1 KM)			

DESCRIPCION DE CONCEPTO:									
CLAVE C28	LOCALIZACION			TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA (40%)	ALTO	UNIDAD
	EJE	TRAMO							
	1 - 2	A	ACARREOS SUB	6	0.80	2.29	1.20	1.20	M3/KM
		B	ACARREOS SUB	6	0.80	2.29	1.20	1.20	
		C	ACARREOS SUB	6	0.80	2.29	1.20	1.20	
		D	ACARREOS SUB	6	0.80	2.29	1.20	1.20	
		E	ACARREOS SUB	6	0.80	2.29	1.20	1.20	
		F	ACARREOS SUB	6	0.80	2.29	1.20	1.20	
	2 - 6	G	ACARREOS SUB	6	0.80	2.29	1.20	1.20	
		H	ACARREOS SUB	6	0.80	2.29	1.20	1.20	
		I	ACARREOS SUB	6	0.80	2.29	1.20	1.20	
		J	ACARREOS SUB	6	0.80	2.29	1.20	1.20	
		K	ACARREOS SUB	6	0.80	2.29	1.20	1.20	
		L	ACARREOS SUB	6	0.80	2.29	1.20	1.20	
	3 - 4	M	ACARREOS SUB	6	0.80	2.29	1.20	1.20	
		N	ACARREOS SUB	6	0.80	2.29	1.20	1.20	
		O	ACARREOS SUB	6	0.80	2.29	1.20	1.20	
		P	ACARREOS SUB	6	0.80	2.29	1.20	1.20	
		Q	ACARREOS SUB	6	0.80	2.29	1.20	1.20	
		R	ACARREOS SUB	6	0.80	2.29	1.20	1.20	
S	ACARREOS SUB	6	0.80	2.29	1.20	1.20			

CONTRATISTA:		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES		PROGRAMA	
MUNICIPIO:		LOCALIDAD:			
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA		FAISM	
EST. No.	1	HOJA:	28	PERIODO DE:	DE: 30
		15/05/2025		A 15/06/2025	
NOTAS :					

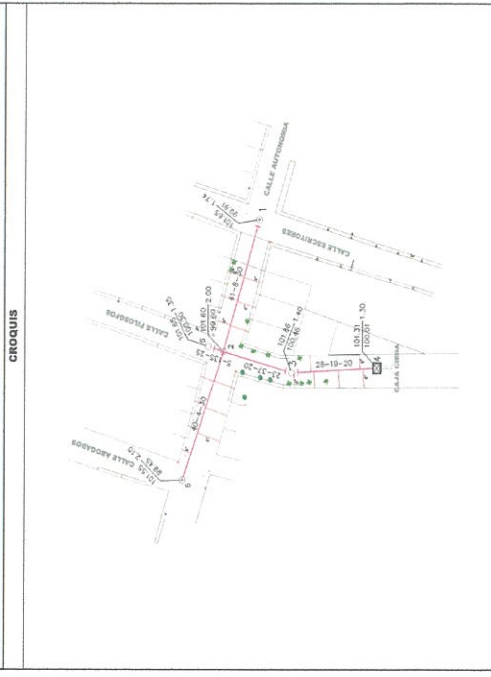

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE NUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR


C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

0172

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO:		CONTRATISTA:	
NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO:	
NOCHIS/FONDOIII/2025/10		C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
MONTTO CONTRATADO:		LOCALIDAD:	
\$278,659.83		NOCHISTLAN DE MEJIA	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		PROGRAMA	
FECHA DE CONTRATO :		FAISM	
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025		EST. No. 1	
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS		HOJA: 15/05/2025	
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025		PERIODO DE: A 15/06/2025	
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		NOTAS :	
CLAVE 028		ACERDO SOBRE CAMION DE VÁLTERO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE, RECORRETIOS DESPRECIADOS, DE CONCRETO (1 KM)	

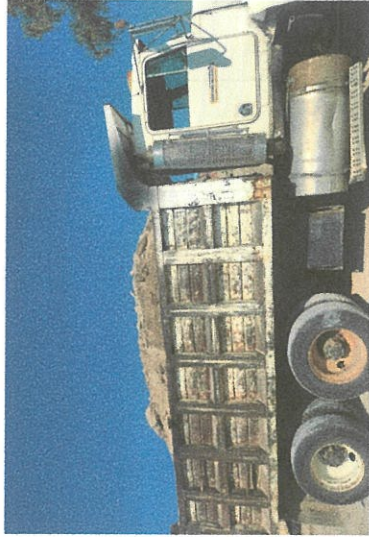

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSÉ GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

0173

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO.		CONTRATISTA:		PROGRAMA	
NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO:		LOCALIDAD:	
NOCHIS/FONDOIII/2025/10		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA	
MONTTO CONTRATADO:		EST. No.		HOJA:	
\$278,659.83		1		30 DE 30	
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2025		PERIODO DE:		A	
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS		15/05/2025		15/06/2025	
FECHA DE TERMINO: 15 DE JUNIO 2025		NOTAS :			
DESCRIPCION DE CONCEPTO:					
CLAVE					
030					



LUGAR DE LA EMPRESA




ING. DIEGO ALCANTAR MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

0177



ACUMULADO DE ESTIMACIONES

RESUMEN DE ESTIMACION		NOMBRE DE LA OBRA:	
NÚMERO DE ESTIMACIÓN		NO. DE CONTRATO	
		UBICACIÓN:	
		PERIODO:	
		IMPORTE DE CONTRATO:	

CONSTRUCCION DE LINEA DE DREANJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.			
NOCHISTLAN DE MEJIA			
15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO			
\$276,659.83			

CLAVE DE CONCEPTO		CONTRATO				ESTIMADO				POR ESTIMAR			
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO													
PRELIMINARES													
001	TRAZO Y NIVELACION CON APARATO INCLUYE: TOPOGRAFO Y CADENERO, OPERADOR.	ML	137.00	\$21.12	\$2,893.44	137	\$21.12	\$2,893.44	0.00	\$21.12	\$0.00		\$0.00
002	CORTE DE FIRME DE CONCRETO CON SIERRA, HASTA UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 2.5 CM	ML	26.00	\$183.99	\$4,783.74	26	\$183.99	\$4,783.74	0.00	\$183.99	\$0.00		\$0.00
003	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE ACOPIO Y TRASPALCOS	M2	10.40	\$163.19	\$1,697.18	10.4	\$163.19	\$1,697.18	0.00	\$163.19	\$0.00		\$0.00
004	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO C, PRIMER KILOMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA	M3	1.56	\$86.09	\$134.30	1.56	\$86.09	\$134.30	0.00	\$86.09	\$0.00		\$0.00
005	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE, KILOMETROS SUBSECUENTES, SE CONCIERAN (1 KM).	M3/KM	1.56	\$8.04	\$12.54	1.56	\$8.04	\$12.54	0.00	\$8.04	\$0.00		\$0.00
TERRACERIAS													
006	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO C EN CEP, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	M3	169.00	\$67.68	\$11,437.92	169	\$67.68	\$11,437.92	0.00	\$67.68	\$0.00		\$0.00
007	CAMA DE TEPETATE DE 0.10 MTS DE ESPESOR EN CEP PARA TENDIDO DE TUBERIAS, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS	M3	16.90	\$272.69	\$4,608.46	16.9	\$272.69	\$4,608.46	0.00	\$272.69	\$0.00		\$0.00
008	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO C, PRIMER KILOMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA	M3	67.60	\$86.09	\$5,819.68	67.6	\$86.09	\$5,819.68	0.00	\$86.09	\$0.00		\$0.00
009	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE, KILOMETROS SUBSECUENTES, SE CONCIERAN (1 KM).	M3/KM	67.60	\$8.04	\$543.50	67.6	\$8.04	\$543.50	0.00	\$8.04	\$0.00		\$0.00
MATERIALES													
010	TUBO FR PVC SERIE 25 DE 12' EN TRAMOS DE 8M. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M	51.00	\$823.61	\$42,004.11	51	\$823.61	\$42,004.11	0.00	\$823.61	\$0.00		\$0.00
011	TUBO PVC SANITARIO DE 10' EN TRAMOS DE 6 MTRS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.	M	5.00	\$636.77	\$3,183.85	5	\$636.77	\$3,183.85	0.00	\$636.77	\$0.00		\$0.00
012	TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO RD-25 DE 8" DE DIAMETRO, JUNTA HERMETICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	ML	81.00	\$352.86	\$28,581.66	81	\$352.86	\$28,581.66	0.00	\$352.86	\$0.00		\$0.00
013	TUBO DE PVC SANITARIO DE 6' EN TRAMOS DE 6 MTS. NORMA CEMENTAR INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T	ML	114.00	\$220.72	\$25,162.08	114	\$220.72	\$25,162.08	0.00	\$220.72	\$0.00		\$0.00
014	CODIGO DE 45° PVC SANITARIO CEMENTAR (HH8) INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T	PIEZA	19.00	\$123.54	\$2,347.26	19	\$123.54	\$2,347.26	0.00	\$123.54	\$0.00		\$0.00
015	SILETA DE PVC SANITARIO SERIE 25 DE 12' A 6", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PIEZA	13.00	\$487.55	\$6,338.15	13	\$487.55	\$6,338.15	0.00	\$487.55	\$0.00		\$0.00

0178

016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILETA SERE 25 DE 8" A 6" PIEZA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.	PIEZA	6.00	\$346.98	\$2,081.88	6	\$346.98	\$2,081.88	0.00	\$346.98	\$0.00
017	RELLENOS RELLENO PARA COSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO CON PISON DE MADERA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL CON CARRETILLA	M3	50.70	\$282.14	\$14,304.50	50.7	\$282.14	\$14,304.50	0.00	\$282.14	\$0.00
018	RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	101.40	\$85.71	\$8,690.99	101.4	\$85.71	\$8,690.99	0.00	\$85.71	\$0.00
019	OBRAS CONEXAS POZO DE VISITA PARA BROCA DE 0.90X1.40 MTS DE PROFUNDIDAD, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 8X14X37 CM DE ESPESOR COLOCADO A 120N DESPLANTADO DOBLE FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:4 SIN EXCAVACION,	PIEZA	1.00	\$8,039.09	\$8,039.09	1	\$8,039.09	\$8,039.09	0.00	\$8,039.09	\$0.00
020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PIEZA	3.00	\$2,117.39	\$6,352.17	3	\$2,117.39	\$6,352.17	0.00	\$2,117.39	\$0.00
021	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE CAPA SUBRASANTE COMPACTADA AL 98% UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PETREO (50% MATERIAL DE BANCO 150% MATERIAL PETREO)	M3	3.12	\$318.25	\$992.94	3.12	\$318.25	\$992.94	0.00	\$318.25	\$0.00
022	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE LA BASE COMPACTADA AL 100%, UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PETREO (50% MATERIAL DE BANCO Y 50% MATERIAL PETREO)	M3	2.08	\$449.05	\$934.02	2.08	\$449.05	\$934.02	0.00	\$449.05	\$0.00
023	PAVIMENTO DE CONCRETO FC = 250 KG/CM2 AGREGADO DE 19 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM, DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENORES	M2	10.40	\$619.83	\$6,446.23	10.4	\$619.83	\$6,446.23	0.00	\$619.83	\$0.00
024	REGISTRO DE 40X40X80CM. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 8X14X37 CMS. JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO PULIDO EN INTERIOR, SOBRE BASE DE PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 Y CADENA DE SECCION 10X12 CM DE CONCRETO 100 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE: TAPA DE NEOPRENO, EXCAVACION, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PIEZA	1.00	\$3,736.57	\$3,736.57	1	\$3,736.57	\$3,736.57	0.00	\$3,736.57	\$0.00
025	DESCARGAS DOMICILIARIAS EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS DE TERRENO EN CEPAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTS. NO INCLUYE BOMBEO DE ACHIQUE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	M3	109.00	\$211.22	\$23,022.98	109	\$211.22	\$23,022.98	0.00	\$211.22	\$0.00
026	CAMA DE TEPEATE DE 0.10 MTS DE ESPESOR EN CEPAL PARA TENDIDO DE TUBERIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS	M3	10.90	\$272.69	\$2,972.32	10.9	\$272.69	\$2,972.32	0.00	\$272.69	\$0.00
027	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO C, PRIMER KILOMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA	M3	43.60	\$86.09	\$3,753.52	43.6	\$86.09	\$3,753.52	0.00	\$86.09	\$0.00
028	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE, KILOMETROS SUBSECUENTES, SE CONSIDERAN (1 KM).	M3/KM	43.60	\$8.04	\$350.54	43.6	\$8.04	\$350.54	0.00	\$8.04	\$0.00
029	RELLENO PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL EN CARRETILLA 30 MTS DE DISTANCIA	M3	32.70	\$295.29	\$9,655.98	32.7	\$295.29	\$9,655.98	0.00	\$295.29	\$0.00
030	RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	109.00	\$85.71	\$9,342.39	109	\$85.71	\$9,342.39	0.00	\$85.71	\$0.00
				IMPORTE	\$240,223.99		IMPORTE	\$240,223.99		IMPORTE	0.00
				IVA	\$38,435.84		IVA	\$38,435.84		IVA	0.00
				TOTAL	\$278,659.83		TOTAL	\$278,659.83		TOTAL	0.00

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DES. ECO. Y SOC.

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C. MA. MARCEDES RODRIGUEZ FUENTES
CONTRATISTA

0179

EJERCICIO 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE :	1
FECHA REPORTE :	24/05/25

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZONA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC

UBICACIÓN : NOCHISTLAN
TIPO DE OBRA : CONSTRUCCION

MODALIDAD EJEC.: CONTRATO

No. CONTRATO : NOCHIS/FONDOIII/2025/10

EMPRESA : IMA MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

MONTO CONTRATO : \$278,659.83

FECHA CONTRATO : 15 DE MAYO DE 2025

MONTO ANTICIPO : S/A

FECHA PAGO ANTICIPO : N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN

FECHAS PROGRAMADAS: 15-may-25

FECHAS REALES: 15-jun-24

FECHAS REPROGRAMADAS:

OBSERVACIONES:


REAL		PROGRAMADO	
% AVANCES FÍSICO	20	% AVANCES FINANCIERO	0
	20		0

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA

		M E S E S							DÍAS	% EN BASE TIEMPO
PARTIDAS	IMPORTE\$	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
PRELIMINARES	\$9,521.2	<								

ENCARGADO DE LA DIRECCION :
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO Q.

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ





MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



0181

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA
LOCALIDAD: ZONA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
PERIODO DE EJECUCIÓN: NOCHISTLAN
FECHA: 15 DE MAYO DE 2025 - 15 DE JUNIO DE 2025
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): viernes, 24 de mayo de 2024



OPERADO
PAISM (FIII)
20.00%
EJERCICIO 20 25

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA


DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Nº. REPORTE :	2
FECHA REPORTE :	27/05/25

REAL		PROGRAMADO	
% AVANCES FÍSICO	40		40
FINANCIERO	0		0

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO	
M E S E S														
PARTIDAS	IMPORTES	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						
PRELIMINARES	\$9,521.2												2	6.25
TERRACERIAS	\$22,409.56												5	15.63
MATERIALES	\$98,931.70												5	15.63
TOTAL DE MATERIALES	\$10,767.29												5	15.63
RELLENOS LINEA PRINCIPAL	\$22,995.49												5	15.63
OBRAS CONEXAS	\$26,501.02												5	15.63
DESCARGAS DOMICILIARIAS	\$49,097.73												5	15.63
SUB-TOTAL	\$240,223.99													
16% I.V.A.	\$38,435.84													
TOTAL	\$278,659.83													
TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE AL PROGRAMA DE OBRA												32		

DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE:	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZONA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MELJIA ZAC
UBICACIÓN :	NOCHISTLAN
TIPO DE OBRA :	CONSTRUCCION
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO
Nº. CONTRATO :	NOCHIS/FONDOIII/2025/10
EMPRESA :	MA MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES
MONTO CONTRATO :	\$89,474.64
FECHA CONTRATO :	15 DE MAYO DE 2025
MONTO ANTICIPO :	S/A
FECHA PAGO ANTICIPO :	N/A
Nº. AMPL. DE CONTRATO:	N/A
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO 15-may-25
FECHAS PROGRAMADAS:	15-jun-24
FECHAS REALES:	
FECHAS REPROGRAMADAS:	
OBSERVACIONES	



RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN :
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO Q.

0182

INFORME FOTOGRÁFICO



0183


CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA
ZONA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
NOCHISTLAN

15 DE MAYO DE 2025 - 15 DE JUNIO DE 2025

martes, 27 de mayo de 2025

40.00%

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):



INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE :	3
FECHA REPORTE :	29/05/25

DATOS DE LA OBRA		
NOMBRE:	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZONA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC	
UBICACIÓN :	NOCHISTLAN	
TIPO DE OBRA :	CONSTRUCCION	
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO	
No. CONTRATO :	NOCHIS/FONDOIIIII/2025/10	
EMPRESA :	MA MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
MONTO CONTRATO :	\$89,474.84	
FECHA CONTRATO :	15 DE MAYO DE 2025	
MONTO ANTICIPO :	S/A	
FECHA PAGO ANTICIPO :	N/A	
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A	
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A	
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A	
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERM.
FECHAS PROGRAMADAS:	15-may-25	15-jun-24
FECHAS REALES:		
FECHAS REPROGRAMADAS:		

OF
FAIS
EJERC


[illegible]

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA M



ENCARGADO DE LA DIRECCION :
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO Q.

0184



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

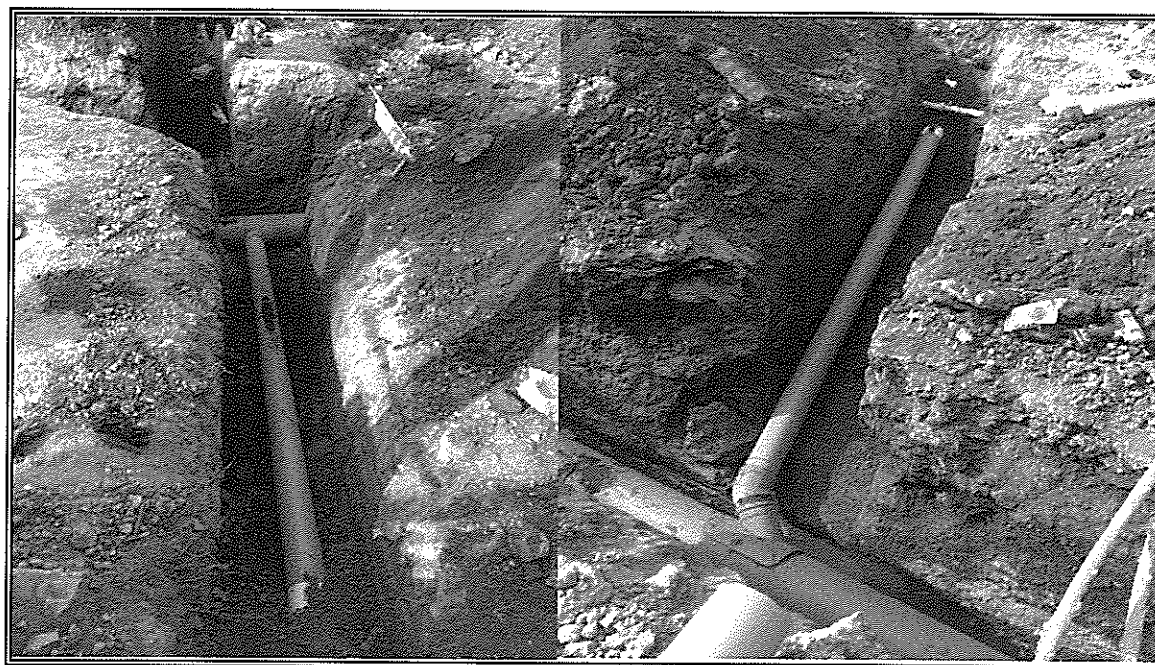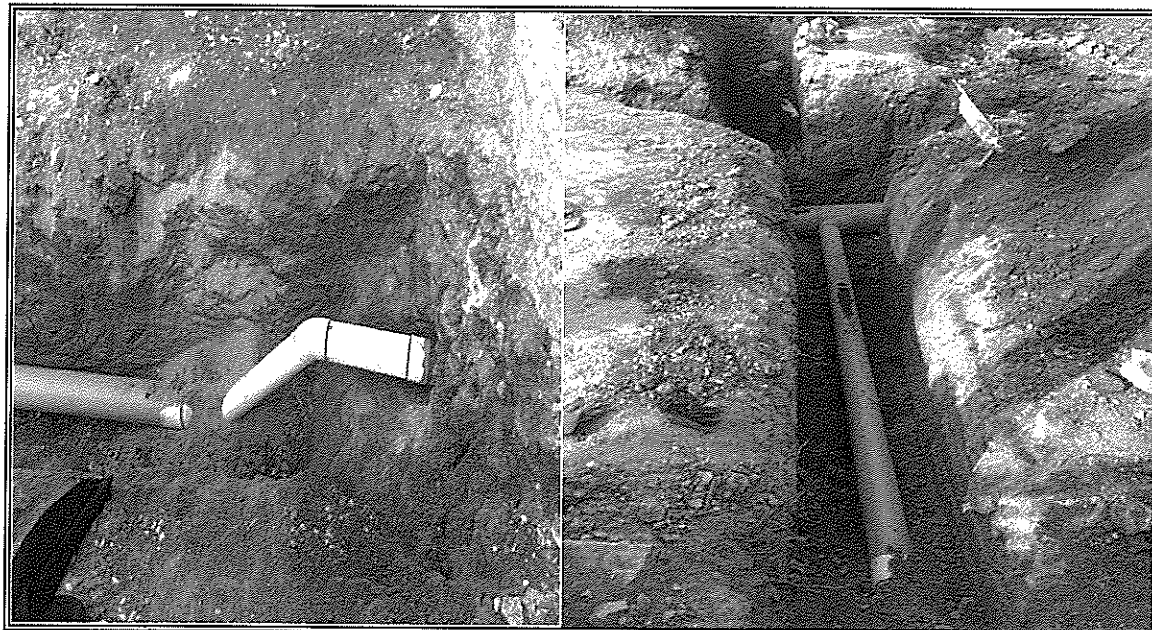

0185

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AUTONOMIA Y FILOSOFOS
DE LA ZONA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN

15 DE MAYO DE 2025 - 15 DE JUNIO DE 2025

Jueves, 29 de mayo de 2025

60.00%

OPERADO

FAISM (FIII)

EJERCICIO 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL





No. REPORTE :	4
FECHA REPORTE :	02/06/25

DATOS DE LA OBRA		
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZONA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC	
UBICACIÓN :	NOCHISTLAN CONSTRUCCION	
TIPO DE OBRA :	CONTRATO	
MODALIDAD EJEC.:		
No. CONTRATO :	NOCHIS/FOND011/2025/08	
EMPRESA :	MA MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES	
MONTO CONTRATO :	\$89,474.64	
FECHA CONTRATO :	15 DE MAYO DE 2025	
MONTO ANTICIPO :	S/A	
FECHA PAGO ANTICIPO :	N/A	
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A	
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A	
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A	
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERMI.
FECHAS PROGRAMADAS:	15-may-25	15-jun-24
FECHAS REALES:		
FECHAS REPROGRAMADAS:		
OBSERVACIONES		

OPERADO FAISM (FIIL) EJERCICIO 2025	
---	--

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA M

% AVANCES	REAL	PROGRAMADO
FÍSICO	40	40
FINANCIERO	0	0

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA													DÍAS	% EN BASE TIEMPO
M E S E S														
PARTIDAS	IMPORTES	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						
PRELIMINARES	\$9,521.2												2	6.25
TERRACERIAS	\$22,409.66												5	15.63
MATERIALES	\$98,931.70												10	31.25
TOTAL DE MATERIALES	\$10,767.29												5	15.63
RELLENOS LINEA PRINCIPAL	\$22,995.49												5	15.63
OBRAS CONEXAS	\$26,501.02												5	15.63
DESCARGAS DOMICILIARIAS	\$49,097.73												5	15.63
SUB-TOTAL	\$240,223.99													
16% I.V.A.	\$38,435.84													
TOTAL	\$278,659.83													
TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE AL PROGRAMA DE OBRA													32	

ENCARGADO DE LA DIRECCION :
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO Q.

0186



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



0187

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AUTONOMIA X FILÓSOFOS
DE LA ZONA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN
15 DE MAYO DE 2025 - 15 DE JUNIO DE 2025

lunes, 2 de junio de 2025

85.00%

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Nº. REPORTE :	5
FECHA REPORTE :	05/06/25

DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE:	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZONA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC		
UBICACIÓN :	NOCHISTLAN		
TIPO DE OBRA :	CONSTRUCCION		
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO		
Nº. CONTRATO :	NOCHIS/FONDI011/2025/10		
EMPRESA :	MA MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES		
MONTO CONTRATO :	\$89,474.64		
FECHA CONTRATO :	15 DE MAYO DE 2025		
MONTO ANTICIPO :	S/A		
FECHA PAGO ANTICIPO :	N/A		
Nº. AMPL. DE CONTRATO:	N/A		
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A		
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A		
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERMA	
FECHAS PROGRAMADAS:	15-may-25	15-jun-24	
FECHAS REALES:			
FECHAS REPROGRAMADAS:			

[illegible]

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA M

ENCARGADO DE LA DIRECCION :
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO Q.

0188



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



0189

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AUTONOMIA Y FILOSOFOS
DE LA ZONA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
NOCHISTLAN





15 DE MAYO DE 2025 - 15 DE JUNIO DE 2025

jueves, 5 de junio de 2025

100.00%

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):


OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

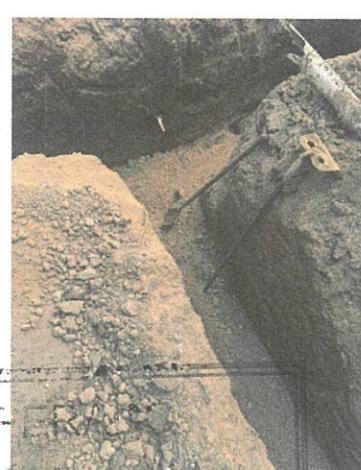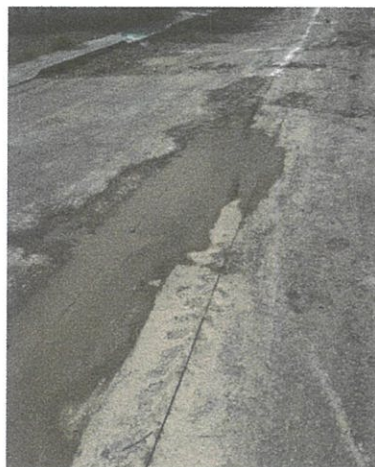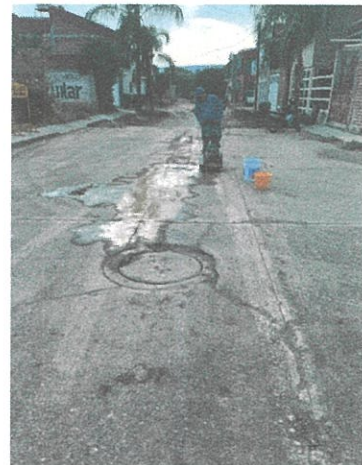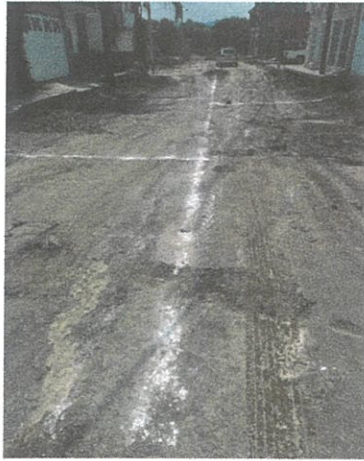

0190

OFERTA
FAISM (FIM)


EJERCICIO 2025

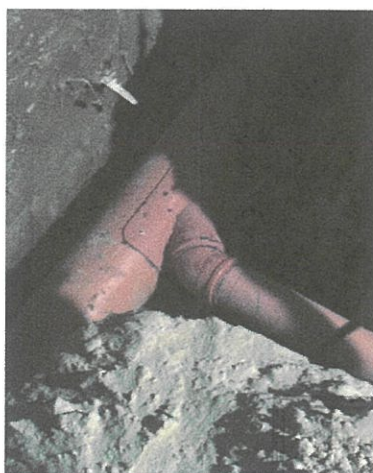

0191

COMPROBADO
FAISM (FIII)

EJERCICIO 2025

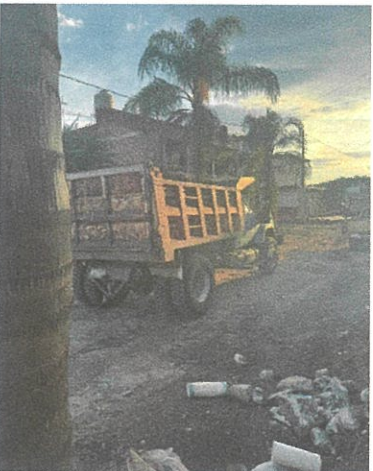

0192

FAISM (FII)
 EJERCICIO 2025



CONSTRUCCIONES "RAMIREZ"

PLANOS, AVALUOS, PERITAJES, MEDICION DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PRESENTE

ASUNTO: TERMINO DE OBRA

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 05 DE JUNIO DEL 2025

HAGO REFERENCIA AL CONTRATO NUMERO NOCHIS/FONDOIII/2025/10 RELATIVO A LA OBRA " **CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AUTONOMIA Y FILOSOFOS, DE LA ZAP 0155, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS** " CON UN IMPORTE DE \$ 278,659.83 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2025 CELEBRADO EN ESA DEPENDENCIA A SU DIGNO CARGO SE LE INFORMA QUE SE TERMINA EN TIEMPO Y FORMA LOS TRABAJOS DE DICHO CONTRATO EL 15 DE JUNIO DEL 2025 DE LA OBRA DENOMINADA:

NOMBRE: " **CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AUTONOMIA Y FILOSOFOS, DE LA ZAP 0155, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS** "


MONTO DEL CONTRATO: \$ 278,659.83

PLAZO DE EJECUCION: *DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2025*

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO, DESEANDOLE ÉXITO Y PROSPERIDAD.

0193

C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES



Aserta.

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
RFC: AAS920731477
Avenida Periférico Sur Número 4829,
Interior Piso 9
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad
de México
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número: 3731-04961-6
Código de Seguridad: Xfa2MGE
Folio: 3719887
Monto de la fianza: \$27,865.98
Monto de este movimiento: \$27,865.98

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 15 de Mayo de 2025

Movimiento: Emisión

Fiado: MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

Moneda: MXN

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

Ante EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.

ANTE EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

PARA GARANTIZAR POR MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. NOCHIS/FONDOIII/2025/10, ASI COMO **LA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS** CON UN IMPORTE TOTAL DE \$278,659.83 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.), RELATIVO A: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS, DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA LA RECEPCIÓN FORMAL Y A SATISFACCIÓN DE EL CONTRATISTA DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y CONTINUARÁ VIGENTE EN TODOS LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: A) PARA EL CASO DE 'EL CONTRATISTA' SE LE OTORGUEN PRORROGAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, B) AUN Y CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SEAN SUBCONTRATADOS POR EL MISMO, C) DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN, Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, EN EL CASO DE PRORROGA O ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARA PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA Y AL EFECTO ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., PAGARA EN TÉRMINOS DE LEY HASTA LA CANTIDAD YA MENCIONADA DE \$27,865.98 (VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.), ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V., ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 282, 283 Y 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".



GABRIEL HUIDOBRO GUZMAN

LÍNEA DE VALIDACIÓN
A14Q OOMZ 225

0194

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 5 de junio de 2015 con el número CNSF-F0012-0074-2015 / CNSF-F0012-0076-2015".

FAISM (FII)

EJERCICIO 2025

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA

- 1.- En toda póliza otorgada por la ASEGURADORA, sus derechos y obligaciones se encuentran regulados por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en adelante (LISF), en lo no previsto por la LISF, se aplicará la legislación mercantil y a falta de disposición expresa, el Código Civil Federal. (Art. 183 LISF); la póliza será numerada al igual que sus endosos debiendo contener, en su caso, indicaciones que administrativamente fijen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en adelante SHCP y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en adelante CNSF (Art. 166 LISF).
- 2.- En caso de PERDIDA O EXTRAVÍO DE LA PÓLIZA DE FIANZA al ejemplar su derecho de redamación de la fianza, deberá comprobar por escrito que la póliza fue otorgada, solicitando a la ASEGURADORA un duplicado de la póliza emitida a su favor. (Art. 166 LISF).
- 3.- Se PRESUME LA EXTINCIÓN de obligación como fiador cuando se hace la devolución de una póliza a la ASEGURADORA, salvo prueba en contrario. (Art. 166 LISF).
- 4.- Las fianzas y los contratos, que en relación a la póliza de fianza se otorguen o se celebren, serán mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES, FIADAS, CONTRAFIADORAS u OBLIGADAS SOLIDARIAS, salvo de la garantía hipotecaria. (Art. 32 LISF).
- 5.- La fianza suscrita en este folio será nula y sin efectos legales, si se garantizan operaciones de crédito, aun cuando en el texto de la misma se señale lo contrario, esta póliza no garantiza el pago de títulos de crédito, como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deban solventarse en dinero. Esta fianza no surtirá efectos, si se garantizan préstamos de dinero, mutuos, financiamientos en numerario o en especie, reestructuras de adeudos, renegociación de pasivos y cualquier otra operación no autorizada por la SHCP.
- 6.- La ASEGURADORA no goza de los beneficios de orden y exención y deberá ser requerida en los términos que establece la LISF. (Art. 178 LISF).
- 7.- La obligación de la ASEGURADORA se extinguirá en los siguientes casos: 7.1 Si el BENEFICIARIO concede al FIADO, prórroga o espera para el cumplimiento de la obligación afianzada sin el consentimiento previo y por escrito de la ASEGURADORA (Art. 179 LISF). 7.2 La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza, si la ASEGURADORA no da su consentimiento previo y por escrito para esa novación y para garantizar con la fianza la obligación novatoria (Arts. 2220 y 2221 del Código Civil Federal en adelante CCF). 7.3 La quita o pago parcial de la obligación afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa la obligación principal afianzada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones (Art. 2847 del CCF). La ASEGURADORA tendrá derecho, a oponer todas las excepciones que le sean inherentes a la obligación principal, incluyendo todas las causas de liberación de la fianza. 7.4 Si en la póliza de fianza no se establece plazo de caducidad se estará a lo señalado en el Art. 174 LISF y, caducará el derecho del beneficiario, para reclamar si la fianza no se reclama dentro del plazo señalado para tal efecto. 7.5 Prescribirá la obligación de la ASEGURADORA una vez transcurrido el plazo para que prescriba la obligación principal garantizada o el de 3 años, lo que resulte menor (Art. 175 LISF), para interrumpir la prescripción deberá requerirse por escrito a la ASEGURADORA, en los términos del Art. 175 LISF.
- 8.- Para redamar la fianza: 8.1 Presentar la redamación directamente y por escrito, en el domicilio de la ASEGURADORA, en alguna de sus sucursales u oficinas de servicios, con la firma del BENEFICIARIO o de su APODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con que se ostenta y señalando: fecha de redamación, número de póliza de fianza relacionada con la redamación que se formula, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del FIADO, nombre o denominación del BENEFICIARIO y en su caso, de su Representante Legal debidamente acreditado, domicilio del BENEFICIARIO para oír y recibir notificaciones, descripción de la obligación garantizada, acompañando copia de la documentación en la que se basó la expedición de la fianza, referencia del contrato o documento fuente (fecha, número, etc.). Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la redamación debiendo acompañar la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado y el importe reclamado como suerte principal, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza. (Circular Única de Seguros y Fianzas en adelante CUSF, Disposición 4.2.8, Frac. VIII y Art. 279 primer párrafo Frac. I LISF). 8.2 Si la fianza garantiza obligaciones fiscales federales se apegará al Art. 143, del Código Fiscal de la Federación. 8.3 Las fianzas expedidas ante la Federación, Ciudad de México, Estados o Municipios se hará efectiva a elección del BENEFICIARIO, de acuerdo con el procedimiento señalado en los Arts. 279 o 282 LISF y en su reglamento. 8.4 Fianzas otorgadas ante autoridades judiciales, no penales, se harán efectivas, a elección del BENEFICIARIO, conforme procedimiento de los Arts. 279 y 280 LISF o por la vía de incidente en el juicio en que se hubieran otorgado (Código Federal de Procedimientos Civiles, Art. 281 LISF). 8.5 Las Fianzas Judiciales Penales otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal, se harán efectivas conforme al Art. 282 LISF. Para la presentación del FIADO, se le requerirá personalmente o por correo certificado, con acuse de recibo a la ASEGURADORA en sus oficinas principales o en el domicilio del Apoderado designado para ello, procediendo a la aplicación del Art. 291 LISF, en caso de la no presentación del FIADO en el plazo concedido. 8.6 Cuando la ASEGURADORA reciba la redamación de la fianza, podrá hacerlo del conocimiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR, haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que presenten oportunamente los elementos y documentación necesaria para inconformarse en contra de la redamación, y que expresen lo que a su derecho convenga. De igual forma, puede denunciar a dichos deudores juicio que en su contra promoviere el BENEFICIARIO para que aporte pruebas en contra de la redamación de la fianza y quede a las resultas del juicio, si se condenare a la ASEGURADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF). 8.7 Una vez integrada la redamación en los términos de los Arts. 279 o 282 LISF, la ASEGURADORA tendrá un plazo hasta de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que fue integrada la redamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al BENEFICIARIO, las razones, causas o motivos de su improcedencia. 8.8 Si la ASEGURADORA no recibe los elementos y documentos citados en el punto 8.6, ésta podrá libremente decidir el pago de la redamación, estando el FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR obligado a reembolsar a la ASEGURADORA lo que a ésta le corresponda, sin que pueda oponer a la ASEGURADORA las excepciones que el FIADO tuviera frente a su acreedor, incluyendo la de pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso los Arts. 2832 y 2833 del CCF (Art. 289 LISF). Sin embargo, el FIADO conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la ASEGURADORA. La ASEGURADORA, al ser requerida o demandada podrá denunciar el pleito al deudor principal para que aporte pruebas en contra de la redamación de la fianza y quede a las resultas del juicio, para el caso de que se llegare a condenar a la ASEGURADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF).
- 9.- En caso de que la ASEGURADORA rechazare la redamación o no diera contestación en los plazos establecidos por la ley, el BENEFICIARIO podrá elegir, en la redamación de su pago, el procedimiento señalado en el Art. 280 LISF o el 50 bis y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
- 10.- OTRAS DISPOSICIONES.- Existe obligación de las oficinas y autoridades dependientes de la

Federación, Ciudad de México, de los Estados o Municipios de proporcionar a la ASEGURADORA los datos sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de cualquier otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza. 10.1 La ASEGURADORA se considera de acreditada solvencia Art. 16 párrafo primero LISF y Art. 18 primer párrafo LISF. 10.2 Si la ASEGURADORA no cumple con la obligación garantizada en la póliza dentro de los plazos legales para su cumplimiento, deberá cubrir al acreedor indemnización por mora conforme al Art. 283 LISF. 10.3 Ninguna autoridad podrá fijar mayor importe para las fianzas que otorguen las AFIANZADORAS Y ASEGURADORAS, que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. La infracción de este precepto será causa de responsabilidad (Art. 18 LISF). Si las obligaciones garantizadas son de hacer o de dar, la ASEGURADORA podrá sustituirse al deudor principal en el cumplimiento de la obligación. En las fianzas en que se garantice el pago de una suma de dinero en parcialidades, la falta de pago de alguna de las parcialidades no da derecho a reclamar la fianza por la totalidad. (Art. 176 LISF). 10.4 El pago de la fianza al BENEFICIARIO, subroga a la ASEGURADORA, por ministerio de ley, en todos los derechos, acciones y privilegios que a favor del acreedor se deriven de la naturaleza de la obligación garantizada. La ASEGURADORA podrá liberarse total o parcialmente de sus obligaciones si por causas imputables al BENEFICIARIO de la póliza de fianza, el pago es impedido o le resulta imposible la subrogación. (Art. 177 LISF y 2830 y 2845 del CCF).

11.- FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA.- Para el caso de fianzas en moneda extranjera, la ASEGURADORA, el BENEFICIARIO, el FIADO y sus OBLIGADOS SOLIDARIOS se someten al Art. 173 LISF y Capítulo 19.2 CUSF.

Únicamente se podrán autorizar este tipo de operaciones, cuando se relacionen con el cumplimiento de obligaciones exigibles fuera del país, o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifique que su pago se convenga en moneda extranjera.

RECLAMACIÓN.- Que el pago de la redamación procedente por fianza expedida en moneda extranjera y que deba realizarse en el extranjero, se efectuará por conducto de instituciones de crédito mexicanas o filiales de estas, a través de sus oficinas del exterior, en el país donde debió cumplirse la obligación afianzada y en la moneda que se haya establecido en la póliza (Disposición 19.2.3, fracción II CUSF).

PRIMAS.- Las primas relacionadas con la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirán a la ASEGURADORA en la misma moneda de expedición de la póliza, conforme al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en Moneda Extranjera pagaderas en la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. (Disposición 19.2.3, fracción I CUSF).

CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a que se refiere la presente, serán competentes las autoridades mexicanas, en los términos LISF, de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales (Disposición 19.2.3, fracción III CUSF).

12.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), y cualesquiera otros obligados, en su caso, así como tratándose de BENEFICIARIOS PARTICULARES, para efectos de interpretación, cumplimiento y ejecución de esta póliza, se someten de forma expresa a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales o del fuero común de la Ciudad de México, y/o Guadalupe, Jalisco y/o Monterrey, Nuevo León y/o Puebla, Puebla, a elección de la parte actora, renunciando de forma expresa e irrevocable a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, en el presente o futuro por concepto de su domicilio o vecindad; aplicándose en todo caso la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y su legislación supletoria. Las fianzas otorgadas a favor de la Federación, Ciudad de México, Estados y Municipios, se harán efectivas en los términos del Art. 282 de LISF.

13.- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O DE CUALQUIER OTRA

TECNOLOGÍA.- De conformidad con lo previsto en los Artículos 165 y 214 LISF las partes pactan que LA COMPAÑÍA ASEGURADORA podrá usar equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología en la celebración de sus operaciones y prestación de servicios, incluyendo la expedición electrónica o digital de sus pólizas de fianza, así como de sus documentos modificatorios, por lo que el uso de la firma digital, resultado de utilizar la Firma Electrónica sobre una fianza electrónica sustituye a la firma autógrafa y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes con el mismo valor probatorio; por tal motivo EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) expresa(n) su consentimiento para que LA COMPAÑÍA ASEGURADORA, emita las fianzas y los documentos modificatorios, en forma escrita o a través de medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología válida y no podrán objetar el uso de estos medios u oponerse a los mismos, por lo que en la interpretación y cumplimiento de este contrato se sujetan a lo dispuesto por el Título Segundo, Del Comercio Electrónico, Libro Segundo del Código de Comercio Vigente artículos 89 al 114 empleo de medios electrónicos en la celebración de actos de comercio, pactando al efecto:

I.- Que a través de estos medios se podrán emitir los recibos de cobro de primas, notas de crédito, emisión de pólizas de fianza, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a LA ASEGURADORA, así como, cualquier otro derivado de la prestación del servicio contratado, documentos electrónicos que podrán imprimirse en papel pero será la versión electrónica la que prevalezca si eventualmente existiera alguna diferencia entre ambas.

II.- Con el fin de establecer que la fianza electrónica fue generada por LA COMPAÑÍA ASEGURADORA, en términos del Artículo 90 Bis del Código de Comercio, las Partes pactan como Medio de Identificación del Usuario y Responsabilidades correspondientes a su uso, la validación de la póliza de fianza, a través de la Constancia de Consulta disponible en el Portal de Internet www.aserta.com.mx para fianzas emitidas por la COMPAÑÍA ASEGURADORA.

Los firmantes declaran conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la celebración de actos jurídicos, mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología, por lo que están dispuestos a operar a través de los mismos, ya que no les son ajenos.

III.- La Creación, Transmisión, Modificación y Extinción de derechos y obligaciones derivados de las pólizas de fianza electrónicas se soporta mediante una Firma Electrónica generada usando certificados digitales en términos del Título Segundo, del Comercio Electrónico, Capítulo I, De los Mensajes de Datos, Artículos 89 al 99 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, lo que garantiza frente a terceros la identidad, autenticidad e integridad de las operaciones y servicios prestados a EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S). De igual forma, los firmantes de este instrumento podrán(n) pactar los medios electrónicos idóneos para la transmisión y extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios señalados en la Fracción I de esta cláusula. Asimismo, LA COMPAÑÍA ASEGURADORA podrá solicitar y recibir documentación e información de los firmantes mediante medios electrónicos siempre y cuando EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) garantice(n) a satisfacción de la receptora los medios de creación, transmisión y modificación de dicha documentación y que le permitan asegurar la identidad, autenticidad e integridad de la documentación electrónica generada y transmitida.



CONSTRUCCIONES "RAMIREZ"

PLANOS, AVALUOS, PERITAJES, MEDICION DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ASUNTO: ACTA DE ENTREGA - RECEPCION



NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 05 DE JUNIO DEL 2025

POR MEDIO DEL PRESENTA, SE FORMULA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA REALIZADA POR MEDIO DEL PROGRAMA FONDO III. EFECTUADA POR C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES, REUNIENDOSE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES PARTES QUE INTERVIENEN, Y FIRMANDO DE COMUN ACUERDO.

DATOS DE LA OBRA

OBRA: " CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AUTONOMIA Y FILOSOFOS, DE LA ZAP 0155, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS "

PROGRAMA: FONDO III

LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA

MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

FECHA DE INICIO (CONTRATO): 15 DE MAYO DEL 2025

FECHA DE TERMINO (CONTRATO): 15 DE JUNIO DEL 2025

FECHA DE INICIO REAL: 24 DE MAYO DEL 2025


FECHA DE TERMINO REAL: 05 DE JUNIO DEL 2025

NUMERO DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2025/10

MONTO DEL CONTRATO: \$ 278,659.83 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CIENCUENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.)

HABIENDO DADO UN RECORRIDO POR LA OBRA SE COMPROBO OBJETIVAMENTE LA TERMINACION DE LA MISMA, DE ACUERDO A LOS PROYECTOS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES APROBADAS POR LAS PARTES, POR LO CUAL SE RECIBE DE CONFORMIDAD Y CON ENTERA SATISFACCION LOS TRABAJOS REALIZADOS.


C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES



0196



CONSTRUCCIONES "RAMIREZ"

ASUNTO: ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
PLANOS, AVALUOS, PERITAJES, MEDICION DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 05 DE JUNIO DEL 2025



POR MEDIO DEL PRESENTA, SE FORMULA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA REALIZADA POR MEDIO DEL PROGRAMA FONDO III. EFECTUADA POR C. MA MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES, REUNIENDOSE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES PARTES QUE INTERVIENEN, Y FIRMANDO DE COMUN ACUERDO.

DATOS DE LA OBRA

OBRA: " CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AUTONOMIA Y FILOSOFOS, DE LA ZAP 0155, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS "

PROGRAMA: FONDO III

LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA

MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

FECHA DE INICIO (CONTRATO): 15 DE MAYO DEL 2025

FECHA DE TERMINO (CONTRATO): 15 DE JUNIO DEL 2025

FECHA DE INICIO REAL: 24 DE MAYO DEL 2025

FECHA DE TERMINO REAL: 05 DE JUNIO DEL 2025

NUMERO DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2025/10

MONTO DEL CONTRATO: \$ 278,659.83 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CIENCUENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.)

HABIENDO DADO UN RECORRIDO POR LA OBRA SE COMPROBO OBJETIVAMENTE LA TERMINACION DE LA MISMA, DE ACUERDO CON EL PROYECTOS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES APROBADAS POR LAS PARTES, POR LO CUAL SE RECIBE DE CONFORMIDAD Y CON ENTERA SATISFACCION LOS TRABAJOS REALIZADOS.


ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCA MELENDREZ

C. MA MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

CONTRATISTA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

Ejercicio 2025

FECHA DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION:
15 DE JUNIO 2025

DATOS GENERALES:


FONDO:	III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social Municipal.	NO. DE PROYECTO:	402005
ESTADO:	032 Zacatecas	PROGRAMA:	ORD. AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO:	034: Nochistlán de Mejía	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA YO ACCIÓN:	
LOCALIDAD:	NOCHISTLAN		CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AUTONOMIA Y FILOSOFOS, DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
METAS CUMPLIDAS:			
FECHA REAL INICIO:			15 MAYO 2025
FECHA REAL TERMINACION:			15 JUNIO 2025

Antonia Avelar R

0198

Firmar al calce

Página 1



Miguel a moroz

Adrian Ramirez

ESTRUCTURA FINANCIERA:

	TOTAL	F.I.S.M.	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
INVERSIÓN APROBADA	\$ 278,659.83	\$ 278,659.83	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA	\$ 278,659.83	\$ 278,659.83	0.00	0.00	0.00

MODALIDAD DE EJECUCION: C(X) AC () AM () AD () M() EQ()

En el municipio de: **NOCHISTLAN DE MEJIA** siendo las 12 :00 HRS. Del día: **15 DE JUNIO DEL 2025**

los C, **MANUEL JIMENEZ FUENTES** PRESIDENTE MUNICIPAL; **LIC. MARIA DEL ROCIO SANDOVAL AVELAR**, SINDICA MUNICIPAL, **ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA**, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; **LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ** SECRETARIO DE GOBIERNO, **C. SERGIO HINOJOZA PEREZ** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, y representantes de las diferentes dependencias que intervienen para efectuar y dar constancia de la **entrega-recepción de la obra**, descrita en la parte superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la ley de adquisiciones y obras públicas y 49 de su reglamento.


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente trizada y operando de acuerdo a la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto, en condiciones de ser recibida por la unidad de su operación (comité o dependencia que se encargará en lo sucesivo de su conservación y mantenimiento).

La presente acta no exime al ejecutor de la obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en ella y se obliga por la presente a corregir la deficiencia detectada sin costo para la federación.

El H. Ayuntamiento representado por el **C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES**, por este medio y este momento hace la entrega a los **Integrantes del Comité de obra**, quien será la entidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quienes reciben de conformidad los que en ella intervienen firmando al calce.

Firmar al calce

Página 2



0199

Orion Ramirez
Miguel a moro

Antonia Avelar R

POR EL MUNICIPIO
ENTREGAN:

Manuel Jimenez
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C, JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES,

RECIBEN LA OBRA:

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

VOCAL DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Miguel A Muñoz

TESTIGOS:


Adrian Ramirez

Antonia Avelar R

0200

Firmar al calce

Página 3





PLANOS, ANÁLISIS, PERFILES, MEDICIÓN DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL

FINIQUITO

NÚMERO DE ESTIMACIÓN:

FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA:
NO. DE CONTRATO:
UBICACIÓN:
PERIODO:
IMPORTE DE CONTRATO:

CONSTRUCCION DE LINEA DE DREAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILOSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
NOCHISTLAN DE MEJIA
15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO
\$278,659.83

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

CLAVE DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
PRELIMINARES	
001	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO INCLUYE: TOPOGRAFO Y CADENERO, OPERADOR
002	CORTE DE FIRME DE CONCRETO CON SIERRA, HASTA UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 2.5 CM
003	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE ACOPPIO Y TRASPALEOS
004	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO C, PRIMER KILOMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA
005	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE, KILOMETROS SUBSECUENTES, SE CONCIERAN (1 KM).
TERRACERIAS	
006	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO C EN CEPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
007	CAMA DE TEPETATE DE 0.10 MTS DE ESPESOR EN CEPA PARA TENDIDO DE TUBERIAS, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS
008	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO C, PRIMER KILOMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA
009	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE, KILOMETROS SUBSECUENTES, SE CONCIERAN (1 KM).
MATERIALES	
010	TUBO FR PVC SERIE 25 DE 12' EN TRAMOS DE 6M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T
011	TUBO PVC SANITARIO DE 10' EN TRAMOS DE 6 MTRS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.
012	TUBERIA DE PVC ALICANTARILLADO RD-25 DE 8" DE DIAMETRO, JUNTA HERMETICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA
013	TUBO DE PVC SANITARIO DE 8" EN TRAMOS DE 6 MTS. NORMA CEMENTAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T
014	CODO DE 15° PVC SANITARIO CEMENTAR (H/160°) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE P.U.O.T
015	SOLETA DE PVC SANITARIO SERIE 25 DE 12" A 6". INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SOLOCACION

CONTRATO				ESTIMADO				POR ESTIMAR			
UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
ML	137.00	\$21.12	\$2,893.44	137	\$21.12	\$2,893.44	0.00	\$21.12	\$0.00	0.00	\$0.00
ML	26.00	\$183.99	\$4,783.74	26	\$183.99	\$4,783.74	0.00	\$183.99	\$0.00	0.00	\$0.00
M2	10.40	\$163.19	\$1,697.18	10.4	\$163.19	\$1,697.18	0.00	\$163.19	\$0.00	0.00	\$0.00
M3	1.56	\$86.09	\$134.30	1.56	\$86.09	\$134.30	0.00	\$86.09	\$0.00	0.00	\$0.00
M3/KM	1.56	\$8.04	\$12.54	1.56	\$8.04	\$12.54	0.00	\$8.04	\$0.00	0.00	\$0.00
M3	169.00	\$67.68	\$11,437.92	169	\$67.68	\$11,437.92	0.00	\$67.68	\$0.00	0.00	\$0.00
M3	16.90	\$272.69	\$4,608.46	16.9	\$272.69	\$4,608.46	0.00	\$272.69	\$0.00	0.00	\$0.00
M3	67.60	\$86.09	\$5,819.68	67.6	\$86.09	\$5,819.68	0.00	\$86.09	\$0.00	0.00	\$0.00
M3/KM	67.60	\$8.04	\$543.50	67.6	\$8.04	\$543.50	0.00	\$8.04	\$0.00	0.00	\$0.00
M	51.00	\$823.61	\$42,004.11	51	\$823.61	\$42,004.11	0.00	\$823.61	\$0.00	0.00	\$0.00
M	5.00	\$636.77	\$3,183.85	5	\$636.77	\$3,183.85	0.00	\$636.77	\$0.00	0.00	\$0.00
ML	81.00	\$352.86	\$28,581.66	81	\$352.86	\$28,581.66	0.00	\$352.86	\$0.00	0.00	\$0.00
ML	114.00	\$220.72	\$25,162.08	114	\$220.72	\$25,162.08	0.00	\$220.72	\$0.00	0.00	\$0.00
PIEZA	19.00	\$123.54	\$2,347.26	19	\$123.54	\$2,347.26	0.00	\$123.54	\$0.00	0.00	\$0.00
PIEZA	13.00	\$487.55	\$6,338.15	13	\$487.55	\$6,338.15	0.00	\$487.55	\$0.00	0.00	\$0.00

0201



016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA SERE 25 DE 8" A 6" PIEZA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.	PIEZA	6.00	\$346.98	\$2,081.88	6	\$346.98	\$2,081.88	0.00	\$346.98	\$0.00
017	RELLENOS RELLENO PARA COSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO CON PISON DE MADERA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL CON CARRETILLA	M3	50.70	\$282.14	\$14,304.50	50.7	\$282.14	\$14,304.50	0.00	\$282.14	\$0.00
018	RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	101.40	\$85.71	\$8,690.99	101.4	\$85.71	\$8,690.99	0.00	\$85.71	\$0.00
019	OBRAS CONEXAS POZO DE VISITA PARA BROCLA DE 0.80X1.40 MTS DE PROFUNDIDAD, CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 8X14X37 CM DE ESPESOR COLOCADO A TIZON DESPLANTADO DOBLE FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:4 SIN EXCAVACION.	PIEZA	1.00	\$8,039.09	\$8,039.09	1	\$8,039.09	\$8,039.09	0.00	\$8,039.09	\$0.00
020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PIEZA	3.00	\$2,117.39	\$6,352.17	3	\$2,117.39	\$6,352.17	0.00	\$2,117.39	\$0.00
021	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE CAPA SUBRASANTE COMPACTADA AL 95% UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PETREO (50% MATERIAL DE BANCO Y 50% MATERIAL PETREO)	M3	3.12	\$318.25	\$992.94	3.12	\$318.25	\$992.94	0.00	\$318.25	\$0.00
022	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE LA BASE COMPACTADA AL 100%, UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PETREO (50% MATERIAL DE BANCO Y 50% MATERIAL PETREO).	M3	2.08	\$449.05	\$934.02	2.08	\$449.05	\$934.02	0.00	\$449.05	\$0.00
023	PAVIMENTO DE CONCRETO FC = 250 KG/CM2 AGREGADO DE 19 MM, CEMENTO NORMAL REVENDIMIENTO 8 A 10 CM. DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTAS MENORES	M2	10.40	\$619.83	\$6,446.23	10.4	\$619.83	\$6,446.23	0.00	\$619.83	\$0.00
024	REGISTRO DE 40X40X60CM. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 8X14X37 CMS. JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN INTERIOR, SOBRE BASE DE PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 Y CADENA DE SECCION 10X12 CM DE CONCRETO 100 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL. INCLUYE: TAPA DE NEOPRENO, EXCAVACION, MATERIALES MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PIEZA	1.00	\$3,736.57	\$3,736.57	1	\$3,736.57	\$3,736.57	0.00	\$3,736.57	\$0.00
025	DESCARGAS DOMICILIARIAS EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS DE TERRENO EN CEPAL, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTS. NO INCLUYE BOMBEO DE AGHQUE, INCLUYE: MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	M3	109.00	\$211.22	\$23,022.98	109	\$211.22	\$23,022.98	0.00	\$211.22	\$0.00
026	CAMA DE TEPEPATE DE 0.10 MTS DE ESPESOR EN CEPAL PARA TENDIDO DE TUBERIAS, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS	M3	10.90	\$272.69	\$2,972.32	10.9	\$272.69	\$2,972.32	0.00	\$272.69	\$0.00
027	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO C, PRIMER KILOMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA	M3	43.60	\$86.09	\$3,753.52	43.6	\$86.09	\$3,753.52	0.00	\$86.09	\$0.00
028	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE, KILOMETROS SUBSECUENTES, SE CONCIERAN (1 KM).	M3/KM	43.60	\$8.04	\$350.54	43.6	\$8.04	\$350.54	0.00	\$8.04	\$0.00
029	RELLENO PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL EN CARRETILLA 30 MTS DE DISTANCIA	M3	32.70	\$295.29	\$9,655.98	32.7	\$295.29	\$9,655.98	0.00	\$295.29	\$0.00
030	RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	109.00	\$85.71	\$9,342.39	109	\$85.71	\$9,342.39	0.00	\$85.71	\$0.00

IMPORTE	\$240,223.99	IMPORTE	\$240,223.99
IVA	\$38,435.84	IVA	\$38,435.84
TOTAL	\$278,659.83	TOTAL	\$278,659.83

IMPORTE	\$85.71	IMPORTE	\$85.71
IVA	\$8.04	IVA	\$8.04
TOTAL	\$93.75	TOTAL	\$93.75

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE PES. ECO. Y SOC.

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

C-MA. MERCEDIS RODRIGUEZ FUENTES
CONTRALISTA

EJERCICIO 2025

0202

ACTA DERECHOS Y OBLIGACIONES

Siendo las **9:00 horas** del día **15 de junio de 2025**, en el espacio que ocupa la oficina de Desarrollo económico y social, Ubicado en el edificio de la presidencia Municipal marcado con el No. 1, de la calle Hidalgo, esquina con la Plaza Principal en Nochistlán, Zac. Las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, conforme a lo dispuesto en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece el artículo 64 de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas con el objeto de llevar a cabo el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones sobre los trabajos ejecutados al amparo del contrato No. **NOCHIS/FONDOIII/2025/10** que suscribieron Desarrollo económico y social el contratista **C.MA. MERCEDESS RODRIGUEZ FUENTES**.

ANTECEDENTES

Con fecha **15 mayo de 2025** las partes celebran contrato de Obra Pública con base a Precio Unitario y tiempo determinado identificado con el No. De Contrato: **NOHIS/FONDOIII/2025/10** para llevar a cabo los trabajos de obra: **CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AUTONOMIA Y FILOSOFOS, DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.** Con fecha de iniciación real de los trabajos el día **15 mayo de 2025** y la fecha de terminación real el día **15 de junio del 2025**.

Quedando un monto total contratado de **\$278,659.83** (doscientos setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 83/100M.N) Esta cantidad incluye el impuesto al valor agregado.


Durante del proceso de la obra se autorizaron un total de **1 (una)** estimaciones a precio unitario por trabajos ejecutados por un monto total de **\$278,659.83** (doscientos setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 83/100M.N) Esta cantidad incluye el impuesto al valor agregado.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprenden:

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AUTONOMIA Y FILOSOFOS, DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

Operado: FONDO III





RELACIÓN DE ESTIMACIONES PAGADAS POR TRABAJOS EJECUTADOS


Por lo anterior manifiestan las partes que no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

No. de Estimac.	Fecha	Importe Total	Deducciones	Anticipo (Amortización)
1	16 de junio de 2025	\$278,659.83	\$0.00	\$0.00

Sin otro asunto que tratar, se cierra la presente Acta firmado de conformidad las personas que interviene en este acto.

RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA
 ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.	 C. MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES

0204





FPS 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Siendo el día 15 del mes de mayo del año 2025, a las 16:00 horas, en la localidad Nochistlán del municipio Nochistlán de Mejía, de la entidad federativa Zacatecas nos encontramos en la Reunión de Instalación del Comité de Participación Social (CPS) para acordar las obras a financiarse con recursos del FAIS y designar a las personas que integrarán el Comité de Participación Social (CPS) que dará seguimiento y vigilancia a la obra construcción de línea de drenaje Sanitario, que se ubicará en Autonomía, Nochistlán, toda vez que la planeación del proyecto sea validada por Bienestar.

CONSIDERANDOS

Que el fundamento legal aplicable al FAIS se establece en el artículo 33 apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal; artículos 3 y 61 de la Ley General de Desarrollo Social; Lineamientos del FAIS 2025; y artículo 2 fracciones II y V, artículo 4 y 85, fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Que la participación social es el derecho que ejerce la población objetivo del FAIS al participar, en coordinación con los gobiernos municipales, de las demarcaciones territoriales y de las entidades federativas, en la identificación de necesidades de infraestructura social básica, así como en el seguimiento y vigilancia de las obras que se realicen con recursos del Fondo.

Que los gobiernos municipales, de las demarcaciones territoriales y de las entidades federativas deberán promover la participación de la población objetivo en los procesos de identificación de necesidades de infraestructura social básica, así como en el seguimiento y vigilancia de las obras que se realicen con recursos del Fondo, apegándose a lo estipulado en la Guía para la Promoción y Seguimiento de la Participación Social en el FAIS.

Que las actividades de los CPS son realizar visitas a las obras, registrar el seguimiento de las obras mediante el correcto llenado de los Formatos de Participación Social vigentes e informar los avances y la conclusión de las obras a la ciudadanía.

ACUERDO ÚNICO

Se declara formalmente instalado el Comité de Participación Social conformado por las personas que al calce de este documento firman en conjunto con la persona enlace del FAIS.

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO <u>MUÑOZ</u>	SEGUNDO APELLIDO <u>PUGA</u>	NOMBRE <u>MIQUEL ANGEL</u>	FIRMA O HUELLA <u>Miguel Angel</u>
CURP <u>MVPA710802H2SX6N09</u>	NÚMERO DE TELÉFONO <u>346 7131911</u>		
DOMICILIO			
CALLE <u>AUTONOMIA Y FILOSOFIA</u>	NÚMERO <u>50</u>	COLONIA <u>EL BAJIO</u>	C.P. <u>99900</u>
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Tache con una X: ☒ NO ☐ SÍ			
En caso de responder Sí, indique a cuál (Por ejemplo, Mazateco, Nahuatl, Maya, O'dam, etc.)			

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO <u>MACIAS</u>	SEGUNDO APELLIDO <u>MUÑOZ</u>	NOMBRE <u>MA. DE JESUS</u>	FIRMA O HUELLA <u>Ma de Jesus Macias</u>
CURP <u>MAMJ720101M1CCX509</u>	NÚMERO DE TELÉFONO <u>346 102 2492</u>		
DOMICILIO			
CALLE <u>FILOSOFIA</u>	NÚMERO <u>50</u>	COLONIA <u>EL BAJIO</u>	C.P. <u>99900</u>
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Tache con una X: ☒ NO ☐ SÍ			
En caso de responder Sí, indique a cuál (Por ejemplo, Mazateco, Nahuatl, Maya, O'dam, etc.)			

EXERCICIO 2025

0205



3. VOCAL

PRIMER APELLIDO MUNOZ	SEGUNDO APELLIDO MACIAS	NOMBRE MIQUEL ALEXANDER	FIRMA O HUELLA Alex
CURP MUMM030308HJGXC GA4		NÚMERO DE TELÉFONO 346 104 6553	
DOMICILIO			
CALLE FLUJOSOS	NÚMERO 50	COLONIA EL BASIO	C.P. 99 900
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Tache con una X: ☒ NO ☐ SÍ			
En caso de responder SÍ, indique a cuál (Por ejemplo, Mazateco, Nahua, Maya, O'dam, etc.)			

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE	FIRMA O HUELLA
CURP		NÚMERO DE TELÉFONO	
DOMICILIO			
CALLE	NÚMERO	COLONIA	C.P.
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Tache con una X: ☐ NO ☐ SÍ			
En caso de responder SÍ, indique a cuál (Por ejemplo, Mazateco, Nahua, Maya, O'dam, etc.)			

ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO Mercado	SEGUNDO APELLIDO Quezada	NOMBRE Diego Alejandro	FIRMA O HUELLA
CURP MEAD930301 H252 2608		NÚMERO DE TELÉFONO 346 102 0234	
DOMICILIO			
CALLE Gonzalez Ortega	NÚMERO 19	COLONIA centro	C.P. 99900

Se deberán colocar por lo menos dos números de teléfono para contactar a las personas integrantes del Comité de Participación Social.

La Secretaría de Bienestar utilizará los datos personales para dar seguimiento a la participación social mediante mecanismos internos apegados a los Lineamientos vigentes del FAIS, no se harán públicos y serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable.

