

Municipio de Nochistlán de Mejía Zacatecas
Dirección de Desarrollo Económico y Social

ACTA DE ENTREGA DEL ÁREA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha: 02 de mayo del 2025

En relación con el contrato de obra pública, precios unitarios y tiempo determinado No. **NOCHIS/FONDOIII/2025/09**, Relativo de los trabajos: **CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** se reunieron en el lugar de los trabajos, por parte del Municipio, el Ing. José Guadalupe Ruvalcaba Melendrez residente de obra, por parte de la empresa el Ing. Elías Macias Ledesma, Para poner a disposición del contratista el área donde habrá de ejecutarse los trabajos del contrato, el cual estará bajo su resguardo durante todo el tiempo que dure la obra, para lo cual debería tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden y la seguridad del inmueble, mismo que terminados los trabajos deberá entregar como mínimo en las condiciones que lo recibe a reserva de las áreas que se intervendrán para el: **CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presenta, firmando de conformidad, al calce de la hoja de la presente, a las 9:00 horas del día 02 de mayo 2025 otorgando una copia a todos los presentes.

Por el municipio.

Por la empresa




Ing. José Guadalupe Ruvalcaba Melendrez
RESIDENTE DE OBRA



Ing. Elías Macias Ledesma
SUPERINTENDENTE DE OBRA

0080



ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA



NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC. 12 DE MAYO DE 2025.
ASUNTO: INICIO DE OBRA.

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.
PRESENTE


Por medio de la presente y en relación al contrato No. NOCHIS/FONDOIII/2024/09 que ampara la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC." con un importe de \$89,474.64 (OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 64/100), le informa a usted que con fecha 12 DE MAYO DE 2025 se inician en tiempo y forma los trabajos del contrato antes mencionado.

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC."

MONTO DE CONTRATO: \$89,474.64

PLAZO DE EJECUCIÓN: DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2025.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo de antemano la atención prestada.


ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA.
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"

0081

c.c.p. PARA ARCHIVO.



DIRECCIÓN: UNIDAD DE PLANEACIÓN

NO. DE OFICIO: 218

SECCION: 1

EXPEDIENTE: ADMVO. 2024-2027

ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ
PRESENTE.

Por este medio me dirijo a usted para designarlo como responsable de la supervisión de la siguiente **CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** con número de contrato **NOCHIS/FONDOIII/2025/09**, de la cual se le hace responsable de la recopilación revisión de la documentación para conformación del expediente técnico que requiere la dependencia ejecutora Dirección de Desarrollo Económico y Social. Dicha información se debe de entregar al responsable del fondo correspondiente.

Documentación a entregar:

- Oficio de invitación.
- Oficio de adjudicación.
- Presupuesto contratado.
- Tarjeta de precios unitarios.
- Permisos de construcción
- Factibilidad de la obra
- Calendario de ejecución del contratista.
- Asignación de residente.
- Oficio de inicio de obra.
- Programa de obra.
- Catálogo de conceptos contratados.
- Revisión y entrega de generadores y estimaciones de obra con fotografías.
- Memoria fotográfica global impresa y digital.
- Bitácora convencional y reporte fotográfico.
- Reporte de visita semanal (día de corte los días viernes).
- Pruebas de laboratorio (pavimentaciones o estructuras con concreto).
- Revisión y análisis correcto de generadores y estimaciones de obra.
- Acta de entrega recepción.
- Fianzas o garantías de obra.
- Finiquito.
- Convenio de ampliación de metas. (oficio de aprobación, proyecto y presupuesto).

Sin más por el momento aprovecho para enviar un cordial saludo, quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración.

Unidad de
Planeación
2024-2027
Nochistlán de Mejía

UP ATENTAMENTE.

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 02 DE MAYO DE 2025
UNIDAD DE PLANEACIÓN



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

0082

Recibi
02 mayo/25
[Signature]

OPERADO
FAISM (FIII)

EJERCICIO 2025

ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA



**NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC. 12 DE MAYO DE 2025.
ASUNTO: DESIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE DE OBRA.**

**ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.
PRESENTE**


Por medio de la presente y con fundamento en los artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 111, primer párrafo, 112 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se le comunica que ha sido designado Residente de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC."** de los trabajos amparados por el contrato número. **NOCHIS/FONDOIII/2025/09** con un monto de **\$ 89,474.64 (OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 64/100)**, en la comunidad de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, adjudicada al **ING. ELIAS MACIAS LEDESMA**, con fecha **02 DE MAYO DEL 2025**.

DATOS DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA

**NOMBRE: I.C. ELIAS MACIAS LEDESMA.
CEDULA PROF: 5660932 U.A.A.
CURP: MALE850804HZSCDL00
DOMICILIO: CALLE HIPÓLITO PUENTES # 9 FRACC. ARBOLEDAS II CP: 99900
TELEFONO: 346-100-8045**

Así mismo está facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos, aun las de carácter personal, y en general para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato de referencia.

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes enviarle un afectuoso saludo, deseándole éxito y prosperidad.


**ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"**

0083

c.c.p. PARA ARCHIVO..



BITACORA DE OBRA:

“CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.”

12 DE MAYO DE 2025: En esta fecha se inician los trabajos de trazo de la línea de proyecto principal y también el trazo de las descargas domiciliarias, se realiza el sondeo con retroexcavadora para poder encontrar el pozo de visita de conexión existente esto ya que no visible a nivel de terracería.

13 DE MAYO DE 2025: Se comienza con la excavación de la zanja que alojara la línea de drenaje sanitario de pvc SERIE 25 DE 8" de diámetro, y se encuentra que en su mayoría es relleno y escombros.

14 DE MAYO DE 2025: Se trabaja en el encamado de tepetate y colocación de tubería de 8" serie 25; también se lleva a cabo el acostillado con tepetate de banco solo dejando las excavaciones de las descargas visibles para poder hacer las conexiones.


15 DE MAYO DE 2025: Con estas fechas se realiza la renivelación del pozo de visita de conexión que se ubica en la calle peñol debido a que se encontró a una profundidad de 1.20 m. y se conectaron dos descargas existentes de 4" ya que tributaban al mismo pozo.

16 DE MAYO DE 2025: Esta fecha se realiza la colocación del brocal en el pozo de visita de la calle peñol y se rellena un tramo de línea principal con material producto de la excavación.

19 DE MAYO DE 2025: Esta fecha se realizan los trabajos carga y acarreo del material producto de la excavación y se lleva al punto de tiro autorizado.

20-23 DE MAYO DE 2024: Estas fechas se realizan trabajos de conexión de descargas domiciliarias con tubería de 6" serie 25 para red sanitaria colocando silletas y codos, así como piezas necesarias para conectar las salidas de las viviendas existentes y en las prevenciones dejando cople y tapa, también se llevó a cabo el acostillado con material de banco.

26-30 DE MAYO DE 2025: En esta semana se trabajan los rellenos de las descargas con material producto de la excavación se realiza el pozo de visita cabecero y se coloca tapa y brocal del mismo, también se retiro el material producto de la excavación de las descargas y se llevo al punto de tiro autorizado. Se realiza una limpieza general y se notifica a la supervisión que se termina en tiempo y forma lo trabajos contratados de este proyecto.




ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.
CONTRATISTA



ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ
SUPERVISOR DE OBRA

0084





Usu: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C01049 Del 25/06/2025


Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2025 09:19 a. m.
Página | 1

Concepto: F538 - Obra Pública : 402004 - CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROY. GP
Folio: 376

Beneficiario: ELIAS MACIAS LEDESMA.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402004-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$89,474.64		FF:511, GP Folio: 376
0002	8260-511-402004-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$89,474.64	FF:511, GP Folio: 376
0003	1112-08-172	FONDO III 2025 01304738879		\$89,474.64	FF:511, GP Folio: 376
0004	2113-000779	ELIAS MACIAS LEDESMA.	\$89,474.64		FF:511, GP Folio: 376
Sumas iguales =>			178,949.28	178,949.28	

0085



Elaboró: Supervisor

Modificó: Supervisor



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS


Póliza: P04953 Del 25/06/2025

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2025
09:18 a. m.
Página | 1

Concepto: F538 - Obra Pública : 402004 - CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROY. GD
Folio: 365

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-402004-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$89,474.64		FF:511, GD Folio: 365
0002	8240-511-402004-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$89,474.64	FF:511, GD Folio: 365
0003	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de	\$89,474.64		FF:511, GD Folio: 365
0004	2113-000779	ELIAS MACIAS LEDESMA.		\$89,474.64	FF:511, GD Folio: 365
Sumas iguales =>			178,949.28	178,949.28	

0086



Reporte de Transferencias SPEIBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927


25/06/2025 12:45

Cuenta/ CLABE Ordenante	1304738879
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
RFC o CURP del Ordenante	MNM850101AC3
Moneda	MXP
ID Tercero	453
Nombre del Beneficiario	ELIAS MACIAS LEDEZMA
Cuenta/CLABE/Celular	012946004829331956
RFC Beneficiario	MALE8508043F9
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$89,474.64
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	25/06/2025
Referencia numérica	53
Propósito de la Transferencia	PAGO DE FACTURA
Clave de Rastreo	8846APR1202506254189377849
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
Fecha Captura	25/06/2025 10:58:32 a. m.
Ejecutó	JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
Fecha de Ejecución	25/06/2025 12:45:50 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



0087

ORDEN DE PAGO 2025

18-jun

UNICIPIO: 034 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 IEA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: RAMO 33 . PROGRAMAS FEDERALES
 JB-PROGRAMA : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 AMO, FONDO O PROGRAMA) (FONDO III 2025)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
 FIRMA DEL SOLICITANTE:
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 18 de junio de 2025
 CUENTA BANCARIA ORIGEN : 1304738879

AMO, FONDO O PROGRAMA)														
(FONDO III 2025)														
No.	CLAVE PRESUPUESTARIA								NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE.	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO						
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	511	FONDO III RAMO 33	402004	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6141	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO.	NOCHIS/FOND OIII/2025/09	ELIAS MACIAS LEDESMA.	F53B	02/06/2025	89,474.64	(OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.)

EJERCICIO 2025
 FAISM (FIII)
 OFENDIDO
 ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 L.C. ROCÍO ROGUE GOMEZ.
 2024 - 2027
 ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL
 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2024 - 2027
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
 DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. MARIA DEL ROCIO SANCHEZ AVELAR.
 SINDICATU MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL..."AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA..."LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRUCTA , PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.

0088

ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA



NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC. 02 DE JUNIO DEL 2025.
ASUNTO: ENTREGA DE ESTIMACION 01 UNICA.

ING. JOSÉ GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.
SUPERVISOR DE OBRA
PRESENTE

AT'N: ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a usted para solicitarle la revisión y aprobación de la **ESTIMACION 01 UNICA** en relación al contrato No. **NOCHIS/FONDOIII/2025/09** que ampara la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC."** con un importe de **\$ 89,474.64 (OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 64/100)**, que amparan los trabajos que enseguida se detallan, en la caratula de la estimación.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo de antemano la atención prestada.


ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA.
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"



0089

RFC emisor: MALE8508043F9 Folio fiscal: B70C5B4E-A561-41E8-B93A-AD29AF1EF53B
Nombre emisor: ELIAS MACIAS LEDESMA No. de serie del CSD: 00001000000600128811
RFC receptor: MNM850101AC3 Código postal, fecha y hora de emisión: 99900 2025-06-02 19:44:09
Nombre receptor: MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS Efecto de comprobante: Ingreso
Código postal del receptor: 99900 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
72141205		1.00	E48	Unidad de servicio	77,133.31	77,133.310000		SI objeto de impuesto
Descripción	RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS LA CANTIDAD DE \$99474.64 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA Y UNICA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS" SEGUN CONTRATO NUM. NOCHISFONDOIII/2025/08				Impuesto Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA Traslado	77,133.310000	Tasa 16.00%	12,341.329600
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 77,133.31
Forma de pago: Por definir Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 12,341.33
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Total \$ 89,474.64

Sello digital del CFDI:

WbZQ0PyCnQm1eGmhLn7oHgEpP0rbciOQUQhA,jwMCoJe8syNgI8YUpRt2RMJRUis5kyYV1nQXEY5QNoloJnhb9WqPnnS/2iWVkmULcxEeJgwPr7lhJdgPkHvQ0g8wKJz2H2kclTHgch/OvB8pwF3s+w2XAGQ34CqHHC2nYQdCJYu9Tq4JCPp8xAGym7OBjBAqqD416CYD4Cn3U2QhPq9BZ9apxNRnHKjSQNH9OolwetG/EChAKezForSPaYhyu60+b8v41JcTqW5eugnbIcpK8kNSAhgUneF2DRrSgyKP1J00G1MaUnQvVVqAYVWK+TIRRVa+qsufbVxhLQ==

Sello digital del SAT:

Du5B8Mnr1rYISMRKRB6lln5ND2keIRdKUiGFsm2aLGgMb/X4GV4MEVYxf5kxKA5Y5NI5AkpSI/85Do3aeGVOKYsT3aNI DUUTCVCY9glpznQ3w1sCMKs9eINBKBHL5ORqdDb0iykgKeWJy2Fn2EIPdy4iwdL1uRoBGQWgToVL9Y7C5aNDZaByNyLMjSEn4ZJf57Uv1XT0jo5a2q5RqI13q3dA4D/AKDIKTGJVopPIWQb57ibczqSCXlbaA2Qm7psxmdYQp1jnBwtEZ1LpRAI9LYCs1UaxKhEg3b8YJdV1lbZlqI6DiKOVEbkdVWuOcdYkmE/Zxhd6Fg==


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B70C5B4E-A561-41E8-B93A-AD29AF1EF53B|2025-06-02T19:44:29|SAT970701NN3|WbZQ0PyCnQm1eGmhLn7oHgEpP0rbciOQUQhA,jwMCoJJe8syNgI8YUpRt2RMJRUis5kyYV1nQXEY5QNoloJnhb9WqPnnS/2iWVkmULcxEeJgwPr7lhJdgPkHvQ0g8wKJz2H2kclTHgch/OvB8pwF3s+w2XAGQ34CqHHC2nYQdCJYu9Tq4JCPp8xAGym7OBjBAqqD416CYD4Cn3U2QhPq9BZ9apxNRnHKjSQNH9OolwetG/EChAKezForSPaYhyu60+b8v41JcTqW5eugnbIcpK8kNSAhgUneF2DRrSgyKP1J00G1MaUnQvVVqAYVWK+TIRRVa+qsufbVxhLQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-06-02 19:44:29

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



0090



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

ESTIMACIÓN 01 ÚNICA

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC		
CIUDAD	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.		
CONTRATISTA	ING. ELIAS MACIAS LEDESMA		
No. DE CONTRATO	NOCHIS/FONDOIII/2025/09		
UBICACIÓN	NOCHISTLÁN		
MONTO CONTRATADO	\$ 89,474.64		
ESTIMACION No.	001/001		
FECHA	DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2025		

ESTADO DE CUENTA

A.- ESTIMACIONES			
		\$	%
A1	Monto del contrato	\$ 89,474.64	100.00
A2	Estimaciones anteriores		0.00
A3	Esta estimación (SUBTOTAL)	77,133.31	86.21
A4	IVA 16%	\$ 12,341.33	13.79
A5	Total estimado	\$ 89,474.64	100.00
A6	Por estimar	\$ -	0.00

RETENCIONES

B.- ANTICIPO		
B1	Monto del Contrato	\$ 89,474.64
B2	Porcentaje de anticipo	0.00%
B3	Monto del Anticipo	\$ -
B4	Amortizaciones Anteriores	\$ -
B5	Amortizado en esta estimación	\$ -
B6	Total amortizado	\$ -
B7	Por amortizar	\$ -

C.- FONDO DE GARANTIA		
C1	Deducción del -5 al millar	0.00%
C2	Retenido estimaciones anteriores	\$ -
C3	En ésta estimación	\$ -
C4	Total retenido	\$ -
C5	Por retener	\$ -

D.- CANTIDAD POR RETENER POR PRUEBAS DE INSTALACIONES		
D1	Pruebas y terminacion de obra	0.00%
D2	Retenido estimaciones anteriores	\$ -
D3	En ésta estimación	\$ -
D4	Total retenido	\$ -

RESUMEN		
A3	Esta estimación (SUBTOTAL)	\$ 89,474.64
B5	Amortizacion de anticipo	\$ -
C3	Fondo de garantía	\$ -
D4	Total de deductivas	\$ -
	Neto a cobrar	\$ 89,474.64
		IVA INCLUIDO.

Bajo protesta de decir verdad declaro que las obras ejecutadas y reconocidas en la presente estimación, se reciben toda vez que han sido supervisadas y cotejadas bajo mi responsabilidad; de acuerdo a las especificaciones pactadas en los anexos técnicos del contrato referido, aceptando expresamente la responsabilidad civil, penal y profesional en la que incurro como Supervisor o Gerente de Obra o Director de Plaza, al asentar y aceptar obras sin la calidad especificada o falsedad con respecto a los avances en la ejecución de la misma, dado que esto representa un quebranto patrimonial para la Empresa.

CONTRATISTA
C. ING. ELIAS MACIAS LEDESMA

ENCARGADO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

SUPERVISOR
ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.



0091



ESTIMACIÓN 1 ÚNICA

EJERCICIO 2025

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA

ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ
SUPERVISOR



ESTIMACIÓN 1 ÚNICA

IMPORTE:	\$ 77,133.31
IVA 16%:	\$ 12,341.33
TOTAL:	\$ 89,474.64


0093

EJERCICIO 2025

Bajo protesta de decir verdad declaro que las obras ejecutadas y reconocidas en la presente estimación, se reciben toda vez que han sido supervisadas y coleccionadas bajo mi responsabilidad; de acuerdo a las especificaciones placiadas en los anexos técnicos del contrato referido, aceptando expresamente la responsabilidad civil, penal y profesional en la que incurriré como Supervisor o Gerente de Obra o Director de Plaza, al asentar, aceptar obras sin la calidad especificada o falsedad con respecto a los avances en la ejecución de la misma, dando que esto representa un quebranto patrimonial para la Empresa.


ING. ELIAS MACIAS LEDESMA
CONTRATISTA


ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDRIZ
SUPERVISOR



NÚM. DE ESTIMACIÓN	001/001
FECHA	DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2025 NOCHISTLAN

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1065A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC

CONTRATO No.	NOCHIS/FONDOI/III/2025/09	CIUDAD:	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	UBICACIÓN	NOCHISTLÁN
DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2025					

[illegible]


CONTRATISTA
C. ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA.


SUPERVISOR.
ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.


0095

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2025





ING. ELIAS MACIAS LEDESMA		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. NOCHISTLAN DE		OBRA :		CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA URESA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC		No. DE ESTIMACION		001001	
CONTRATO No.		MEJIA, ZAC.		CIUDAD:		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.		FECHA		DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2025	
NUMEROS GENERADORES Y MEMORIA FOTOGRAFICA		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.		LOCALIZACION		DIMENSIONES ANCHO		LARGO		PIEZAS	
CONCEPTO		UNIDAD		1		2		40.00		40.00	
Tubo pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta eleccion del p.u.o.t.		m		1		2		40.00		40.00	
CROQUIS DE OBRA		40-12-20		PRIV. ARROYO BLANCO		CALLE LIMON		100.00		98.70	
1		2		1.30							

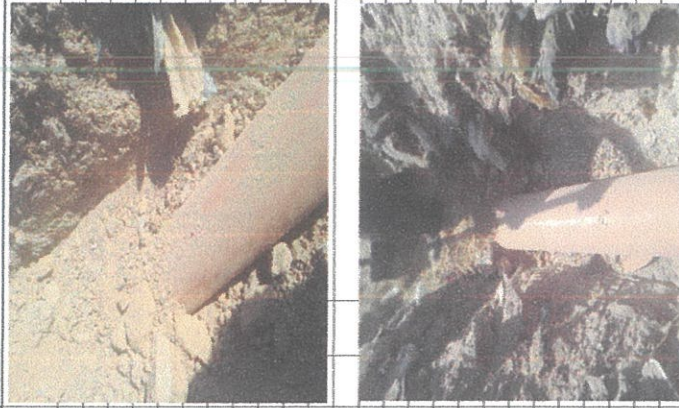

CONTRATISTA
C. ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.

SUPERVISOR
ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

0099



ING. ELIAS MACIAS LEDESMA

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL- NOCHISTLAN DE

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAR. URBANIA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

001001

ESTIMACION

DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2025

FECHA

NOCHISTLAN

UBICACION

NUMEROS GENERADORES Y MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO No.

NOCHISTLAN/202509

CUIDAD:

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

CONCEPTO
Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma cementar, incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución de p.u.o.t.

UNIDAD

mL

LOCALIZACION

ALTO

ANCHO

AREA



LARGO

RESULTADOS

PARCIAL

TOTAL

CROQUIS DE OBRA

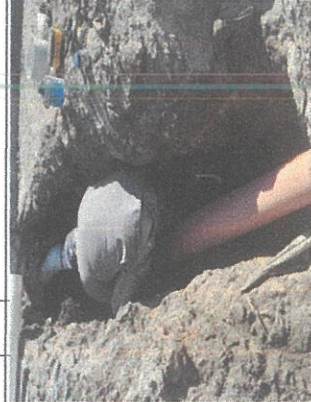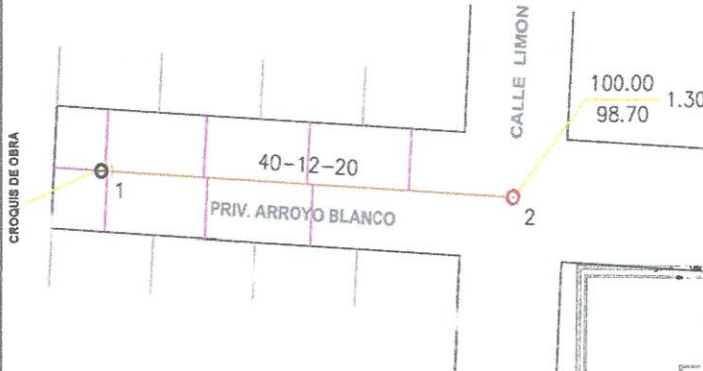


OPERADO
FAISM (FIII)

EJERCICIO 2025

CONTRATISTA
ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.

SUPERVISOR
ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ.

0100

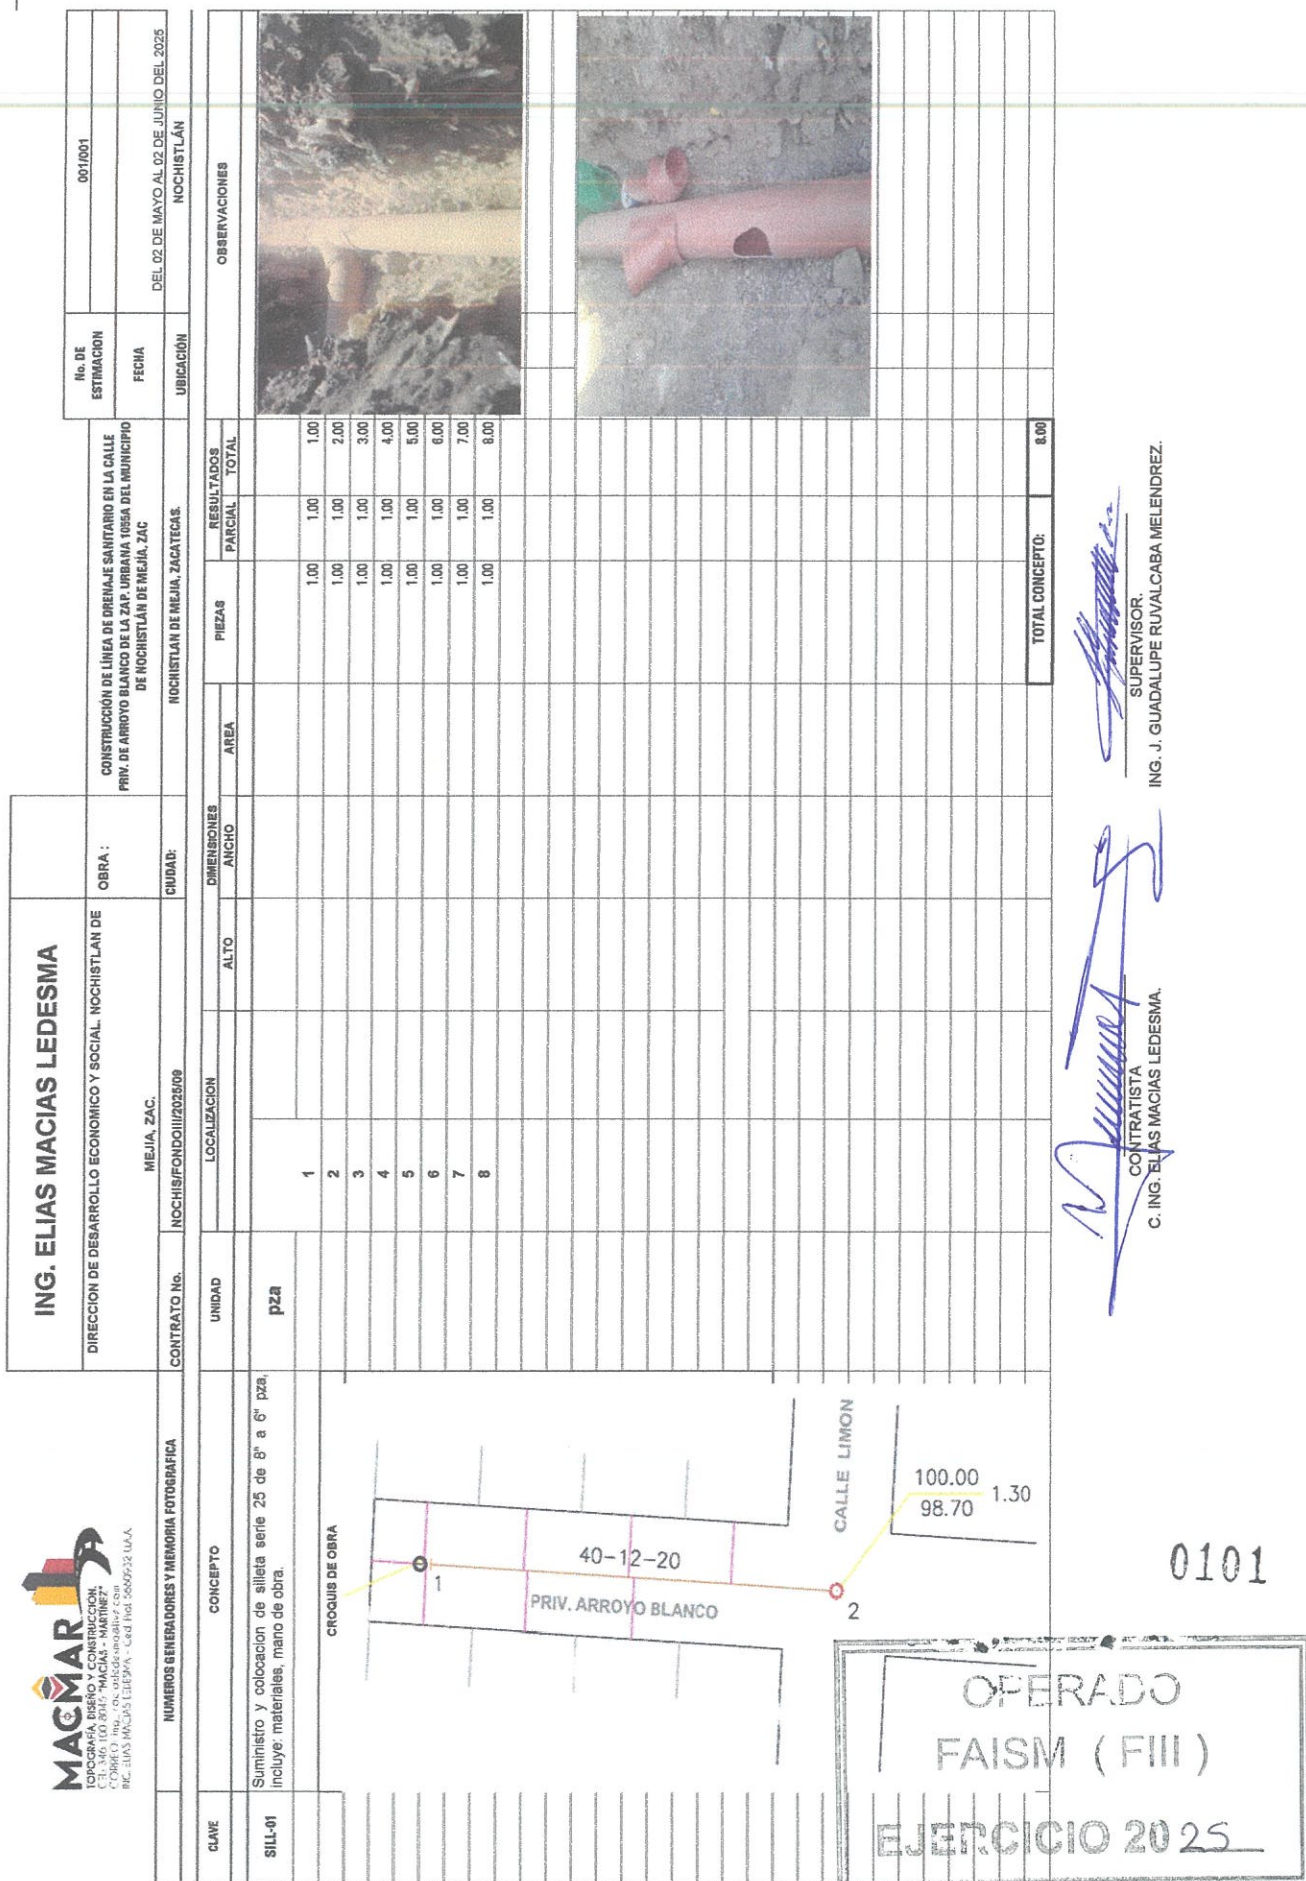

0101

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

SUPERVISOR.
ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.

CONTRATISTA
C. ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.

0102

No. DE ESTIMACION	001/001
FECHA	DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2025
UBICACIÓN	NOCHISTLAN

[illegible]

CONTRATISTA
C. ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.



SUPERVISOR.
ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ

0103

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, NOCHISTLAN DE

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV.
DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC

No. DE	001/001
--------	---------


DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2025

NUMEROS GENERADORES Y MEMORIA FOTOGRAFICA

CONCEPTO
Relleño con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

CROQUIS DE OBRA

DETALLE DE INSTALACION
DE TUBERIA CON ZANJA

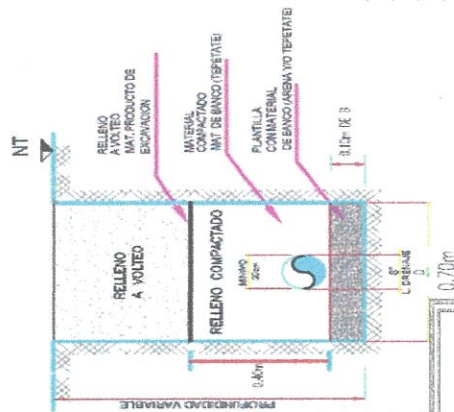

OFERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2021

0106


CONTRATISTA
C. ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.


SUPERVISOR.
ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ

[illegible]



C. ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

ACUMULADO DE ESTIMACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1066A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC													ESTIMACION No.		001/001		DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2025						
OBRA		CIUDAD		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.		CONTRATISTA		ING. ELIAS MACIAS LEDESMA		No. DE CONTRATO		NOCHIS/FONDOIII/2025/09		MONTO CONTRATADO		CONCEPTO:		UBICACION		ACUMULADO DE ESTIMACIONES		NOCHISTLAN	
PAQ. No.	CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACIONES ANTERIORES		EST 1	EST 2	EST 3	EST 4	CANTIDAD POR ESTIMAR	IMPORTE ESTIMACION									
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1066A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.																							
PRELIMINARES																							
01-RSD	Trazo y nivelación de ejes para líneas de drenaje con equipo topográfico, incluye: equipo necesario, señalización del banco, puntos, distancias, angulosos y cotas que se requieran en la nivelación con pintura y nivelaciones necesarias.		ml	40.00	\$ 24.57	\$ 982.80	0.0000		40.00				0.0000	\$ 982.80	SUBTOTAL		\$		982.80				
TERRACERIAS																							
RETR-460	Excavación por medios mecánicos en terreno Tipo I zona A en cepa o zanja, hasta una profundidad de 0 a 2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.		m3	82.32	104.72	\$ 8,620.55	0.0000		82.32				0.0000	\$ 8,620.55	SUBTOTAL		\$		24,262.91				
04	Cana de tepalcate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye: material, mano de obra y herramienta.		m3	6.16	363.61	\$ 2,239.84	0.0000		6.16				0.0000	\$ 2,239.84	SUBTOTAL		\$		2,239.84				
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavación, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con		m3	82.32	127.59	\$ 10,503.21	0.0000		82.32				0.0000	\$ 10,503.21	SUBTOTAL		\$		10,503.21				
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se consideran (2 km)		m3/Km	164.64	17.61	\$ 2,899.31	0.0000		164.64				0.0000	\$ 2,899.31	SUBTOTAL		\$		28,417.28				
MATERIALES																							
070208-1	Tubo pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.		m	40	282.26	\$ 11,290.40	0.0000		40.00				0.0000	\$ 11,290.40	SUBTOTAL		\$		11,290.40				
070211	Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma cementar, incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución de p.u.o.t.		m	48.00	210.93	\$ 10,124.64	0.0000		48.00				0.0000	\$ 10,124.64	SUBTOTAL		\$		10,124.64				
SILL-01	Suministro y colocación de silleta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye: materiales, mano de obra.		pza	8.00	442.78	\$ 3,542.24	0.0000		8.00				0.0000	\$ 3,542.24	SUBTOTAL		\$		3,542.24				
071005	Codo 45° pvc sanitario serie 25 de 6" incluye:materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución del p.u.o.t.		pza	8.00	294.94	\$ 2,359.52	0.0000		8.00				0.0000	\$ 2,359.52	SUBTOTAL		\$		2,359.52				
071311	obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.		pza	3.00	149.11	\$ 447.33	0.0000		3.00				0.0000	\$ 447.33	SUBTOTAL		\$		447.33				
070508-01	Reducción pvc sanitario cementar 6" x 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.		pza	5.00	130.63	\$ 653.15	0.0000		5.00				0.0000	\$ 653.15	SUBTOTAL		\$		653.15				

ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ
SUPERVISOR

RECIBIDO
FACSA (FIII)
20 25

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA
CONTRATISTA




DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

ACUMULADO DE ESTIMACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1056A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC												
OBRA		ESTIMACION No.		001/001								
CIUDAD		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.		DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2025								
CONTRATISTA		ING. ELIAS MACIAS LEDESMA		1								
No. DE CONTRATO		NOCHIS/FONDOIII/2025/09		ACUMULADO DE ESTIMACIONES								
MONTO CONTRATADO		89,474.64		NOCHISTLAN								
PAQ. No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACIONES ANTERIORES	EST 1	EST 2	EST 3	EST 4	CANTIDAD POR ESTIMAR	IMPORTE ESTIMACION
RELLENOS												
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pisón de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de	m3	24.64	319.14	\$ 7,863.61	0.0000	24.64				0.0000	\$ 7,863.61
020116	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	51.52	130.88	\$ 6,742.94	0.0000	51.52				0.0000	\$ 6,742.94
SUBTOTAL												\$ 14,806.55
OBRAS CONEXAS												
170401	Pozo de visita con tapa brocal de concreto, de 0.90 x 1.30 mts de profundidad con muro de tabique rojo de 8 x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizon desplantado sobre firme de concreto de f'c=150 Kg/cm2, juntado y aplastado interior con mortero 1:4, sin excavación.	m3	1.00	8863.77	\$ 8,863.77	0.0000	1.00				0.0000	\$ 8,863.77
SUBTOTAL												\$ 8,863.77

IMPORTE:	\$	77,133.31
IVA 16% :	\$	12,341.33
TOTAL :	\$	89,474.64



0109

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA
CONTRATISTA

ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ
SUPERVISOR

El presente documento es una copia de la original, el cual se encuentra en poder de la Contratación Pública, por lo que se declara que las obras ejecutadas y reconocidas en la presente estimación, se reciben toda vez que han sido supervisadas y coalejadas bajo mi responsabilidad, de acuerdo a las especificaciones pactadas en los anexos técnicos del contrato referido, aceptando expresamente la responsabilidad civil, penal y profesional en la que incurro como Supervisor o Gerente de Obra o Director de Plaza, al asentar y aceptar obras sin la calidad especificada o falsedad con respecto a los avances en la ejecución de la misma, dado que esto representa un quebranto patrimonial para la Empresa.

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

No. REPORTE :	1
FECHA REPORTE :	12/05/25

DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE:		CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN L CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA,ZAC.	
UBICACIÓN :		NOCHISTLAN	
TIPO DE OBRA :		CONSTRUCCION	
MODALIDAD EJEC.:		CONTRATO	
No. CONTRATO :	NOCHIS/FONDOIIII/2025/09		
EMPRESA :	ING ELIAS MACIAS LEDESMA		
MONTO CONTRATO :	\$89,474.64		
FECHA CONTRATO :	02 DE MAYO DE 2025		
MONTO ANTICIPO :	S/A		
FECHA PAGO ANTICIPO :	N/A		
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A		
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A		
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A		
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERMA.	
FECHAS PROGRAMADAS:	2-may-25	21-jun-24	
FECHAS REALES:			
FECHAS REPROGRAMADAS:			

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA													
MESES													
		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		DÍAS	% EN BASE TIEMPO		
PARTIDAS	IMPORTES												
PRELIMINARES	\$982.80											2	6.25
TERRACERIAS	\$24,262.81											5	15.63
MATERIALES	\$28,417.28											5	15.63
RELLENOS	\$14,606.55											5	15.63
OBRAS CONEXAS	\$8,863.77											5	15.63
												5	15.63
												5	15.63

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ

ENCARGADO DE LA DIRECCION :
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO Q.

0110

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

INFORME FOTOGRÁFICO



0111

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN L CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN
02 DE MAYO DE 2025 - 02 DE JUNIO DE 2025
domingo, 12 de mayo de 2024
20.00%

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Nº. REPORTE : 2
FECHA REPORTE : 13/05/25

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN L CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA.ZAC.

UBICACIÓN : NOCHISTLAN
TIPO DE OBRA : CONSTRUCCION

MODALIDAD E.JEC.: CONTRATO

Nº. CONTRATO : NOCHIS/FOND011/2025/08

EMPRESA : ING ELIAS MACIAS LEDESMA

MONTO CONTRATO : \$89,474.64

FECHA CONTRATO : 03 DE MAYO DE 2025

MONTO ANTICIPO : S/A

FECHA PAGO ANTICIPO : N/A

Nº. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A


PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO 2-may-25

FECHAS PROGRAMADAS: 2-jun-24

FECHAS REALES: 2-jun-24


FECHAS REPROGRAMADAS: 2-jun-24

OBSERVACIONES



RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN :
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO Q.

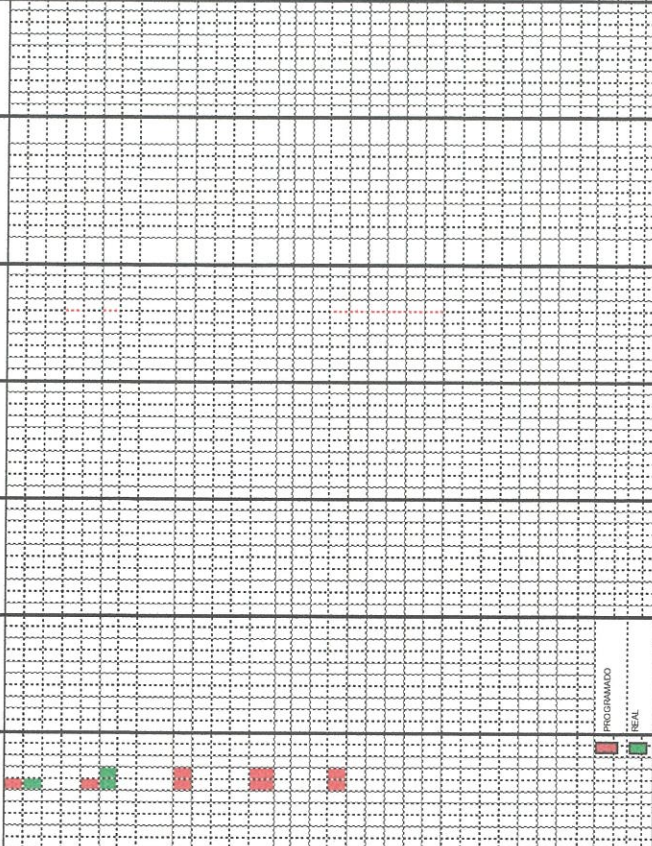PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA										DIAS	% EN BASE TIEMPO
PARTIDAS	IMPORTES	M E S E S									
		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			
PRELIMINARES	\$982.80									2	6.25
TERRACERIAS	\$24,262.91									5	15.63
MATERIALES	\$26,417.28									5	15.63
RELLENOS	\$14,606.55									5	15.63
OBRAS CONEXAS	\$8,863.77									5	15.63
SUB-TOTAL	\$77,133.31										
16% I.V.A.	\$12,341.33										
TOTAL	\$89,474.64									32	TOTAL DE DIAS NATURALES EN BASE AL PROGRAMA DE OBRA

INFORME FOTOGRÁFICO



0113

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN L CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA
ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN
02 DE MAYO DE 2025 - 02 DE JUNIO DE 2025
martes, 13 de mayo de 2025
40.00%

GERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

No. REPORTE :	3
FECHA REPORTE :	14/05/25

DATOS DE LA OBRA			
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZONA ZA. URBANA 165A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC			
NOMBRE:			
UBICACIÓN :	NOCHISTLAN		
TIPO DE OBRA :	CONSTRUCCION		
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO		
No. CONTRATO :	NOCHIS/FONDOII/17/2025/08		
EMPRESA :	ING ELIAS MACIAS LEDESMA		
MONTO CONTRATO :	\$89,474.64		
FECHA CONTRATO :	03 DE MAYO DE 2025		
MONTO ANTICIPO :	S/A		
FECHA PAGO ANTICIPO :	N/A		
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A		
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A		
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A		
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERM.	
FECHAS PROGRAMADAS:	2-may-25	2-jun-24	
FECHAS REALES:			
FECHAS REPROGRAMADAS:			

OBSERVACIONES	

OPERADO
FAISM (FIIL)
EJERCICIO 2025

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:

NG: JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ

0114

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												FINANCIERO		0	0	0
			M E S E S							DÍAS	% EN BASE TIEMPO					
PARTIDAS	IMPORTES	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE								
PRELIMINARES	\$982.80									2	6.25					
										5	15.63					
TERRACERIAS	\$24,262.91															
										5	15.63					
MATERIALES	\$28,417.28															
										5	15.63					
RELLENOS	\$14,606.55															
										5	15.63					
OBRAS CONEXAS	\$8,863.77															
										5	15.63					
										5	15.63					

ENCARGADO DE LA DIRECCION :
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO Q.

INFORME FOTOGRÁFICO



0115

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE
LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN

02 DE MAYO DE 2025 - 02 DE JUNIO DE 2025

miércoles, 14 de mayo de 2025

46.00%

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

No. REPORTE : 4
FECHA REPORTE : 15/05/25

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZONA ZA. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA,ZAC

NOMBRE:

UBICACIÓN : NOCHISTLAN
TIPO DE OBRA : CONSTRUCCION
MODALIDAD EJEC.: CONTRATO

No. CONTRATO : NOCHIS/FOND011/2025/08

EMPRESA : ING ELIAS MACIAS LEDESMA

MONTO CONTRATO : \$89,474.64

FECHA CONTRATO : 03 DE MAYO DE 2025

MONTO ANTICIPO : S/A

FECHA PAGO ANTICIPO : N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A


PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO 2-may-25

FECHAS PROGRAMADAS: 2-jun-24

FECHAS REALES: OBSERVACIONES

REAL		PROGRAMADO	
% AVANCES FÍSICO	50	% AVANCES FINANCIERO	0

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA										DÍAS	% EN BASE TIEMPO
M E S E S											
		FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0		
PARTIDAS	IMPORTES	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			
PRELIMINARES	\$982.80									2	6.25
TERRACERIAS	\$24,262.91									5	15.63
MATERIALES	\$28,417.28									5	15.63
RELLENOS	\$14,606.55									5	15.63
OBRAS CONEXAS	\$8,863.77									5	15.63



RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ


ENCARGADO DE LA DIRECCION :
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO Q.

0116



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

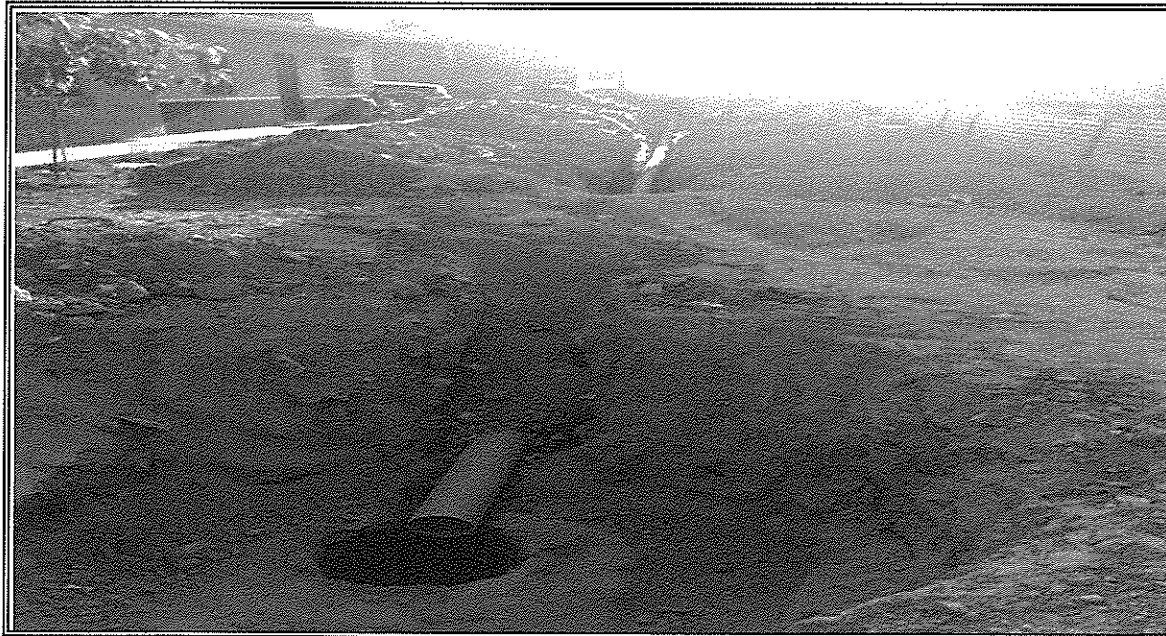

0117

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN L CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE
LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA


PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN

02 DE MAYO DE 2025 - 02 DE JUNIO DE 2025

jueves, 15 de mayo de 2025

50.00%



INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANICO Y SOCIAL

No. REPORTE :	5
FECHA REPORTE :	15/05/25

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZONA ZA. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC

UBICACIÓN : NOCHISTLAN
TIPO DE OBRA : CONSTRUCCION

MODALIDAD E.JEC.: CONTRATO

No. CONTRATO : NOCHIS/FONDOI/II/2025/08

EMPRESA : ING ELIAS MACIAS LEDESMA

MONTO CONTRATO : \$89,474.64

FECHA CONTRATO : 03 DE MAYO DE 2025

MONTO ANTICIPO : S/A

FECHA PAGO ANTICIPO :

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO TERM.

FECHAS PROGRAMADAS: 2-may-25 21-jun-24

FECHAS REALES:


FECHAS REPROGRAMADAS:

OBSERVACIONES

% AVANCES		REAL		PROGRAMADO	
FÍSICO	FINANCIERO	55	0	55	0

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA

M E S E S

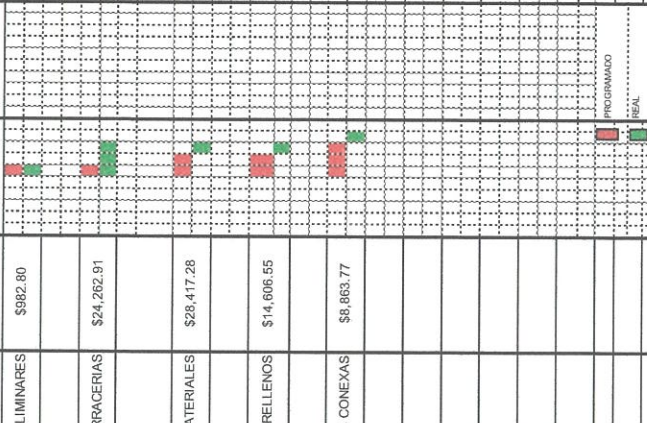PARTIDAS	IMPORTES	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			
PRELIMINARES	\$982.80									2	6.25
TERRACERIAS	\$24,262.91									5	15.63
MATERIALES	\$28,417.28									5	15.63
RELLENOS	\$14,606.55								5	15.63	
OBRAS CONEXAS	\$8,863.77								5	15.63	
									5	15.63	
									5	15.63	
										</	

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDEZ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN:
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO Q.



0118

INFORME FOTOGRÁFICO




0119

**CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO
DE LA ZONA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.**

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN
02 DE MAYO DE 2025 - 02 DE JUNIO DE 2025
viernes, 16 de mayo de 2025
55.00%



INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE :	6
FECHA REPORTE :	19/05/25

DATOS DE LA OBRA		
NOMBRE:	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZONA ZA. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA,ZAC	
UBICACION :	NOCHISTLAN	
TIPO DE OBRA :	CONSTRUCCION	
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO	
No. CONTRATO :	NOCHIS/FONDOIII/2025/08	
EMPRESA :	ING ELIAS MACIAS LEDESMA	
MONTO CONTRATO :	\$89,474.64	
FECHA CONTRATO :	03 DE MAYO DE 2025	
MONTO ANTICIPO :	S/A	
FECHA PAGO ANTICIPO :	N/A	
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A	
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A	
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A	
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERM.
FECHAS PROGRAMADAS:	2-mar-25	2-jun-24
FECHAS REALES:		
FECHAS REPROGRAMADAS:		

OBSERVACIONES

[illegible]

RESIDENTE DE SUBDIVISIÓN:

ENCARGADO DE LA DIRECCION :
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO Q.

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 25

INFORME FOTOGRÁFICO



0121

**CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO
DE LA ZONA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.**

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA


PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN

02 DE MAYO DE 2025 - 02 DE JUNIO DE 2025

lunes, 19 de mayo de 2025

70.00%



INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

No. REPORTE :	7	
FECHA REPORTE :	23/05/25	
DATOS DE LA OBRA		
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZONA 4A. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC		
NOMBRE:		
UBICACIÓN :	NOCHISTLAN	
TIPO DE OBRA :	CONSTRUCCION	
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO	
No. CONTRATO :	NOCHIS/FOND011/2025/08	
EMPRESA :	ING ELIAS MACIAS LEDESMA	
Monto CONTRATO :	\$89,474.64	
FECHA CONTRATO :	03 DE MAYO DE 2025	
Monto ANTICIPO :	S/A	
FECHA PAGO ANTICIPO :	N/A	
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A	
Monto AMPL. CONTRATO:	N/A	
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A	
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERM.
FECHAS PROGRAMADAS:	2-may-25	2-jun-24
FECHAS REALES:		
FECHAS REPROGRAMADAS:		

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA																						
FINANCIERO 0 0 0																						
M E S E S																						
				MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DIAS		% EN BASE TIEMPO		
PARTIDAS		IMPORTES																				
PRELIMINARES		\$982.80																	2		6.25	
TERRACERIAS		\$24,262.91																	5		15.63	
MATERIALES		\$28,417.28																	5		15.63	
RELLENOS		\$14,606.55																	5		15.63	
OBRAS CONEXAS		\$8,863.77																	5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5		15.63	
																			5			


RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:

ENCARGADO DE LA DIRECCION :
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO Q.

OPERADO
FAISM (FIIR)
EJERCICIO 2025

0122

INFORME FOTOGRÁFICO

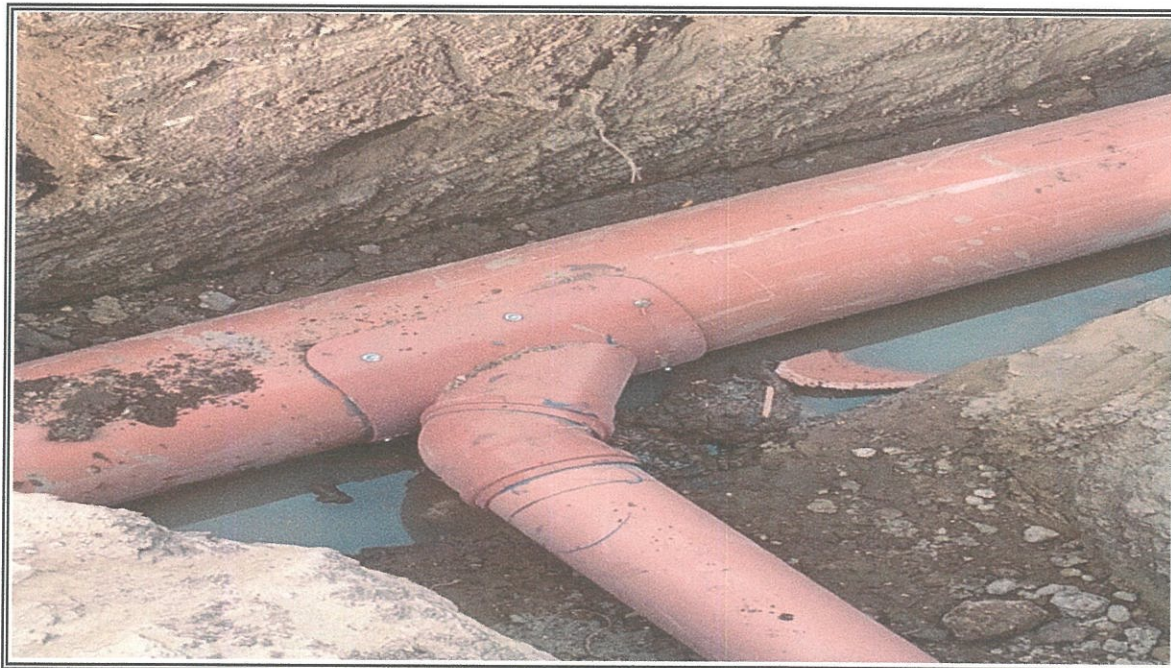

0123

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO
DE LA ZONA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN

02 DE MAYO DE 2025 - 02 DE JUNIO DE 2025

viernes, 23 de mayo de 2025

90.00%

OPERADO
FAISM (FIH)
EJERCICIO 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

No. REPORTE :		8
FECHA REPORTE :		30/05/25

DATOS DE LA OBRA		
NOMBRE:	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITRIO DE LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZONA ZA. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	
UBICACIÓN :	NOCHISTLAN	
TIPO DE OBRA :	CONSTRUCCIÓN	
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO	
No. CONTRATO :	NOCHIS/FONDOI/III/2025/08	
EMPRESA :	ING ELIAS MACIAS LEDESMA	
MONTO CONTRATO :	\$89,474.64	
FECHA CONTRATO :	03 DE MAYO DE 2025	
MONTO ANTICIPO :	S/A	
FECHA PAGO ANTICIPO :	N/A	
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A	
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A	
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A	
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERM.
FECHAS PROGRAMADAS:		
FECHAS REALES:	2-may-25	2-jun-24
FECHAS REPROGRAMADAS:		

[illegible]

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ

ENCARGADO DE LA DIRECCION :
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO Q.

0124

OPERADO
FAISM (FIH)
EJERCICIO 2025

INFORME FOTOGRÁFICO



0125

**CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO
DE LA ZONA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.**

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN

02 DE MAYO DE 2025 - 02 DE JUNIO DE 2025

viernes, 30 de mayo de 2025

100.00%

**OPERADO
FAISM (FIII)**

EJERCICIO 2025



ARCHIVO FOTOGRAFICO: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC."





0127

J. RA
 S. MA (- J)
 F. CICIO 2025

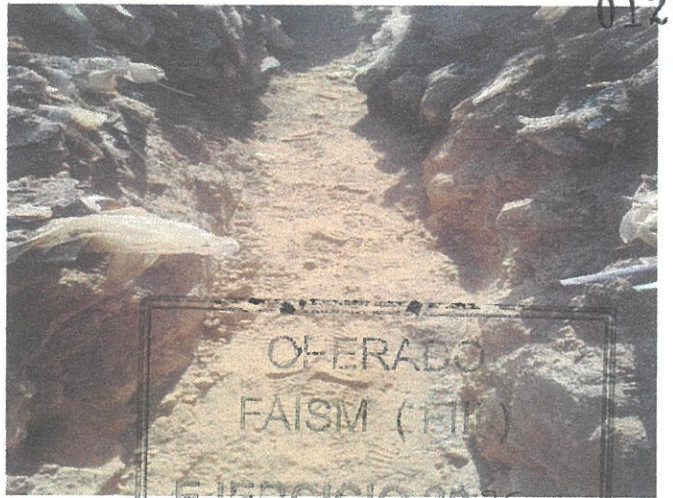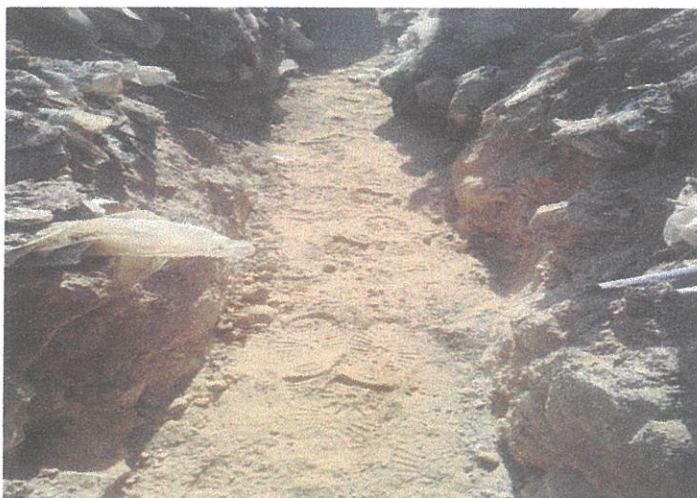


0128

OPERADO
 FAISM (FIA)
 EJERCICIO 2025



0129

OTRADO
 MSM (C)
 EJERCICIO 025

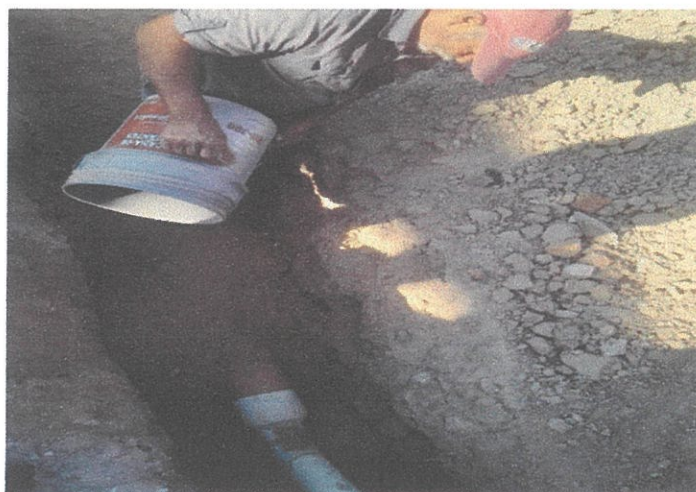



OPERADO
 FAISM (FII)
 EJERCICIO 2025



OPERADO
 FAISM (FIII)

FECHA DE EJECUCIÓN 2025 0132



EJERCICIO 20 25

ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA



NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC. 02 DE JUNIO DE 2025.
ASUNTO: TÉRMINO DE OBRA.

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.
PRESENTE


Por medio de la presente y en relación al contrato No. NOCHIS/FONDOIII/2025/09 que ampara la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC." con un importe de \$89,474.64 ((OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 64/100), le informa a usted que con fecha 02 DE JUNIO DE 2025 SE TERMINAN EN TIEMPO Y FORMA LOS TRABAJOS del contrato antes mencionado, agotando todos los volúmenes del catálogo de conceptos contratado.

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC."

MONTO DE CONTRATO: \$ 89,474.64

PLAZO DE EJECUCION: DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2025.


Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo de antemano la atención prestada.



ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA.
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"

0134

c.c.p. PARA ARCHIVO.



ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA



NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC. 02 DE JUNIO DE 2025.
ASUNTO: CARTA GARANTÍA DE OBRA.

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.
PRESENTE

CARTA GARANTÍA POR 1 AÑO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

Por medio de la presente carta de garantía, la empresa **MAC-MAR CONSTRUCCIONES** con registro federal de contribuyentes **MALE 8508043F9**, domicilio ubicado en **HIPOLITO PUENTES # 9** del municipio de Nochistlán de Mejía Zacatecas, asume completa responsabilidad y obligación solidaria para cubrir cualquier obligación de pago, en relación al contrato No. **NOCHIS/FONDOIII/2025/09** con un importe de **\$ 89,474.64 (OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 64/100)**, con un periodo de ejecución **DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2025** cebrado con en **H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA**.

Por este medio ratifico, en representación de **ELIAS MACIAS LEDESMA**, el garante del contrato **NOCHIS/FONDOIII/2025/08** y declaro de manera irrevocable, que **ELIAS MACIAS LEDESMA**, se hará responsable de cubrir y solventar cualquier falla generada en dicha obra.


Por lo antes mencionado de deja en garantía al municipio el número de cheque **0000002** por la cantidad de **\$ 8,947.46** a nombre del **MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA**, el cual corresponde al **10 %** de la obra total; garantizando en su totalidad los trabajos realizados en dicha obra por un año, a partir del termino de los trabajos de la obra.

Se anexa el cheque de garantía de los trabajos.


ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"

0135

c.c.p. PARA ARCHIVO.



BBVA

97015495

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 02/JUNIO/2025

Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas \$ 8,947.46

CON
LETRA

Ocho mil Nooveientos Cuarenta y Siete Pesos 46/100 Moneda Nacional

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

ELIAS MACIAS LEDESMA

RFC: MALE2508043F9

OFICINA: 3966 NOCHISTLAN CENTRO

No DE CUENTA: 00482933195

NOCHISTLAN, ZAC.

Firma (s)

5598:519460172:00482933195:0000002

CUENTA No.

CHEQUE No.

0136'



ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA



NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC. 02 DE JUNIO DE 2025.

ACTA ENTREGA-RECEPCION

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.
PRESENTE


HAGO REFERENCIA AL CONTRATO NOCHIS/FONDOIII/2025/09 RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC." DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025 CELEBRADO CON ESA DEPENDENCIA A SU DIGNO CARGO.

DATOS DE LA OBRA.

MONTO: \$ 89,474.64
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.
CONTRATISTA: ING. ELIAS MACIAS LEDESMA
UBICACIÓN DE LA OBRA: NOCHISTLAN.
FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TÉRMINO: 02 DE JUNIO DE 2025.
NO. DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2025/09
PROGRAMA: FONDO III

CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA EN MENCIÓN POR PARTE DEL ING. ELIAS MACIAS LEDESMA AL REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS/COMITÉ DE OBRA, PARA LO CUAL SE HA REALIZADO LA SUPERVISIÓN HACIENDO UN RECORRIDO CORRESPONDIENTE DE OBRA POR AMBAS PARTES CONSTATANDO QUE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO CONTRATADO HAN SIDO EJECUTADOS, ASÍ MISMO QUE LOS MATERIALES UTILIZADOS Y LOS TRABAJOS EN GENERAL SON DE BUENA CALIDAD.

POR LO ANTERIORMENTE CITADO FIRMAN DE CONFORMIDAD Y ENTERA SATISFACCION LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTANCIAS PARTICIPANTES CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS FINES QUE HAYA A LUGAR.


ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"


REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS.
COMITÉ DE OBRA.

0137



ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA



NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC. 02 DE JUNIO DE 2025.

ACTA ENTREGA-RECEPCION

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.
PRESENTE

HAGO REFERENCIA AL CONTRATO **NOCHIS/FONDOIII/2025/09** RELATIVO A LA OBRA
"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO
BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC."
DE FECHA **02 DE MAYO DE 2025** CELEBRADO CON ESA DEPENDENCIA A SU DIGNO
CARGO.

DATOS DE LA OBRA.


MONTO: \$ 89,474.64
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.
CONTRATISTA: ING. ELIAS MACIAS LEDESMA
UBICACIÓN DE LA OBRA: NOCHISTLAN.
FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TÉRMINO: 02 DE JUNIO DE 2025.
NO. DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2025/09
PROGRAMA: FONDO III

CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA EN MENCIÓN POR
PARTE DEL **ING. ELIAS MACIAS LEDESMA** A LA **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE**
NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS, PARA LO CUAL SE HA REALIZADO LA SUPERVISIÓN
CORRESPONDIENTE POR AMBAS PARTES CONSTATANDO QUE LA TOTALIDAD DE LOS
CONCEPTOS, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO
CONTRATADO HAN SIDO EJECUTADOS, ASÍ MISMO QUE LOS MATERIALES UTILIZADOS Y
LOS TRABAJOS EN GENERAL SON DE BUENA CALIDAD.

POR LO ANTERIORMENTE CITADO FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS REPRESENTANTES DE
LAS INSTANCIAS PARTICIPANTES CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS
FINES QUE HAYA A LUGAR.


C. JOSÉ MANUEL JIMENEZ FUENTES.
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO


ING. ELIAS MACIAS LEDESMA
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

0138

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

Ejercicio 2025

FECHA DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION:

02 DE MAYO 2025

DATOS GENERALES:

FONDO: **III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social Municipal.**

NO. DE PROYECTO: **402004**

ESTADO: **032 Zacatecas**

PROGRAMA: **ORD. AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO**

MUNICIPIO: **034: Nochistlán de Mejía**

NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA
YO ACCIÓN:

LOCALIDAD: **NOCHISTLAN DE MEJIA**

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

METAS

CUMPLIDAS:

FECHA REAL INICIO:

02 MAYO 2025

FECHA REAL TERMINACION:

02 JUNIO 2025

Firmar al calce

Página 1

0139



ESTRUCTURA FINANCIERA:

	TOTAL	F.I.S.M.	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
INVERSIÓN APROBADA	\$89,474.64	\$89,474.64	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA	\$89,474.64	\$89,474.64	0.00	0.00	0.00

MODALIDAD DE EJECUCION: C(X) AC () AM () AD () M() EQ()

En el municipio de: **NOCHISTLAN DE MEJIA** siendo las 12 :00 HRS. Del día: **02 DE MAYO DEL 2025**

los C, **MANUEL JIMENEZ FUENTES** PRESIDENTE MUNICIPAL; **LIC. MARIA DEL ROCIO SANDOVAL AVELAR**, SINDICA MUNICIPAL, **ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA**, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; **LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ** SECRETARIO DE GOBIERNO, **C. SERGIO HINOJOZA PEREZ** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, y representantes de las diferentes dependencias que intervienen para efectuar y dar constancia de la **entrega-recepción de la obra**, descrita en la parte superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la ley de adquisiciones y obras públicas y 49 de su reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente trizada y operando de acuerdo a la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto, en condiciones de ser recibida por la unidad de su operación (comité o dependencia que se encargará en lo sucesivo de su conservación y mantenimiento).

La presente acta no exime al ejecutor de la obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en ella y se obliga por la presente a corregir la deficiencia detectada sin costo para la federación.

El H. Ayuntamiento representado por el **C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES**, por este medio y este momento hace la entrega a los **Integrantes del Comité de obra**, quien será la entidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quienes reciben de conformidad los que en ella intervienen firmando al calce.

Firmar al calce

Página 2

0140



d Rosatio Villalobos P

Romeira P.S

J. Carlos Lopez A.

Miguel Alonzo

POR EL MUNICIPIO
ENTREGAN:

Manuel Jimenez J

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C, JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES,

RECIBEN LA OBRA:

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

VOCAL DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

J. Carlos LOPEZ A

Romelia P.S

L. ROSARIO VILLALOBOS TESTIGOS:

Miguel ALONZO

Firmar al calce

0141

Página 3



ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA



NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC. 02 DE JUNIO DE 2025.
ASUNTO: ENTREGA DE FINIQUITO DE OBRA.

ING. JOSÉ GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.
SUPERVISOR DE OBRA
PRESENTE

AT'N: ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

Por medio de la presente y manera más atenta me dirijo a usted para solicitarle la revisión y aprobación del FINIQUITO DE OBRA en relación al contrato NO. NOCHIS/FONDOIII/2025/09 que ampara la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC." con un importe de \$ 89,474.64 (OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 64/100), que amparan los trabajos contratados.


sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo de antemano la atención prestada.



ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA.
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"

0142

c.c.p. PARA ARCHIVO.





DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

FINIQUITO

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC		
CIUDAD	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.		
CONTRATISTA	ING. ELIAS MACIAS LEDESMA		
No. DE CONTRATO	NOCHIS/FONDOIII/2025/09		
UBICACIÓN	NOCHISTLÁN		
MONTO CONTRATADO	\$ 89,474.64		
ESTIMACION No.	FINIQUITO		
FECHA	DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2025		

ESTADO DE CUENTA

A.- ESTIMACIONES

		\$	%
A1	Monto del contrato	\$ 89,474.64	100.00
A2	Estimaciones anteriores	89,474.64	100.00
A3	Esta estimación (SUBTOTAL)	-	0.00
A4	IVA 16%	-	0.00
A5	Total estimado	\$ 89,474.64	100.00
A6	Por estimar	0.000	0.00

RETENCIONES

B.- ANTICIPO

B1	Monto del Contrato	\$ 89,474.64
B2	Porcentaje de anticipo	0.00%
B3	Monto del Anticipo	-
B4	Amortizaciones Anteriores	-
B5	Amortizado en esta estimación	-
B6	Total amortizado	-
B7	Por amortizar	-

C.- FONDO DE GARANTIA

C1	Deducción del -5 al millar	0.50%
C2	Retenido estimaciones anteriores	-
C3	En ésta estimación	-
C4	Total retenido	-
C5	Por retener	-

D.- CANTIDAD POR RETENER POR PRUEBAS DE INSTALACIONES

D1	Pruebas y terminacion de obra	0.00%
D2	Retenido estimaciones anteriores	-
D3	En ésta estimación	-
D4	Total retenido	-

RESUMEN

A3	Esta estimación (SUBTOTAL)	\$ -
B5	Amortizacion de anticipo	-
C3	Fondo de garantia	-
D4	Total de deductivas	-
	Neto a cobrar	0.00

IVA INCLUIDO.

Bajo protesta de decir verdad declaro que las obras ejecutadas y reconocidas en la presente estimación, se reciben toda vez que han sido supervisadas y cotejadas bajo mi responsabilidad; de acuerdo a las especificaciones pactadas en los anexos técnicos del contrato referido, aceptando expresamente la responsabilidad civil, penal y profesional en la que incurro como Supervisor o Gerente de Obra o Director de Plaza, al asentar y aceptar obras sin la calidad especificada o falsedad con respecto a los avances en la ejecución de la misma, dado que esto representa un quebranto patrimonial para la Empresa.

CONTRATISTA
C. ING. ELIAS MACIAS LEDESMA

ENCARGADO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

SUPERVISOR
ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.



0143



CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1066A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC										ESTIMACIÓN No.		001/001	
OBRA		CUIDAD		NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.		FECHA		DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2025					
CONTRATISTA		ING. ELIAS MACIAS LEDESMA											
No. DE CONTRATO		NOCHISIFOND00III/2025/09								FINIQUITO DE OBRA			
MONTO CONTRATADO		\$		89,474.64						NOCHISTLÁN			
PAQ.	No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO CONTRATADO	IMPORTE CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO EJECUTADO	IMPORTE EJECUTADO	CANTIDAD POR EJECUTAR	IMPORTE POR EJECUTAR		
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1066A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.													
PRELIMINARES													
01-RED		Trazo y nivelación de ejes para líneas de drenaje con equipo topográfico, incluye: equipo necesario, señalización del buco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requieran en la nivelación con pintura y nivelaciones necesarias.	ml	40.00	\$ 24.57	\$ 982.80	40.00	\$ 24.57	\$ 982.80	0.0000	0.00		
TERRACERIAS													
RETR-450		Excavación por medios mecánicos en terreno Tipo I zona A en cepa o zanja, hasta una profundidad de 0 a - 2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	82.32	104.72	\$ 8,620.55	82.32	\$ 104.72	\$ 8,620.55	0.0000	0.00		
04		Cana de tepiate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye: material, mano de obra y herramienta.	m3	6.16	363.61	\$ 2,239.84	6.16	\$ 363.61	\$ 2,239.84	0.0000	0.00		
010818		Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavación, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, Kilómetros	m3	82.32	127.59	\$ 10,503.21	82.32	\$ 127.59	\$ 10,503.21	0.0000	0.00		
ACAR-02		subsecuentes, se consideraran (2 km)	m3/Km	164.64	17.61	\$ 2,899.31	164.64	\$ 17.61	\$ 2,899.31	0.0000	0.00		
MATERIALES													
070206-1		Tubo pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	40	282.26	\$ 11,290.40	40.00	\$ 282.26	\$ 11,290.40	0.0000	0.00		
070211		Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma cementar, incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución de p.u.o.t.	m	48.00	210.93	\$ 10,124.64	48.00	\$ 210.93	\$ 10,124.64	0.0000	0.00		
SILL-01		Suministro y colocación de sileta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye: materiales, mano de obra.	pza	8.00	442.78	\$ 3,542.24	8.00	\$ 442.78	\$ 3,542.24	0.0000	0.00		
071005		Codo 45° pvc sanitario serie 25 de 6" incluye:materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	8.00	294.94	\$ 2,359.52	8.00	\$ 294.94	\$ 2,359.52	0.0000	0.00		
071311		Tapón pvc sanitario 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	3.00	149.11	\$ 447.33	3.00	\$ 149.11	\$ 447.33	0.0000	0.00		
070808-01		Reducción pvc sanitario cementar 6" x 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	5.00	130.63	\$ 653.15	5.00	\$ 130.63	\$ 653.15	0.0000	0.00		
RELLENOS													
SUBTOTAL													

ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ
SUPERVISOR

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA
CONTRATISTA




DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1056A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC				ESTIMACION No.	001/001
CIUDAD	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.				FECHA	DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2025
CONTRATISTA	ING. ELIAS MACIAS LEDESMA				FINIQUITO DE OBRA	
No. DE CONTRATO	NOCHIS/FOND0311/2025/09				NOCHISTLAN	
Monto CONTRATADO	\$ 89,474.64					
10	Relleno para acondillado de tubería con material de banco (lepetate) compactado con pisón de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	24.64	319.14	\$ 7,863.61	0.00
000116	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	51.52	130.88	\$ 6,742.94	0.00
OBRAS CONEXAS						0.00
170401	Pozo de visita con tapa brosal de concreto, de 0.90 x 1.30 mts de profundidad con muro de tabique rojo de 8 x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizon desplantado sobre firme de concreto de f'c=150 Kg/cm2 junteado y aplandado interior con mortero 1:4, sin excavación.	m3	1.00	8863.77	\$ 8,863.77	0.00
SUBTOTAL						0.00
						0.00

TOTALES : 0.00 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaro que las obras ejecutadas y reconocidas en la presente estimación, se reciben toda vez que han sido supervisadas y coleccionadas por el personal de la Empresa, aceptando expresamente la responsabilidad civil, penal y profesional en la que incurro como Supervisor o Gerente de Obra o Director de Plaza, al aseriar y aceptar obras sin la calidad especificada o falsedad con respecto a los avances en la ejecución de la misma, dudo que esto represente un quebranto patrimonial para la Empresa.



0145

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA
CONTRATISTA

ING. J. GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ
SUPERVISOR

ACTA DERECHOS Y OBLIGACIONES

Siendo las **9:00 horas** del día **02 de mayo de 2025**, en el espacio que ocupa la oficina de Desarrollo económico y social, Ubicado en el edificio de la presidencia Municipal marcado con el No. 1, de la calle Hidalgo, esquina con la Plaza Principal en Nochistlán, Zac. Las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, conforme a lo dispuesto en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas con el objeto de llevar a cabo el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones sobre los trabajos ejecutados al amparo del contrato No. **NOCHIS/FONDOIII/2025/09** que suscribieron Desarrollo económico y social el contratista **ING. ELIAS MACIAS LEDESMA**.

ANTECEDENTES

Con fecha **02 mayo de 2025** las partes celebran contrato de Obra Pública con base a Precio Unitario y tiempo determinado identificado con el No. De Contrato: **NOHIS/FONDOIII/2025/09** para llevar a cabo los trabajos de obra: **CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**. Con fecha de iniciación real de los trabajos el día **02 mayo de 2025** y la fecha de terminación real el día **02 de junio del 2025**.

Quedando un monto total contratado de **\$89,474.64** (ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 64/100M.N) Esta cantidad incluye el impuesto al valor agregado.

Durante del proceso de la obra se autorizaron un total de 1 (**una**) estimaciones a precio unitario por trabajos ejecutados por un monto total de **\$89,474.64** (ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 64/100M.N) Esta cantidad incluye el impuesto al valor agregado.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprenden:

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

Operado: FONDO III





RELACIÓN DE ESTIMACIONES PAGADAS POR TRABAJOS EJECUTADOS

Por lo anterior manifiestan las partes que no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

No. de Estimac.	Fecha	Importe Total	Deducciones	Anticipo (Amortización)
1	25 de junio de 2025	\$89,474.64	\$0.00	\$0.00

Sin otro asunto que tratar, se cierra la presente Acta firmado de conformidad las personas que interviene en este acto.

RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA
	
ING. JOSE GUADALUPE RUVALCABA MELENDREZ.	ING. ELIAS MACIAS LEDESMA

0147





FPS 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Siendo el día 04 del mes de Abril del año 2025, a las 12:00 horas, en la localidad Nochistlán del municipio Nochistlán de Mejía de la entidad federativa Zacatecas nos encontramos en la Reunión de Instalación del Comité de Participación Social (CPS) para acordar las obras a financiarse con recursos del FAIS y designar a las personas que integrarán el Comité de Participación Social (CPS) que dará seguimiento y vigilancia a la obra construcción de línea de agua potable, que se ubicará en Arroyo blanco Nochistlán Zel. toda vez que la planeación del proyecto sea validada por Bienestar.

CONSIDERANDOS

Que el fundamento legal aplicable al FAIS se establece en el artículo 33 apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal; artículos 3 y 61 de la Ley General de Desarrollo Social; Lineamientos del FAIS 2025; y artículo 2 fracciones II y V, artículo 4 y 85, fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Que la participación social es el derecho que ejerce la población objetivo del FAIS al participar, en coordinación con los gobiernos municipales, de las demarcaciones territoriales y de las entidades federativas, en la identificación de necesidades de infraestructura social básica, así como en el seguimiento y vigilancia de las obras que se realicen con recursos del Fondo.

Que los gobiernos municipales, de las demarcaciones territoriales y de las entidades federativas deberán promover la participación de la población objetivo en los procesos de identificación de necesidades de infraestructura social básica, así como en el seguimiento y vigilancia de las obras que se realicen con recursos del Fondo, apegándose a lo estipulado en la Guía para la Promoción y Seguimiento de la Participación Social en el FAIS.

Que las actividades de los CPS son realizar visitas a las obras, registrar el seguimiento de las obras mediante el correcto llenado de los Formatos de Participación Social vigentes e informar los avances y la conclusión de las obras a la ciudadanía.

ACUERDO ÚNICO

Se declara formalmente instalado el Comité de Participación Social conformado por las personas que al calce de este documento firman en conjunto con la persona enlace del FAIS.

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO <u>LOPEZ</u>	SEGUNDO APELLIDO <u>Hinososa</u>	NOMBRE <u>Juan Carlos</u>	FIRMA O HUELLA
CURP <u>LOHJ780618 HZSPNN07</u>	NÚMERO DE TELÉFONO <u>346-102-47-13</u>		
DOMICILIO CALLE <u>Priv. Juan de Oñate</u> NÚMERO <u>18</u> COLONIA <u>Centro</u> C.P. <u>99900</u>			
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Tache con una X: ☒ NO ☐ SÍ			
En caso de responder Sí, indique a cuál (Por ejemplo, Mazateco, Nahua, Maya, O'dam, etc.)			

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO <u>Perez</u>	SEGUNDO APELLIDO <u>sandoval</u>	NOMBRE <u>Romelia</u>	FIRMA O HUELLA
CURP <u>No esta alta la curp</u>	NÚMERO DE TELÉFONO <u>346-100-65-97</u>		
DOMICILIO CALLE <u>Arroyo blanco</u> NÚMERO <u>44</u> COLONIA <u>Centro</u> C.P. <u>99900</u>			
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Tache con una X: ☒ NO ☐ SÍ			
En caso de responder Sí, indique a cuál (Por ejemplo, Mazateco, Nahua, Maya, O'dam, etc.)			



3.VOCAL

PRIMER APELLIDO <i>Villalobos</i>	SEGUNDO APELLIDO <i>Perez</i>	NOMBRE <i>Jose del Rosario</i>	FIRMA O HUELLA <i>Villalobos P L. Rosano</i>
CURP <i>VIPR 571216 HZSL R 507</i>		NÚMERO DE TELÉFONO <i>253-709-88-80</i>	
DOMICILIO			
CALLE <i>Tenamaxtic</i>	NÚMERO <i>32-A</i>	COLONIA <i>centro</i>	C.P. <i>99900</i>
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Tache con una X: ☒ NO ☐ SÍ			
En caso de responder SÍ, indique a cuál (Por ejemplo, Mazateco, Nahuatl, Maya, O'dam, etc.)			

4.VOCAL

PRIMER APELLIDO <i>Alonso</i>	SEGUNDO APELLIDO <i>villalobos</i>	NOMBRE <i>Miguel</i>	FIRMA O HUELLA <i>Miguel P6nzo</i>
CURP <i>AOVM 62 0929 HZSL L 604</i>		NÚMERO DE TELÉFONO <i>NO CUENTA</i>	
DOMICILIO			
CALLE <i>Tenamaxtic</i>	NÚMERO <i>10</i>	COLONIA <i>centro</i>	C.P. <i>99900</i>
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Tache con una X: ☒ NO ☐ SÍ			
En caso de responder SÍ, indique a cuál (Por ejemplo, Mazateco, Nahuatl, Maya, O'dam, etc.)			

ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO <i>Mercado</i>	SEGUNDO APELLIDO <i>Quezada</i>	NOMBRE <i>Diego Alejandro</i>	FIRMA O HUELLA
CURP <i>MEQD 930301 HZSR 2408</i>		NÚMERO DE TELÉFONO <i>346 1020234</i>	
DOMICILIO			
CALLE <i>Concepcion Ortega</i>	NÚMERO <i>19</i>	COLONIA <i>centro</i>	C.P. <i>99900</i>

Se deberán colocar por lo menos dos números de teléfono para contactar a las personas integrantes del Comité de Participación Social.

La Secretaría de Bienestar utilizará los datos personales para dar seguimiento a la participación social mediante mecanismos internos apegados a los Lineamientos vigentes del FAIS, no se harán públicos y serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable.

0149

