

DATOS DE LA OBRA		EXPEDIENTE TÉCNICO		ADJUDICACIÓN		Ejecución	
NO. DE OBRA	NO. DE PROYECTO						
		PROYECTO EJECUTIVO (DIGITAL E IMPRESO)					
		CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA					
		PRESUPUESTO BASE					
		PROGRAMA DE OBRA					
		OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS, AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CABILDO					
		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O TERCEROS					
		ESTUDIOS DE LA OBRA					
		PERMISOS DE LA OBRA (PERFORACIÓN, CRUCE CARRETERO, OTROS)					
		IMPACTO AMBIENTAL					
		FACTIBILIDAD Y/O VALIDACIÓN DE LA OBRA					
		ACREDITACIÓN LEGAL DE LA TENENCIA DE LA TIERRA					
		CONVOCATORIA U OFICIOS DE INVITACIÓN					
		BASES DE LICITACIÓN / INVITACIÓN					
		DOCUMENTO DE PUBLICACIÓN EN COMPRANET (OBRAS FEDERALES)					
		DOCUMENTO DE PUBLICACIÓN-PERIÓDICO OFICIAL (OBRAS ESTATALES)					
		PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICAS DE PARTICIPANTES ( DIGITAL) NO GANADORES					
		ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES					
		ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS					
		DICTAMEN Y FALLO					
		CONTRATO					
		CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTRATADO					
		TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS					
		ANÁLISIS DE INDIRECTOS					
		GARANTÍA Y/O FIANZA DE ANTICIPO					
		GARANTÍA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO					
		DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN (FUNDADO Y MOTIVADO)					
		CÉDULA DE REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA)					
		CÉDULA DE REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS (CONTRALORÍA MUNICIPAL)					
		DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE					
		NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LOS TRABAJOS					
		SOLICITUD, DICTAMEN Y CONVENIO DE MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN					
		SOLICITUD, DICTAMEN Y CONVENIO DE MODIFICACIÓN DEL MONTO Y/O AMPLIACIÓN DE CONTRATO					
		NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO					
		NOMBRAMIENTO DEL SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA					
		AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROYECTO					
		BITÁCORA DE OBRA (BEOP O CONVENCIONAL)					
		ESTIMACIONES					
		NÚMEROS GENERADORES					
		ACUMULADO DE ESTIMACIONES (DIGITAL E IMPRESO (kbs))					
		SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATÁLOGO					
		REPORTES DE SUPERVISIÓN					
		REPORTE FOTOGRÁFICO					
		PRUEBAS DE LABORATORIO (RESISTENCIA DE CONCRETO, CALIDAD DEL AGUA, OTROS)					
		DOCUMENTO DE RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO					
		NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LA OBRA (CONTRATISTA)					
		GARANTÍA Y/O FIANZA DE VICIOS OCULTOS					
		ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN					
		FINIQUITO					
		ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES					

1 EXISTE EL DOCUMENTO  
 2 EXISTE EL DOCUMENTO (INCOMPLETO Y/O SIN FIRMA)  
 X NO EXISTE EL DOCUMENTO  
 N/A NO APLICA

CONCLUSIONES / OBSERVACIONES:

EN EL CASO DEL PROYECTO EJECUTIVO ESTE DEBERÁ CONTENER LO ESTABLECIDO TANTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE CARÁCTER FEDERAL Y/O ESTATAL, SEGÚN CORRESPONDA.

TEORÍA DE CÁLCULO, MECÁNICA DE SUELOS, Y DEMÁS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PLUMBACIÓN.

EN EL CASO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS DEBERÁ INTEGRAR ADEMAS DEL DICTAMEN DE LA JUSTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN: ACTA CIRCUNSTANCIADA

EN EL CASO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROYECTO DEBERÁ INCLUIR ADEMAS: JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL ÁREA CORRESPONDIENTE POR EL CAMBIO DE PROYECTOS O METAS

LA PROPIETARIA DEBERÁ DE CONTENER LOS FORMATOS (Y REGALISTROS) COMPLETOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA ASI COMO LO CITADO EN EN LA LEY Y SU REGLAMENTO APLICABLE.

Fecha de Autor: 07 / 12 / 2021



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**SECCIÓN: 2**  
**OFICIO: NO. 134**  
**EXPEDIENTE: ADMVO. 2021/2024**

**ASUNTO: SOLICITUD**

**DEPARTAMENTO DE PLANEACION  
PRESENTE**

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA ME DIRIJO A USTED CON LA FINALIDAD DE SOLICITARLE GIRE INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDE PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO DE OBRA: **PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD LAS HUERTAS EL MOLINO** SOLICITADO POR LA COMUNIDAD INTERESA HACIA MI CARGO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL.



Atentamente

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.  
2021 - 2024

*Manuel Jimenez Fuentes*  
**C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES**

Presidente Municipal de Nochistlán de Mejía Zac.



0001

**LOCALIZACIÓN**



**CAMINO EL MOLINO - LAS HUERTAS**

DESPALME = 9.90 m<sup>2</sup>  
 RETIRO DE EMPEDRADO = 42.17 m<sup>2</sup>  
 TERRAPLEN = 164.75 m<sup>2</sup>  
 VOLUMEN DE CORTE = 600.00 m<sup>3</sup>  
 VOLUMEN DE SUB-RASANTE = 210.00 m<sup>3</sup>  
 VOLUMEN DE BASE = 210.00 m<sup>3</sup>  
 LOSA DE CONCRETO = 990.00 m<sup>2</sup>  
 CUNEA = 340.00 m<sup>2</sup>



U  
 N  
 I  
 D  
 A  
 D  
 DE PLANEACIÓN  
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 NOCHISTLÁN, ZAC

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES  
 DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

PAVIMENTACION DE CAMINO EL  
 MOLINO - LAS HUERTAS

LOSA DE CONCRETO  
 Unidad de Planeación  
 2021-2024  
 Nochistlán, Zac.  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



CONTENIDO  
 PLANTA TOPOGRAFICA

UBICACIÓN  
 EL MOLINO, LAS HUERTAS, NOCHISTLAN ZAC.

PROYECTÓ  
 UNIDAD DE PLANEACION  
 ESCALA  
 S/E

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  
 UNIDAD DE PLANEACION  
 FECHA  
 MAYO DEL 2023  
 CLAVE DEL PLANO  
 TOP - 1

REVISÓ Y AUTORIZÓ  
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

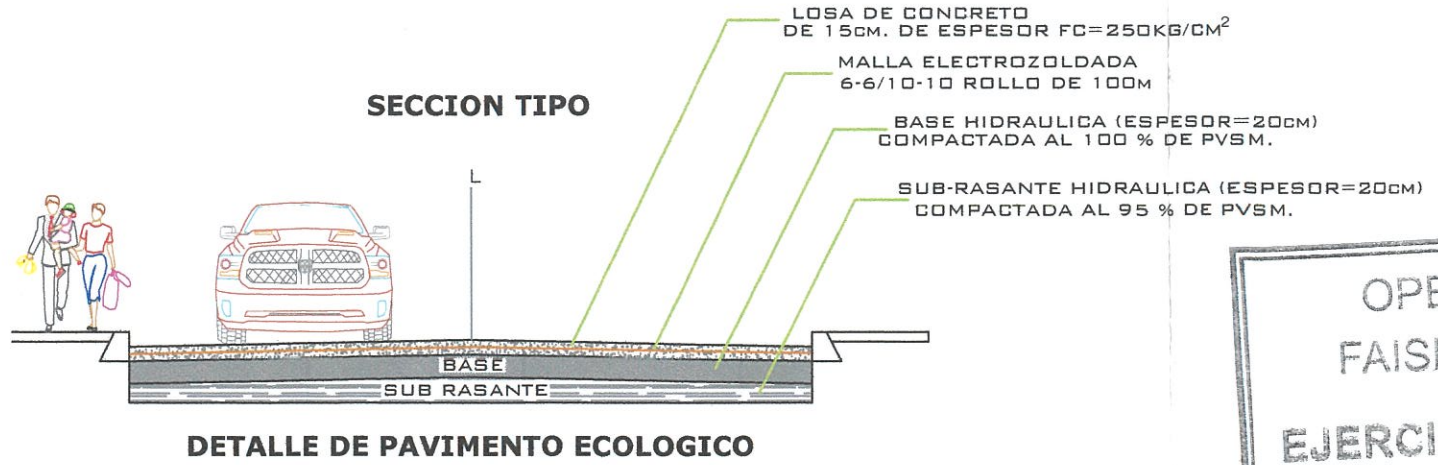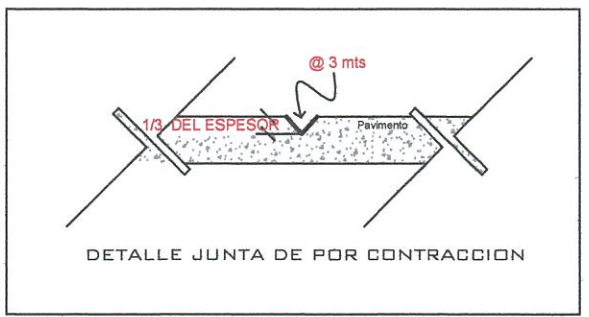

OPERADO 0002  
 FAISM (FII) NOCHISTLÁN  
 EJERCICIO 2023  
 GOBIERNO 2021-2023



**CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR PROYECTO**  
**PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)**  
EJERCICIO 2023

**I.- UBICACIÓN**

	CLAVE	NOMBRE
REGIÓN	<u>09</u>	<u>CAÑON DE JUCHIPILA</u>
MUNICIPIO	<u>034</u>	<u>NOCHISTLÁN DE MEJIA</u>
LOCALIDAD	<u>0001</u>	<u>NOCHISTLÁN DE MEJIA</u>
BARRIO, COLONIA, RANCIERÍA, ETC.		
TIPO DE LOCALIDAD	CP( X )	PR( )

**II.- IDENTIFICACIÓN**

	CLAVE	NOMBRE
No. DE OBRA	<u>404002</u>	
PROGRAMA	<u>404</u>	<u>URBANIZACION MINICIPAL</u>
SUBPROGRAMA	<u>221</u>	<u>URBANIZACION</u>
TIPO DE PROYECTO	<u>6141</u>	<u>DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION</u>
NOMBRE DE LA OBRA	<u>PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.</u>	
DESCRIPCION DE LA OBRA	<u>PAVIMENTACION EN LAS HUERTAS EL MOLINO</u>	
TIPO DE OBRA	NUEVA( X )	AMPLIACIÓN( ) REHABILITACIÓN( ) PROCESO( )
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	C( X ) M( )	AM( ) AD( ) AC( )
INSTANCIA EJECUTORA	<u>PRESIDENCIA MUNICIPAL</u>	

**III.-INVERSIONES**

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	F.I.S.M.	BENEFICIARIOS
INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2023	\$1,255,007.03			\$1,255,007.03	
INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DIC. DE 2023					

**IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO**

	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS DEL PROYECTO	<u>LOTE</u>	<u>1</u>
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	<u>PERSONAS</u>	<u>MUJERES (70) - HOMBRES( 50 )</u>
LOCALIZACION	<u>COORDENADAS</u>	<u>21.271107 N, -102.883334 O</u>


**V.-PERIODO DE EJECUCIÓN**

FECHA DE: INICIO: 01/06/2023 TERMINO: 07/08/2023

ANOTAR SI BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS):

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



0003



## PROGRAMA CALENDARIZADO ANUAL FÍSICO FINANCIERO

### PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)


NOMBRE DE LA OBRA	PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	
FECHA DE:	INICIO: 01/06/2023	TERMINO: 07/08/2023

PROGRAMADO TODO EL AÑO		
FÍSICO	100%	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO ( PESOS)
LOTE	1.00	\$1,255,007.03

	FÍSICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO	50%	\$627,503.51
AGOSTO	50%	\$627,503.52
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
<b>TOTAL:</b>		<b>\$1,255,007.03</b>

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Este prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



0004







### CROQUIS DEL MUNICIPIO

#### MACROLOCALIZACION

**Zacatecas**  
División municipal

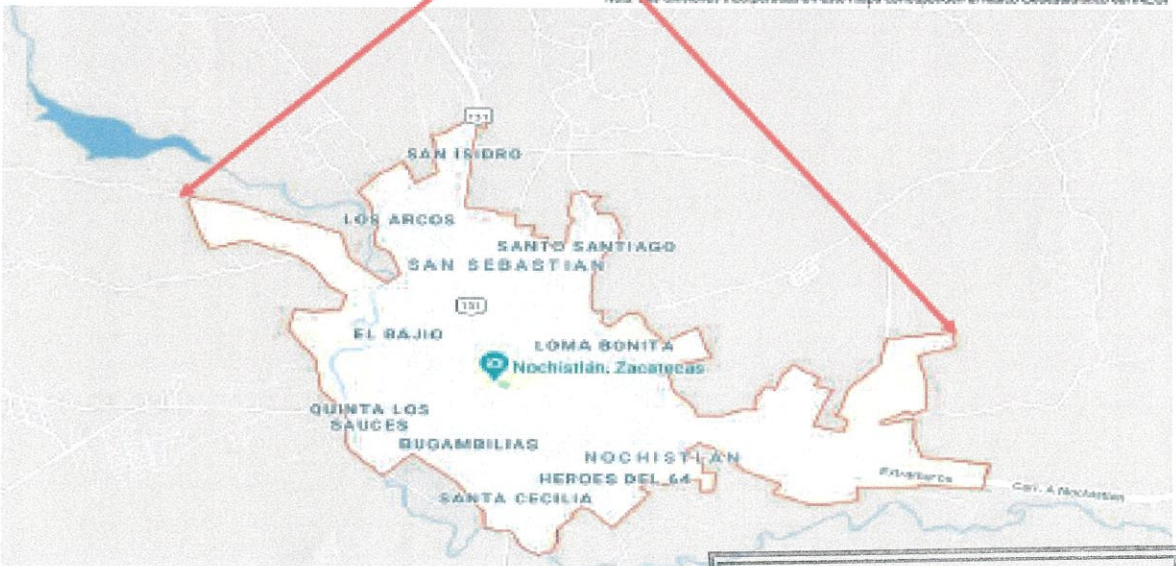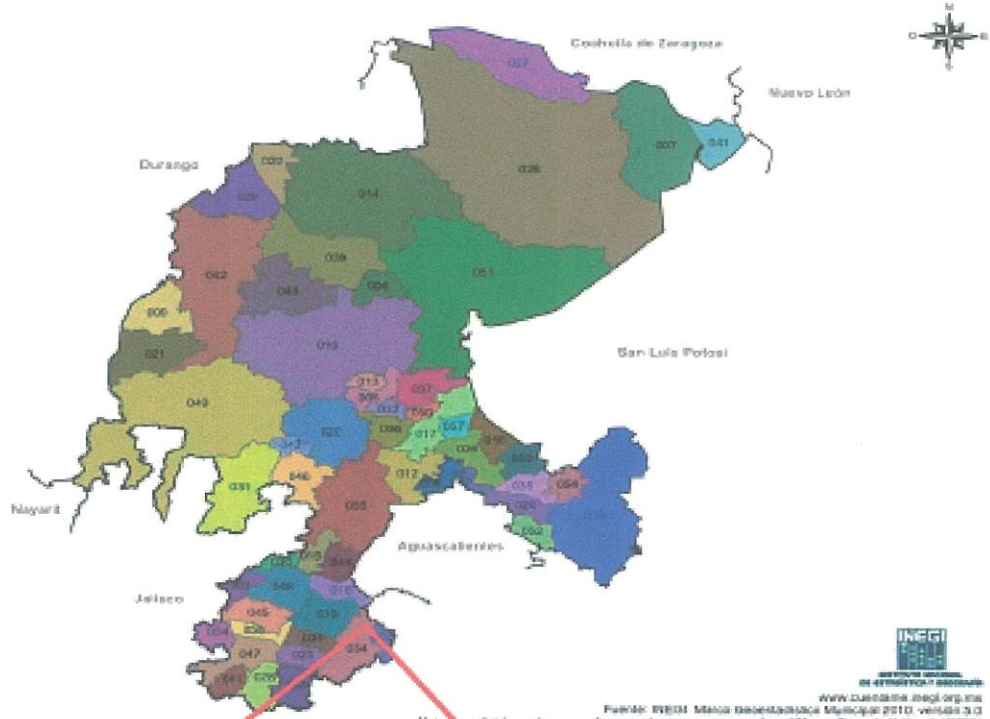


OPERADO  
FAISM (FIII)  
EJERCICIO 2023

0005



CROQUIS DEL MUNICIPIO

MICROLOCALIZACION

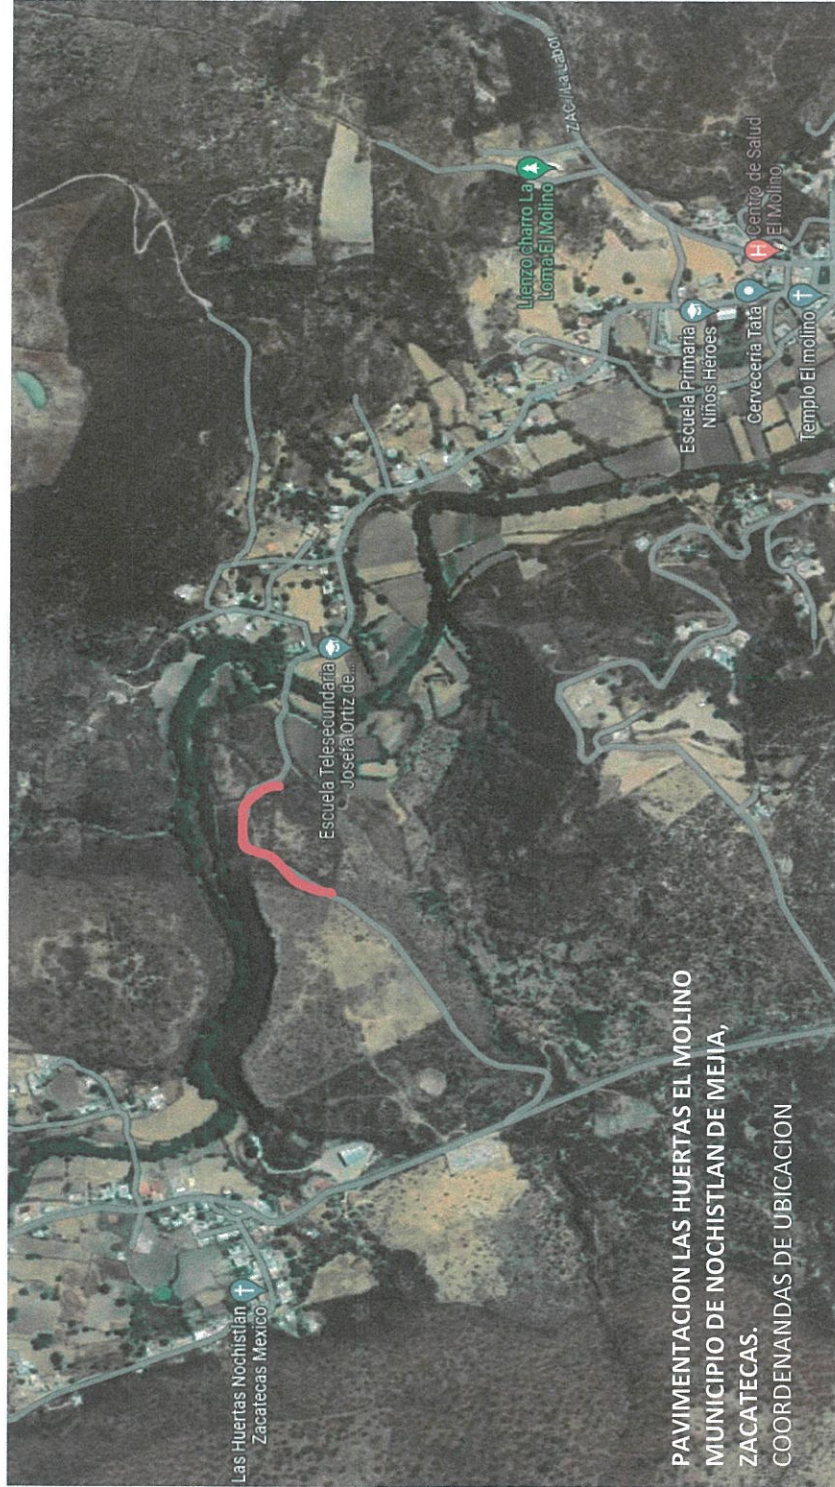

PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO  
MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA,  
ZACATECAS.  
COORDENANDAS DE UBICACION

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

OPERADO  
FAISM (FIII)  
EJERCICIO 2023

0006



**Obra: PAVIMENTO DE HUERTAS - MOLINO**

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
<b>PAVIMENTO DE HUERTAS - MOLINO</b>						
<b>PREELIMINARES</b>						
010705	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2. Incluye: Topografo y cadenero. operador	m2	990.00	D EZ PESOS 00/100 MXN	\$10.00	\$9,900.00
010128	Terraplenes, extendido de materiales, formación, incorporación de agua, compactado en capas de 20 cm de espesor, con material producto del corte al 95% p.v.s.m., incluye: mano de obra, maquinaria p.u.o.t.	m2	164.75	VEINTE Y UN PESO 00/100 MXN	\$21.00	\$3,459.75
010625	Despalme de 20 cm de espesor a máquina en material B desperdiciando el material par desplante de terraplenes acarreo libre a 50 m	m3	9.90	C NCUENTA Y SIETE PESOS 52/100 MXN	\$57.52	\$569.45
010815	Retiro de empedrado con recuperacion de material incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.	m3	42.17	C JARENTA Y SEIS PESOS 26/100 MXN	\$46.26	\$1,950.55
010815	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	m3	42.17	SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MXN	\$69.90	\$2,947.33
010815	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (1 km)	m3/km	42.17	N JEVE PESOS 23/100 MXN	\$9.23	\$389.23
<b>PREELIMINARES TERRACERIAS</b>						
010815	Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (montonivadora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo al proyecto	m3	600.00	CJARENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MXN	\$44.20	\$26,520.00
010815	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	m3		SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MXN	\$69.90	\$41,940.00
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (1 km)	m3/km		N JEVE PESOS 23/100 MXN	\$9.23	\$5,538.00
<b>IMPORTE DE TERRACERIAS</b>						
				Importe Parcial de esta Hoja :		
				Importe Acumulado :		\$73,998.00

**OPERADO**  
**FAASM (FII)**  
**TEMP-3**  
**EJERCICIO 2023**



0007

**Obra: PAVIMENTO DE HUERTAS - MOLINO**

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
<b>SUB-BASE Y BASE</b>						
METAC-0002-3	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de capa subrasante compactada al 95% utilizando material de banco y material petro (50% material de banco - 50% material petreo)	m3	210.00	CJATRO CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN	\$454.00	\$95,340.00
METAC-0002	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (90% material de banco - 10% material petreo)	m3	210.00	CJATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 MXN	\$435.00	\$91,350.00
<b>IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE CONCRETO</b>						
030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	990.00	SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 17/100 MXN	\$631.17	\$624,858.00
CUN-01	Cuneta de concreto f'c=160 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 10 cm. de espesor, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	340.00	QUINIENTOS VEINTE Y UNO PESOS 00/100 MXN	\$521.00	\$177,140.00
				<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO IVA(16%)</b>		<b>\$801,998.00</b>
				<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA</b>		<b>\$1,081,902.61</b>
				<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA</b>		<b>\$1,255,007.03</b>

Unidad de Planeación  
 Planeación y CINGO MIL SIETE CIENTOS 03/100 MXN \*)  
 Ing. Diego Alejandro Mercado Q.



EJERCICIO 20 23  
 IMPORTE DE CONCRETO  
 IMPORTE DE PAVIMENTO DE HUERTAS - MOLINO  
 ERADO  
 M (FII)

0008





**PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)**

**CALENDARIO DE EJECUCIÓN**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
PRELIMINARES	01/06/2023-15/06/2023
TERRACERIAS	16/06/2023-08/07/2023
SUB-BASE Y BASE	10/07/2023-21/07/2023
CONCETO Y CUNETAS	22/07/2023-07/08/2023

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2023

0009

Heriberto Garcia S

**ACTA DE CONSEJO DE PLANEACION MUNICIPAL**

**MUNICIPIO: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.**

**ACTA NO. 1**

**EJERCICIO 2023.**

En la ciudad de Nochistlán de Mejía, Estado de Zacatecas, siendo las 10:00 horas del día 21 de Abril de 2023, reunidos en el salón de Cabildos del Edificio de la Presidencia Municipal, estando presentes. los ciudadanos: C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, Presidente Municipal; LIC. ARMANDO AGUIRRE, Secretaria de Gobierno, LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ, Sindica Municipal, ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Director de Desarrollo económico y social, ING. ANA GABRIELA TACHIQUIN TORRES, Contralor Municipal, C. SERGIO HINOJOZA PEREZ, Director de Obras Públicas y Servicios Municipales, L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ, Encargada de Tesorería Municipal, representantes parlamentarios de los diferentes partidos PAN, PRI y Alianza en el municipio, así como representantes comunitarios, denominados también consejeros comunitarios, de las diferentes comunidades del municipio, integrantes del concejo municipal de planeación, organismo técnico auxiliar del ayuntamiento, constituido conforme lo dispone el art. 198 de la ley orgánica del municipio en vigor, con el propósito de llevar a cabo la presente reunión de trabajo a la que previamente se convocó y que se habrá de desarrollar Con el fin principal:


Bajo el siguiente orden del día:

1. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.
2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, QUORUM LEGAL, E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA
3. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2021-2024.
4. PROPUESTA PARA SU VALIDACION DE OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR CON RECURSOS DEL RAMO 33, EJERCICIO 2023, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
5. ASUNTOS GENERALES. Y/O ACLARACIONES
6. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

1. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.

Toma la palabra el presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL EL C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, da la bienvenida a todos los asistentes a esta reunión, consejeros, delegados, directores, Regidores y miembros del ayuntamiento, a esta reunión del Consejo de Planeación de esta Administración 2021-2024, primera del ejercicio 2023.

2. PUNTO 2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, QUORUM LEGAL, E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA



Maria Zapata  
Jose Aguirre  
Ma. Dolores Ordovica  
Salvador Araceli  
Agure Perez  
Perez Frias  
Aguiro  
B. Adriano Aguayo R.  
Jose Manuel Jimenez Fuentes

Juan Salazar  
Martin Delacruz  
Luis Antonio Duran  
Elicia Ramirez Gonzalez  
Endelia Puga G.  
Tose Rosario Prieto  
Antonio  
David  
Jose Juan Mejia R.  
Jose Juan Mejia  
Constancio Frias  
David  
Yessenia Muñoz Guzman  
Justina Duran Villalobos  
Silberto Techuga H.  
Rosa Arceada



Heriberto Garcia

B. Adriana Aguayo R.


Acto siguiente, se le otorga la palabra a el ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Secretario técnico del Consejo de Planeación Municipal para proceder con el siguiente punto del orden del día, el cual es el Pase de lista, una vez realizado, informa al presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL que se cuenta con la presencia de \_\_\_\_\_ consejeros de un total de \_\_\_\_\_ que integran el CONSEJO de desarrollo municipal, así como se cuenta con la presencia de los Delegados Municipales o en su caso suplentes de la mayoría de las comunidades, una Asamblea muy concurrida, lo que permite al Presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Que se cuenta con quórum legal para continuar con la asamblea el C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, presidente del consejo, declara la instalación legal de la asamblea y apertura de los trabajos y por lo tanto, validos los acuerdos que de ella misma emanen.

3. **CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2021-2024.**

El siguiente punto, se otorga el uso de la palabra el ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Secretario técnico del Concejo de Planeación Municipal para proceder con el siguiente punto del orden del día, el cual es la capacitación al Concejo de Desarrollo Municipal, otorgándoles a cada concejero las obligaciones y funciones de acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio, y se da a conocer el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PUBLICADO EL 14 DE FEBRERO DE 2014 Y SUS MODIFICATORIOS EL 13 DE MAYO DE 2014, EL 12 DE MARZO DE 2015 Y EL 31 DE MARZO DE 2016, publicados por la Secretaria de Desarrollo social para el presente ejercicio. Haciendo hincapié en lo siguiente: Da lectura del extracto de los lineamientos de operación, que en el direccionamiento de los recursos, los gobiernos locales y de las entidades federativas podrán planear hasta un 100% de sus recursos del FAIS en obras de incidencia directa, para el caso de incidencia complementaria podrán planear hasta el 60% de sus recursos del FAIS; el resto de los recursos se invertirá en demarcaciones territoriales con alto y muy alto grado de rezago, que para la identificación de la población en pobreza extrema los gobiernos locales deberán hacer uso de los Criterios de Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema.

4. **PROPUESTA PARA SU VALIDACION DE OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR CON RECURSOS DEL RAMO 33, EJERCICIO 2023, DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.**

5. Continuando con el orden del día, acto seguido, se le otorga la palabra a el ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Secretario técnico del Consejo de Planeación Municipal para proceder con la reunión de trabajo, e informar a los presentes que el techo financiero del fondo para la infraestructura Social Municipal, dado a conocer a los miembros del consejo lo que corresponde a las liberaciones de



Vertical list of names on the left margin:   
- Juan Manuel Jimenez Fuentes  
- Salvador Aguirre Perez  
- Ma. Dolores Ordorica  
- Araceli Perez Frias  
- Rosalio Orsapego

Vertical list of names at the bottom:   
- Yesenia Muñoz Gorman  
- Sofia Muñoz Villalobos  
- Jose Aguirre  
- Jose Rodrigo  
- Josefina Durán Villalobos  
- Gilberto Sotomayor H  
- Yoni Toribio Sandoval S

Vertical list of names on the right margin:   
- David Durán  
- Antonio Durán  
- Endelia Fugate  
- Juan Manuel Jimenez Fuentes  
- José Juan Mejía  
- Juan Solazar  
- Constantino Frías  
- Rubalcaba  
- Rosa







B. Adriano Aguirre

Heriberto Garcia S

Juan...  
Antonio...  
Jose...

acuerdo a las necesidades que esta Asamblea señala, y con ello de ser posible realizarse con recursos del presente ejercicio o bien dentro del próximo ejercicio fiscal, cabe mencionar que por el momento se desconocen los montos de estos proyectos.

Respecto al resultado de desahogo de los puntos anteriores, se acuerda:

**Primero:** Tenernos por enterados y conformes, en nuestra calidad de integrantes del Consejo, respecto a la información a que se refiere el punto 3 del Orden del día.

**Segundo:** Tenernos por enterados y conformes y emitiendo nuestra aprobación, en nuestro carácter de miembros del Consejo, respecto a todas y cada una de las acciones de obra contenidas en el listado a que se refiere el punto 4 del orden del día.

**Tercero:** Tenernos de igual forma, en nuestra calidad de integrantes del Consejo, suscribiendo, en documento por separado, las peticiones o propuestas de acciones de obra que pudieran realizarse de ser posible en el presente ejercicio o bien en el próximo año fiscal, con recursos del fondo III Y/O mezcla de recursos derivadas de otras fuentes de financiamiento asunto este al que se hizo alusión en algún punto del orden del día.

**6. ASUNTOS GENERALES. Y/O ACLARACIONES**

Surgieron inquietudes por parte de los representantes comunitarios, de obras que se solicitaron en las reuniones comunitarias, así como de otros programas como Tres por uno, aclarando el secretario del Consejo y Presidente Municipal, las dudas.

**6. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA**

Para finalizar y tomando en cuenta que no hay otro asunto que tratar se da por clausurada la asamblea, en la forma propuesta en el punto 7 del orden del día, siendo las 12:00 horas del día de la fecha, firmando para constancia y para validez legal de lo descrito en este documento, los intervinientes. **Damos fe.**

Se adjuntan los anexos 1 y 2. (La lista de asistencia y la lista de obras)

José de Jesús  
Salvador Aguirre Pérez  
Araceli Pérez Frijas  
Rosario Proppa

Sofía Muñoz Villalobos  
José Rodríguez  
Gilberto Lechuga H  
Yoni Toribio Sandoval S.  
CRISTIANO FRIAS  
Gonzalo  
José Daniel Jaime


Yesenia Muñoz Guzman  
Josefina Durán Villalobos  
María C. Zapata  
Yvonne Mercedes Mando  
Endelia Puga G.


OPERADO  
FAISM (FIII)  
Juan Salazar  
EJERCICIO 2023

Antonio...  
Jose Rosario Prieto  
Tase Juan Mejia P.  
David Durán B.  
Luis Antonio Durán  
0013

Araceli Pérez Frías  
Cecilia Alcalá Aguayo.

POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

PRESIDENTE DEL C.D.M.  
  
C. JOSE MANUNUEL JIMENEZ FUENTES

SECRETARIO DE GOBIERNO  
  
LIC. ARMANDO AGUIRRE GOMEZ.

ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL.  
  
L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ.


SÍNDICO MUNICIPAL  
  
LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ.

DIRECTOR DE OBRAS SERVICIOS PUBLICOS  
  
C. SERGIO HINOJOZA PEREZ.


CONTRALOR MUNICIPAL.  
  
ING. ANA GABRIELA TACHIQUIN


SECRETARIO TECNICO DEL C.D.M.  
  
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

REPRESENTANTES PARLAMENTARIOS ANTE EL CONSEJO

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO  
PAN - PRI - PRD  
  
LIC. REYNA VILLALOBOS PEREZ

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2023

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO  
MOVIMIENTO CIUDADANO  
  
C. BEATRIZ ADRIANA AGUAYO RODRIGUEZ

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO  
FUERZA POPULAR MEXICO  
  
LIC. CELINA AMADAI TAQUICHIN BECERRA

REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL  
  
LIC. RAFAEL CERVANTES DURAN.

REGIDOR DE DESARROLLO ECONOMICO  
  
PROF. JORGE ORTIZ RAMIREZ.

0014



Jennifer Belen Oares Flores Rubi Gómez R.  
 Hazel Peréz José Vallín Muñoz

2023

ANEXO 2

Erika Luis Garcia  
 Froylan Valdéz A.

Ruben Jimenez

No.	LOCALIDAD	OBRA/ ACCIÓN	MONTO	SUBCLASIFICACION	INCIDENCIA
1	VELADORES	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE VELADORES	\$1,297,230.96	DRENAJE SANITARIO	DIRECTA
2	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AROLLO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL	\$427,997.84	DRENAJE SANITARIO	DIRECTA
3	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL AUZA, CABECERA MUNICIPAL	\$110,000.00	DRENAJE SANITARIO	DIRECTA
4	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AROLLO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL	\$214,024.70	AGUA POTABLE	DIRECTA
5	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL AUZA, CABECERA MUNICIPAL	\$85,000.00	AGUA POTABLE	DIRECTA
6	LA COFRADIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA	\$734,676.50	CAMINO	DIRECTA
7	LAS CRUCES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES	\$769,295.01	CAMINO	DIRECTA
8	RINCONADA DE MELAZCO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE RINCONADA DE VELAZCO	\$1,076,001.05	CAMINO	DIRECTA
9	TOYAHUA DE ABAJO	CONSTRUCCION DE HUELLA ECOLOGICA EN TOYAHUA DE ABAJO I	\$1,164,097.92	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
10	TOYAHUA DE ABAJO	CONSTRUCCION DE HUELLA ECOLOGICA EN TOYAHUA DE ABAJO II	\$1,199,870.63	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA

Juan Salazar

Martin Saldivar E.

Gilberto Lechuga Hdez.  
 en sumatoria

Aroceli Pérez Frijas

Sofia Muñoz V.

M. Guadalupe Meda Doza Frijas

Juana Figueroa

OPERADO  
 FAISM (FIII)  
 EJERCICIO 2023

0015



*Rubi Gómez R.*

*Jennifer Belen Flores Flores M. Guadalupe Rendón*

**ANEXO 2**

*Abel Pérez*

**2023**

*Erika Luis Garcia*  
*Froal Valdez A. Ruben Jiménez Q*

No.	LOCALIDAD	OBRA/ ACCIÓN	MONTO	SUBCLASIFICACION	INCIDENCIA
11	EL PEINE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DEL PEINE	\$1,200,474.55	CAMINO	DIRECTA
12	LAS HUERTAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS-EL MOLINO	\$1,249,342.93	CAMINO	DIRECTA
13	CAPELLANIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE CAPELLANIA	\$453,744.14	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
14	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL AUZA	\$530,000.00	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
15	CABECERA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DE LAS ROSAS CABECERA MUNICIPAL, NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$402,130.22	ELECTRIFICACION	DIRECTA
16	TOYAHUA DE ARRIBA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE TOYAHUA DE ARRIBA, NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$319,000.00	ELECTRIFICACION	DIRECTA
17	VELADORES	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE VELADORES, NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$322,225.96	ELECTRIFICACION	DIRECTA
19	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ANDADOR HACIA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOCHISTLAN, NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$1,799,990.00	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA
20	LOS SANDOVALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LOS SANDOVALES	\$887,747.48	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
21	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CALLE LAZARO CARDENAS	\$1,014,079.40	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA

**OTRO TRABAJO  
FAJOM (TIII)  
EJERCICIO 2023**

*Juan Salazar*  
*Araucel Pérez Frías*  
*M. Martin Saldivar E.*  
*Gilberto Leduga Hdz.*  
*Sofia Muñoz V.*  
*de puntas*

*Joana Iniguez G.*

0016



Jennifer Belen Flores Flores  
Jose Vallin Muñoz

2023

Erika Luis Garcia  
Froel Valdez A. Ruben Jimenez Q

ANEXO 2

No.	LOCALIDAD	OBRA/ ACCIÓN	MONTO	SUBCLASIFICACION	INCIDENCIA
22	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMPO EL GIRO EN UNIDAD DEPORTIVA	\$743,384.76	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA
24	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$131,372.82	AGUA POTABLE	DIRECTA
25	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$217,449.13	DRENAJE SANITARIO	DIRECTA
<b>CONVENIOS</b>					
26	VARIOS	CONVENIO VIVIENDA	\$1,500,000.00	CUARTO PARA BAÑO, CUARTO PARA DORMITORIO Y TECHO FIRME	DIRECTA

OPERADO  
 FAISM ( FIII )  
 EJERCICIO 20 23

TOTAL DE OBRAS  
 \$17,849,136.00

Abel Perez  
 m. Guadalupe mendoza F Rubi Gomez R.  
 Oct Muller M. Martin Saldivar E.  
 Sofia Muñoz V.  
 Juan Salazar Araceli Pérez Frias  
 Gilberto Leduga Hde.  
 de Munta

Juana Iniguez G.

0017



CONSEJERO	
VICENTE MENA MERCADO	Vicente Mena Mercado
OMAR LOPEZ VELEZ	Maria Concepción Zapata F.
MA. GUADALUPE MENDOZA FRIAS	Mano C. Zopeta
EVELIA RAMIREZ GOMEZ	Evelia Ramirez Gomez
JOSE VALLIN MUÑOZ	Suplente
JAVIER MARTINEZ QUEZADA	Suplente Verónica Muñoz Guzmán
FELIPA PEREZ MEJIA	
OSCAR JIMENEZ DURAN	"Papa" Jimenez
MARIO HERNANDEZ LECHUGA	Gilberto Lechuga H
GILBERTO LECHUGA HERNANDEZ	Salvador Aguirre Perez
SALVADOR AGUIRRE PEREZ	
ELISEO MUÑOZ DURAN	
JOSE JOVANI GONZALEZ CORONA	
JOSE RODRIGUEZ	Jose Rodriguez
ROSA MARIA CORONA LARIS	
GEORGINA DANIELA RUIZ VIRAMONTES	
JOSE PERFECTO GONZALEZ	
IRENE OLIVOS SALDIVAR	
MIA DEL CARMEN BECERA ESPARZA	
EDGAR IVAN GONZALEZ CORDOVA	
ENRIQUE RUVALCABA	
MARTIN SALDIVAR ESPARZA	Martin Saldivar
JUAN RAMON AGUSTIN SIGALA SALDIVAR	

EXERCICIO 2023

Yoni Toribio Sandoval S.  
 Endelia Puga G.  
 Ma. Dolores Ordorica L. Abto. P. Sandoval



ANTONIO QUEZADA DIAZ	Suplente Teresa da Jesus
ANTONIO MEJIA QUEZADA	Autora
SOFIA MUÑOZ VILLALOBOS	Sofia Muñoz Villalobos
JOSEFINA DURAN VILLALOBOS	Josefina Duran Villalobos
JOSE DURAN JAIME	Jose Duran
ESPERANZA GOMEZ DURAN	
RAUL GOMEZ ANDRADE	Raul
JOSE JUAN MEJIA PEREZ	Jose Juan Mejia Perez
MANUEL TENORIO CORDERO	
IGNACIO ALVAREZ M	
ARACELI PEREZ FRIAS	Araceli Perez Frias
RUBEN GUZMAN LUNA	
ABEL PEREZ FRIAS	
JUAN PABLO SALAZAR PEREZ	Juan Salazar
EFRAIN ROBLES VELAZCO	
DAVID DURAN BUSTOS	David Duran B.
JOSE AGUIRRE LOMELI	Jose Aguirre
JOSE ARTURO ALVAREZ VILLEGAS	
JOSE ROSARIO PRIETO	Jose Rosario Prieto
ABELINO PEREZ GOMEZ	
JOSE RUVALCABA RUVALCABA	Jose Ruvalcaba
VICTOR MANUEL VILLALOBOS JAUREGUI	
RUBEN JIMENEZ QUEZADA	
ERIKA LUIS GARCIA	
VICTOR MANUEL RODRIGUEZ DURAN	
JOSE SANDOVAL GOMEZ	

Hilda Yarmir Gonzalez



J. RAMON QUEZADA RUVALCABA	
ROSARIO OROPEZA GARCIA	<i>Rosario Oropeza</i>
LUIS ANTONIO DURAN MUÑOZ	<i>Luis Antonio Duran</i>

*Constancio Frias*

*Ramon Duezeda*

OPERADO  
 FAISM ( FIII )  
 EJERCICIO 2023

0020



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**  
**RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES**  
**FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

**CONVENIO DE CONCERTACIÓN 2023**

**OBRA: PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**

Convenio de Concertación, que con objeto de llevar a cabo obras y/o acciones de beneficio social, celebran, por una parte, el H. Ayuntamiento de: Nochistlán, Zac. Representado por el C. Presidente Municipal quien a su vez es el Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal; y por otra el comité comunitario y/o por obra del municipio **MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA** los que en lo sucesivo se denominarán “AYUNTAMIENTO”, “CONSEJO” Y “COMITÉ” respectivamente.

**ANTECEDENTES**

1.- El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Desarrollo Social y de Contraloría y Desarrollo Administrativo: el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; y los Ayuntamientos de los 56 municipios del Estado, celebraron un anexo de ejecución del Convenio de Desarrollo Social 2023, el cual tiene por objeto operar el programa denominado “ Fondo ; mediante la transparencia de los recursos federales y estatales a los H. Ayuntamientos, y estos a su vez los operan conjuntamente con los Consejos de Desarrollo Municipal y los Comités del referido programa.


2.- El consejo de Desarrollo Municipal, correspondiente al municipio de NOCHISTLÁN, con domicilio en CALLE HIDALGO #1, se encuentra constituido según consta en el Acta levantada en Asamblea de consejeros de fecha **21 DE ABRIL DE 2023** y tiene como principal objetivo efectuar la promoción de los objetivos, estrategias, programas y acciones del Fondo de Desarrollo Social Municipal ; y a la vez promover e impulsar la organización social y la participación de la población organizada.

El **C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES** en su carácter de Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal, tiene facultades para suscribir el presente convenio a nombre y representación de dicho Consejo.

3.- LA : **PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS** constituyó el **26 DE MAYO DE 2023** con el propósito de ejecutar, así como operar y conservar las obras y/o acciones que en su localidad se definieron como prioritarias.

El \_\_\_\_\_ en su carácter de Presidente del Comité, tiene facultades para suscribir el presente Convenio a nombre y representación de dicho Comité.

En razón de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos I fracc. II, 3,4,6,7,28,29,30,50,51 y 82 de la Ley de Adquisiciones de Obras Públicas; y en las disposiciones aplicables de la ley orgánica Municipal, las partes celebran el presente concentrado el tenor de las siguientes



0021

*Jose Manuel Jimenez Fuentes*  
*Antonio Cruzado Diaz*

*Antonio Cruzado Diaz*



## CLAUSULAS

**PRIMERA** ,- El H. "AYUNTAMIENTO", el "CONSEJO" y el "COMITÉ", convienen en conjuntar esfuerzos y recursos para la realización de obras y/o acciones, en el marco del programa "Fondo para la Infraestructura Social Municipal".

**SEGUNDA**.- Las obras y/o acciones que se ejecutarán por el "Comité" serán las que a continuación se describen: **PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**

Para la realización de las obras y/o acciones anteriormente señaladas, el "AYUNTAMIENTO" ministrará al "COMITÉ" **\$1'249,342.93 (UN MILLON DISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESO 93/100 MN)**

**TERCERA**.- La ministración de los recursos a que se refiere la cláusula anterior estará a cargo del "AYUNTAMIENTO".


La ejecución de las obras, objeto del presente instrumento, estará bajo la responsabilidad directa del "CONSEJO" y la supervisión y vigilancia de la misma estará bajo la responsabilidad del "CONSEJO" y del "AYUNTAMIENTO".

**CUARTA**.- El "AYUNTAMIENTO" se compromete a:

- a) Ministrará los recursos al "COMITÉ", de acuerdo a los lineamientos que norman el programa
- b) Llevar un registro contable por separado, de los recursos designados a las obras y/o acciones a que se refiere este Convenio, independiente de la contabilidad de los ingresos del propio "AYUNTAMIENTO" y de otros programas.
- c) Solicitar informes con periodicidad que se requiera, conforme al tipo de obra y/o acción, al "CONSEJO" y al "COMITÉ" respecto de avance físico de las obras del presente Convenio; así como el ejercicio de los recursos que se otorguen.
- d) Proporcionar asesoría técnica al Comité en la ejecución de la obra, y apoyar a este con la ministración oportuna de los recursos.
- e) Informa al Ejecutivo Estatal del avance físico de las acciones u obras y del ejercicio del recurso, objeto del presente Convenio.

**QUINTA**.- El "COMITÉ" se compromete a:

- a) Realizar las obras y/o acciones objeto del presente Convenio, sujetándose a los lineamientos del programa a efecto de que se cumplan los principios de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia aplicables, en el ejercicio de los recursos que se aportan.
- b) Ejercer la totalidad de los recursos señalados en la cláusula segunda, destinándolos única y exclusivamente a las acciones u obras objeto del presente Convenio.
- c) Proporcionar oportunamente los bancos de materiales que se requieran, así como la mano de obra necesaria en la realización de las obras que se comprometen en este Convenio.



*Jaime Ibarra Mdz*  
*Antonio Augusto Diaz*

*F. B. Battezzati*




- d) Informar al representante comunitario ante el Consejo, los avances físicos así como la aplicación de los recursos.
- e) Colaborar con el "CONSEJO" en la resolución de problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
- f) Informar mensualmente al "AYUNTAMIENTO", por escrito, del avance físico de las obras y/o acciones, así como de la aplicación de los recursos económicos.
- g) Atender al "CONSEJO" en la inspección de las instalaciones, a efecto de verificar el avance de las acciones u obras objeto del presente Convenio y colaborar con éste, cuando sea necesario.
- h) Llevar una contabilidad especial, de los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda, para la realización del objeto del presente Convenio.  
Así como entregar al Consejo los recibos de comprobantes, que amparen las erogaciones realizadas; permitir a las autoridades competentes, auditar dicha contabilidad, si así lo juzgan necesario.
- i) Dar aviso al "CONSEJO" sobre la terminación de las obras de que proceda a su verificación y preparación del informe y acta respectiva.
- j) Recibir las obras y responsabilizarse de su conservación, mantenimiento y operación.
- k) Denunciar ante el "AYUNTAMIENTO" o la Contraloría del Estado, la irregularidades que observen en la aplicación de los recursos financieros; tanto por parte de las autoridades, como de los particulares.

**SEXTA.** El "CONSEJO" se compromete a:

- a) Gestionar y coordinar los diversos apoyos institucionales que requiera el "COMITÉ", para la realización de las obras y/o acciones derivadas del presente Convenio.
- b) Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la realización de las obras y/o acciones y el ejercicio de los recursos derivados del presente Convenio, de acuerdo con los lineamientos del programa
- c) Realizar visitas de inspección a las instalaciones donde se lleven a cabo las obras y/o acciones.
- d) Solicitar ante las autoridades competentes, los permisos o licencias de construcción que se requieran para la realización de las obras; o en su caso de las acciones, a que se refiere este documento, conforme las leyes aplicables.
- e) Llevar a cabo el seguimiento, registro, control y evaluación del ejercicio de los recursos financieros, así como del avance físico de las acciones u obras objeto del presente Convenio.

**SEPTIMA.**-El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el "CONSEJO" y el "COMITÉ", ya sea consecuencia de dolo, culpa o negligencia de los servidores públicos municipales o de los representantes del "CONSEJO" y/o "COMITÉ" dará lugar a la terminación anticipada del presente convenio. En tal caso se comprometen a reintegrar al "AYUNTAMIENTO" los recursos que se les hayan ministrado y estén por alguna causa sin ejercer en este momento.



Sr. Juan José I.  
 Antonio Quezada Díaz

A. Balleza

Quien tenga conocimiento de las irregularidades, que en este contexto tuvieren lugar, procederá de inmediato a comunicar los hechos a la Contraloría Estatal o Municipal, para que se determine la responsabilidad administrativa que pudiera derivar de tales hechos o circunstancias, la cuál será independiente de la del orden civil o penal que puedan configurarse.

**OCTAVA.-** En caso de suscitarse duda o controversia respecto a la interpretación y cumplimiento del presente instrumento jurídico, las partes convienen expresamente, someterse a corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

**NOVENA.** - El presente Convenio de concertación entrará en vigor el día de su firma y su vigencia será el **ejercicio fiscal 2023**, pudiéndose modificar o adicionar de común acuerdo por las partes; las modificaciones Y adicciones deberá constar por escrito y surtirán efectos a partir de su suscripción.

Jose Quirarosa M.R.  
H+M desp me dia percu

Antonio Quirarosa Diaz  
J. Battagolera

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2023

0024

IV



Dado que fue el presente Convenio de Concertación y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firma para constancia y validez en: **26 DE MAYO DE 2023**

**OBRA: PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**

POR EL H. AYUNTAMIENTO  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL C.D.S.M.

  
C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO

  
L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO

  
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

POR EL COMITÉ DE OBRA

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE:


NOMBRE:

SECRETARIO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA .

TESORERO DEL COMITÉ



NOMBRE Y FIRMA



NOMBRE:

VOCAL DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA.

  
NOMBRE: 

V

0025

# ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ COMUNITARIO Y/O POR OBRA

404002

## EJERCICIO 2023

### RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

#### MARCO ESTRATÉGICO

Se promueve, la integralidad política institucional y de la sociedad para fortalecer el proceso de descentralización ampliando las capacidades de estados y municipios promoviendo la corresponsabilidad ciudadana y la participación social en la aplicación de los recursos públicos; sumando esfuerzos colectivos para alcanzar mejores condiciones de vida; cuidando que la obra a ejecutar se haga con transferencia y calidad. Es por ello y que en apego al Manual Único de Operación se formula la siguiente actuación:

En el municipio de NOCHISTLAN DE MEJIA y reunidos los habitantes del lugar que en forma anexa firman de asistencia en el lugar que ocupa LUGAR DE REUNION con la finalidad de concertar y conformar con la participación comunitaria y democrática el comité de obra comunitaria acordada por el Consejo de Desarrollo Municipal y autorizada y aprobada por la secretaría de Planeación y Finanzas en oficio No. respectivamente en la ejecución de la obra: PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS Siendo las 12:00 Horas del día 21 ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRES y en asamblea general extraordinaria, legalmente constituida con la asistencia de la mayoría de los habitantes con derecho a participar y ante la presencia de las diversas representaciones de los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales y del representante del Consejo en esta comunidad se da por iniciada bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación de autoridades.
- 2.- Lista de presentes.
- 3.- Objetivos generales de constituir el comité de obra comunitario.
- 4.- Alcances y beneficios del programa de desarrollarse en esta población.
- 5.- Propuestas para la integración del comité.

Abordados y agotados los puntos del 1 al 4, se escucharon propuestas a candidatos para la integración del comité habiendo quedado por mayoría como se especifica al final de esta actuación firmando de conformidad los que en ésta aceptan los cargos y responsabilidades.



0026

Andrés Mejía  
Antonio Dugana (Dug)

J. Baltazar  
José Francisco



## LOS BENEFICIARIOS SE COMPROMETEN A:

- 1.- Aportar: \$ 0.00/100 MN que corresponde al 0% aproximadamente del costo total para el programa F.I.S.M. Para que la obra se realice en el menor tiempo posible y hasta la fecha programada para su ejecución final, así como otros trabajos donde se requiera su participación.
- 2.- Colaborar con las autoridades en la resolución de los problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
- 3.- Aplicar los recursos de conformidad con el Manual Único de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 y la ley de adquisiciones y obras públicas, contenidas en las siguientes:

## CLAUSULAS

**PRIMERA:** El comité se denominará: comité de PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS personalidad jurídica y patrimonio propio.

**SEGUNDA:** El comité tendrá por objetivo contribuir a la construcción de la obra a que se hace referencia en el apartado anterior de éste documento apoyando y vigilando la operación y administración del programa, participará también en la organización de tareas comunitarias en las que se aporten materiales y/o mano de obra de los beneficiarios.

**TERCERA:** El domicilio legal del comité de obras se fijará en: **LUGAR DE LA OBRA** del municipio de **Nochistlán de Mejía**.


**CUARTA:** El comité se encargará de llevar a cabo tareas de promoción, difusión, organización construcción, vigilancia y mantenimiento de las obras que con motivo del programa se ejecuten.

**QUINTA:** El presidente del comité informará al representante comunitario del Consejo de Desarrollo Municipal de los avances físicos y financieros de la obra y comunicará a través del mismo al seno del consejo la problemática relacionada con la operación del programa. El presidente del comité tendrá la representación de la asamblea general ante toda clase de autoridades, organismos, personas físicas y morales siempre que sea necesario para el cumplimiento de los compromisos del comité.

**SEXTA:** El secretario tendrá a su cargo el archivo de la documentación correspondiente así como contestar y recibir toda clase de correspondencia.

**SEPTIMA:** El tesorero controlará los fondos y distribuirá los pagos que con motivo de la realización de las obras se erogan en liquidación de mano de obra y/o materiales, teniendo especial cuidado de recabar la documentación comprobatoria de los gastos.

**OCTAVA:** El Vocal de control y vigilancia informa y orienta al comité y a la comunidad acerca de los lineamientos de operación del fondo, trámites, recursos asignados y desarrollo



0027

Andres mejia petez  
Antonio Quetzada Cruz

Abel Torres  
Joni Francisco May

de las obras y acciones. Así como la estricta vigilancia de las obras y la actuación de los servidores públicos.

**NOVENA:** En este acto el comité recibe por parte del "AYUNTAMIENTO" fotocopia del proyecto técnico de la obra a ejecutar para su consulta y conocimiento de las diversas representaciones involucradas en el programa que se los requiera como referencia.

Leída que fue la presente acta constitutiva y enterados los participantes de su contenido y alcance legal, la firman de conformidad para su constancia y validez los que en ella quedaron como comité; la presente se integra con la lista de asistencia en la comunidad de **PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**

**EL PRESIDENTE DEL COMITÉ**

NOMBRE Y FIRMA

J Baltazar Pérez

NOMBRE:

**SECRETARIO DEL COMITÉ**

NOMBRE Y FIRMA.

José Francisco Mol L.

NOMBRE:

**TESORERO DEL COMITÉ**

NOMBRE Y FIRMA

Antonio Rosada Díaz

NOMBRE:

**VOCAL DE CONTROL**

NOMBRE Y FIRMA.

Andrés Mejía Pérez

NOMBRE:

Manuel Jiménez

POR LA PRESIDENCIA MPAL.

**C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES.**

**DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA  
REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO.**

l



0028



**LISTA DE ASISTENCIA**

Relación de participantes para la conformación del comité comunitario de la comunidad de:  
LAS HUERTAS – EL MOLINO municipio de Nochistlán de Mejía de la obra de  
PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

Andres mejia perel \_\_\_\_\_

J Baltazar Perez C \_\_\_\_\_

Jovita Rios \_\_\_\_\_

Jose Francis Mdz S. \_\_\_\_\_

Antonio Aguada Diaz \_\_\_\_\_

Roberto Lopez \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2023

0029



**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR



**FAIS**

FONDO DE APORTACIONES PARA  
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXOS PARA EL REPORTE DE LA  
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL FONDO PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE  
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL  
DISTRITO FEDERAL- FISMDF 2023

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL**

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2023

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

0030



**2022** Ricardo  
Flores  
Año de  
Magón  
PRESENCIA EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA





## ANEXO 1

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

*Aviso de privacidad: Los datos personales que se recaban por la DGDR serán utilizados para los fines establecidos en los lineamientos del Fondo, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte.*

## RESPONSABLE DEL LLENADO: ENLACE FISDMF Y COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

## 1.1 Acta de Instalación del Comité de participación social

Siendo las 12:00 horas del día 20 del mes de Mayo del año 2023 en la localidad de LAS HUERTAS, del municipio NOCHISTLAN, de la entidad ZACATECAS, se encuentran reunidos el/la C. Jose Guadalupe Buvalcaba Melendrez, designado (a) como enlace FISDMF, quien ostenta el cargo de \_\_\_\_\_ en calidad de representante de la instancia ejecutora, el/la C. Andres mejia perez, el/la C. Baltazar Perez Gmarena, el/la C. Francisco Adas, el/la C. Antonio Oropeza, y el/la C. Roberto para celebrar la instalación del Comité de participación social, que dará seguimiento y verificación de la obra: Pavimentación LAS HUERTAS EL MOLINO MUNICIPIO NOCHISTLAN a realizarse con los recursos del FAIS, componente FISDMF, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

## CONSIDERANDO

Que el artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal, establece la obligación que tendrán municipios y demarcaciones territoriales de promover la participación de las comunidades beneficiarias en la planeación, ejecución, control, vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras y acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Que los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigentes, publicados el en Diario Oficial de la Federación, en su numeral 3.1.2, fracciones XV y XVI, los gobiernos locales tendrán como responsabilidades: 1.- Promover la participación social en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través de los comités de participación social o de las formas de organización con las que cuente el municipio o demarcación territorial. 2.- Los municipios y demarcaciones territoriales deberán reportar los formatos de la integración y operación de los comités de participación social en el Módulo de Participación Social de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social-MIDS.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

OPERADO  
FAISM (FIII)  
EJERCICIO 2023



0031





## ANEXO 1

Que la Guía de Participación define al comité de participación social-CPS, como un órgano de participación social y representación de una comunidad, ya sea urbana, rural, indígena, o afromexicana, electos de manera democrática que dan seguimiento a la ejecución de las obras o acciones que se programan a través del FISMD, así como cualquier otra forma de organización con la que cuente el municipio o alcaldía, mismo que deberá conformarse en cada obra del FISMD. Este acto deberá formalizarse mediante la elaboración del acta respectiva.

Que el comité de participación social (CPS) deberá estar compuesto por cuatro personas como mínimo, que sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, que ocuparán los cargos de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo será el participar en la planeación, ejecución, control, vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras y acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México.


El comité de participación social deberá cumplir con las siguientes actividades:

1. Dar seguimiento al avance y conclusión de las obras o acciones a realizar con recursos del FISMD, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos se realice bajo los principios de transparencia, eficacia, legalidad y honradez.
2. Realizar visitas a las obras e informar de los avances, así como de y la conclusión de las mismas a sus comunidades y a la Secretaría de Bienestar, a través de llenado de los Anexos (1, 2, 3 y 4) de participación social.
3. Participar en la capacitación que brindará el Gobierno Municipal, sobre las tareas y responsabilidades de supervisión de las obras que vigilará.
4. Participar en los procesos de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades municipales, siempre y cuando los proyectos sugeridos se apeguen a los lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos.

En tal contexto, tomando en consideración las atribuciones que se contienen en los ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente:

**ACUERDO ÚNICO.-** Se declara formalmente **INSTALADO** el comité de participación social en la localidad de Las Huertas y el Molino del municipio de Nocistlán, de la entidad Zacatecas, que dará seguimiento y verificación de la obra Pavimentación Las Huertas El Molino, Municipio de Nocistlán de Mesa Zacatecas.

Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los/as intervinientes e integrantes del comité de participación social, para los efectos conducentes.



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





## ANEXO 1

## INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Nombre completo	Datos de contacto (Domicilio, teléfono y correo electrónico)	Cargo	¿Se considera usted integrante de pueblos indígenas o afroamericanos? Si/No ¿A Cuál (especifique)?	Firma
Baltazar Pérez	Hidalgo #23	Presidente (a)	NO	Baltazar Pérez
Francisco Robles	Hidalgo SS 344 106 0001	Secretario (a)	NO	Las Flores Mdy
Andrés Mejía Pérez	Felipe Angeles HS3 346 109 60 93	Vocal	NO	Andrés Mejía Pérez
Antonio Oueda Díaz	CALLE HIDALGO #49	Vocal	NO	Antonio Oueda Díaz
Ricardo Flores	Hidalgo #11 LAS HUERTAS	Vocal	NO	Ricardo Flores

## TESTIGO

Nombre completo	Datos de contacto (Domicilio, teléfono y correo electrónico)	Cargo	Firma
Jose Guadalupe Rivalcaba Meléndez	Roble #23 492-159-93-41	Enlace FISMDF de la instancia ejecutora	



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

0033

ANEXO 1

1.2. REPORTE DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la obra:	Pavimentación Las Huertas el Molino Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas		
Folio del proyecto:	404002		
Municipio	Nochistlán de Mejía Zacatecas		
Localidad	Las Huertas el Molino		
Entidad	Zacatecas		
Fecha y hora de la capacitación	12:00 20 Mayo 2023		
Lugar de la capacitación	Comunidad de las Huertas y el Molino		
Nombre del facilitador/a	Jose Guadalupe Rivalcaba Meléndez		
Temas	Pavimentación Las Huertas el Molino		
Número de asistentes	Mujeres	30	Hombres 25

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre	Datos de contacto (Domicilio, teléfono y correo electrónico)	Cargo	Recibió los materiales informativos del FAIS (Sí o No)	Firma
Andrés Mejía Pérez	Felipe Angeles #53 346 109 60 93	VOCAL	Si	Andrés Mejía Pérez
Jose Francisco	Hidalgo 55 344 106 0001	secretario	Si	Jose Francisco
Baltazar	43 Revolucion	Presidente	Si	Baltazar
Antonio Quintero	#IDALGO#49	vocal	Si	Antonio Quintero
Roberto Mada	Hidalgo #11	vocal	Si	Roberto Mada

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."






0034



ANEXO 1

FOTOGRAFÍAS DE LA CAPACITACIÓN

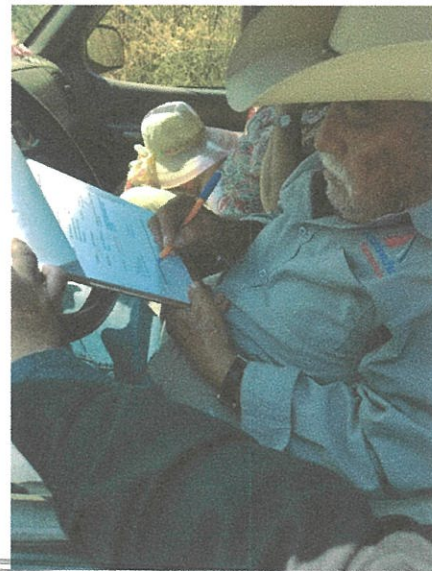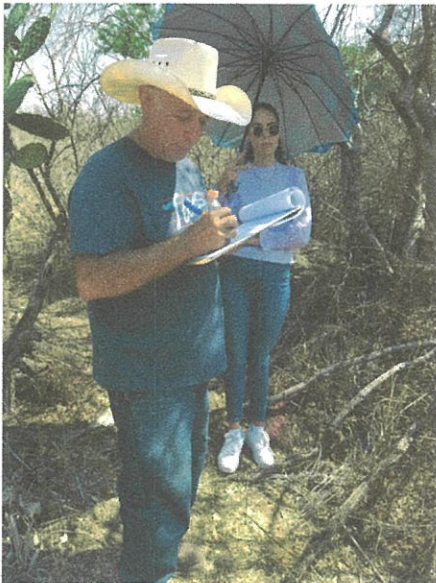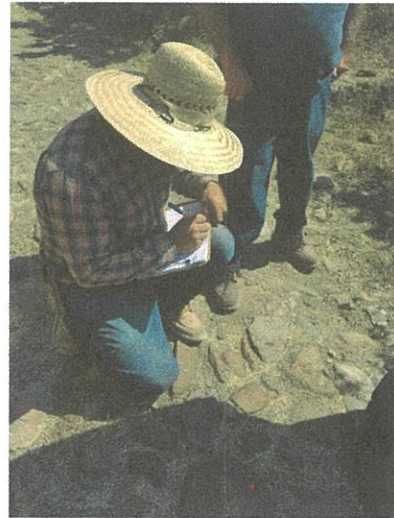

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2023

0035

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 2

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Fecha: (dd/mm/aaaa)

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	Pavimentación las Huertas el Molino, municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas		
Folio del proyecto	404002		
Municipio	Nochistlán de Mejía Zacatecas		
Localidad	Las Huertas		
Entidad	Zacatecas		
Monto invertido	\$ 1,249,342.93		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa)	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( )	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No ( <input checked="" type="checkbox"/> )
2. Descripción de la obra	Describa aquí en qué consiste la obra:  Pavimentación de las Huertas El Molino municipio Nochistlán de Mejía Zacatecas		
3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	No ( )	

**OPERADO**  
**FAISM ( FIII )**  
**EJERCICIO 2023**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0036





## ANEXO 2

4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad	Se beneficiara ya que es una vía corta para llevar a los niños a la escuela	
6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una <b>X</b> las opciones que considere. Seleccione máximo 3. a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). ( <input checked="" type="checkbox"/> ) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. ( ) d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. ( ) f) Otra, indique cual: _____	



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



**ANEXO 2**

9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	a) 1-3 ( )	b) 4-6 (X)	c) +6 ( )
--	------------	------------	-----------

**FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

*J. Baltazar Lopez*  
**Presidente(a) del Comité de Participación Social**  
 (Nombre completo y firma)

*José Tomasado Nely S.*  
**Secretario(a) del Comité de Participación Social**  
 (Nombre completo y firma)

*Andrés Mejía Deroz*  
**Vocal del Comité de Participación Social**  
 (Nombre completo y firma)

*Antonio Aguada Díaz*  
**Vocal del Comité de Participación Social**  
 (Nombre completo y firma)

*Ricardo Flores Magón*  
**Vocal del Comité de Participación Social**  
 (Nombre completo y firma)

*José Guadalupe Ruzalcaba*  
**Enlace FISMDF**  
 (Nombre completo y firma)



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





**ANEXO 3**

**ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS.**

**RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF**

**DATOS DE LA OBRA**

Nombre de la obra		
Folio de la obra		
Municipio		
Localidad		
Entidad		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa)
¿Se registraron quejas o denuncias) ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( )	No ( )
Seleccione el tipo de registro ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Queja ( ) En caso de contestar <b>queja</b> , pase a la pregunta 1.	Denuncia ( ) En caso de contestar <b>denuncia</b> , pase a la pregunta 2
1. ¿Cuál es el motivo de la queja?	Describa la queja a continuación:	
2. ¿Cuál es el motivo de la denuncia?	Describa la denuncia a continuación:	
3. ¿Entregó y/o presentó la queja o denuncia ante alguna autoridad? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
	No ( )	
4. ¿La queja o denuncia fue atendida de manera satisfactoria? ( Marque con una <b>X</b> la	Sí ( )	

**OPERADO**  
**FAISM ( FIII )**  
**EJERCICIO 2023**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0039




**ANEXO 3**

opción correspondiente).	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
5. Escriba el nombre de la(s) instancia(s) ante la cual presentó la queja o denuncia (Puede ser el folio de seguimiento, número de expediente o algún otro dato, como número telefónico, correo electrónico, etcétera.)		

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE PROMUEVE LA QUEJA O DENUNCIA**

Anónimo	( ) ( Marque con una <b>X</b> en caso de denuncia anónima)		
En caso de que quiera identificarse, complete la información que se solicita a continuación:			
Nombre completo			
Sexo M ( ) F ( )	Edad		Escolaridad
Ocupación			
Datos de contacto (teléfono y correo electrónico)			
<b>ACUSE DE RECIBIDO EN EL CPS</b>	<b>Presidente(a) del Comité de participación social</b> (Nombre completo y firma)		
<b>ACUSE DE RECIBIDO MUNICIPIO</b>	<b>Persona Funcionaria Pública</b> (Nombre completo y firma)		



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."




0040



## ANEXO 4

**ANEXO 4. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.**
**RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF**
**DATOS DE LA OBRA**

Nombre de la obra	Pavimentación las heretas el molino, municipio de Nochistlan de Magón	
Folio del proyecto	404002	
Dirección o ubicación	Las heretas - El Molino	
Municipio	Nochistlan de Magón	
Localidad	Las Heretas - EL Molino	
Entidad	Zacatecas	
Monto invertido	/ 1 249 342.73	
1. ¿La obra concluyó conforme el periodo de ejecución? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué  (favor de pasar a la pregunta 9)
2. Desde su punto de vista, ¿la obra se concluyó satisfactoriamente? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
3. Indicar la fecha de inauguración o entrega de la obra:	(dd/mm/aaaa) 09 Agosto 2023	
4. ¿El comité estuvo presente en la inauguración o entrega de la obra? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

**ANEXO 4**

5. ¿El comité colocó la placa de conclusión de la obra? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
6. ¿Recibieron por parte del municipio el acta entrega-recepción de la obra? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
7. Mencione dos resultados o beneficios obtenidos en su comunidad con el trabajo realizado por el CPS de FISMDF	<p><i>Vías de Comunicación de Calidad,</i> <i>Participación de la Comunidad</i></p>	
8. ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de haber participado en el CPS de FISMDF? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
9.-En caso de no haberse concluido la obra, colocar la posible fecha de término.		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."




**2022 Flores**  
Año de Magón


0042



FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL



**Presidente(a) del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)




**Secretario(a) del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)



**Vocal del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)



**Vocal del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)




**Vocal del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)



**José Guadalupe Rivalcaba M**

**Enlace FISDMF**  
(Nombre completo y firma)



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0043

## ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

## RESPONSABLE DEL LLENADO: MUNICIPIO Y COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISDMF)

Siendo las 16 horas del día 26 del mes de Mayo del año 2023 en la localidad de Las Huertas, del municipio Nocistlán, de la entidad Zacatecas, se encuentran reunidos el/la C. Jose Guadalupe Rovalcaba Melendez, quien ostenta el cargo de Enlace FISDMF en calidad de la instancia ejecutora, así como el Comité de participación social integrado por el/la C. Baltazar Perez, el/la C. Francisco Robles, el/la C. Andres Mesa, el/la C. Antonio Quezada, y el/la C. Roberto Novales para celebrar la entrega-recepción de la obra: Pavimentación Las Huertas el Molino Nocistlán, conforme a lo acordado en sus especificaciones técnicas y legales, que se describen a continuación.


## DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	<u>Pavimentación Las Huertas el Molino Municipio de Nocistlán</u>	
Número de folio	<u>404002</u>	
Dirección o ubicación	<u>Camino de las Huertas a el Molino</u>	
Municipio	<u>Nocistlán de Mejía</u>	
Localidad	<u>Las Huertas</u>	
Entidad	<u>Zacatecas</u>	
Monto invertido	<u>\$ 1,249,342.93</u>	
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) <u>1 / Junio / 2023</u>	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa) <u>07 Agosto 2023</u>

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y los y las integrantes del Comité de participación social responsables, y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra queda terminada conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.

No habiendo otro asunto a tratar, se da por terminada la entrega-recepción, siendo las 16:00 horas del día 9 Agosto citado, levantando para evidencia de este acuerdo la presente, donde firman de conformidad las partes.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0044



**ENTREGAN POR PARTE DEL MUNICIPIO (Nombre del municipio)**




Jose Euachilupe Ruygicaba Melendez

**Persona Funcionaria Pública**  
(Nombre completo, cargo y firma)

**RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**



**Presidente(a) del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)



**Secretario(a) del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)




**Vocal del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)



**Vocal del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)



**Vocal del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



**NOCHISTLÁN**  
De Mejía  
PUEBLO MÁGICO

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
NO. OFICIO	163
ASUNTO:	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

**C. ANGÉLICA RUANO ÁVILA**  
DOMICILIO: 16 DE SEPTIEMBRE NO.166, DANIEL CAMARENA  
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS

En virtud de haber cumplido adecuadamente las disposiciones legales y vigentes contenidos en el Artículo 64, de la Ley de Ingresos Municipales para el año 2023, esta Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, a mi cargo, le autoriza: **“PERMISO DE CONSTRUCCIÓN” DE PAVIMENTACIÓN LAS HUERTAS EL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS** según contrato con el H. Ayuntamiento de este municipio.

Es facultad de esta dependencia conforme a lo establecido en la Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas y Municipios en el artículo 36 fracción II art. 103, 104, 105, 106 y las Normas de Seguridad para la Población Laboral emitidas por STPS ejecutar dichas acciones.

Así mismo se le notifica que:

- ◆ Está prohibido conectar las aguas pluviales a la línea de drenaje.
- ◆ No deberá dejar escombros o material obstruyendo la vía pública.

**Nota:** deberá de sujetarse a la construcción del proyecto que ampara su contrato NO. NOCHIS/FONDOIII/2023/05 con el H. Ayuntamiento, además tiene la obligación de notificar la terminación de la obra.

Se extiende la presente a solicitud del interesado para los usos y fines legales que al mismo convengan, en la ciudad de **Nochistlán de Mejía, Estado de Zacatecas, a 23 de junio de 2023.**

ATENTAMENTE  
ENCARGADO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

*P. A.*



**C. SERGIO HINOJOSA PÉREZ**  
OBRAS PÚBLICAS  
NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZAC  
2021 - 2024



c.e.p. LIC. ROCIO ROQUE GÓMEZ, Tesorera Municipal Presidencia Municipal. - Para su conocimiento y fines de pago.  
c.e.p. El Archivo.

0046

"2023, Cuentenarario de la declaración de Zacatecas como Estado Libre y Soberano, Federado e instalación del Primer Congreso Constituyente"



## VALIDACIÓN O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

**PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCIÓN, COMPROMETIÉNDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS POSIBILIDADES

POR LA DEPENDENCIA O  
NORMATIVA



DESARROLLO  
ECONÓMICO Y SOCIAL

**DR. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA**  
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.  
2021 - 2024

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

POR LA DEPENDENCIA  
O ENTIDAD EJECUTORA



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

**C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES**  
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.  
2021 - 2024  
PRESIDENTE MPAL.


LUGAR: NOCHISTLAN ,ZAC.

FECHA: 26/05/2023

INFORMACIÓN ADICIONAL: \_\_\_\_\_

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Este prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



0047



## ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA COMUNIDAD

FECHA: 26-may-23

COMUNIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJIA DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACIÓN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO

PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: \_\_\_\_\_

PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

Jose Eusebio Delos J

Manuel Jimenez

C. JOSE MANUEL JIMÉNEZ FUENTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



0048





**NOCHISTLÁN**  
**De Mejía**  
**PUEBLO MÁGICO**

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 18 DE MAYO DEL 2023

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

**C.ISAAC DE JESUS GARCIA NUÑEZ.**

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII2023/05, CONSISTENTE; **PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS** ANEXANDO EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PARA LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 01 DE JUNIO DEL 2023 A LAS 11:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL .

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.



DESARROLLO  
ECONOMICO Y SOCIAL  
NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.  
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0049

**Obra: PAVIMENTO DE HUERTAS - MOLINO**

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
IMPORTE EN PESOS					
<b>PAVIMENTO DE HUERTAS - MOLINO</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
010705	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2, Incluye: Topografo y cadenero, operador	m2	990.00		
010128	Terraplenes, extendido de materiales, formación, incorporación de agua, compactado en capas de 20 cm de espesor, con material producto del corte al 95% p.v.s.m., Incluye: mano de obra, maquinaria p.u.o.t.	m2	164.75		
010625	Despalme de 20 cm de espesor a máquina en material B desperdiciando el material por despilante de terraplenes acarreo libre a 50 m	m3	9.90		
	Retiro de empedrado con recuperación de material incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.	m3	42.17		
010815	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	m3	42.17		
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (1 km)	m3/km	42.17		
<b>IMPORTE DE PRELIMINARES TERRACERIAS</b>					
	Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo al proyecto	m3	600.00		
	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	m3	600.00		
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (1 km)	m3/km	600.00		
<b>IMPORTE DE TERRACERIAS</b>					
				Importe Parcial de esta Hoja :	
				Importe Acumulado :	

OPERADO  
 FAJAM ( )  
 TEMP\*30  
 EJERCICIO 2023

0050



**Obra: PAVIMENTO DE HUERTAS - MOLINO**

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO

<b>SUB-BASE Y BASE</b>					
METAC-0002-3	Mezclado tendido y compactación de la construcción de capa subrasante compactada al 95% utilizando material de banco y material petro (50% material de banco - 50% material petreo)	m3	405.90		
METAC-0002	Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (90% material de banco - 10% material petreo)	m3	237.60		
<b>IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE</b>					
<b>CONCRETO</b>					
030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 66'10'10 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	990.00		
CUN-01	Cuneta de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 66'10'10 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	340.00		

**IMPORTE DE CONCRETO**  
**IMPORTE DE PAVIMENTO DE HUERTAS - MOLINO**

**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO**  
IVA(16%)  
**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA**



0051

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024	Ing. Diego Alejandro Mercado Q. Dir. Desarrollo Económico y Social
Importe Parcial de esta Hoja :	Importe Acumulado :

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 18 DE MAYO DEL 2023

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

**C.MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES**

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII2023/05, CONSISTENTE; **PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS** ANEXANDO EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PARA LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 01 DE JUNIO DEL 2023 A LAS 11:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL .

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.




**DESARROLLO  
ECONOMICO Y SOCIAL**  
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.  
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.





 <p>NOCHISTLAN GOBIERNO MUNICIPAL</p>	<p><b>MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS</b> DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL PAVIMENTO COMUNIDAD DE HUERTAS - MOLINO</p>	<p>Fecha: 15/may/2023 Página: 1 de 2</p>
--	--	--

**Obra: PAVIMENTO DE HUERTAS - MOLINO**

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
IMPORTE EN PESOS					
<b>PAVIMENTO DE HUERTAS - MOLINO</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
010705	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2. Incluye: Topografo y cadenero, operador	m2	990.00		
010128	Terraplenes, extendido de materiales, formación, incorporación de agua, compactado en capas de 20 cm de espesor, con material producto del corte al 95% p.v.s.m., incluye: mano de obra, maquinaria p.u.o.t.	m2	164.75		
010625	Despalme de 20 cm de espesor a máquina en material B desperdiciando el material por despante de terraplenes acarreo libre a 50 m	m3	9.90		
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperación de material incluye: almacenamiento a una distancia máxima de 20 mts.	m3	42.17		
010815	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	m3	42.17		
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se concideran (1 km)	m3/km	42.17		
<b>IMPORTE DE PRELIMINARES TERRACERIAS</b>					
010815	Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo al proyecto	m3	600.00		
010815	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	m3	600.00		
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se concideran (1 km)	m3/km	600.00		
<b>IMPORTE DE TERRACERIAS</b>					
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024				Ing. Diego Alejandro Mercado Q., Dir. Desarrollo Económico y Social	
				Importe Parcial de esta Hoja :	
				Importe Acumulado :	



0053

**Obra: PAVIMENTO DE HUERTAS - MOLINO**

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO

**METAC-0002-3** Mezclado tendido y compactación de la construcción de capa subrasante compactada al 95% utilizando material de banco y material petro (50% material de banco - 50% material petreo)

m3 405.90

**METAC-0002** Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (90% material de banco - 10% material petreo)

m3 237.60

**IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE**

**CONCRETO**

**030504** Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.

m2 990.00

**CUN-01** Cuneta de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.

m2 340.00

**IMPORTE DE CONCRETO**  
**IMPORTE DE PAVIMENTO DE HUERTAS - MOLINO**

**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO**

**IVA(16%)**

**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA**



H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024	Ing. Diego Alejandro Mercado Q. Dir. Desarrollo Económico y Social
	Importe Parcial de esta Hoja : Importe Acumulado :

0054





**NOCHISTLÁN**  
De Mejía  
PUEBLO MÁGICO

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 18 DE MAYO DEL 2023

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

**C.ANGELICA RUANO AVILA.**

PRESENTE.


POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII2023/05, CONSISTENTE; **PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS** ANEXANDO EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PARA LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 01 DE JUNIO DEL 2023 A LAS 11:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL .

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.



**DESARROLLO  
ECONOMICO Y SOCIAL**  
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.  
ING. DEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0055

**Obra: PAVIMENTO DE HUERTAS - MOLINO**

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PREGIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
<b>PAVIMENTO DE HUERTAS - MOLINO</b>						
<b>PRELIMINARES</b>						
010705	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2, incluye: Topografo y cadenero, operador	m2	990.00			
010128	Terraplenes extendido de materiales, formación, incorporación de agua, compactado en capas de 20 cm de espesor, con material producto del corte al 95% p.v.s.m., incluye: mano de obra, maquinaria p.u.o.t.	m2	164.75			
010625	Despalme de 20 cm de espesor a máquina en material B desperdiciando el material por despante de terraplenes acarreo libre a 50 m	m3	9.90			
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperacion de material incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.	m3	42.17			
010815	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	m3	42.17			
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (1 km)	m3/km	42.17			
<b>IMPORTE DE PRELIMINARES TERRACERIAS</b>						
	Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) conciderando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo al proyecto	m3	600.00			
010815	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	m3	600.00			
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (1 km)	m3/km	600.00			

**IMPORTE DE TERRACERIAS**

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024	Ing. Diego Alejandro Mercado Q.
	Dir. Desarrollo Economico y Social

**OPERADO**  
**IMPORTE DE PRELIMINARES TERRACERIAS**  
 TEMP 3  
 010815 (F11)  
**EJERCICIO 2023**

0056



**Obra: PAVIMENTO DE HUERTAS - MOLINO**

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
<b>SUB-BASE Y BASE</b>						
METAC-0002-3	Mezclado tendido y compactación de la construcción de capa subrasante compactada al 95% utilizando material de banco y material petro (50% material de banco - 50% material petreo)	m3	405.90			
METAC-0002	Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (90% material de banco - 10% material petreo)	m3	237.60			
<b>IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE CONCRETO</b>						
030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 66'10'10 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	990.00			
CUN-01	Cuneta de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 66'10'10 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	340.00			

**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO**  
**IVA(16%)**  
**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA**

**IMPORTE DE CONCRETO OPERADO**  
**IMPORTE DE PAVIMENTO DE HUERTAS - MOLINO FAISM ( FIII )**  
**EJERCICIO 2023**

0054





# CONSTRUCCIONES "RAMIREZ"



PLANOS, AVALUOS, PERITAJES, MEDICION DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL

PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>PRELIMINARES</b>				
TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICOS EN TERRENO PLANO DE 1000 A 200 M2, INCLUYE: TOPOGRAFO Y CADENERO OPERADOR	M2	990	\$ 12.73	\$ 12,599.73
TERRAPLENES EXTENDIDOS DE MATERIALES, FORMACION, INCORPORACION DE AGUA, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CIN MAQUINA P.U.O.T.	M3	164.75	\$ 17.96	\$ 2,959.40
DESPLAME DE 20 CM DE ESPESOR A MAQUINA EN MATERIAL B, DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES ACARREO LIBRE A 50 M.	m3	9.9	\$ 60.53	\$ 599.28
RETIRO DE EMPEDRADO CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: ALMACENAMIENTO A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M3	42.17	\$ 75.58	\$ 3,187.25
ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL, PRIMER KILOMETRO SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA	M3	42.17	\$ 80.26	\$ 3,384.40
ACARREO SOBRE CAMION DE VOLETO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE KILOMETROS SUBSECUENTES, SE COSIDERA 1 KM	M3/KM	42.17	\$ 18.14	\$ 764.92
<b>TERRACERIAS</b>				
EXCAVACION EN CORTE DEBAJO DE LA SUBRRSANTE MATERIAL TIPO II CON MEDIOS MECANICOS (MOTONIVELDORA) CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE Y DEJANDO PENDIENTE DE ACUERDO AL PROYECTO	M3	600	\$ 48.13	\$ 28,875.00
ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL, PRIMER KILOMETRO SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA	M3	600	\$ 80.26	\$ 48,153.60
ACARREO SOBRE CAMION DE VOLETO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE KILOMETROS SUBSECUENTES, SE COSIDERA 1 KM	M3/KM	600	\$ 18.14	\$ 10,883.40
<b>SUB-BASE Y BASE</b>				
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE CAPA SUBRRASANTE COMPACTADA AL 95% UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PETREO (50% MATERIAL DE BANCO Y 50% MATERIAL PETREO)	M3	210	\$ 555.62	\$ 116,680.41
MEZCALDO, TENDIDO Y COMPATACION DE LA CONSTRUCCION DE LA BASE COMPACTADA AL 100%, UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PETREO ( 50% MATERIAL DE BANCO Y 50% MATERIAL PETREO.	M3	210	\$ 508.86	\$ 106,860.60
<b>CONCRETO,</b>				
PAVIMENTO DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 AGREGADO DE 19 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 15 CM DE ESPEOSR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERAMIENTAS MENORES	M2	990	\$ 683.52	\$ 676,682.82
CUNETETA DE CONCRETOF'C= 150 KG/CM2 AGREGADO DE 19MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 10 CM DE ESPESOR. CIMBRA METALICA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	340	\$ 509.09	\$ 173,090.94
				<b>SIB TOTA \$ 1,184,721.75</b>
				<b>IVA \$ 189,555.48</b>
				<b>TOTAL \$ 1,374,277.23</b>

OPERADO  
EJERCICIO 2023

0058

Pila Azul No. 9 Frac. Colinas del Acueducto

Tel (346) 7000108

Nochistlan, Zac. C.P. 99900

**MA. MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES**

email: luisda\_ra@yahoo.com.mx

Ma. Mercedes R.F.



# ISAAC DE JESUS GARCIA NUÑEZ

**GANI990225JK3**

Calle Rio Ancho #7 Col. Nanguel del Refugio,  
Yahualica de González Gallo, Jalisco C.P. 47309  
PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO

CEL: 344 101 0710 / 344 103 4898

CORREO PRELIMINARES99@outlook.es



CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TRAZO Y NVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICOS EN TERRENO PLANO DE 1000 A 200 M2, INCLUYE: TOPOGRAFO Y CADENERO OPERADOR	M2	990	\$ 12.15	\$ 12,027.02
TERRAPLENES EXTENIDOS DE MATERIALES, FORMACION, INCORPORACION DE AGUA, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CIN MAQUINA P.U.O.T.	M3	164.75	\$ 17.15	\$ 2,824.89
DESPLAME DE 20 CM DE ESPESOR A MAQUINA EN MATERIAL B, DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES ACARREO LIBRE A 50 M.	m3	9.9	\$ 57.78	\$ 572.04
RETIRO DE EMPEDRADO CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: ALMACENAMIENTO A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M3	42.17	\$ 72.15	\$ 3,042.38
ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL, PRIMER KILOMETRO SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA	M3	42.17	\$ 76.61	\$ 3,230.56
ACARREO SOBRE CAMION DE VOLETO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE KILOMETROS SUBSECUENTES, SE COSIDERA 1 KM	M3/KM	42.17	\$ 17.31	\$ 730.15
<b>TERRACERIAS</b>			\$ -	
EXCAVACION EN CORTE DEBAJO DE LA SUBRRSANTE MATERIAL TIPO II CON MEDIOS MECANICOS (MOTONIVELDORA) CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE Y DEJANDO PENDIENTE DE ACUERDO AL PROYECTO	M3	600	\$ 45.94	\$ 27,562.50
ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL, PRIMER KILOMETRO SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA	M3	600	\$ 76.61	\$ 45,964.80
ACARREO SOBRE CAMION DE VOLETO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE KILOMETROS SUBSECUENTES, SE COSIDERA 1 KM	M3/KM	600	\$ 17.31	\$ 10,388.70
<b>SUB-BASE Y BASE</b>			\$ -	\$ -
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE CAPA SUBRRASANTE COMPACTADA AL 95% UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PETREO (50% MATERIAL DE BANCO Y50% MATERIAL PETREO)	M3	210	\$ 530.37	\$ 111,376.76
MEZCALDO, TENDIDO Y COMPATACION DE LA CONSTRUCCION DE LA BASE COMPACTADA AL 100%, UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PETREO ( 50% MATERIAL DE BANCO Y 50% MATERIAL PETREO.	M3	210	\$ 485.73	\$ 102,003.30
<b>CONCRETO</b>			\$ -	
PAVIMENTO DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 AGREGADO DE 19 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 15 CM DE ESPEOSR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERAMIENTAS MENORES	M2	990	\$ 652.45	\$ 645,924.51
CUNETA DE CONCRETOF'C= 150 KG/CM2 AGREGADO DE 19MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 10 CM DE ESPESOR. CIMBRA METALICA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	340	\$ 485.95	\$ 165,223.17
<b>SIB TOTAL</b>				<b>\$ 1,130,870.76</b>
<b>IVA</b>				<b>\$ 180,939.32</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1,311,810.08</b>

OPERADO  
FAISM (FII)  
EJERCICIO 2023

0059



**NOCHISTLÁN**  
De Mejía  
PUEBLO MÁGICO

# ACUERDO DE MODALIDAD DE EJECUCION.

**MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA.**

**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.**

**CONTRATO # NOCHIS/FONDOIII/2023/05**

PARA DAR ATENCION AL ARTICULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y DE ACUERDO A LOS MONTOS SEÑALADOS ESPECIFICAMENTE EN EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS , EL PRESENTE CONTRATO CONSISTENTE EN; **PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA , ZACATECAS.** SE CONTRATO BAJO EL ESQUEMA DE ADJUDICACION DIRECTA A LA C. **ANGELICA RUANO AVILA,** SIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA MAS FACTIBLE PARA EL MUNICIPIO Y LOS INTERESES DEL MISMO.

SE EXTIENDE LAS PRESENTE DE LA PARTE NORMATIVA PARA LOS USOS Y FINES LEGALES , EN LA CIUDAD DE NOCHISTLAN ZACATECAS 01 DE JUNIO DEL 2023.



DESARROLLO  
ECONOMICO Y SOCIAL  
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.  
2021 - 2024

**ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.**

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0060



# CONTRATO

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

CTO.  
NO.NOCHIS/FONDOIII/2023/05  
R.F.C.MNM850101AC3

## DECLARACIONES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. A TRAVES DE EL PRESIDENTE MUNICIPAL; EL SINDICO; DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; A TRAVES DE SUS TITULARES LOS C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES PRESIDENTE MUNICIPAL; C. LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ, SINDICO MUNICIPAL ; ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO , Y POR LA OTRA: LA C. ANGELICA RUANO AVILA, A QUIEN SE DENOMINARA EL CONTRATISTA, SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

*Manuel Jimenez*

*[Handwritten mark]*

### PRIMERA.- EL MUNICIPIO DECLARA:

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUBRIRAN CON RECURSOS DEL FONDO III.

1.2.- QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO # 1 ZONA CENTRO DE , NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.3.- QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ POR: ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

*[Handwritten signature]*


### SEGUNDA.- LA CONTRATISTA DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

II.1 QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS NECESARIAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DENTRO DE SUS OBJETIVOS COMPRENDE: LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

II.2- QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

*[Handwritten signature]*

0061





II.3.- QUE HA VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO EN QUE HABRÁN DE EJECUTARSE LAS OBRAS, PARA OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

II.4.- QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE 48 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. EL REGLAMENTO DE LA LEY DE QUE SE INVOCA, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, QUE SE SEGUIRÁN APLICANDO, EN TODO LO QUE NO SE OpongA A LA LEY QUE SE INVOCA Y SU REGLAMENTO Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA DEL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS. LOS ANEXOS, (PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O PARTICULARES EN LA CONSTRUCCIÓN, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES), QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y LAS DEMÁS NORMAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LOS TRABAJOS.

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE #166. DANIEL CAMARENA NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.6. SER UNA EMPRESA MEXICANA LO CUAL ACREDITA CON RFC. RUAA880710SQ6.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

### CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS, CONSISTENTES EN: PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA , ZACATECAS. Y ESTA SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SEÑALAN EN ESTE CONTRATO, ASÍ COMO DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" DISPONDRÁ DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO III.

SEGUNDA: TIPO DE ADJUDICACIÓN.- CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 EN RELACIÓN EL 46 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.", LA ASIGNACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" A "EL CONTRATISTA" FUE MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.- LAS PARTES ACUERDAN QUE EL MONTO QUE SE CUBRIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, POR LA CANTIDAD DE \$1,249,342.93 (UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 93/100), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MONTO QUE SOLO PODRÁ SER MODIFICADO CUANDO EXISTAN RAZONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLÍCITAS, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL ARTICULO 128 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.


EJERCICIO 2023

*Marcos Jimenez*

*Andres*

*Jimenez*

0062





**CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN,- "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2023, PARA CONCLUIRLA EN SU TOTALIDAD EL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA EN EL SUPUESTO DE RETRASO SE ESTARÁ A LO QUE SE ESTABLECE SI EL CONTRATISTA ADVIERTE QUE NO ES POSIBLE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A ÉL, DEBERÁ NOTIFICARLO, MEDIANTE LA BITÁCORA, AL ENTE PÚBLICO EJECUTOR, PRESENTANDO SU SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL PLAZO Y LA DOCUMENTACIÓN QUE LO JUSTIFIQUE. EL ENTE PÚBLICO DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, EMITIRÁ EL DICTAMEN DE RESOLUCIÓN, DE NO HACERLO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR NO ACEPTADA. EL CONVENIO, EN SU CASO, DEBERÁ FORMALIZARSE DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A UNO U OTRO SUCESO SEÑALADO EN EL ARTICULO 130 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.**

*Manuel Quiroz*

**QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL MUNICIPIO" SE OBLIGA DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS., A ENTREGAR AL CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CON OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA; EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", PRORROGARÁ EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SITUACIÓN QUE QUEDARÁ DE MANIFIESTO EN UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN.**

*[Handwritten mark]*

**SEXTA: ANTICIPOS.- SIN ANTICIPO**

**SEPTIMA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASÍ MISMO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO" EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SU REPRESENTANTE LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA QUE PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA.**


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**OCTAVA: FORMA DE PAGO.- LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARQUEN COMO MÁXIMO PERIODOS MENSUALES, ESTIMACIONES QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ÉSTAS, LAS QUE SERÁN QUINCE Y ULTIMO DE CADA MES, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EL LUGAR DE PAGO SERÁ EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.**

0063

**"EL CONTRATISTA" SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR**





SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE "EL MUNICIPIO" TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN, EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARÁ EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA, A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERÁ APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE "EL MUNICIPIO", INDEPENDIEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.4 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE "EL MUNICIPIO", ÉSTE PODRÁ ORDENAR SU DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO EN ESTE CASO, "EL MUNICIPIO", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, "EL MUNICIPIO", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHO GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA".

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTA DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES


*Manuel Quintana*

*✓*

*Andrés*

*Sebastián*

0064





PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO".


**NOVENA: GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS., Y SU REGLAMENTO VIGENTE, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO ASÍ MISMO AL CONTRATISTA AL MOMENTO DE LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA ENTREGARÁ A "EL MUNICIPIO" UNA PÓLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE INCURRA, LO ANTERIOR CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TÉRMINOS LEGALES DEL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.**

**DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-** LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. SU REGLAMENTO VIGENTE, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE "EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA" EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. "EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

**DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER EN TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL MUNICIPIO" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO. POR LO ANTERIOR EXPUESTO, PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS LA EMPRESA CONTRATISTA SE COMPROMETE Y OBLIGA QUE TODO EL PERSONAL QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN LA OBRA DEBERÁ CONTAR CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE CONSISTIRÁ EN UNIFORMES, BOTAS, GUANTES CASCO DE PROTECCIÓN, Y TODOS AQUELLOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU SEGURIDAD, TODO ELLO EN APEGO A LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS QUE SE DESARROLLAN, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE, ASÍ COMO LO ORDENA LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-113 STPS-2009, SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN DE PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN -CLASIFICACIÓN ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.**

**DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN EN SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGOS DE LOS EFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS. IGUALMENTE SE OBLIGA AL CONTRATISTA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS Ó MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO"**

0065





EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

**DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.-** "EL MUNICIPIO" TENDRÁN LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS ESTÁN SIENDO EJECUTADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA. "EL MUNICIPIO" APLICARÁ COMO SANCIÓN EL 5 % DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBÍA DE EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA AL TÉRMINO DE LA OBRA, APLICÁNDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL MUNICIPIO" COMO PENA CONVENCIONAL.

**DECIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-** "EL MUNICIPIO" PODRÁN SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LA CUAL HARÁ LA COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.


**DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-** "EL MUNICIPIO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS., SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL MUNICIPIO" ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO.

**DECIMAM SEXTA.-** LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

**DECIMA SEPTIMA.-** PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN DE LA CIUDAD DE ZACATECAS POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE NOCHISTLAN, ZAC. EN ORIGINAL EL DÍA 05 DEL MES DE JUNIO DEL 2023.





"EL CONTRATISTA"

C. ANGELICA RUANO AVILA...

"EL MUNICIPIO"

POR SINDICATURA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES.

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

0067

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2023

**ASUNTO: ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN**

01 DE JUNIO DE 2023, NOCHISTLAN, ZAC.

**C. JOSÉ MANUEL JIMENEZ FUENTES**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA HACERLE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL CONTRATISTA DENOMINADO **ANGÉLICA RUANO AVILA**, SI **ACEPTA PARTICIPAR** EN LA ADJUDICACION DE LA OBRA **“PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS”** POR LO QUE ELABORAREMOS NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA.

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADECIENDOLE SU ATENCION ME DESPIDO ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO QUEDANDO A SUS ORDENES

ATENTAMENTE:

  
\_\_\_\_\_  
**C. ANGÉLICA RUANO AVILA**  
SERVICIOS MELENDREZ

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2023

0068

 **Angélica Ruano Avila**  
**RUA880710506**  
16 de Septiembre 166  
Centro Localidad Daniel Camarena  
Nochistlán de Mejía, Zac.  
México C.P.99914

 **CEL. 346 101 2142**

 **@ j\_melendrez@hotmail.com**



**ASUNTO: CONOCIMIENTO DEL SITIO**  
01 DE JUNIO DE 2023, NOCHISTLAN, ZAC.

**C. JOSÉ MANUEL JIMENEZ FUENTES**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**PRESENTE:**

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA HACERLE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL CONTRATISTA DENOMINADO ANGÉLICA RUANO AVILA, AGRADECE LA CONSIDERACION Y SE TIENE PLENO CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LA OBRA DENOMINADA “PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS”

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADECIENDOLE SU ATENCION ME DESPIDO ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO QUEDANDO A SUS ORDENES

ATENTAMENTE:



**C. ANGÉLICA RUANO AVILA**  
**SERVICIOS MELENDREZ**

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2023-0069

 **Angélica Ruano Avila**  
**RUA880710506**  
16 de Septiembre 166  
Centro Localidad Daniel Camarena  
Nochistlán de Mejía, Zac.  
México C.P.99914

 **CEL. 346 101 2142**

 **@ j\_melendrez@hotmail.com**

# SERVICIOS MELENDREZ

CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA

## PRESPUESTO

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO</b>				
<b>PRELIMINARES</b>				
TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICOS EN TERRENO PLANO DE 1000 A 200 M2, INCLUYE: TOPOGRAFO Y CADENERO OPERADOR	M2	990.00	11.60	11,484.00
TERRAPLENES EXTENIDOS DE MATERIALES, FORMACION, INCORPORACION DE AGUA, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CIN MAQUINA P.U.O.T.	M3	164.75	16.11	2,654.12
DESPLAME DE 20 CM DE ESPESOR A MAQUINA EN MATERIAL B, DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES ACARREO LIBRE A 50 M.	m3	9.90	53.80	532.62
RETIRO DE EMPEDRADO CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: ALMACENAMIENTO A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M3	42.17	67.79	2,858.70
ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL, PRIMER KILOMETRO SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA	M3	42.17	62.47	2,634.36
ACARREO SOBRE CAMION DE VOLETO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE KILOMETROS SUBSECUENTES, SE COSIDERA 1 KM	M3/KM	42.17	14.12	595.44
<b>Total de PRELIMINARES</b>				<b>20,759.24</b>
<b>TERRACERIAS</b>				
EXCAVACION EN CORTE DEBAJO DE LA SUBRRSANTE MATERIAL TIPO II CON MEDIOS MECANICOS (MOTONIVELDORA) CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE Y DEJANDO PENDIENTE DE ACUERDO AL PROYECTO	M3	600.00	43.11	25,866.00
ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL, PRIMER KILOMETRO SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA	M3	600.00	62.47	37,482.00
ACARREO SOBRE CAMION DE VOLETO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE KILOMETROS SUBSECUENTES, SE COSIDERA 1 KM	M3/KM	600.00	14.12	8,472.00
<b>Total de TERRACERIAS</b>				<b>71,820.00</b>
<b>TERRAPLENES Y BASE</b>				
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE CAPA SUBRRASANTE COMPACTADA AL 95% UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PETREO (50% MATERIAL DE BANCO Y50% MATERIAL PETREO)	M3	210.00	555.73	116,703.30
MEZCALDO, TENDIDO Y COMPATACION DE LA CONSTRUCCION DE LA BASE COMPACTADA AL 100%, UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PETREO ( 50% MATERIAL DE BANCO Y 50% MATERIAL PETREO.	M3	210.00	477.08	100,186.80
<b>Total de TERRAPLENES Y BASE</b>				<b>216,890.10</b>
<b>CONCRETO</b>				
PAVIMENTO DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 AGREGADO DE 19 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 15 CM DE ESPEOSR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERAMIENTAS MENORES	M2	990.00	618.56	612,374.40
CUNETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 AGREGADO DE 19MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 10 CM DE ESPESOR. CIMBRA METALICA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	340.00	456.40	155,176.00
<b>Total de CONCRETO</b>				<b>767,550.40</b>
<b>Total de PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO</b>				<b>1'077,019.74</b>



*Angélica* 0070

**Angélica Ruano Avila**  
**RURR880710506**  
 16 de Septiembre 166  
 Centro Localidad Daniel Camarena  
 Nochistlán de Mejía, Zac.  
 México C.P.99914

CEL. 346 101 2142

@ j.melendrez@hotmail.com



# SERVICIOS MELENDREZ

CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA

## PRESPUESTO

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Subtotal de Presupuesto				1'077,019.74
			IVA	172,323.16
			Total	1'249,342.90

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2023

0071



Angélica Ruano Avila

RUR880710506



16 de Septiembre 166  
Centro Localidad Daniel Camarena  
Nochistlán de Mejía, Zac.  
México C.P.99914



CEL. 346 101 2142



@ j\_melendrez@hotmail.com

**Análisis de Precio Unitario****Descripción**

CUNETAS DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 AGREGADO DE 19MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 10 CM DE ESPESOR. CIMBRA METALICA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.


Unidad : M2  
 Cantidad : 340.00  
 Precio Unitario : 456.40  
 TOTAL : 155,176.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
<b>Mano de Obra</b>						
	OF-AL	OFICIAL ALBAÑIL	jor	0.20833	454.59	94.70
	PEON	PEON	jor	0.26651	257.83	68.71
<b>Total de Mano de Obra</b>						<b>163.41</b>
<b>Herramienta</b>						
	H-ERR	HERRAMIENTAS	(%)mo	0.03000	163.41	4.90
<b>Total de Herramienta</b>						<b>4.90</b>
<b>Auxiliares</b>						
	+ PCON-003	Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 12 a 15 cm.	m3	0.08888	2,285.80	203.16
<b>Total de Auxiliares</b>						<b>203.16</b>

Costo Directo	371.47
Indirectos ( 4.13%)	15.34
Indirectos de Campo ( 1.18%)	4.38
Subtotal	391.19
Financiamiento ( 0.00%)	0.00
Subtotal	391.19
Utilidad ( 16.67%)	65.21
Cargos Adicionales ( 0.00%)	0.00

Precio Unitario 456.40

\*\* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. \*\*



0072



**Angélica Ruano Avila**

**RUA000710506**

16 de Septiembre 166  
 Centro Localidad Daniel Camarena  
 Nochistlán de Mejía, Zac.  
 México C.P.99914



**CEL. 346 101 2142**



**@ j\_melendrez@hotmail.com**



### Análisis de Precio Unitario

#### Descripción


PAVIMENTO DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 AGREGADO DE 19 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 15 CM DE ESPEOSR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERAMIENTAS MENORES

Unidad : M2  
 Cantidad : 990.00  
 Precio Unitario : 618.56  
 TOTAL : 612,374.40

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
<b>Materiales</b>						
	ACES-001	Malla electrosoldada 66-1010 / 1.02 kg/m2).	m2	1.00000	35.00	35.00
<b>Total de Materiales</b>						<b>35.00</b>
<b>Mano de Obra</b>						
	+ MOCU-002	Cuadrilla No 2 (1.00 Albañil + 1.00 Peón)	jor	0.06222	1,476.07	91.84
<b>Total de Mano de Obra</b>						<b>91.84</b>
<b>Herramienta</b>						
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000	91.84	2.76
<b>Total de Herramienta</b>						<b>2.76</b>
<b>Equipo</b>						
	F AMAIN-001	Revolvedora para concreto marca Cipsa modelo R10 de un saco tipo trompo, cap. 5 m3/hr, motor a gasolina marca Kohler de 8 HP, con reductor, montada sobre ruedas tipo B78X-13, peso de la máquina con motor 363 kg.	hora	0.03087	225.78	6.97
	F AMALI-017	Vibrador de gasolina marca Dynapac modelo MVK8 cap. 12000 VPM, con chicote de 4.00 mts, por 38 mm ( 1 1/2"), con motor de gasolina de 4 H. P.	hora	0.00000	119.15	0.00
<b>Total de Equipo</b>						<b>6.97</b>
<b>Auxiliares</b>						
	+ PCON-014	Concreto 250 Kg/cm2 agregado de 38 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm.	m3	0.13332	2,751.84	366.88
<b>Total de Auxiliares</b>						<b>366.88</b>

Costo Directo	503.45
Indirectos ( 4.13%)	20.79
Indirectos de Campo ( 1.18%)	5.94
<b>Subtotal</b>	<b>530.18</b>
Financiamiento ( 0.00%)	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>530.18</b>
Utilidad ( 16.67%)	88.38
Cargos Adicionales ( 0.00%)	0.00

Precio Unitario 618.56  
 \*\* SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 56/100 M.N. \*\*

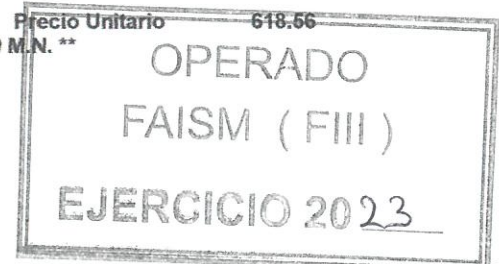

0073



**Angélica Ruano Avila**

**RUA880710SQ6**

16 de Septiembre 166  
 Centro Localidad Daniel Camarena  
 Nochistlán de Mejía, Zac.  
 México C.P.99914



**CEL. 346 101 2142**



**@ j\_melendrez@hotmail.com**

**Análisis de Precio Unitario****Descripción**

MEZCALDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE LA BASE COMPACTADA AL 100%,  
UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PETREO ( 50% MATERIAL DE BANCO Y 50% MATERIAL PETREO.


Unidad : M3  
Cantidad : 210.00  
Precio Unitario : 477.08  
TOTAL : 100,186.80

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
<b>Materiales</b>					
TEP-1	TEPETATE	m3	0.30000	400.00	120.00
AGRE-016C	Pipa de agua	Pipa	0.01000	820.00	8.20
<b>Total de Materiales</b>					<b>128.20</b>
<b>Mano de Obra</b>					
+ MOCU-002	Cuadrilla No 2 (1.00 Albañil + 1.00 Peón)	jor	0.05332	1,476.07	78.70
<b>Total de Mano de Obra</b>					<b>78.70</b>
<b>Equipo</b>					
† AMAPE-024	Motoniveladora 16-H, de 275 hp, capacidad de carga 24.7 ton	hora	0.08888	1,555.97	138.29
† AMAPE-039	Camión de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad.	hora	0.08888	484.94	43.10
<b>Total de Equipo</b>					<b>181.39</b>

<b>Costo Directo</b>	<b>388.29</b>
Indirectos ( 4.13%)	16.04
Indirectos de Campo ( 1.18%)	4.58
<b>Subtotal</b>	<b>408.91</b>
Financiamiento ( 0.00%)	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>408.91</b>
Utilidad ( 16.67%)	68.17
Cargos Adicionales ( 0.00%)	0.00

**Precio Unitario 477.08**

**\*\* CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. \*\***



**Angélica Ruano Avila**

**RUA880710506**

16 de Septiembre 166  
Centro Localidad Daniel Camarena  
Nochistlán de Mejía, Zac.  
México C.P.99914



**CEL. 346 101 2142**



**@ j\_melendrez@hotmail.com**



### Análisis de Precio Unitario

#### Descripción

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE CAPA SUBRRASANTE COMPACTADA AL 95% UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PETREO (50% MATERIAL DE BANCO Y50% MATERIAL PETREO)


Unidad : M3  
 Cantidad : 210.00  
 Precio Unitario : 555.73  
 TOTAL : 116,703.30

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
<b>Materiales</b>					
TEP-1	TEPETATE	m3	0.55000	400.00	220.00
AGRE-016D	agua en pipa	m3	0.09000	160.00	14.40
CAS-1	CASCAJO	m3	0.40000	300.00	120.00
<b>Total de Materiales</b>					<b>354.40</b>
<b>Herramienta</b>					
H-ERR	HERRAMIENTAS	(%)mo	0.02000	0.00	0.00
<b>Total de Herramienta</b>					<b>0.00</b>
<b>Equipo</b>					
F EQUI-CAR	CARGADOR 955-L CAP 1.5 M3	hora	0.01778	617.94	10.99
F EQUI-PIPA	CAMION PIPA CAP 8000 LTS	hora	0.04446	384.07	17.08
F MOTO	MOTOCONFORMADORA CM17	hora	0.01778	865.63	15.39
F COMP-1	COMPACTADOR CA25-2	hora	0.01778	595.83	10.59
<b>Total de Equipo</b>					<b>54.05</b>
<b>Auxiliares</b>					
+ EXTRA -C	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO C	M3	0.88824	49.38	43.86
<b>Total de Auxiliares</b>					<b>43.86</b>

Costo Directo	452.31
Indirectos ( 4.13%)	18.68
Indirectos de Campo ( 1.18%)	5.34
<b>Subtotal</b>	<b>476.33</b>
Financiamiento ( 0.00%)	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>476.33</b>
Utilidad ( 16.67%)	79.40
Cargos Adicionales ( 0.00%)	0.00

**Precio Unitario 555.73**

**\*\* QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N. \*\***



0075

**Angélica Ruano Avila**  
 RUA880710506  
 16 de Septiembre 166  
 Centro Localidad Daniel Camarena  
 Nochistlán de Mejía, Zac.  
 México C.P.99914

CEL. 346 101 2142

@ j\_melendrez@hotmail.com

**Análisis de Precio Unitario**

**Descripción**

ACARREO SOBRE CAMION DE VOLETO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE KILOMETROS SUBSECUENTES, SE  
 COSIDERA 1 KM

Unidad : M3/KM  
 Cantidad : 600.00  
 Precio Unitario : 14.12  
**TOTAL : 8,472.00**

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
<b>Equipo</b>						
F	AMAPE-039	Camión de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad.	hora	0.02370	484.94	11.49
<b>Total de Equipo</b>						<b>11.49</b>

<b>Costo Directo</b>	<b>11.49</b>
Indirectos ( 4.13%)	0.47
Indirectos de Campo ( 1.18%)	0.14
<b>Subtotal</b>	<b>12.10</b>
Financiamiento ( 0.00%)	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>12.10</b>
Utilidad ( 16.67%)	2.02
Cargos Adicionales ( 0.00%)	0.00
<b>Precio Unitario</b>	<b>14.12</b>

**\*\* CATORCE PESOS 12/100 M.N. \*\***



0076

**Angélica Ruano Avila**  
**RUA880710506**  
 16 de Septiembre 166  
 Centro Localidad Daniel Camarena  
 Nochistlán de Mejía, Zac.  
 México C.P.99914

**CEL. 346 101 2142**

**@ j\_melendrez@hotmail.com**



# SERVICIOS MELENDREZ

CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA

## Análisis de Precio Unitario

### Descripción

ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL, PRIMER KILOMETRO SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA

Unidad : M3  
Cantidad : 600.00  
Precio Unitario : 62.47  
TOTAL : 37,482.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	Herramienta					
	H-ERR	HERRAMIENTAS	(%)mo	0.03000	0.00	0.00
	<b>Total de Herramienta</b>					<b>0.00</b>
	Equipo					
	F CAMI-VOL	CAMION VOLTEO CAP. 6 M3	hora	0.07899	435.02	34.36
	F AMAPE-033	Retroexcavadora 416 D, de 80 hp, capacidad 6.9 ton	hora	0.03952	416.95	16.48
	<b>Total de Equipo</b>					<b>50.84</b>

Costo Directo	50.84
Indirectos ( 4.13%)	2.10
Indirectos de Campo ( 1.18%)	0.60
Subtotal	53.54
Financiamiento ( 0.00%)	0.00
Subtotal	53.54
Utilidad ( 16.67%)	8.93
Cargos Adicionales ( 0.00%)	0.00

Precio Unitario 62.47

\*\* SESENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. \*\*



0077



Angélica Ruano Avila

RUA880710506

16 de Septiembre 166  
Centro Localidad Daniel Camarena  
Nochistlán de Mejía, Zac.  
México C.P.99914



CEL. 346 101 2142



j\_melendrez@hotmail.com

**Análisis de Precio Unitario**

**Descripción**

EXCAVACION EN CORTE DEBAJO DE LA SUBRRSANTE MATERIAL TIPO II CON MEDIOS MECANICOS ( MOTONIVELDORA) CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE Y DEJANDO PENDIENTE DE ACUERDO AL PROYECTO

Unidad : M3  
 Cantidad : 600.00  
 Precio Unitario : 43.11  
**TOTAL : 25,866.00**

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
<b>Herramienta</b>					
H-ERR	HERRAMIENTAS	(%)mo	0.03000	0.00	0.00
<b>Total de Herramienta</b>					<b>0.00</b>
<b>Equipo</b>					
F EQUI-TRAC	TRACTOR D65	hora	0.03553	987.68	35.09
<b>Total de Equipo</b>					<b>35.09</b>

**Costo Directo** 35.09  
 Indirectos ( 4.13%) 1.45  
 Indirectos de Campo ( 1.18%) 0.41  
**Subtotal** 36.95  
 Financiamiento ( 0.00%) 0.00  
**Subtotal** 36.95  
 Utilidad ( 16.67%) 6.16  
 Cargos Adicionales ( 0.00%) 0.00

**Precio Unitario 43.11**

**\*\* CUARENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. \*\***

OPERADO  
 FAISM ( FIII )  
 EJERCICIO 2023

0078

**Angélica Ruano Avila**  
**RUF880710506**  
 16 de Septiembre 166  
 Centro Localidad Daniel Camarena  
 Nochistlán de Mejía, Zac.  
 México C.P.99914

CEL. 346 101 2142

@ j\_melendrez@hotmail.com



**Análisis de Precio Unitario**

**Descripción**

ACARREO SOBRE CAMION DE VOLETO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE KILOMETROS SUBSECUENTES, SE  
 COSIDERA 1 KM

Unidad : M3/KM  
 Cantidad : 42.17  
 Precio Unitario : 14.12  
 TOTAL : 595.44

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
<b>Equipo</b>						
F	AMAPE-039	Camión de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad.	hora	0.02370	484.94	11.49
<b>Total de Equipo</b>						<b>11.49</b>

<b>Costo Directo</b>	<b>11.49</b>
Indirectos ( 4.13%)	0.47
Indirectos de Campo ( 1.18%)	0.14
<b>Subtotal</b>	<b>12.10</b>
Financiamiento ( 0.00%)	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>12.10</b>
Utilidad ( 16.67%)	2.02
Cargos Adicionales ( 0.00%)	0.00
<b>Precio Unitario</b>	<b>14.12</b>

**\*\* CATORCE PESOS 12/100 M.N. \*\***



0079

**Angélica Ruano Avila**  
**RUR880710506**  
 16 de Septiembre 166  
 Centro Localidad Daniel Camarena  
 Nochistlán de Mejía, Zac.  
 México C.P.99914

**CEL. 346 101 2142**

**@ j\_melendrez@hotmail.com**

**Análisis de Precio Unitario**

**Descripción**

ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL, PRIMER KILOMETRO SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA

Unidad : M3  
 Cantidad : 42.17  
 Precio Unitario : 62.47  
 TOTAL : 2,634.36

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
<b>Herramienta</b>					
H-ERR	HERRAMIENTAS	(%)mo	0.03000	0.00	0.00
<b>Total de Herramienta</b>					<b>0.00</b>
<b>Equipo</b>					
F CAMI-VOL	CAMION VOLTEO CAP. 6 M3	hora	0.07899	435.02	34.36
F AMAPE-033	Retroexcavadora 416 D, de 80 hp, capacidad 6.9 ton	hora	0.03952	416.95	16.48
<b>Total de Equipo</b>					<b>50.84</b>

Costo Directo	50.84
Indirectos ( 4.13%)	2.10
Indirectos de Campo ( 1.18%)	0.60
Subtotal	53.54
Financiamiento ( 0.00%)	0.00
Subtotal	53.54
Utilidad ( 16.67%)	8.93
Cargos Adicionales ( 0.00%)	0.00
<b>Precio Unitario</b>	<b>62.47</b>

\*\* SESENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. \*\*

OPERADO  
 FAISM ( FIII )  
 EJERCICIO 2023

0080



**Angélica Ruano Avila**

**RUF880710506**

16 de Septiembre 166  
 Centro Localidad Daniel Camarena  
 Nochistlán de Mejía, Zac.  
 México C.P.99914



**CEL. 346 101 2142**



**@ j\_melendrez@hotmail.com**



**Análisis de Precio Unitario**

**Descripción**

RETIRO DE EMPEDRADO CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: ALMACENAMIENTO A UNA DISTANCIA DE 20 M.

Unidad : M3  
Cantidad : 42.17  
Precio Unitario : 67.79  
TOTAL : 2,858.70

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
<b>Equipo</b>						
F	AMAPE-039	Camión de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad.	hora	0.07553	484.94	36.63
F	AMAPE-033	Retroexcavadora 416 D, de 80 hp, capacidad 6.9 ton	hora	0.04446	416.95	18.54
<b>Total de Equipo</b>						<b>55.17</b>

Costo Directo	55.17
Indirectos ( 4.13%)	2.28
Indirectos de Campo ( 1.18%)	0.65
Subtotal	58.10
Financiamiento ( 0.00%)	0.00
Subtotal	58.10
Utilidad ( 16.67%)	9.69
Cargos Adicionales ( 0.00%)	0.00
<b>Precio Unitario</b>	<b>67.79</b>

\*\* SESENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N. \*\*



0081

**Angélica Ruano Avila**  
RUA880710506  
16 de Septiembre 166  
Centro Localidad Daniel Camarena  
Nochistlán de Mejía, Zac.  
México C.P.99914

CEL. 346 101 2142

@ j\_melendrez@hotmail.com


**Análisis de Precio Unitario****Descripción**DESPLAME DE 20 CM DE ESPESOR A MAQUINA EN MATERIAL B, DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA  
DESPLANTE DE TERRAPLENES ACARREO LIBRE A 50 M.Unidad : m3  
Cantidad : 9.90  
Precio Unitario : 53.80  
TOTAL : 532.62

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	Mano de Obra + MOCU-026	Cuadrilla No 26 (0.10 Cabo + 1.00 Ayudante General)	jor	0.12770	332.79	42.50
	<b>Total de Mano de Obra</b>					<b>42.50</b>
	Herramienta FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000	42.50	1.28
	<b>Total de Herramienta</b>					<b>1.28</b>

Costo Directo	43.78
Indirectos ( 4.13%)	1.81
Indirectos de Campo ( 1.18%)	0.52
Subtotal	46.11
Financiamiento ( 0.00%)	0.00
Subtotal	46.11
Utilidad ( 16.67%)	7.69
Cargos Adicionales ( 0.00%)	0.00

Precio Unitario 53.80

\*\* CINCUENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. \*\*

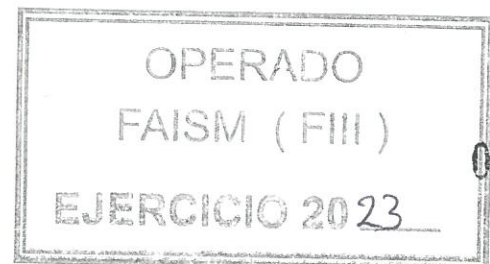

0082

**Angélica Ruano Avila****RUA880710SQ6**16 de Septiembre 166  
Centro Localidad Daniel Camarena  
Nochistlán de Mejía, Zac.  
México C.P.99914

CEL. 346 101 2142



j\_melendrez@hotmail.com



**Análisis de Precio Unitario****Descripción**

TERRAPLENES EXTENIDOS DE MATERIALES, FORMACION, INCORPORACION DE AGUA, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CIN MAQUINA P.U.O.T.

Unidad : M3

Cantidad : 164.75

Precio Unitario : 16.11

TOTAL : 2,654.12

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
<b>Herramienta</b>					
H-ERR	HERRAMIENTAS	(%)mo	0.03000	0.00	0.00
<b>Total de Herramienta</b>					<b>0.00</b>
<b>Equipo</b>					
F MOTO	MOTOCONFORMADORA CM17	hora	0.00533	865.63	4.61
F COMP-1	COMPACTADOR CA25-2	hora	0.00444	595.83	2.65
F EQUI-PIPA	CAMION PIPA CAP 8000 LTS	hora	0.00889	384.07	3.41
<b>Total de Equipo</b>					<b>10.67</b>
<b>Auxiliares</b>					
+ EXTR-A	EXTRACCION DE AGUA EN M3 BANCO		0.11006	22.23	2.45
<b>Total de Auxiliares</b>					<b>2.45</b>

Costo Directo	13.12
Indirectos ( 4.13%)	0.54
Indirectos de Campo ( 1.18%)	0.15
<b>Subtotal</b>	<b>13.81</b>
Financiamiento ( 0.00%)	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>13.81</b>
Utilidad ( 16.67%)	2.30
Cargos Adicionales ( 0.00%)	0.00
<b>Precio Unitario</b>	<b>16.11</b>

\*\* DIECISEIS PESOS 11/100 M.N. \*\*



**Análisis de Precio Unitario****Descripción**TRAZO Y NVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICOS EN TERRENO PLANO DE 1000 A 200 M2, INCLUYE:  
TOPOGRAFO Y CADENERO OPERADORUnidad : M2  
Cantidad : 990.00  
Precio Unitario : 11.60  
TOTAL : 11,484.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
<b>Materiales</b>						
	AGRE-014	Calhidra	ton	0.00004	3,400.00	0.14
	MDES-006	Hilo cáñamo o de plástico de 300 mts	pieza	0.00167	85.00	0.14
	MACI-009	Barrote 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	0.01450	50.00	0.73
<b>Total de Materiales</b>						<b>1.01</b>
<b>Mano de Obra</b>						
	+ MOCU-002	Cuadrilla No 2 (1.00 Albañil + 1.00 Peón)	jor	0.00554	1,476.07	8.18
<b>Total de Mano de Obra</b>						<b>8.18</b>
<b>Herramienta</b>						
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000	8.18	0.25
<b>Total de Herramienta</b>						<b>0.25</b>

Costo Directo	9.44
Indirectos ( 4.13%)	0.39
Indirectos de Campo ( 1.18%)	0.11
Subtotal	9.94
Financiamiento ( 0.00%)	0.00
Subtotal	9.94
Utilidad ( 16.67%)	1.66
Cargos Adicionales ( 0.00%)	0.00

**Precio Unitario 11.60****\*\* ONCE PESOS 60/100 M.N. \*\***

0084

**Angélica Ruano Avila**  
**RUA880710SQ6**  
 16 de Septiembre 166  
 Centro Localidad Daniel Camarena  
 Nochistlán de Mejía, Zac.  
 México C.P.99914

**CEL. 346 101 2142**
**@ j\_melendrez@hotmail.com**



**Cálculo de Indirectos**

Descripción	Importe / Periodo		% participa	Importe periodo para of. central		Total para oficina central	Importe / Periodo Oficina Obra		Importe Total Oficina Obra
	Oficina Central			oficina central			Oficina Obra		
Construcción y Conservación de Caminos de Acceso	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mortajes y Desmantelamiento de Equipo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL DE TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES</b>						<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>						<b>19,530.00</b>		<b>6,975.00</b>	
Primas por Seguros	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Primas por Fianzas	7,000.00		100.00	7,000.00	7,000.00	19,530.00	2,500.00	6,975.00	
<b>TOTAL DE SEGUROS Y FIANZAS</b>						<b>19,530.00</b>		<b>6,975.00</b>	
<b>RESUMEN</b>									
<b>HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES</b>						<b>2,943.45</b>		<b>3,348.00</b>	
<b>DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS</b>						<b>3,208.50</b>		<b>0.00</b>	
<b>SERVICIOS</b>						<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>FLETES Y ACARREOS</b>						<b>3,487.50</b>		<b>0.00</b>	
<b>GASTOS DE OFICINA</b>						<b>7,058.70</b>		<b>0.00</b>	
<b>TRABAJO PREVIOS AUXILIARES</b>						<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>						<b>19,530.00</b>		<b>6,975.00</b>	
<b>TOTAL</b>						<b>36,228.15</b>		<b>10,323.00</b>	

**OPERADO**  
**FAISM ( FIII )**  
**EJERCICIO 2023**

A) Costo directo de la obra: **876,588.81**  
 B) Gastos de oficina central para la obra: **36,228.15**  
 D) Indirectos de la oficina en obra: **10,323.00**

E) % indirectos de oficina central = ( B / A ) 100 = **4.13**  
 F) % indirectos de oficina en obra = ( D / A ) 100 = **1.18**

**% DE INDIRECTOS = E + F = 5.31**

0085

**Angélica Ruano Avila**  
**RUAA880710506**  
 16 de Septiembre 166  
 Centro Localidad Daniel Camarena  
 Nochistlán de Mejía, Zac.  
 México C.P.99914

CEL. 346 101 2142  
 @ j\_melendrez@hotmail.com

0086

**Cálculo de Indirectos**

Descripción	Importe / Periodo		% participa	Importe periodo		Total para oficina central	Importe / Periodo		Importe Total
	Oficina Central	Central		para of. central	oficina central		Oficina Obra	Oficina Obra	
<b>Cálculo de Indirectos</b>						36,228.15			10,323.00
<b>HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES</b>						2,943.45			3,348.00
Personal Directivo						1,143.90			0.00
Personal Técnico						0.00			1,674.00
Personal Administrativo						125.55			1,674.00
Personal de Tránsito	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00
Cuotas Patronales	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00
Prestaciones que obliga la ley	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00
Pasajes y Viáticos	1,200.00		50.00			600.00	0.00		0.00
Consultores y Asesores	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00
<b>TOTAL DE HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES</b>						2,943.45			3,348.00
<b>DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS</b>						3,208.50			0.00
Edificios y Locales	1,000.00		25.00			250.00	0.00		0.00
Locales de Mantenimiento y Guarda	1,100.00		25.00			275.00	0.00		0.00
Instalaciones Generales	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00
Bodegas	1,500.00		25.00			375.00	0.00		0.00
Muebles y Enseres	1,000.00		25.00			250.00	0.00		0.00
Depreciación o Renta y Operación de Vehículos	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00
Campaneros	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00
<b>TOTAL DE DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS</b>						3,208.50			0.00
<b>SERVICIOS</b>						0.00			0.00
Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00
Estudio e Investigación	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00
<b>TOTAL DE SERVICIOS</b>						0.00			0.00
<b>FLETES Y ACARREOS</b>						3,487.50			0.00
De campamentos	5,000.00		25.00			1,250.00	0.00		0.00
De Equipo de Construcción	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00
De Plantas y Elementos para Instalaciones	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00
De Mobiliario	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00
<b>TOTAL DE FLETES Y ACARREOS</b>						3,487.50			0.00
<b>GASTOS DE OFICINA</b>						7,058.70			0.00
Paperería y Útiles de Escritorio	1,300.00		50.00			650.00	0.00		0.00
Correos, Teléfonos, Telégrafos, Radio	1,000.00		20.00			200.00	0.00		0.00
Situación de Fondos	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00
Copias y Duplicados	500.00		20.00			100.00	0.00		0.00
Luz, Gas y Otros Consumos	400.00		20.00			80.00	0.00		0.00
Gastos de Concursos	1,500.00		100.00			1,500.00	0.00		0.00
<b>TOTAL DE GASTOS DE OFICINA</b>						7,058.70			0.00
<b>TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES</b>						0.00			0.00

OPERADO  
POR ( FILL )  
EJERCICIO 2023

**Angélica Ruano Avila**  
RUA880710506  
16 de Septiembre 166  
Centro Localidad Daniel Camarena  
Nochistlán de Mejía, Zac.  
México C.P.99914

CEL. 346 101 2142  
@ j\_melendrez@hotmail.com



**PROGRAMA DE OBRA**

Descripción Inicia Duración Termina 2023 Jun Jul Ago

0087

**PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO**

**PRELIMINARES**

TRAZO Y NVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICOS EN TERRENO PLANO DE 1000 A 200 M2. INCLUYE: TOPOGRAFO Y CADENERO OPERADOR

01/Jun/2023 50 05/Jun/2023

TERRAPLENES EXTENDIDOS DE MATERIALES, FORMACION, INCORPORACION DE AGUA, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CIN MAQUINA P.U.O.T.

05/Jun/2023 50 09/Jun/2023

DESPLAME DE 20 CM DE ESPESOR A MAQUINA EN MATERIAL B, DESPERDIJANDO EL MATERIAL PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES ACARREO LIBRE A 50 M.

09/Jun/2023 50 13/Jun/2023

RETIRO DE EMPEDRADO CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: ALMACENAMIENTO A UNA DISTANCIA DE 20 M.

13/Jun/2023 50 17/Jun/2023

ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL, PRIMER KILOMETRO SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA

17/Jun/2023 50 21/Jun/2023

ACARREO SOBRE CAMION DE VOLETO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE KILOMETROS SUBSECUENTES, SE COSIDERA 1 KM

21/Jun/2023 50 25/Jun/2023

**TERRACERIAS**

EXCAVACION EN CORTE DEBAJO DE LA SUBRRSANTE MATERIAL TIPO II CON MEDIOS MECANICOS (MOTONIVELDORA) CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE Y DEJANDO PENDIENTE DE ACUERDO AL PROYECTO

25/Jun/2023 50 29/Jun/2023

ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL, PRIMER KILOMETRO SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, CARGA CON MAQUINA

29/Jun/2023 50 03/Jul/2023

ACARREO SOBRE CAMION DE VOLETO DE 7 M3 DE MATERIAL NO UTILIZABLE KILOMETROS SUBSECUENTES, SE COSIDERA 1 KM

03/Jul/2023 50 07/Jul/2023

**TERRAPLENES Y BASE**

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2023

**Angélica Ruano Avila**  
RUA880710506  
16 de Septiembre 166  
Centro Localidad Daniel Camarena  
Nochistlán de Mejía, Zac.  
México C.P.99914

CEL. 346 101 2142  
@ j\_melendrez@hotmail.com

**PROGRAMA DE OBRA**

Descripción	Inicia	Duración	Termina
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE CAPA SUBRASANTE COMPACTADA AL 95% UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PETREO (50% MATERIAL DE BANCO Y 50% MATERIAL PETREO)	07/Jul/2023	5c	11/Jul/2023
MEZCALDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE LA BASE COMPACTADA AL 100%, UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO Y MATERIAL PETREO ( 50% MATERIAL DE BANCO Y 50% MATERIAL PETREO.	11/Jul/2023	5c	15/Jul/2023
<b>CONCRETO</b>			
PAVIMENTO DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 AGREGADO DE 19 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 15 CM DE ESPEOSR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERAMIENTAS MENORES	15/Jul/2023	15c	29/Jul/2023
CUNETTA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 AGREGADO DE 19MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 10 CM DE ESPEOSR. CIMBRA METALICA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	29/Jul/2023	10c	07/Ago/2023

2023  
Jun

Jul

Ago

0088

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2023

**Angélica Ruano Avila**

**RUAA880710506**

16 de Septiembre 166  
Centro Localidad Daniel Camarena  
Nochistlán de Mejía, Zac.  
México C.P.99914

CEL. 346 101 2142

@ j\_melendrez@hotmail.com



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
PRESENTE.


ASUNTO: RENUNCIA A ANTICIPO

NOCHISTLÁN, ZAC., A 1 DE JUNIO DEL 2023

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO A USTE MI DESEO DE  
**RENUNCIAR** AL ANTICIPO DE LA OBRA "**PAVIMENTACIÓN DE CAMINO LAS  
HUERTAS EL MOLINO**" EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES  
ENVIARE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



ANGELICA RUANO ÁVILA







**ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**  
 RFC: AAS9207314T7  
 Avenida Periférico Sur Número 4829,  
 Interior Piso 9  
 Col. Parque del Pedregal  
 México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad  
 de México  
 Teléfono: (55) 5447-3900

**Fianza Número:** 3731-04502-5  
**Código de Seguridad:** qWwE6To  
**Folio:** 3372418  
**Monto de la fianza:** \$124,934.29  
**Monto de este movimiento:** \$124,934.29

**PÓLIZA DE FIANZA**

**Lugar y Fecha de Expedición:** Ciudad de México, 5 de Junio de 2023

**Moneda:** MXN

**Movimiento:** Emisión

**Vigencia:** De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

**Fiado:** ANGELICA RUANO AVILA

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

Ante EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.

ANTE EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

PARA GARANTIZAR POR ANGELICA RUANO AVILA, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. NOCHIS/FONDOIII/2023/05, ASI COMO LA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,249,342.93 (UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.), RELATIVO A: PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS. LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA LA RECEPCIÓN FORMAL Y A SATISFACCIÓN DE EL CONTRATISTA DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y CONTINUARÁ VIGENTE EN TODOS LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: A) PARA EL CASO DE 'EL CONTRATISTA' SE LE OTORGUEN PRORROGAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, B) AUN Y CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SEAN SUBCONTRATADOS POR EL MISMO, C) DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN, Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, EN EL CASO DE PRORROGA O ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARA PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA Y AL EFECTO ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., PAGARA EN TÉRMINOS DE LEY HASTA LA CANTIDAD YA MENCIONADA DE \$124,934.29 (CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N.), ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V., ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 282, 283 Y 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx)  
 CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx), para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".



LÍNEA DE VALIDACIÓN  
 A121 W15D 523

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 5 de junio de 2015 con el número CNSF-F0012-0074-2015 / CNSF-F0012-0076-2015".

0090

Firma Digital  
 G4748F91NEC6aYR10MS6MFI7C1ed1fM1TRPHX+3f40aH5b7FUTD1TSRBOFCxacaAUMF=elH4HOJLZYAOnINEXW98UJMSwHqJua1wBw6w1pH85dWGB37U8ZBFPc0d1WazvAZZZE3636XJVB5XG32WRZQ858mbHmQUNEBZ16nFzLZLZXW5ZQ7MP  
 Se le Certificado: 00000100009900015141. Prestador de Servicios de Certificación: Cerecban SA de CV



### NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA

1.- En toda póliza otorgada por la ASEGURADORA, sus derechos y obligaciones se encuentran regulados por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en adelante (LISF), en lo no previsto por la LISF, se aplicará la legislación mercantil y a falta de disposición expresa, el Código Civil Federal. (Art. 183 LISF); la póliza será numerada al igual que sus endosos debiendo contener, en su caso, indicaciones que administrativamente fijen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en adelante SHCP y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en adelante CNSF (Art.166 LISF).

2.- En caso de PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE LA PÓLIZA DE FIANZA al ejercitar su derecho de reclamación de la fianza, deberá comprobar por escrito que la póliza fue otorgada, solicitando a la ASEGURADORA un duplicado de la póliza emitida a su favor. (Art.166 LISF).

3.- Se PRESUME LA EXTINCIÓN de obligación como fiadora cuando se hace la devolución de una póliza a la ASEGURADORA, salvo prueba en contrario. (Art.166 LISF).

4.- Las fianzas y los contratos, que en relación a la póliza de fianza se otorguen o se celebren, serán mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES, FIADAS, CONTRAFIADORAS u OBLIGADAS SOLIDARIAS, salvo de la garantía hipotecaria. (Art.32 LISF).

5.- La fianza suscrita en este folio será nula y sin efectos legales, si se garantizan operaciones de crédito, aun cuando en el texto de la misma se señale lo contrario, esta póliza no garantiza el pago de títulos de crédito, como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deban solventarse en dinero. Esta fianza no surtirá efectos, si se garantizan préstamos de dinero, mutuos, financiamientos en numerario o en especie, reestructuras de adeudos, renegociación de pasivos y cualquier otra operación no autorizada por la SHCP.

6.- La ASEGURADORA no goza de los beneficios de orden y excusión y deberá ser requerida en los términos que establece la LISF. (Art.178 LISF).

7.- La obligación de la ASEGURADORA se extinguirá en los siguientes casos: 7.1 Si el BENEFICIARIO concede al FIADO, prórroga o espera para el cumplimiento de la obligación afianzada sin el consentimiento previo y por escrito de la ASEGURADORA (Art. 179 LISF). 7.2 La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza, si la ASEGURADORA no da su consentimiento previo y por escrito para esa novación y para garantizar con la fianza la obligación novatoria (Arts. 2220 y 2221 del Código Civil Federal en adelante CCF). 7.3 La quita o pago parcial de la obligación afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa la obligación principal afianzada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones (Art. 2847 del CCF). La ASEGURADORA tendrá derecho, a oponer todas las excepciones que le sean inherentes a la obligación principal, incluyendo todas las causas de liberación de la fianza. 7.4 Si en la póliza de fianza no se establece plazo de caducidad se estará a lo señalado en el Art.174 LISF y, caducará el derecho del beneficiario, para reclamar si la fianza no se reclama dentro del plazo señalado para tal efecto. 7.5 Prescribirá la obligación de la ASEGURADORA una vez transcurrido el plazo para que prescriba la obligación principal garantizada o el de 3 años, lo que resulte menor (Art.175 LISF), para interrumpir la prescripción deberá requerirse por escrito a la ASEGURADORA, en los términos del Art. 175 LISF.

8.- Para reclamar la fianza: 8.1 Presentar la reclamación directamente y por escrito, en el domicilio de la ASEGURADORA, en alguna de sus sucursales u oficinas de servicios, con la firma del BENEFICIARIO o de su APODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con que se ostenta y señalando: fecha de reclamación, número de póliza de fianza relacionada con la reclamación que se formula, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del FIADO, nombre o denominación del BENEFICIARIO y en su caso, de su Representante Legal debidamente acreditado, domicilio del BENEFICIARIO para oír y recibir notificaciones, descripción de la obligación garantizada, acompañando copia de la documentación en la que se basó la expedición de la fianza, referencia del contrato o documento fuente (fecha, número, etc.). Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación debiendo acompañar la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado y el importe reclamado como suerte principal, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza. (Circular Única de Seguros y Fianzas en adelante CUSF, Disposición 4.2.8, Frac.VIII y Art. 279 primer párrafo Frac. I LISF).

8.2 Si la fianza garantiza obligaciones fiscales federales se apegará al Art. 143, del Código Fiscal de la Federación. 8.3 Las fianzas expedidas ante la Federación, Ciudad de México, Estados o Municipios se hará efectiva a elección del BENEFICIARIO, de acuerdo con el procedimiento señalado en los Arts. 279 o 282 LISF y en su reglamento. 8.4 Fianzas otorgadas ante autoridades judiciales, no penales, se harán efectivas, a elección del BENEFICIARIO, conforme procedimiento de los Arts. 279 y 280 LISF o por la vía de incidente en el juicio en que se hubieran otorgado (Código Federal de Procedimientos Civiles, Art. 281 LISF). 8.5 Las Fianzas Judiciales Penales otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal, se harán efectivas conforme al Art. 282 LISF. Para la presentación del FIADO, se le requerirá personalmente o por correo certificado, con acuse de recibo a la ASEGURADORA en sus oficinas principales o en el domicilio del Apoderado designado para ello, procediendo a la aplicación del Art. 291 LISF, en caso de la no presentación del FIADO en el plazo concedido. 8.6 Cuando la ASEGURADORA reciba la reclamación de la fianza, podrá hacerlo del conocimiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR, haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que presenten oportunamente los elementos y documentación necesaria para inconformarse en contra de la reclamación, y que expresen lo que a su derecho convenga. De igual forma, puede denunciar a dichos deudores juicio que en su contra promoviere el BENEFICIARIO para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del juicio, si se condenare a la ASEGURADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF). 8.7 Una vez integrada la reclamación en los términos de los Arts. 279 o 282 LISF, la ASEGURADORA tendrá un plazo hasta de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al BENEFICIARIO, las razones, causas o motivos de su improcedencia. 8.8 Si la ASEGURADORA no recibe los elementos y documentos citados en el punto 8.6, ésta podrá libremente decidir el pago de la reclamación, estando el FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR obligado a reembolsar a la ASEGURADORA lo que a ésta le corresponda, sin que pueda oponer a la ASEGURADORA las excepciones que el FIADO tuviera frente a su acreedor, incluyendo la de pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso los Arts. 2832 y 2833 del CCF (Art. 289 LISF). Sin embargo, el FIADO conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la ASEGURADORA. La ASEGURADORA, al ser requerida o demandada podrá denunciar el pleito al deudor principal para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del juicio, para el caso de que se llegare a condenar a la ASEGURADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF).

9.- En caso de que la ASEGURADORA rechazare la reclamación o no diera contestación en los plazos establecidos por la ley; el BENEFICIARIO podrá elegir, en la reclamación de su pago, el procedimiento señalado en el Art. 280 LISF o el 50 bis y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

10.- OTRAS DISPOSICIONES.- Existe obligación de las oficinas y autoridades dependientes de la

Federación, Ciudad de México, de los Estados o Municipios de proporcionar a la ASEGURADORA los datos sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de cualquier otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza. 10.1 La ASEGURADORA se considera de acreditada solvencia Art.16 párrafo primero LISF y Art.18 primer párrafo LISF. 10.2 Si la ASEGURADORA no cumple con la obligación garantizada en la póliza dentro de los plazos legales para su cumplimiento, deberá cubrir al acreedor indemnización por mora conforme al Art. 283 LISF. 10.3 Ninguna autoridad podrá fijar mayor importe para las fianzas que otorguen las AFIANZADORAS Y ASEGURADORAS, que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. La infracción de este precepto será causa de responsabilidad (Art. 18 LISF). Si las obligaciones garantizadas son de hacer o de dar, la ASEGURADORA podrá sustituirse al deudor principal en el cumplimiento de la obligación. En las fianzas en que se garantice el pago de una suma de dinero en parcialidades, la falta de pago de alguna de las parcialidades no da derecho a reclamar la fianza por la totalidad. (Art. 176 LISF). 10.4 El pago de la fianza al BENEFICIARIO, subroga a la ASEGURADORA, por ministerio de ley, en todos los derechos, acciones y privilegios que a favor del acreedor se deriven de la naturaleza de la obligación garantizada. La ASEGURADORA podrá liberarse total o parcialmente de sus obligaciones si por causas imputables al BENEFICIARIO de la póliza de fianza, el pago es impedido o le resulta imposible la subrogación. (Art. 177 LISF y 2830 y 2845 del CCF).

11.- FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA.- Para el caso de fianzas en moneda extranjera, la ASEGURADORA, el BENEFICIARIO, el FIADO y sus OBLIGADOS SOLIDARIOS se someten al Art. 173 LISF y Capítulo 19.2 CUSF. Únicamente se podrán autorizar este tipo de operaciones, cuando se relacionen con el cumplimiento de obligaciones exigibles fuera del país, o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifique que su pago se convenga en moneda extranjera. RECLAMACION.- Que el pago de la reclamación procedente por fianza expedida en moneda extranjera y que deba realizarse en el extranjero, se efectuará por conducto de instituciones de crédito mexicanas o filiales de estas, a través de sus oficinas del exterior, en el país donde debió cumplirse la obligación afianzada y en la moneda que se haya establecido en la póliza (Disposición 19.2.3, fracción II CUSF). PRIMAS.- Las primas relacionadas con la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirán a la ASEGURADORA en la misma moneda de expedición de la póliza, conforme al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en Moneda Extranjera pagaderas en la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. (Disposición 19.2.3, fracción I CUSF). CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a que se refiere la presente, serán competentes las autoridades mexicanas, en los términos LISF, de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales (Disposición 19.2.3, fracción III CUSF).

12.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), y cualesquiera otros obligados, en su caso, así como tratándose de BENEFICIARIOS PARTICULARES, para efectos de interpretación, cumplimiento y ejecución de esta póliza, se someten de forma expresa a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales o del fuero común de la Ciudad de México, y/o Guadalajara, Jalisco y/o Monterrey, Nuevo León y/o Puebla, Puebla, a elección de la parte actora, renunciando de forma expresa e irrevocable a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, en el presente o futuro por concepto de su domicilio o veindad; aplicándose en todo caso la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y su legislación supletoria. Las fianzas otorgadas a favor de la Federación, Ciudad de México, Estados y Municipios, se harán efectivas en los términos del Art. 282 de LISF. 13.- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O DE CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA.- De conformidad con lo previsto en los Artículos 165 y 214 LISF las partes pactan que LA COMPANÍA ASEGURADORA podrá usar equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología en la celebración de sus operaciones y prestación de servicios, incluyendo la expedición electrónica o digital de sus pólizas de fianza, así como de sus documentos modificatorios, por lo que el uso de la firma digital, resultado de utilizar la Firma Electrónica sobre una fianza electrónica sustituye a la firma autógrafa y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes con el mismo valor probatorio; por tal motivo EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) expresa(n) su consentimiento para que LA COMPANÍA ASEGURADORA, emita las fianzas y los documentos modificatorios, en forma escrita o a través de medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología válida y no podrán objetar el uso de estos medios u oponerse a los mismos, por lo que en la interpretación y cumplimiento de este contrato se sujetan a lo dispuesto por el Título Segundo, Del Comercio Electrónico, Libro Segundo del Código de Comercio Vigente artículos 89 al 114 empleo de medios electrónicos en la celebración de actos de comercio, pactando al efecto: I.- Que a través de estos medios se podrán emitir los recibos de cobro de primas, notas de crédito, emisión de pólizas de fianza, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a LA ASEGURADORA, así como, cualquier otro derivado de la prestación del servicio contratado, documentos electrónicos que podrán imprimirse en papel pero será la versión electrónica la que prevalezca si eventualmente existiera alguna diferencia entre ambas.

II.- Con el fin de establecer que la fianza electrónica fue generada por LA COMPANÍA ASEGURADORA, en términos del Artículo 90 Bis del Código de Comercio, las Partes pactan como Medio de Identificación del Usuario y Responsabilidades correspondientes a su uso, la validación de la póliza de fianza, a través de la Constancia de Consulta disponible en el Portal de Internet [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx) para fianzas emitidas por LA COMPANÍA ASEGURADORA. 2023 0091 Los firmantes declaran conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la celebración de actos jurídicos, mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología, por lo cual están dispuestos a operar a través de los mismos, ya que no les son ajenos.

III.- La Creación, Transmisión, Modificación y Extinción de derechos y obligaciones derivados de las pólizas de fianza electrónicas se soporta mediante una Firma Electrónica generada usando certificados digitales en términos del Título Segundo, del Comercio Electrónico, Capítulo I, De los Mensajes de Datos, Artículos 89 al 99 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, lo cual garantiza frente a terceros la identidad, autenticidad e integridad de las operaciones y servicios prestados a EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S). De igual forma, los firmantes de este instrumento podrán(n) pactar los medios electrónicos idóneos para la transmisión y extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios señalados en la Fracción I de esta cláusula. Asimismo, LA COMPANÍA ASEGURADORA podrá solicitar y recibir documentación e información de los firmantes mediante medios electrónicos siempre y cuando EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) garantice(n) a satisfacción de la receptora los medios de creación, transmisión y modificación de dicha documentación y que le permitan asegurar la identidad, autenticidad e integridad de la documentación electrónica generada y transmitida.



## CÉDULA DE REGISTRO

C2023680008357

ANGELICA RUANO AVILA

PRESENTE:

Se expide la presente cédula con base en las facultades otorgadas por los Artículos 30 fracción XXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 33, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas, Título III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas y Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen los lineamientos para el Registro Único de Proveedores y Contratistas Validados de Gobierno del Estado de Zacatecas, publicado el miércoles 20 de junio de 2018, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

### Cédula de Contratista

No. Cédula	DLC/C/275/2023		
Razón Social	ANGELICA RUANO AVILA		
Dirección	16 DE SEPTIEMBRE 166 DANIEL CAMARENA	Teléfono	3467131050
Estado	Zacatecas	Municipio	NOCHISTLAN DE MEJIA
R.F.C.	RUAA880710SQ6	Capital Contable	\$3,988,276.38

### Especialidad

### Porcentaje

Construcción y mantenimiento de canales y drenes.	50
Construcción, rehabilitación y mantenimiento de los sistemas y obras complementarias de agua potable.	50

Los datos registrados para la emisión de la presente cédula están sujetos a verificación y fiscalización por parte de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado. Esta cédula puede ser suspendida o cancelada de acuerdo a la normatividad vigente aplicable a la materia. La vigencia de ésta cédula es de 12 meses a partir de la fecha de validación

**La vigencia de ésta cédula es de 12 meses a partir de la fecha de validación de la información presentada**

Zacatecas, Zac. a 2 de junio del 2023

La presente cédula será válida hasta el día 2 de junio del 2024



0092



### Memorándum de Verificación

ANGELICA RUANO AVILA

PRESENTE:

Felicidades por haber realizado el trámite y obtenido la Cédula en el Registro Único de Proveedores y Contratistas Validados, a través de la plataforma electrónica RUPCOVA; trámite que forma parte de los programas de modernización que Gobierno del Estado implementa para brindar una mejor atención a las personas interesadas en realizarlo, facilitando la realización vía internet, sin tener que trasladarse a las oficinas de la Secretaría de la Función Pública.

Es nuestro objetivo establecer un efectivo control que permita brindar certeza de la capacidad técnica, jurídica, económica y material de las personas físicas y morales con las que el Gobierno del Estado celebre contratos de adquisiciones, servicios y obra pública.

Los datos proporcionados por los interesados en el trámite de inscripción o revalidación son recibidos de buena fe, por lo que la Secretaría de la Función Pública, podrá requerir en cualquier momento los documentos originales que acrediten la información proporcionada para su cotejo.

La Secretaría está facultada para cancelar la Cédula, sin perjuicio de accionar la vía legal correspondiente cuando la información proporcionada resulte falsa.

Asimismo, la Secretaría se reserva el derecho para efectuar visitas de verificación a los domicilios de las personas con registro para constatar la veracidad de la información asentada y documentación presentada en el trámite de registro; en caso de que el proveedor o contratista se niegue a dar las facilidades necesarias para que la Secretaría ejerza sus funciones de verificación, podrá suspender la cédula hasta por el término de doce meses.

Si durante la vigencia de la cédula existen modificaciones a los datos proporcionados en el registro, el proveedor o contratista tendrá la obligación de comunicarlo en un plazo no mayor a diez días hábiles a la fecha en que ocurrió la modificación a la Secretaría con la finalidad de mantener actualizada la información en el RUPCOVA, acreditando lo anterior con el documento respectivo.

Lo anterior, con base en las facultades otorgadas por los Artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 20, 21, 22, 25 y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, Título III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen los lineamientos para el Registro Único de Proveedores y Contratistas Validados de Gobierno del Estado de Zacatecas, publicado el miércoles 20 de junio de 2018, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

ATENTAMENTE.

**Lic. Carlos Eduardo Torres Muñoz**

Subsecretario de Control de la Secretaría de la Función Pública



DIRECCION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

**PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO**

ANGELICA RUANO AVILA  
PRESENTE:

Se expide la presente cédula con base en las facultades otorgadas por los artículos 30 fracción XXXV de la Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 33, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas, Título III de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios De Zacatecas.

El siguiente Registro Único de Proveedores y Contratistas del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas; está verificado y cumple con los requisitos que marcan la normativa vigente.

**Cédula de Contratista**

No. Cédula	Nochistlán/06/2023
Razón Social	ANGELICA RUANO AVILA
Dirección	16 DE SEPTIEMBRE 166, DANIEL CAMARENA
Teléfono	3467131050
Estado	ZACATECAS
Municipio	NOCHISTLAN DE MEJIA
RFC	RUAA880710SQ6

*Recibi  
Angelica Ruano Avila  
13/06/23 11:36 ar*

La Vigencia de la presente cédula es hasta el 31 diciembre de 2023.

**ATENTAMENTE  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.**



**CONTRALORIA  
MUNICIPAL**

**ING. ANA GABRIELA TACHIQUIN RAMIREZ DE MEJIA-ZAC.**



0094



Municipio de Nochistlán de Mejía Zacatecas  
Dirección de Desarrollo Económico y Social

## ACTA DE ENTREGA DEL ÁREA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha: 01 de junio del 2023

En relación al contrato de obra pública, precios unitarios y tiempo determinado No. **NOCHIS/FONDOIII/2023/05**, Relativo de los trabajos: **PAVIMENTACION LAS HUERTAS EL MOLINO MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** se reunieron en el lugar de los trabajos, por parte del Municipio, el Arq. Juan Carlos Avelar Ramírez residente de obra, por parte de la empresa el C. Angelica Ruano Ávila, Para poner a disposición del contratista el área donde habrá de ejecutarse los trabajos del contrato, el cual estará bajo su resguardo durante todo el tiempo que dure la obra, para lo cual debería tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden y la seguridad del inmueble, mismo que terminados los trabajos deberá entregar como mínimo en las condiciones que lo recibe a reserva de las áreas que se intervendrán para el: **PAVIMENTACION CAMINO A RINCONADA DE VELASCO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presenta, firmando de conformidad, al calce de la hoja de la presente, a las 9:00 horas del día 01 de junio 2023 otorgando una copia a todos los presentes.

Por el municipio.

Por la empresa



Arq. Juan Carlos Avelar Ramírez  
RESIDENTE DE OBRA



Ing. Luis David Ramírez Villegas  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

