

DATOS DE LA OBRA		EXPEDIENTE TÉCNICO		ADJUDICACIÓN		Ejecución	
NO. DE OBRA	NO. DE PROYECTO						
		PROYECTO EJECUTIVO (DIGITAL E IMPRESO)					
		CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA					
		PRESUPUESTO BASE					
		PROGRAMA DE OBRA					
		OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS, AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CABILDO					
		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O TERCEROS					
		ESTUDIOS DE LA OBRA					
		PERMISOS DE LA OBRA (PERFORACIÓN, CRUCE CARRTERO, OTROS)					
		IMPACTO AMBIENTAL					
		FACTIBILIDAD Y/O VALIDACIÓN DE LA OBRA					
		ACREDITACIÓN LEGAL DE LA TENENCIA DE LA TIERRA					
		CONVOCATORIA U OFICIOS DE INVITACIÓN					
		BASES DE LICITACIÓN / INVITACIÓN					
		DOCUMENTO DE PUBLICACIÓN EN COMPRANET (OBRAS FEDERALES)					
		DOCUMENTO DE PUBLICACIÓN-PERIÓDICO OFICIAL (OBRAS ESTATALES)					
		PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICAS DE PARTICIPANTES (DIGITAL) NO GANADORES					
		ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES					
		ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS					
		DICTAMEN Y FALLO					
		CONTRATO					
		CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTRATADO					
		TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS					
		ANÁLISIS DE INDIRECTOS					
		GARANTÍA Y/O FIANZA DE ANTICIPO					
		GARANTÍA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO					
		DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN (FUNDADO Y MOTIVADO)					
		CÉDULA DE REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA)					
		CÉDULA DE REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS (CONTRALORÍA MUNICIPAL)					
		DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE					
		NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LOS TRABAJOS					
		SOLICITUD, DICTAMEN Y CONVENIO DE MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN					
		SOLICITUD, DICTAMEN Y CONVENIO DE MODIFICACIÓN DEL MONTO Y/O AMPLIACIÓN DE CONTRATO					
		NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO					
		NOMBRAMIENTO DEL SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA					
		AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROYECTO					
		BIYÁCORA DE OBRA (BEOP O CONVENCIONAL)					
		ESTIMACIONES					
		NÚMEROS GENERADORES					
		ACUMULADO DE ESTIMACIONES (DIGITAL E IMPRESO (N/A))					
		SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATÁLOGO					
		REPORTES DE SUPERVISIÓN					
		REPORTE FOTOGRÁFICO					
		PRUEBAS DE LABORATORIO (RESISTENCIA DE CONCRETO, CALIDAD DEL AGUA, OTROS)					
		DOCUMENTO DE RESISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO					
		NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LA OBRA (CONTRATISTA)					
		GARANTÍA Y/O FIANZA DE VICIOS OCULTOS					
		ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN					
		FINQUITO					
		ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES					

1 EXISTE EL DOCUMENTO
 2 EXISTE EL DOCUMENTO (INCOMPLETO Y/O SIN FIRMA)
 X NO EXISTE EL DOCUMENTO
 N/A NO APLICA

CONCLUSIONES / OBSERVACIONES:
 EN EL CASO DEL PROYECTO EJECUTIVO ESTE DEBERÁ CONTENER LO ESTABLECIDO TANTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COMO LAS MISMAS DE CARÁCTER FEDERAL Y/O ESTATAL, SEGÚN CORRESPONDA.

MECÁNICA DE CÁLULO, MECÁNICA DE SUELOS, Y DEMÁS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PLANEACIÓN.

EN EL CASO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS DEBERÁ INTEGRAR ADEMÁS DEL DICTAMEN DE LA JUSTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN:
 ACTA CIRCUNSTANCIADA

EN EL CASO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROYECTO DEBERÁ INCLUIR ADEMÁS:
 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL ÁREA CORRESPONDIENTE POR EL CAMBIO DE PROYECTOS O ÁREAS


LA PROPOSTA DEBERÁ CONTENER LOS FOLIOS (REQUISITOS) COMPLETOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LO CITADO EN EN LA LEY Y SU REGLAMENTO APLICABLE.

Fecha de Autorización: 07 / 12 / 2021




CALLE MIGUEL AUZA

- TOTAL VOLUMEN CORTE = 245.00m³
- TOTAL VOLUMEN DE SUBRASANTE = 122.40m³
- TOTAL VOLUMEN DE BASE = 81.50m³
- RETIRO DE EMPEDRADO = 253.00m²
- T. VOLUMEN DE CONCRETO HIDRAULICO = 315.54m²
- DEMOLICION DE BANQUETA = 54.00m²
- TOTAL VOLUMEN DE BANQUETA = 79.60m²
- TOTAL VOLUMEN DE MACHUELO = 85.00ml.

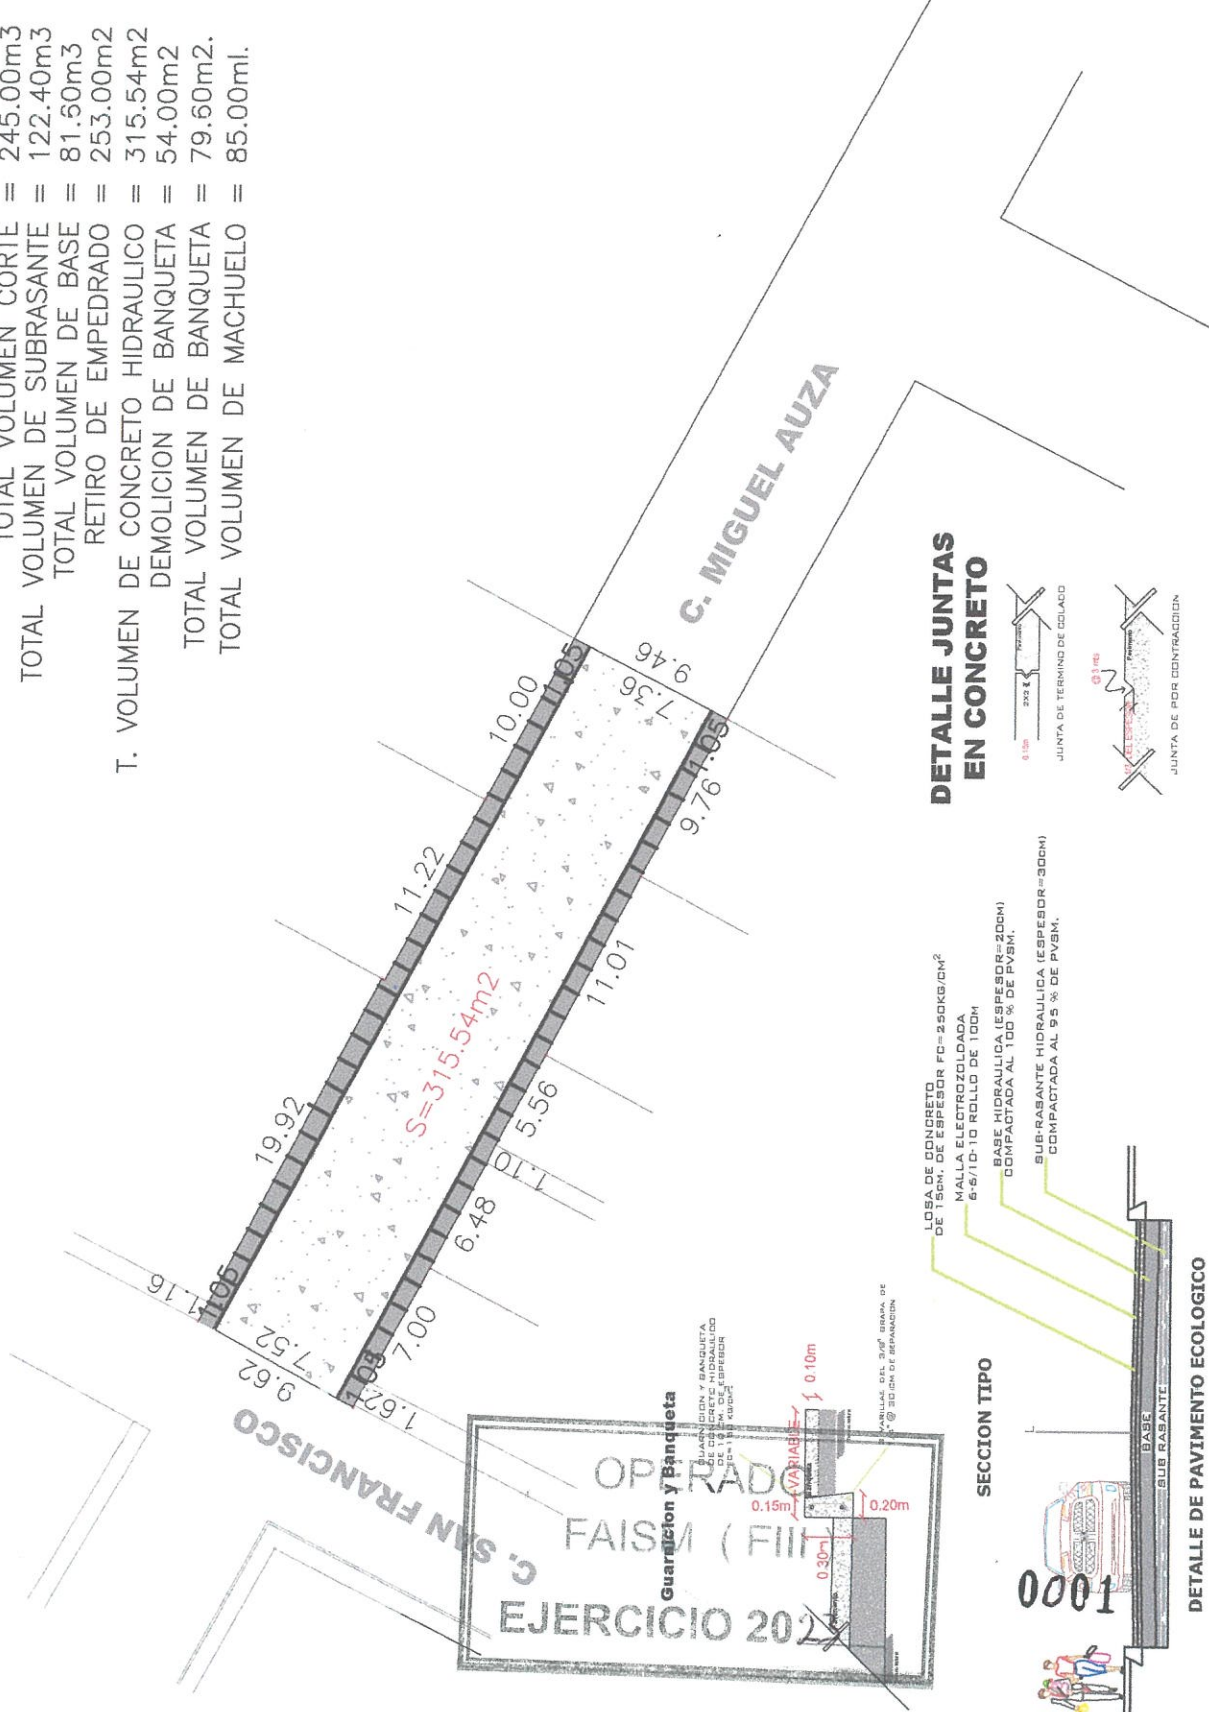


DETALLE JUNTAS EN CONCRETO



LOSA DE CONCRETO DE 15cm, DE ESPESOR FC=250KG/CM²
 MALLA ELECTROZOLLADA 6/6/10-10 ROLLO DE 100M
 BASE HIDRAULICA (ESPESOR=20CM) COMPACTADA AL 100 % DE PVS.M.
 SUB-RASANTE HIDRAULICA (ESPESOR=30CM) COMPACTADA AL 95 % DE PVS.M.

SECCION TIPO



DETALLE DE PAVIMENTO ECOLOGICO



SIMBOLOGIA
 TUBERIA DE 63.5mm (2 1/2")

- EXTREMIDAD CAMPANA
- EXTREMIDAD ESPIGA
- NUMERO DE CRUCERO
- TAPON CAMPANA
- VALVULA DE SECCIONAMIENTO
- L=1.35m
- LONGITUD DE TRAMO EN METROS

Q=120.17ps GASTO EN LITROS POR SEGURO
 CONTRATO

LEJIA DE AGUA
 TUBERIA
 PLANTA TOPOGRAFICA
 UBICACION
 CALLE MIGUEL AUZA, MOCHISTLAN, Q.G.
 PROYECTO
 UNIDAD DE PLANEACION
 TITULAR/PROYECTANTE
 UNIDAD DE PLANEACION
 FECHA
 ABRIL DEL 2023
 PROYECTO
 REDES DE AGUA POTABLE

PROYECTO: AGUA POTABLE C. AUZA
 TABLA DE CALCULO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE METODO HARDY-CROSS/MANNING
 PROYECTISTA: PLANEACION

DESCRIPCION	TRAMO	LONGITUD (m)	DIAMETRO INTERIOR (mm)	DIAMETRO EFECTIVO (mm)	COEF.	GASTO INICIAL (pps)	GASTO FINAL (pps)	VELOCIDAD (m/s)	PERDIDA DE CARGA (m)	COTA PIEZOMETRICA (m)		CARGA DISPONIBLE (m)	OBSERVACIONES
										INICIAL	FINAL		
	1	66.00	63.5	63.5	0.01400	1.000	1.000	0.316	0.323	0.000	99.770	139.770	47.897
	2										139.447	40.000	

DATOS DE PROYECTO

- No. DE LOTES: 9
- POBLACION PROYECTO: 45 HAB.
- DOTACION: 200 LTS/HAB/DIA
- FUENTE DE ABASTECIMIENTO: AGUAS SUBTERRANEAS
- CAPTACION: POZO PROFUNDO (EXISTENTE)
- REGULARIZACION: TANQUE SUPERFICIAL
- SISTEMA: BOMBEO AL TANQUE GRAVEDAD
- A LA RED DE DISTRIBUCION

COEFICIENTES DE VARIACION


- DIARIA: 1.2
- HORARIA: 1.5
- GASTOS: 1.00 LITS/SEG
- MAXIMO DIARIO: 1.30 LITS/SEG
- MAXIMO HORARIO: 2.10 LITS/SEG

VOLUMEN DE EXCAVACION

- EXCAVACION: 75.00 M3
- PLANTILLA MATERIAL DE BANCO (ARENOSO): 7.500 M3
- ACOSTILLADO MATERIAL DE BANCO (TEPETATE): 22.50 M3
- RELLENO MATERIAL DE BANCO (TEPETATE): 45.00 M3


CANTIDADES DE TUBERIA

- TUBERIAS (P.V.C. RD-26) 2 1/2" (63.5mm): L= 66.00mts.
- MANGERA HIDRAULICA DE 1/2": L= 52.00mts.
- ECAMIZADA EN MANGERA AGRICOLA DE 1": L= 52.00mts.



DETALLE DE ZANJA

ANCHO DE ZANJAS	
DIAMETRO DE TUBERIA	PROF. (H/C/M)
30	120
60	120

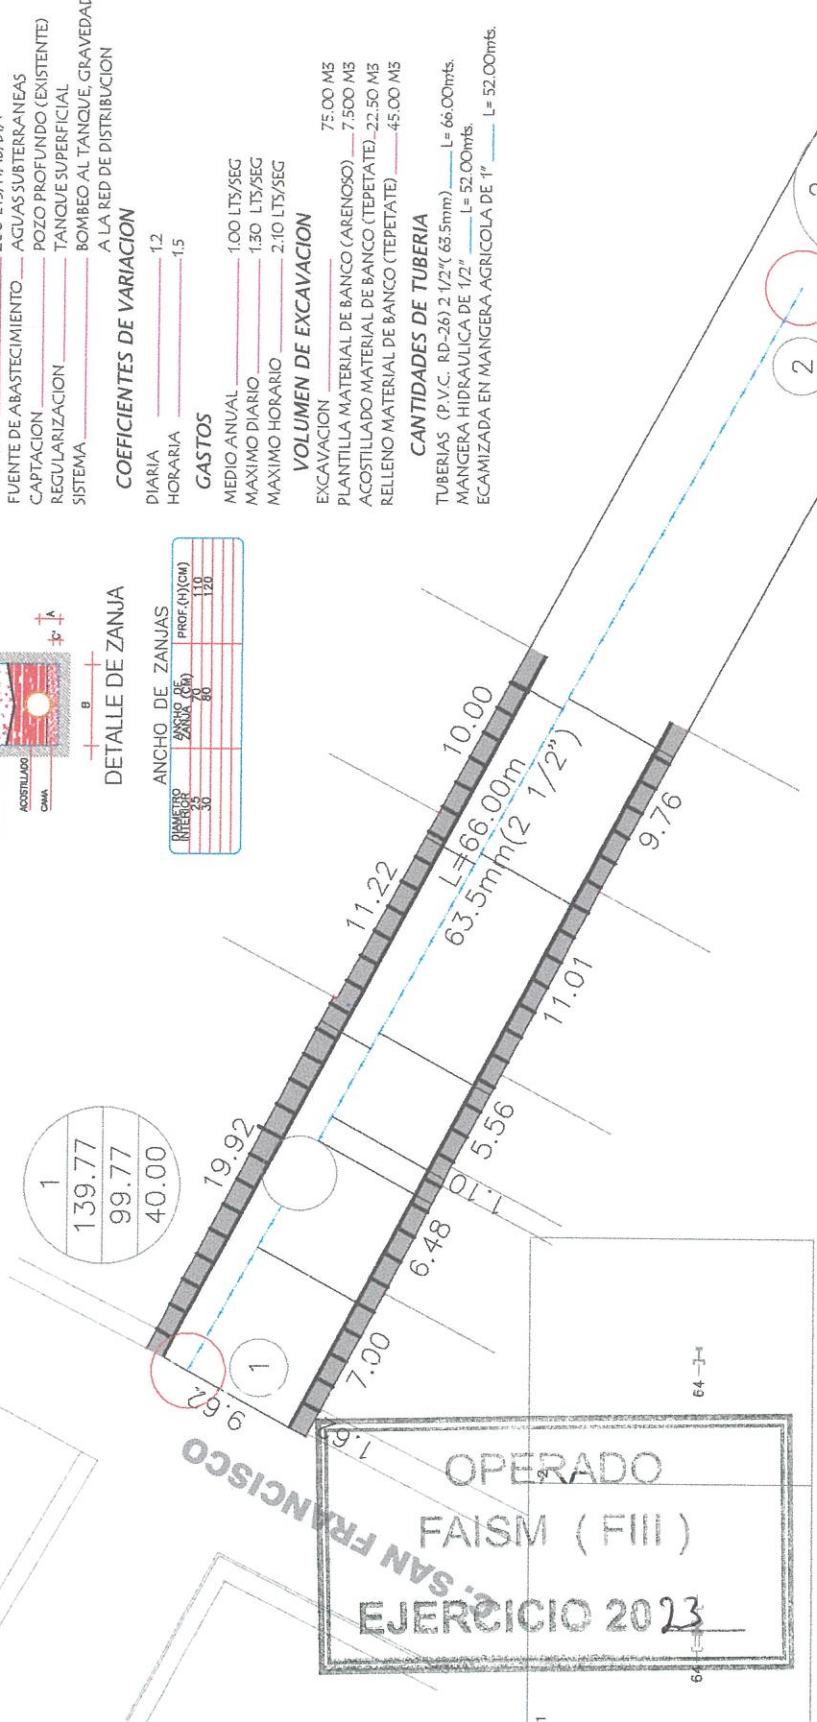

DESCRIPCION	CANT.
EXTREMIDAD CAMPANA DE P.V.C DIAMETRO 64 MM. (2 1/2")	1.00
VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE FO.FO. DIAM. 64 MM. (2 1/2")	1.00
EXTREMIDAD ESPIGA DE P.V.C DIAMETRO 64 MM. (2 1/2")	1.00
TAPON CAMPANA DE P.V.C DIAMETRO 64 MM. (2 1/2")	1.00

OPERADO
 FAISM (FIIL)
 EJERCICIO 2023

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: 3
OFICIO: NO. 069
EXPEDIENTE: ADMVO. 2021/2024

ASUNTO: SOLICITUD

DEPARTAMENTO DE PLANEACION
PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA ME DIRIJO A USTED CON LA FINALIDAD DE SOLICITARLE GIRE INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDE PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO DE OBRA: **PAVIMENTACION DE LA CALLE AUZA** SOLICITADO POR LA COMUNIDAD INTERESA HACIA MI CARGO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL.

Atentamente



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

Jose Manuel Jimenez Fuentes
C. JOSÉ MANUEL JIMENEZ FUENTES

Presidente Municipal de Nochistlán de Mejía Zac.



0003



CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR PROYECTO
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
EJERCICIO 2023

I.- UBICACIÓN

	CLAVE	NOMBRE
REGIÓN	09	CAÑÓN DE JUCHIPILA
MUNICIPIO	034	NOCHISTLÁN DE MEJÍA
LOCALIDAD	0001	NOCHISTLÁN DE MEJÍA
BARRIO, COLONIA, RANCHERÍA, ETC.		
TIPO DE LOCALIDAD	CP(X)	PR()

II.- IDENTIFICACIÓN

	CLAVE	NOMBRE
No. DE OBRA	404013	
PROGRAMA	404	URBANIZACION MINICIPAL
SUBPROGRAMA	221	URBANIZACION
TIPO DE PROYECTO	6141	DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION
NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	
DESCRIPCION DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367	
TIPO DE OBRA	NUEVA(X)	AMPLIACIÓN() REHABILITACIÓN() PROCESO()
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	C(X)	AM() AD() AC()
INSTANCIA EJECUTORA	M()	PRESIDENCIA MUNICIPAL

III.-INVERSIONES

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	F.I.S.M.	BENEFICIARIOS
INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2023	\$620,003.23			\$620,003.23	
INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DIC. DE 2023					

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO


METAS DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS DEL PROYECTO	LOTE	1
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	PERSONAS	MUJERES (30) - HOMBRES (20)
LOCALIZACION	COORDENADAS	21.359538 N, -102.836973 O

V.-PERIODO DE EJECUCIÓN

FECHA DE: INICIO: 01/12/2023

TERMINO: 31/12/2023

ANOTAR SI BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS):



0094

Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS



CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR PROYECTO
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
EJERCICIO 2023

I.- UBICACIÓN

Table with columns: REGION, MUNICIPIO, LOCALIDAD, BARRIO, COLONIA, RANCHERÍA, ETC., TIPO DE LOCALIDAD, CLAVE, NOMBRE. Values include: 09, 034, 0001, CAÑON DE JUCHIPILA, NOCHISTLÁN DE MEJIA, NOCHISTLÁN DE MEJIA.

II.- IDENTIFICACIÓN

Table with columns: No. DE OBRA, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, TIPO DE PROYECTO, NOMBRE DE LA OBRA, DESCRIPCION DE LA OBRA, TIPO DE OBRA, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, INSTANCIA EJECUTORA, CLAVE, NOMBRE. Values include: 404013, 404, 221, 6141, URBANIZACION MINICIPAL, URBANIZACION, DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

III.- INVERSIONES

Table with columns: CONCEPTO, TOTAL, FEDERAL, ESTATAL, F.I.S.M., BENEFICIARIOS. Rows include: INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2023, INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DIC. DE 2023.

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO


Table with columns: METAS DEL PROYECTO, BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, LOCALIZACION, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD. Values include: LOTE, 1, PERSONAS, MUJERES (30) - HOMBRES (20), COORDENADAS, 21.359538 N, -102.836973 O.

V. PERIODO DE EJECUCIÓN

FECHA DE: INICIO: 01/12/2023

TERMINO: 31/12/2023

ANOTAR SI BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS):



0005

Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable al delito de su naturaleza.



PROGRAMA CALENDARIZADO ANUAL FÍSICO FINANCIERO
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	
FECHA DE:	INICIO: 01/12/2023	TERMINO: 31/12/2023

PROGRAMADO TODO EL AÑO		
FÍSICO	100%	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO (PESOS)
LOTE	1.00	\$620,003.27

	FÍSICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE	100%	\$620,003.27
TOTAL:		\$620,003.27

L.GDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2023


0006




CROQUIS DEL MUNICIPIO

MACROLOCALIZACION

Zacatecas
División municipal

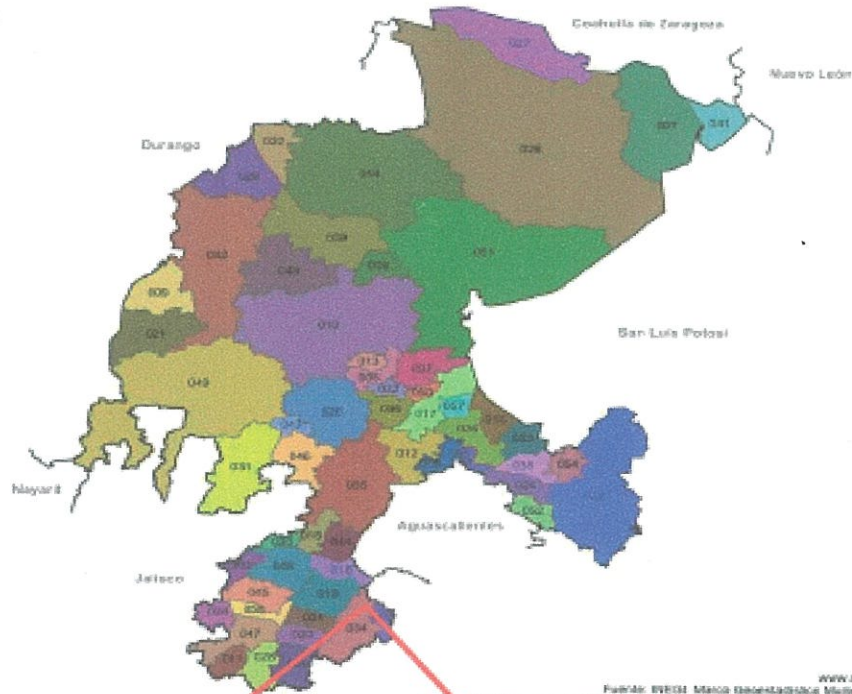

Nota: las divisiones incorporadas en este mapa corresponden al Marco Geográfico del INEGI

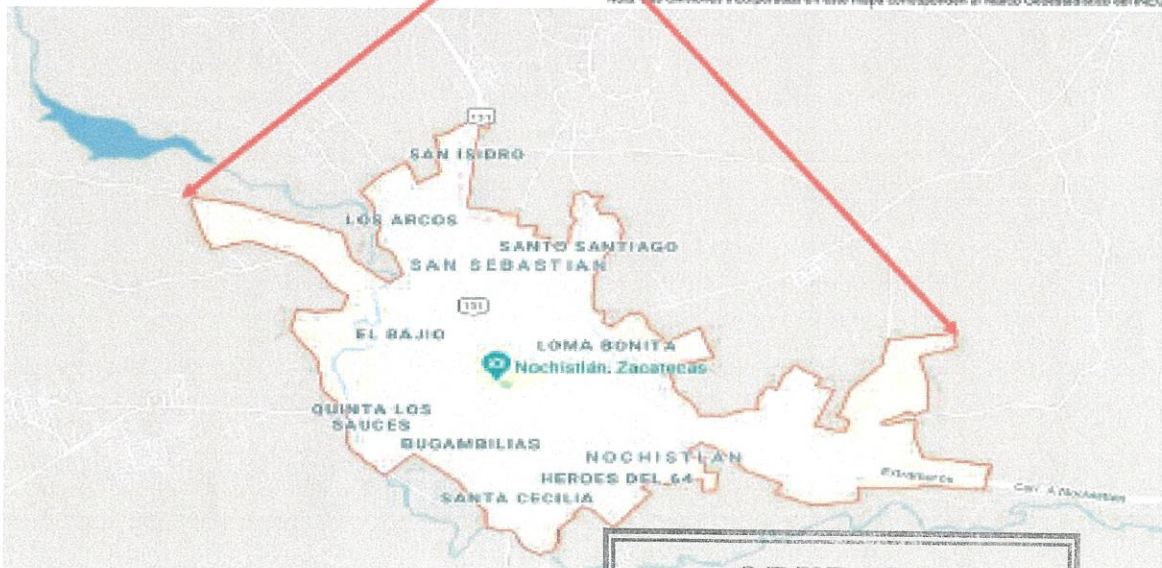

OPERADO
FAISM (FIII)

EJERCICIO 2023

0007

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

CROQUIS DEL MUNICIPIO

MICROLOCALIZACION


CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS. CORDENANDAS DE UBICACION 21.359538 N, -102.836973 O



OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

LGDJS Art. 28 "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social." Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. MUNICIPIO: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE CALLE AUZA					
PRELIMINARES					
010705	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2, incluye: Topografo, cadenero y operador.	m2	315.54	12.10	3,818.03
(*TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 03/100 MXN*)					
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperacion de material, incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.	m3	38.00	63.70	2,420.60
(*DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 60/100 MXN*)					
TEMP*4-1	Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaños	m2	130.20	64.64	8,416.13
(*OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 13/100 MXN*)					
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometre, sobre camino de terraceria, carga con máquina.	m3	43.40	146.05	6,338.57
(*SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 57/100 MXN*)					
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsiguientes se consideraran (4 km).	m3/Km	54.00	17.19	928.26
(*NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 26/100 MXN*)					
IMPORTE DE PRELIMINARES					
TERRACERIAS					
TEMP*3	Excavación en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo a proyecto.	m3	245.00	64.87	15,893.15
(*QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 15/100 MXN*)					
					21,921.59

OPERA
FAISM (III)
EJERCICIO 2023

0009

010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	m3	245.00	146.05	35,782.25
(*TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 25/100 MXN*)					
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsiguientes se consideran (3 km).	m3/Km	735.00	17.19	12,634.65
(*DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 65/100 MXN*)					
IMPORTE DE TERRACERIAS					
SUB-BASE Y BASE					
BAS-01	Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 %, utilizando material de banco y material pétreo (50% tepetate - 50% pétreo)	m3	122.40	459.29	56,217.10
(*CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 10/100 MXN*)					
METAC-0002	Mezclado tendido y compactación de la construcción de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material pétreo (40% tepetate - 60% pétreo)	m3	81.60	462.82	37,766.11
(*TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 11/100 MXN*)					
IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE					
GUARNICION - BANQUETA - CONCRETO					
170701	Guarnición de concreto $f'c=150$ kg/cm2 agregado de 20 mm cemento normal revenimiento 8 a 10 cm, sección Trapezoidal de 0.15 x 0.20 x 0.40 armada con dos varillas de 3/8" y grapas de alambros de 1/4 a cada 20 cm, cimbra metálica a 20 usos, incluye: Pintura para tráfico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	85.00	465.00	39,525.00
(*TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 MXN*)					
170713	Banqueta de Concreto $f'c=150$ Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	79.60	450.00	35,820.00
(*TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN*)					
030504	Pavimento de concreto $f'c=250$ Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	315.54	663.48	215,665.28

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0010

(*DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 28/100 MXN*)

IMPORTE DE GUARNICION - BANQUETA - CONCRETO

291,010.28

IMPORTE DE REHABILITACION DE CALLE AUZA

471,225.13

REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE AUZA

PRELIMINARES

010418	Trazo y nivelacion de terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m	66.00	10.53	694.98
--------	---	---	-------	-------	--------

(*SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 98/100 MXN*)

IMPORTE DE PRELIMINARES

694.98

TERRACERIAS

020249	Excavacion por medios mecanicos en terreno tipo I zona B en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	75.00	55.60	4,170.00
--------	--	----	-------	-------	----------

(*CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MXN*)

AFI-01 Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo I

572.25

(*QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 25/100 MXN*)

04 Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberias, incluye: material, mano de obra y herramienta.

1,893.45

(*UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 45/100 MXN*)

010818 Acarreo sobre camion de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria, carga con maquina.

1,095.38

(*UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 38/100 MXN*)

ACAR-02 Acarreo sobre camion de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilometros subsiguientes se consideraran (3 km).

386.78

(*TRES CIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 78/100 MXN*)

IMPORTE DE TERRACERIAS

8,117.85

MATERIALES

080415	Tubo Pvc Hid. Rd-26- Tramo de 6 Mts. 2 1/2" incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecucion del p.u.o.t.	m	66.00	116.11	7,663.26
--------	---	---	-------	--------	----------



0011

(*SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 26/100 MXN*)

AP-10 Valvula de Seccionamiento de fo.fo. diametro (2 1/2") Incluye: suministro, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. pza 1.00 3,926.59 3,926.59

(*TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 59/100 MXN*)

AP-12 Registro para Valvulas, incluye:marco c/tepa tipo MT-50 de PEAD o similar, contra marco, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. pza 1.00 5,740.22 5,740.22

(*CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 22/100 MXN*)

AP-14 Extremidad campana de PVC 2 1/2" de diametro incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. pza 1.00 359.42 359.42

(*TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 42/100 MXN*)

AP-15 Extremidad espiga de PVC 2 1/2" de diametro incluye: suministro y colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación pza 1.00 329.05 329.05

(*TRECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 05/100 MXN*)

18,018.54

IMPORTE DE MATERIALES

RELLENOS

Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepéate) compactado con pisón de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de distancia. m3 22.50 249.81 5,620.73

(*CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 73/100 MXN*)

Relleno con material producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. m3 45.00 46.03 2,071.35

(*DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 35/100 MXN*)

7,692.08

IMPORTE DE RELLENOS


TOMA DOMICILIARIA

28,737.00

TOMD-01

Suministro y colocación de medidor de agua potable, incluye: manguera de alta densidad (5 ml promedio), encamisado de poliducto naranja de 1", abarazadera omega de 2 1/2" con salida a 1/2", 1 llave de inserción, 1 valvula limitadora, niple galvanizado de 1/2", 1 niple cuerda corrida de 1/2", llave de paso de 1/2" de esfera, 1 niple galvanizado de 70 cm, registro para medidor de polietileno, medidor de chorro multiple de 1/2", conexiones a domicilio con tubo plus,mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

(*VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN*)



0012

IMPORTE DE TOMA DOMICILIARIA	28,737.00
IMPORTE DE REHABILITACION DE DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE AUZA	63,260.45
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO	534,485.57
IVA (16.00%)	85,517.69
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO	620,003.27

(*SEISCIENTOS VEINTE MIL. TRES PESOS 27/100 MXN*)

ING. DIEGO MERCADO QUEZADA
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0013

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
PRELIMINARES	01/12/2023-05/12/2023
TERRACERIAS	06/12/2023-13/12/2023
SUB-BASE Y BASE	14/12/2023-20/12/2023
CONCETO	21/12/2023-31/12/2023
MATERIALES	11/12/2023-13/12/2023
RELLENOS	13/12/2023-13/12/2023

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



0014

ACTA DE CONSEJO DE PLANEACION MUNICIPAL
MUNICIPIO: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

ACTA NO. 1
EJERCICIO 2023.

En la ciudad de Nochistlán de Mejía, Estado de Zacatecas, siendo las 10:00 horas del día **21 de Abril de 2023**, reunidos en el salón de Cabildos del Edificio de la Presidencia Municipal, estando presentes. los ciudadanos: C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, Presidente Municipal; LIC. ARMANDO AGUIRRE, Secretaria de Gobierno, LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ, Sindica Municipal, ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Director de Desarrollo económico y social, ING. ANA GABRIELA TACHIQUIN TORRES, Contralor Municipal, C. SERGIO HINOJOZA PEREZ, Director de Obras Públicas y Servicios Municipales, L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ, Encargada de Tesorería Municipal, representantes parlamentarios de los diferentes partidos PAN, PRI y Alianza en el municipio, así como representantes comunitarios, denominados también consejeros comunitarios, de las diferentes comunidades del municipio, integrantes del concejo municipal de planeación, organismo técnico auxiliar del ayuntamiento, constituido conforme lo dispone el art. 198 de la ley orgánica del municipio en vigor, con el propósito de llevar a cabo la presente reunión de trabajo a la que previamente se convocó y que se habrá de desarrollar Con el fin principal:


Bajo el siguiente orden del día:

1. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.
2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, QUORUM LEGAL, E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA
3. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2021-2024.
4. PROPUESTA PARA SU VALIDACION DE OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR CON RECURSOS DEL RAMO 33, EJERCICIO 2023, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
5. ASUNTOS GENERALES. Y/O ACLARACIONES
6. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

1. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.

Toma la palabra el presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL EL C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, da la bienvenida a todos los asistentes a esta reunión, consejeros, delegados, directores, Regidores y miembros del ayuntamiento, a esta reunión del Consejo de Planeación de esta Administración 2021-2024, primera del ejercicio 2023.

2. PUNTO 2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, QUORUM LEGAL, E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA EJERCICIO 2023



Sofia Muñoz Villalobos
Jose Rodriguez

Joselina Durán Villalobos
Silberto Lechuga H
Van: Tovar

0015

Adriano Aguiro R
Diana Jimenez
Jose Aguirre S
Ma. Dolores Ordovica
Salvador Araceli
Agure Pérez
Pérez Frias

Heriberto Garcia S
A.
Lus Antonio Durán
Elicia Ramirez Gomez
Endelia Puga G.
Toso Rosario Prieto
Juan Solazay
Martin Dehdezay
José Juan Mesia R.
Constancio Frias
David Durán B.
David Maso Mesa

Heriberto Garcia

B. Adriana Aguayo R.

Humberto Zamora

Salvador Aguirre Lopez Rosalia Oropeza

Mar. Dolores Ordorica b. Araceli Pérez Frías

Jose Duran Gaimas


Acto siguiente, se le otorga la palabra a el ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Secretario técnico del Consejo de Planeación Municipal para proceder con el siguiente punto del orden del día, el cual es el Pase de lista, una vez realizado, informa al presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL que se cuenta con la presencia de _____ consejeros de un total de _____ que integran el CONSEJO de desarrollo municipal, así como se cuenta con la presencia de los Delegados Municipales o en su caso suplentes de la mayoría de las comunidades, una Asamblea muy concurrida, lo que permite al Presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Que se cuenta con quórum legal para continuar con la asamblea el C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, presidente del consejo, declara la instalación legal de la asamblea y apertura de los trabajos y por lo tanto, validos los acuerdos que de ella misma emanen.

3. **CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2021-2024.**

El siguiente punto, se otorga el uso de la palabra el ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Secretario técnico del Concejo de Planeación Municipal para proceder con el siguiente punto del orden del día, el cual es la capacitación al Concejo de Desarrollo Municipal, otorgándoles a cada concejero las obligaciones y funciones de acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio, y se da a conocer el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PUBLICADO EL 14 DE FEBRERO DE 2014 Y SUS MODIFICATORIOS EL 13 DE MAYO DE 2014, EL 12 DE MARZO DE 2015 Y EL 31 DE MARZO DE 2016, publicados por la Secretaria de Desarrollo social para el presente ejercicio. Haciendo hincapié en lo siguiente : Da lectura del extracto de los lineamientos de operación, que en el direccionamiento de los recursos, los gobiernos locales y de las entidades federativas podrán planear hasta un 100% de sus recursos del FAIS en obras de incidencia directa, para el caso de incidencia complementaria podrán planear hasta el 60% de sus recursos del FAIS; el resto de los recursos se invertirá en demarcaciones territoriales con alto y muy alto grado de rezago, que para la identificación de la población en pobreza extrema los gobiernos locales deberán hacer uso de los Criterios de Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema.

4. **PROPUESTA PARA SU VALIDACION DE OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR CON RECURSOS DEL RAMO 33, EJERCICIO 2023, DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.**

5. Continuando con el orden del día, acto seguido, se le otorga la palabra a el ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Secretario técnico del Consejo de Planeación Municipal para proceder con la reunión de trabajo, e informar a los presentes que el techo financiero del fondo para la infraestructura Social Municipal, dado a conocer a los miembros del consejo lo que corresponde a las liberaciones de



Sofia Muñoz Villalobos
Jose Rodriiguez

Jose Manuel Muñoz Gorman
Josefina Duran Villalobos
Alberto Ferrugón H
Xeni Toribio sandovar-s

0016

Antonio Durán David
Endelia Puga
Araceli Pérez Frías
Jose Juan Mejia
Jose Rosendo Pineda
Constancia Frías
Dolores Ordorica
Jose Duran Gaimas
Heriberto Garcia
Humberto Zamora
Mar. Dolores Ordorica b.
Salvador Aguirre Lopez
Sofia Muñoz Villalobos
Xeni Toribio sandovar-s

Juan Solazar

Heriberto Garcia

acuerdo a las necesidades que esta Asamblea señala, y con ello de ser posible realizarse con recursos del presente ejercicio o bien dentro del próximo ejercicio fiscal, cabe mencionar que por el momento se desconocen los montos de estos proyectos.

Respecto al resultado de desahogo de los puntos anteriores, se acuerda:

Primero: Tenemos por enterados y conformes, en nuestra calidad de integrantes del Consejo, respecto a la información a que se refiere el punto 3 del Orden del día.

Segundo: Tenemos por enterados y conformes y emitiendo nuestra aprobación, en nuestro carácter de miembros del Consejo, respecto a todas y cada una de las acciones de obra contenidas en el listado a que se refiere el punto 4 del orden del día.

Tercero: Tenemos de igual forma, en nuestra calidad de integrantes del Consejo, suscribiendo, en documento por separado, las peticiones o propuestas de acciones de obra que pudieran realizarse de ser posible en el presente ejercicio o bien en el próximo año fiscal, con recursos del fondo III Y/O mezcla de recursos derivadas de otras fuentes de financiamiento asunto este al que se hizo alusión en algún punto del orden del día.

6. ASUNTOS GENERALES. Y/O ACLARACIONES

Surgieron inquietudes por parte de los representantes comunitarios, de obras que se solicitaron en las reuniones comunitarias, así como de otros programas como Tres por uno, aclarando el secretario del Consejo y Presidente Municipal, las dudas.


6. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

Para finalizar y tomando en cuenta que no hay otro asunto que tratar se da por clausurada la asamblea, en la forma propuesta en el punto 7 del orden del día, siendo las 12:00 horas del día de la fecha, firmando para constancia y para validez legal de lo descrito en este documento, los intervinientes. **Damos fe.**

Se adjuntan los anexos 1 y 2. (La lista de asistencia y la lista de obras)

B. Adriano Aguirre
Teresa L. Jose
Salvador Aguirre Perez
Araceli Perez Frias
Rosario Prieto
Jose Juan Mejia P.
Jose Rosario Prieto
Jose Juan Mejia P.
Luis Antonio Duran
David Duran B.
Luis Antonio Duran
David Duran B.
Luis Antonio Duran
David Duran B.

A.
Yesenia Muñoz Guzman
Josefina Duran Villalobos
Maria C. Zapata
Vicente Marcos Mando
Sofia Muñoz Villalobos
Jose Rodriguez
María C. Zapata
Vicente Marcos Mando
Pugá G.
FAISM
EJERCICIO 2023
Juan Salazar

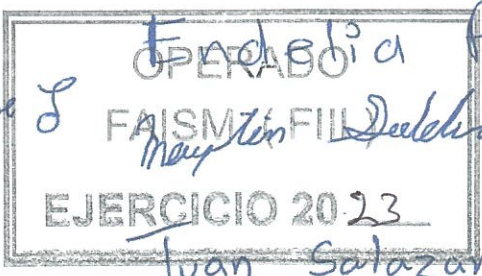

0018

CONSEJERO	
VICENTE MEXAS MERCADO	Vicente Mexias Mercado
Maria Concepción Zapata F.	Maria C. Zapata
OMAR LOPEZ VELEZ	
MA. GUADALUPE MENDOZA FRIAS	
EVELIA RAMIREZ GOMEZ	Evelia Ramirez Gomez
JOSE VALLIN MUÑOZ	Suplente
JAVIER MARTINEZ QUEZADA	Suplente Yesenia Muñoz Guzmán
FELIPA PEREZ MEJIA	
OSCAR JIMENEZ DURAN	"Papel" Jimenez
MARIO HERNANDEZ LECHUGA	
GILBERTO LECHUGA HERNANDEZ	Gilberto Lechuga H
SALVADOR AGUIRRE PEREZ	Salvador Aguirre Perez
ELISEO MUÑOZ DURAN	
JOSE JOVANI GONZALEZ CORONA	
JOSE RODRIGUEZ	Jose Rodriguez
ROSA MARIA CORONA LARIS	
GEORGINA DANIELA RUIZ VIRAMONTES	
JOSE PERFECTO GONZALEZ	
IRENE OLMOS SALDIVAR	
MA DEL CARMEN BECERA ESPARZA	
EDGAR IVAN GONZALEZ CORDOVA	
ENRIQUE RUVALCABA	
MARTIN SALDIVAR ESPARZA	Martin Saldivar
JUAN RAMON AGUSTIN SIGALA SALDIVAR	

Yoni Toribio Sandoval S

Endelia Puga G
Ma. Dolores Ordorica L Abto. Pedagogico

EJERCICIO 2023

0019

ANTONIO QUEZADA DIAZ	• Suplente Teresa de Jesus
ANTONIO MEJIA QUEZADA	• Antonia
SOFIA MUÑOZ VILLALOBOS	Sofia Muñoz Villalobos
JOSEFINA DURAN VILLALOBOS	Josefina Duran Villalobos
JOSE DURAN JAIME	• José Durán
ESPERANZA GOMEZ DURAN	• Esperanza
RAUL GOMEZ ANDRADE	• Raúl
JOSE JUAN MEJIA PEREZ	José Juan Mejía Pérez
MANUEL TENORIO CORDERO	
IGNACIO ALVAREZ M	
ARACELI PEREZ FRIAS	Araceli Pérez Frías
RUBEN GUZMAN LUNA	
ABEL PEREZ FRIAS	
JUAN PABLO SALAZAR PEREZ	• Juan Salazar
EFRAIN ROBLES VELAZCO	
DAVID DURAN BUSTOS	• David Durán B.
JOSE AGUIRRE LOMELI	• José Aguirre L.
JOSE ARTURO ALVAREZ VILLEGAS	
JOSE ROSARIO PRIETO	• José Rosario Prieto
ABEJINO PEREZ GOMEZ	
JOSE RUVALCABA RUVALCABA	• José Ruvalcaba
VICTOR MANUEL VILLALOBOS JAUREGUI	
RUBEN JIMENEZ QUEZADA	
ERIKA LUIS GARCIA	
VICTOR MANUEL RODRIGUEZ DURAN	
JOSE SANDOVAL GOMEZ	

~~Hilda~~

Hilda Yarmín González

EJERCICIO 2023

J. RAMON QUEZADA RUVALCABA	
ROSARIO OROPEZA GARCIA	<i>Rosario Oropeza</i>
LUIS ANTONIO DURAN MUÑOZ	<i>Luis Antonio Duran</i>

Constancio Frias


Ramon Durazda


OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0021

Araceli Pérez Frías
Cecilia Alcalá Aguayo.


POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024


PRESIDENTE DEL C.D.M.

C. JOSE MANUNUEL JIMENEZ FUENTES

SECRETARIO DE GOBIERNO

LIC. ARMANDO AGUIRRE GOMEZ.

ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL.

L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ.

SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ.

DIRECTOR DE OBRAS SERVICIOS PUBLICOS

C. SERGIO HINOJOZA PEREZ.


CONTRALOR MUNICIPAL.

ING. ANA GABRIELA TACHIQUIN


SECRETARIO TECNICO DEL C.D.M.


ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

REPRESENTANTES PARLAMENTARIOS ANTE EL CONSEJO

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO
PAN - PRI - PRD

LIC. REYNA VILLALOBOS PEREZ

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. BEATRIZ ADRIANA AGUAYO RODRIGUEZ

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO
FUERZA POPULAR MEXICO

LIC. CELINA AMADITA QUICHIN BECERRA

REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. RAFAEL CERVANTES DURAN.

REGIDOR DE DESARROLLO ECONOMICO

PROF. JORGE ORTIZ RAMIREZ.

0022

Jennifer Belen Flores Rubi Gómez R.
 Hazel Peréz José Vallín Muñoz

ANEXO 2

2023

Erika Luis Garcia
 Froyel Vardéz A.

Ruben Jimenez D

No.	LOCALIDAD	OBRA/ ACCIÓN	MONTO	SUBCLASIFICACION	INCIDENCIA
1	VELADORES	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE VELADORES	\$1,297,230.96	DRENAJE SANITARIO	DIRECTA
2	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AROLLO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL	\$427,997.84	DRENAJE SANITARIO	DIRECTA
3	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL AUZA, CABECERA MUNICIPAL	\$110,000.00	DRENAJE SANITARIO	DIRECTA
4	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AROLLO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL	\$214,024.70	AGUA POTABLE	DIRECTA
5	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL AUZA, CABECERA MUNICIPAL	\$85,000.00	AGUA POTABLE	DIRECTA
6	LA COFRADIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA	\$734,676.50	CAMINO	DIRECTA
7	LAS CRUCES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES	\$769,295.01	CAMINO	DIRECTA
8	RINCONADA DE VELAZCO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE RINCONADA DE VELAZCO	\$1,076,001.05	CAMINO	DIRECTA
9	TOYAHUA DE ABAJO	CONSTRUCCION DE HUELLA ECOLOGICA EN TOYAHUA DE ABAJO I	\$1,164,097.92	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
10	TOYAHUA DE ABAJO	CONSTRUCCION DE HUELLA ECOLOGICA EN TOYAHUA DE ABAJO II	\$1,199,870.63	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA

Juana Piniguez

OPERADO
 FAISM (FIIII)
 EJERCICIO 2023

Aracely Pérez Fria
 M. Guadalupe Mendoza Fria
 Sofia Muñoz V.
 Gilberto Lechaga Hdz.
 Martin Saldivar E.
 Juan Salazar

[Signature]

Rubí Gómez R. Jennifer Delen Abel Pérez
Flores Flores M. Guadalupe Mendoza
José Vallín Muñoz

ANEXO 2

2023

No.	LOCALIDAD	OBRA/ ACCIÓN	MONTO	SUBCLASIFICACION	INCIDENCIA
11	EL PEINE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DEL PEINE	\$1,200,474.55	CAMINO	DIRECTA
12	LAS HUERTAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS-EL MOLINO	\$1,249,342.93	CAMINO	DIRECTA
13	CAPELLANIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE CAPELLANIA	\$453,744.14	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
14	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL AUZA	\$530,000.00	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
15	CABECERA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DE LAS ROSAS CABECERA MUNICIPAL, NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$402,130.22	ELECTRIFICACION	DIRECTA
16	TOYAHUA DE ARRIBA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE TOYAHUA DE ARRIBA, NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$319,000.00	ELECTRIFICACION	DIRECTA
17	VELADORES	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE VELADORES, NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$322,225.96	ELECTRIFICACION	DIRECTA
19	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ANDADOR HACIA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOCHISTLAN, NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$1,799,990.00	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA
20	LOS SANDOVALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LOS SANDOVALES	\$887,747.48	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
21	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CALLE LAZARO CARDENAS	\$1,014,079.40	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA

Erika Luis Garcia
Froel Valdez A. Ruben Jiménez Q

OPERACIONES
FAISM (FII)
EJERCICIO 2023

Juan Salazar
Araceli Pérez Frías
Sofia Muñoz V.
M. Martin Saldivar E.
Gilberto Lechuga Hde.
En Muñoz

0024

Juana Triguero S.

ANEXO 2

Jennifer Belen Flores Flores

Jose Vallin Muñoz

2023

Erika Luis Garcia
Froel Valdez A. Ruben Jimenez Q

No.	LOCALIDAD	OBRA/ ACCIÓN	MONTO	SUBCLASIFICACION	INCIDENCIA
22	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMPO EL GIRO EN UNIDAD DEPORTIVA	\$743,384.76	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA
24	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$131,372.82	AGUA POTABLE	DIRECTA
25	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$217,449.13	DRENAJE SANITARIO	DIRECTA
CONVENIOS					
26	VARIOS	CONVENIO VIVIENDA	\$1,500,000.00	CUARTO PARA BAÑO, CUARTO PARA DORMITORIO Y TECHO FIRME	DIRECTA

TOTAL DE OBRAS

\$17,849,136.00

Abel Perez

m. Guadalupe mendoza f

Rubi Gomez R.

M. J. Muñoz M.

Martin Saldivar E.

Sofia Muñoz U.

Gilberto Ledaga Hdc.

Araçeli Pérez Frías

Juan Salazar

du muñoz

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0025

Juana Iniguez G.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

CONVENIO DE CONCERTACIÓN 2023

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

Convenio de Concertación, que con objeto de llevar a cabo obras y/o acciones de beneficio social, celebran, por una parte, el H. Ayuntamiento de: Nochistlán, Zac. Representado por el C. Presidente Municipal quien a su vez es el Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal; y por otra el comité comunitario y/o por obra del municipio **MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA** los que en lo sucesivo se denominarán “AYUNTAMIENTO”, “CONSEJO” Y “COMITÉ” respectivamente.

ANTECEDENTES

1.- El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Desarrollo Social y de Contraloría y Desarrollo Administrativo; el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; y los Ayuntamientos de los 56 municipios del Estado, celebraron un anexo de ejecución del Convenio de Desarrollo Social 2023, el cual tiene por objeto operar el programa denominado “ Fondo ; mediante la transparencia de los recursos federales y estatales a los H. Ayuntamientos, y estos a su vez los operan conjuntamente con los Consejos de Desarrollo Municipal y los Comités del referido programa.


2.- El consejo de Desarrollo Municipal, correspondiente al municipio de NOCHISTLÁN, con domicilio en CALLE HIDALGO #1, se encuentra constituido según consta en el Acta levantada en Asamblea de consejeros de fecha **21 DE ABRIL DE 2023** y tiene como principal objetivo efectuar la promoción de los objetivos, estrategias, programas y acciones del Fondo de Desarrollo Social Municipal ; y a la vez promover e impulsar la organización social y la participación de la población organizada.

El **C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES** en su carácter de Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal, tiene facultades para suscribir el presente convenio a nombre y representación de dicho Consejo.

3.- LA : **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS** _constituyó el **27 DE NOVIEMBRE DE 2023** con el propósito de ejecutar, así como operar y conservar las obras y/o acciones que en su localidad se definieron como prioritarias.

El _____ en su carácter de Presidente del Comité, tiene facultades para suscribir el presente Convenio a nombre y representación de dicho Comité.

En razón de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos I fracc. II, 3,4,6,7,28,29,30,50,51 y 82 de la Ley de Adquisiciones de Obras Públicas; y en las disposiciones



0026

I

MP
Jeresa Ledezma Román
Serran

Dora Josefina A.S.

ABEL CRISTIANO BELTRAN

aplicables de la ley orgánica Municipal, las partes celebran el presente concentrado el tenor de las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA ,- El H. "AYUNTAMIENTO", el "CONSEJO" y el "COMITÉ" , convienen en conjuntar esfuerzos y recursos para la realización de obras y/o acciones, en el marco del programa " Fondo para la Infraestructura Social Municipal".

SEGUNDA.- Las obras y/o acciones que se ejecutarán por el "Comité" serán las que a continuación se describen: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS. Para la realización de las obras y/o acciones anteriormente señaladas, el "AYUNTAMIENTO" ministrará al "COMITÉ" \$614,791.20 (SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 20/100 MN)

TERCERA.- La ministración de los recursos a que se refiere la cláusula anterior estará a cargo del "AYUNTAMIENTO".


La ejecución de las obras, objeto del presente instrumento, estará bajo la responsabilidad directa del "CONSEJO" y la supervisión y vigilancia de la misma estará bajo la responsabilidad del "CONSEJO" y del "AYUNTAMIENTO".

CUARTA.- El "AYUNTAMIENTO" se compromete a:

- Ministrar los recursos al "COMITÉ", de acuerdo a los lineamientos que norman el programa
- Llevar un registro contable por separado, de los recursos designados a las obras y/o acciones a que se refiere este Convenio, independiente de la contabilidad de los ingresos del propio "AYUNTAMIENTO" y de otros programas.
- Solicitar informes con periodicidad que se requiera, conforme al tipo de obra y/o acción, al "CONSEJO" y al "COMITÉ" respecto de avance físico de las obras del presente Convenio; así como el ejercicio de los recursos que se otorguen.
- Proporcionar asesoría técnica al Comité en la ejecución de la obra, y apoyar a este con la ministración oportuna de los recursos.
- Informa al Ejecutivo Estatal del avance físico de las acciones u obras y del ejercicio del recurso, objeto del presente Convenio.

QUINTA.- El "COMITÉ" se compromete a:

- Realizar las obras y/o acciones objeto del presente Convenio, sujetándose a los lineamientos del programa a efecto de que se cumplan los principios de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia aplicables, en el ejercicio de los recursos que se aportan.
- Ejercer la totalidad de los recursos señalados en la cláusula segunda, destinándolos única y exclusivamente a las acciones u obras objeto del presente Convenio.



0027

Mra Teresa Ledezma D. Domínguez Sánchez
Dora Yosel, H.S.


AS 24/38 013 FIAN 7387
ABEL QUINTERO BELTRÁN

- c) Proporcionar oportunamente los bancos de materiales que se requieran, así como la mano de obra necesaria en la realización de las obras que se comprometen en este Convenio.
- d) Informar al representante comunitario ante el Consejo, los avances físicos así como la aplicación de los recursos.
- e) Colaborar con el "CONSEJO" en la resolución de problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
- f) Informar mensualmente al "AYUNTAMIENTO", por escrito, del avance físico de las obras y/o acciones, así como de la aplicación de los recursos económicos.
- g) Atender al "CONSEJO" en la inspección de las instalaciones, a efecto de verificar el avance de las acciones u obras objeto del presente Convenio y colaborar con éste, cuando sea necesario.
- h) Llevar una contabilidad especial, de los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda, para la realización del objeto del presente Convenio.
Así como entregar al Consejo los recibos de comprobantes, que amparen las erogaciones realizadas; permitir a las autoridades competentes, auditar dicha contabilidad, si así lo juzgan necesario.
- i) Dar aviso al "CONSEJO" sobre la terminación de las obras de que proceda a su verificación y preparación del informe y acta respectiva.
- j) Recibir las obras y responsabilizarse de su conservación, mantenimiento y operación.
- k) Denunciar ante el "AYUNTAMIENTO" o la Contraloría del Estado, la irregularidades que observen en la aplicación de los recursos financieros; tanto por parte de las autoridades, como de los particulares.

SIXTA. _ El "CONSEJO" se compromete a:

- a) Gestionar y coordinar los diversos apoyos institucionales que requiera el "COMITÉ", para la realización de las obras y/o acciones derivadas del presente Convenio.
- b) Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la realización de las obras y/o acciones y el ejercicio de los recursos derivados del presente Convenio, de acuerdo con los lineamientos del programa
- c) Realizar visitas de inspección a las instalaciones donde se lleven a cabo las obras y/o acciones.
- d) Solicitar ante las autoridades competentes, los permisos o licencias de construcción que se requieran para la realización de las obras; o en su caso de las acciones, a que se refiere este documento, conforme las leyes aplicables.
- e) Llevar a cabo el seguimiento, registro, control y evaluación del ejercicio de los recursos financieros, así como del avance físico de las acciones u obras objeto del presente Convenio.

SEPTIMA.-El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el "CONSEJO" y el "COMITÉ", ya sea consecuencia de dolo, culpa o negligencia de los servidores públicos municipales o de los representantes del "CONSEJO" y/o "COMITÉ" dará lugar a la terminación anticipada del presente convenio. En tal caso se comprometen a reintegrar al "AYUNTAMIENTO" los recursos que se les hayan ministrado y estén por alguna causa sin ejercer en este momento.



0028

M^{ra} Teresa Ledezma J. P.
 Para el del H.S.

M^{ra} Teresa Ledezma J. P.
 01/27/2023

Quien tenga conocimiento de las irregularidades, que en este contexto tuvieren lugar, procederá de inmediato a comunicar los hechos a la Contraloría Estatal o Municipal, para que se determine la responsabilidad administrativa que pudiera derivar de tales hechos o circunstancias, la cuál será independiente de la del orden civil o penal que puedan configurarse.

OCTAVA.- En caso de suscitarse duda o controversia respecto a la interpretación y cumplimiento del presente instrumento jurídico, las partes convienen expresamente, someterse a corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

NOVENA. - El presente Convenio de concertación entrará en vigor el día de su firma y su vigencia será el **ejercicio fiscal 2023**, pudiéndose modificar o adicionar de común acuerdo por las partes; las modificaciones Y adiciones deberá constar por escrito y surtirán efectos a partir de su suscripción.

Mra Teresa Ledezma Domínguez

Dora Yoselin H.S.

ABEL QUINTERO BELTRAN

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0029

IV

Dado que fue el presente Convenio de Concertación y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firma para constancia y validez en: **27 DE NOVIEMBRE DE 2023**

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL C.D.S.M.

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO

L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

POR EL COMITÉ DE OBRA

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

SECRETARIO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA

M^a Teresa Ledezma

NOMBRE:

NOMBRE Y FIRMA

ABEL PUINTEIRO BELTRÁN

NOMBRE:

TESORERO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA

Margarita Suran

NOMBRE:

VOCAL DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA

Dora Yoselin H.S.
FISM (FIII)

NOMBRE

EJERCICIO 2023

0030

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ
COMUNITARIO Y/O POR OBRA

404013

EJERCICIO 2023

RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

MARCO ESTRATÉGICO

Se promueve, la integralidad política institucional y de la sociedad para fortalecer el proceso de descentralización ampliando las capacidades de estados y municipios promoviendo la corresponsabilidad ciudadana y la participación social en la aplicación de los recursos públicos; sumando esfuerzos colectivos para alcanzar mejores condiciones de vida; cuidando que la obra a ejecutar se haga con transferencia y calidad. Es por ello y que en apego al Manual Único de Operación se formula la siguiente actuación:

En el municipio de NOCHISTLAN DE MEJIA y reunidos los habitantes del lugar que en forma anexa firman de asistencia en el lugar que ocupa LUGAR DE REUNION con la finalidad de concertar y conformar con la participación comunitaria y democrática el comité de obra comunitaria acordada por el Consejo de Desarrollo Municipal y autorizada y aprobada por la secretaría de Planeación y Finanzas en oficio No. respectivamente en la ejecución de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS. Siendo las **12:00** Horas del día **21 ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRES** y en asamblea general extraordinaria, legalmente constituida con la asistencia de la mayoría de los habitantes con derecho a participar y ante la presencia de las diversas representaciones de los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales y del representante del Consejo en esta comunidad se da por iniciada bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación de autoridades.
- 2.- Lista de presentes.
- 3.- Objetivos generales de constituir el comité de obra comunitario.
- 4.- Alcances y beneficios del programa de desarrollarse en esta población.
- 5.- Propuestas para la integración del comité.

Abordados y agotados los puntos del 1 al 4, se escucharon propuestas a candidatos para la integración del comité habiendo quedado por mayoría como se especifica al final de esta actuación firmando de conformidad los que en ésta aceptan los cargos y responsabilidades.

*Sumario
Por organista
Mra Teresa Ledezma*

*ABEL Quintana B & /fra
Dora Yolanda H.S.*

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 23

0031

LOS BENEFICIARIOS SE COMPROMETEN A:

- 1.- Aportar: \$ 0. 00/100 MN que corresponde al 0% aproximadamente del costo total para el programa F.I.S.M. Para que la obra se realice en el menor tiempo posible y hasta la fecha programada para su ejecución final, así como otros trabajos donde se requiera su participación.
- 2.- Colaborar con las autoridades en la resolución de los problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
- 3.- Aplicar los recursos de conformidad con el Manual Único de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 y la ley de adquisiciones y obras públicas, contenidas en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: El comité se denominará: comité de CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS personalidad jurídica y patrimonio propio.

SEGUNDA: El comité tendrá por objetivo contribuir a la construcción de la obra a que se hace referencia en el apartado anterior de éste documento apoyando y vigilando la operación y administración del programa, participará también en la organización de tareas comunitarias en las que se aporten materiales y/o mano de obra de los beneficiarios.


TERCERA: El domicilio legal del comité de obras se fijará en: **LUGAR DE LA OBRA** del municipio de Nochistlán de Mejía.

CUARTA: El comité se encargará de llevar a cabo tareas de promoción, difusión, organización construcción, vigilancia y mantenimiento de las obras que con motivo del programa se ejecuten.

QUINTA: El presidente del comité informará al representante comunitario del Consejo de Desarrollo Municipal de los avances físicos y financieros de la obra y comunicará a través del mismo al seno del consejo la problemática relacionada con la operación del programa. El presidente del comité tendrá la representación de la asamblea general ante toda clase de autoridades, organismos, personas físicas y morales siempre que sea necesario para el cumplimiento de los compromisos del comité.

SEXTA: El secretario tendrá a su cargo el archivo de la documentación correspondiente así como contestar y recibir toda clase de correspondencia.

SEPTIMA: El tesorero controlará los fondos y distribuirá los pagos que con motivo de la realización de las obras se eroguen en liquidación de mano de obra y/o materiales, teniendo especial cuidado de recabar la documentación comprobatoria de los gastos.



0032

Organista Suran
M^a Teresa Ledezma P.

ABEL QUINTANA BOJAFRA
Dora yoselin H.S.

OCTAVA: El Vocal de control y vigilancia informa y orienta al comité y a la comunidad acerca de los lineamientos de operación del fondo, trámites, recursos asignados y desarrollo de las obras y acciones. Así como la estricta vigilancia de las obras y la actuación de los servidores públicos.

NOVENA: En este acto el comité recibe por parte del "AYUNTAMIENTO" fotocopia del proyecto técnico de la obra a ejecutar para su consulta y conocimiento de las diversas representaciones involucradas en el programa que se los requiera como referencia.

Leída que fue la presente acta constitutiva y enterados los participantes de su contenido y alcance legal, la firman de conformidad para su constancia y validez los que en ella quedaron como comité; la presente se integra con la lista de asistencia en la comunidad de CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA

M^g Teresa Ledezman

NOMBRE:

SECRETARIO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA

ABEL Quintero Belltrán

NOMBRE:

TESORERO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA

margarita Suran

NOMBRE:

VOCAL DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA

Dora Yoselin H.S

NOMBRE:

Manuel Jimenez J.
POR LA PRESIDENCIA MPAL.

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES.

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO.

FAISM (FIII)

EJERCICIO 2023

III

0033

LISTA DE ASISTENCIA

Relación de participantes para la conformación del comité comunitario de la comunidad de:
Nochistlán de Mejía municipio de Nochistlán de Mejía de la obra de
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA
CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

M^{ra} Teresa Ledezma P.

ABEL QUINTERO BELTRÁN

Margarita Suran

APPKOMIAPRO

Dora Yselin H.S.

PIO SANDOVA

Susana Bravo Campos.

Joselina María

Jesus Perez

Ante Sandoval Z

OPERADO
FAISM (FII)

EJERCICIO 2023

0034



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXOS PARA EL REPORTE DE LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL- FISMDF 2023
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

0035



ANEXO 1

**ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y REPORTE DE CAPACITACIÓN**

Aviso de privacidad: Los datos personales que se recaban por la DGDR serán utilizados para los fines establecidos en los lineamientos del Fondo, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte.

RESPONSABLE DEL LLENADO: ENLACE FISDMF Y COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
1.1 Acta de Instalación del Comité de participación social

Siendo las 12:00 horas del día 27 del mes de Nov del año 2023 en la localidad de Nochistlan, del municipio Nochistlan, de la entidad Zacatecas, se encuentran reunidos el/la C. Diego Alejandro Mercado Quezada, designado (a) como enlace FISDMF, quien ostenta el cargo de Enlace en calidad de representante de la instancia ejecutora, el/la C. Abel Quintero Beltran, el/la C. Dora Yosefin H. S, el/la C. Ma Teresa Ledesma, el/la C. Margarita Duran, y el/la C. _____ para celebrar la instalación del Comité de participación social, que dará seguimiento y verificación de la obra: Construcción de Pavimentación y Red de Agua Potable a realizarse con los recursos del FAIS, componente FISDMF, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

CONSIDERANDO

Que el artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal, establece la obligación que tendrán municipios y demarcaciones territoriales de promover la participación de las comunidades beneficiarias en la planeación, ejecución, control, vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras y acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Que los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigentes, publicados el en Diario Oficial de la Federación, en su numeral 3.1.2, fracciones XV y XVI, los gobiernos locales tendrán como responsabilidades: 1.- Promover la participación social en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través de los comités de participación social o de las formas de organización con las que cuente el municipio o demarcación territorial. 2.- Los municipios y demarcaciones territoriales deberán reportar los formatos de la integración y operación de los comités de participación social en el Módulo de Participación Social de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social-MIDS.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0036

**ANEXO 1**

Que la Guía de Participación define al comité de participación social-CPS, como un órgano de participación social y representación de una comunidad, ya sea urbana, rural, indígena, o afromexicana, electos de manera democrática que dan seguimiento a la ejecución de las obras o acciones que se programan a través del FISMD, así como cualquier otra forma de organización con la que cuente el municipio o alcaldía, mismo que deberá conformarse en cada obra del FISMD. Este acto deberá formalizarse mediante la elaboración del acta respectiva.

Que el comité de participación social (CPS) deberá estar compuesto por cuatro personas como mínimo, que sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, que ocuparán los cargos de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo será el participar en la planeación, ejecución, control, vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras y acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

El comité de participación social deberá cumplir con las siguientes actividades:

1. Dar seguimiento al avance y conclusión de las obras o acciones a realizar con recursos del FISMD, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos se realice bajo los principios de transparencia, eficacia, legalidad y honradez.
2. Realizar visitas a las obras e informar de los avances, así como de y la conclusión de las mismas a sus comunidades y a la Secretaría de Bienestar, a través de llenado de los Anexos (1, 2, 3 y 4) de participación social.
3. Participar en la capacitación que brindará el Gobierno Municipal, sobre las tareas y responsabilidades de supervisión de las obras que vigilará.
4. Participar en los procesos de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades municipales, siempre y cuando los proyectos sugeridos se apeguen a los lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos.

En tal contexto, tomando en consideración las atribuciones que se contienen en los ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente:

ACUERDO ÚNICO.- Se declara formalmente INSTALADO el comité de participación social en la localidad de NOCHISTIÁN DE MESÍAS del municipio de NOCHISTIÁN, de la entidad ZACATECAS, que dará seguimiento y verificación de la obra CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AZUA EN LA ZONA ZAR 3203400010367

Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los/as intervinientes e integrantes del comité de participación social, para los efectos conducentes.



0037


"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

ANEXO 1

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

Nombre completo	Datos de contacto (Domicilio, teléfono y correo electrónico)	Cargo	¿Se considera usted integrante de pueblos indígenas o afroamericanos? Si/No ¿A Cuál (especifique)?	Firma
M ^{ra} Teresa Ledezma		Presidente (a)	NO	M ^{ra} Teresa Ledezma
	Calle miguel Auza	Secretario (a)	NO	DBEL Quintero
DBEL Quintero Beltrán		Vocal	NO	DBEL Quintero
Manzanita	avda TB 5 Supan	Vocal	NO	Manzanita
Dora Yoselin H.S.	Auza # 133	Vocal	NO	Dora Yoselin H.S.
		Vocal		

TESTIGO

Nombre completo	Datos de contacto (Domicilio, teléfono y correo electrónico)	Cargo	Firma
		Enlace FISDMF de la instancia ejecutora	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

0038

ANEXO 1

1.2. REPORTE DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la obra:	Construcción de Pavimentación y Red de Agua potable en calle AUZA de la Zona ZAP 3203400010367		
Folio del proyecto:	404013		
Municipio	Nocistlán de Jesús		
Localidad	Nocistlán		
Entidad	Zacatecas		
Fecha y hora de la capacitación	27 / Nov / 2023 12:00 hrs		
Lugar de la capacitación	Nocistlán		
Nombre del facilitador/a	Jose Guadalupe Ruvacaba Merendez		
Temas	Construcción de Pavimentación y Red de Agua Potable calle AUZA		
Número de asistentes	Mujeres	18	Hombres 17

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre	Datos de contacto (Domicilio, teléfono y correo electrónico)	Cargo	Recibió los materiales informativos del FAIS (Sí o No)	Firma
M ^{te} Teresa Ledezma	AUZA 137	Presidente	si	M ^{te} Teresa Ledezma
ABEL Quintana	AUZA #137	secretario	si	ABEL Quintana
margarita	auza H.S.	vocal	si	margarita
Dora Yoselin H.S.	AUZA #133	vocal	si	Dora Yoselin H.S.



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

0039



ANEXO 1

FOTOGRAFÍAS DE LA CAPACITACIÓN



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 23

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

0040



ANEXO 2

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Fecha: (dd/mm/aaaa)

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	construcción de Pavimentación y Red de Agua Potable en calle AVZA de 14 zona 249 32 03 4000 10367		
Folio del proyecto	404013		
Municipio	Nocnistán de Mesia		
Localidad	Nocnistán		
Entidad	Zacatecas		
Monto invertido	\$ 614,791.20		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa)	
	01/Dic/2023	31/Dic/2023	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No (X)
2. Descripción de la obra	Describa aquí en qué consiste la obra: construcción de Pavimentación y Red de Agua Potable en calle AVZA		
3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	No (X)	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

ANEXO 2

4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad		
6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3. <ul style="list-style-type: none"> a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (<input checked="" type="checkbox"/>) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). (<input checked="" type="checkbox"/>) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. (<input checked="" type="checkbox"/>) d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (<input checked="" type="checkbox"/>) e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. () f) Otra, indique cual: _____ 	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 23

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

0042

ANEXO 2

<p>9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>a) 1-3 ()</p>	<p>b) 4-6 (X)</p>	<p>c) +6 ()</p>
---	-------------------	--------------------------	------------------

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

M^{ra} Teresa Ledezma P.

Presidente(a) del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

ABEL QUINTERO B

Secretario(a) del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

CONCEPCION SUAREZ

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

Dora Yoselin H.S.

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

[Firma]

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

[Firma]

Enlace FISMD
(Nombre completo y firma)

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 3

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra		
Folio de la obra		
Municipio		
Localidad		
Entidad		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa)
¿Se registraron quejas o denuncias) (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	No ()
Seleccione el tipo de registro (Marque con una X la opción correspondiente).	Queja () En caso de contestar queja , pase a la pregunta 1.	Denuncia () En caso de contestar denuncia , pase a la pregunta 2
1. ¿Cuál es el motivo de la queja?	Describa la queja a continuación:	
2. ¿Cuál es el motivo de la denuncia?	Describa la denuncia a continuación:	
3. ¿Entregó y/o presentó la queja o denuncia ante alguna autoridad? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
	No ()	
4. ¿La queja o denuncia fue atendida de manera satisfactoria? (Marque con una X la	Sí ()	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del programa para actividades distintas a los establecidos en el programa."



2022 Flores
Año de Magón
PROCESANDO EN LA RED. CONECCIONANDO

0044




ANEXO 3

opción correspondiente).	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
5. Escriba el nombre de la(s) instancia(s) ante la cual presentó la queja o denuncia (Puede ser el folio de seguimiento, número de expediente o algún otro dato, como número telefónico, correo electrónico, etcétera.)		

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE PROMUEVE LA QUEJA O DENUNCIA

Anónimo	() (Marque con una X en caso de denuncia anónima)		
En caso de que quiera identificarse, complete la información que se solicita a continuación:.			
Nombre completo			
Sexo M () F ()	Edad		Escolaridad
Ocupación			
Datos de contacto (teléfono y correo electrónico)			
ACUSE DE RECIBIDO EN EL CPS	Presidente(a) del Comité de participación social (Nombre completo y firma)		
ACUSE DE RECIBIDO MUNICIPIO	Persona Funcionaria Pública (Nombre completo y firma)		



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0045

ANEXO 4

ANEXO 4. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	construcción de pavimentación y Red de Agua Potable en la calle AVDA Zona ZAR 3203400010367	
Folio del proyecto	404013	
Dirección o ubicación	Nocnistlán	
Municipio	Nocnistlán	
Localidad	Nocnistlán	
Entidad	ZARATECAS	
Monto invertido	\$ 614,791.20	
1. ¿La obra concluyó conforme el periodo de ejecución? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué (favor de pasar a la pregunta 9)
2. Desde su punto de vista, ¿la obra se concluyó satisfactoriamente? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
3. Indicar la fecha de inauguración o entrega de la obra:	(dd/mm/aaaa)	
4. ¿El comité estuvo presente en la inauguración o entrega de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0046



ANEXO 4

5. ¿El comité colocó la placa de conclusión de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
6. ¿Recibieron por parte del municipio el acta entrega-recepción de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
7. Mencione dos resultados o beneficios obtenidos en su comunidad con el trabajo realizado por el CPS de FISMDF		
8. ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de haber participado en el CPS de FISMDF? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
9.-En caso de no haberse concluido la obra, colocar la posible fecha de término.		

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

0047



FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Ma Teresa Ledezma D.

**Presidente(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

ABEL Quintana BE

**Secretario(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

Margarita Surran

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

Dora Yoselin H.S.

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

[Signature]

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

[Signature]

Enlace FISDMF
(Nombre completo y firma)



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

0048





ANEXO 4

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

RESPONSABLE DEL LLENADO: MUNICIPIO Y COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISDMF)

Siendo las 2:00 horas del día 31^o del mes de Dic del año 2023 en la localidad de Nochistlán, del municipio Nochistlán, de la entidad Zacatecas, se encuentran reunidos el/la C. Diego Alejandro Mercado Quezada, quien ostenta el cargo de Enlace FISDMF en calidad de la instancia ejecutora, así como el Comité de participación social integrado por el/la C. _____, el/la C. _____, el/la C. _____, el/la C. _____, el/la C. _____, y el/la C. _____ para celebrar la entrega-recepción de la obra: Construcción de Pavimentación y Red de Agua Potable Calle Avza, conforme a lo acordado en sus especificaciones técnicas y legales, que se describen a continuación.

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	Construcción de Pavimentación y Red de Agua Potable en la Calle Avza de la Zona ZAP 3203400010367	
Número de folio	404013	
Dirección o ubicación	Nochistlán de Mejía	
Municipio	Nochistlán	
Localidad	Nochistlán	
Entidad	Zacatecas	
Monto invertido	\$ 514,791.20	
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) 01/Dic/2023	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa) 31/Dic/2023

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y los y las integrantes del Comité de participación social responsables, y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra queda terminada conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.

No habiendo otro asunto a tratar, se da por terminada la entrega-recepción siendo las 2:53 pm horas del día 31/Dic/23 citado, levantando para evidencia de este acuerdo la presente, donde firman de conformidad las partes.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0049



ENTREGAN POR PARTE DEL MUNICIPIO (Nombre del municipio)

[Handwritten signature]

Persona Funcionaria Pública
(Nombre completo, cargo y firma)

RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

M^{ra} Teresa Ledezma P.

Presidente(a) del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

ABEL (Quintero) B.

Secretario(a) del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

[Handwritten signature]

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

Dora Yoselin H.S.

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

0050

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
NO. OFICIO	286
ASUNTO:	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA
DOMICILIO: HIPÓLITO FUENTES
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS

En virtud de haber cumplido adecuadamente las disposiciones legales y vigentes contenidos en el Artículo 64, Fracción I de la Ley de Ingresos Municipales para el año 2023, esta Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, a mi cargo, le autoriza: **“PERMISO DE CONSTRUCCIÓN” DE PAVIMENTACIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS** según contrato con el H. Ayuntamiento de este municipio.

Es facultad de esta dependencia conforme a lo establecido en la Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas y Municipios en el artículo 36 fracción II art. 103, 104, 105, 106 y las Normas de Seguridad para la Población Laboral emitidas por STPS ejecutar dichas acciones.

Así mismo se le notifica que:

- ◆ Está prohibido conectar las aguas pluviales a la línea de drenaje.
- ◆ No deberá dejar escombros o material obstruyendo la vía pública.

Nota: deberá de sujetarse a la construcción del proyecto que ampara su contrato NO. NOCHIS/FONDOIII/2023/22 con el H. Ayuntamiento, además tiene la obligación de notificar la terminación de la obra.

Se extiende la presente a solicitud del interesado para los usos y fines legales que al mismo convengan, en la ciudad de **Nochistlán de Mejía, Estado de Zacatecas, a 07 de diciembre de 2023.**

ATENTAMENTE
ENCARGADO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MPALES.




C. SERGIO HINOJOSA PÉREZ

OPERADO FAISM (FIII) EJERCICIO 20 23
--



VALIDACIÓN O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCIÓN, COMPROMETIÉNDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS POSIBILIDADES

POR LA DEPENDENCIA O
NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD EJECUTORA

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

PRESIDENTE MPAL.

LUGAR: NOCHISTLAN ,ZAC.

FECHA: 27/12/2023

INFORMACIÓN ADICIONAL: _____

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



0052



ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA COMUNIDAD

FECHA: 27-dic-23

COMUNIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACIÓN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

M^{te} Teresa Ledezma R.

Manuel Jimenez J

C. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa en fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



0053

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ.

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2023/22 CONSISTENTE; **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 320340010367, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS** EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PARA LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 A LAS 11:30 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL .

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.



DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NO DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
2021 - 2024

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0054

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL MUNICIPIO: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE CALLE AUZA					
PRELIMINARES					
010705	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2, incluye: Topografo, cadenero y operador.	m2	315.54		
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperacion de material, incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.	m3	38.00		
TEMP*4-1	Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaños	m2	130.20		
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	m3	43.40		
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros sucesivos se consideran (4 km).	m3/Km	54.00		
IMPORTE DE PRELIMINARES					
TERRACERIAS					
TEMP*3	Excavación en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo a proyecto.	m3	245.00		

OPERADO
 FAISM (FII)
 EJERCICIO 2023

0055

010818 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina. m3 245.00

ACAR-02 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsiguientes se consideran (3 km). m3/km 735.00

IMPORTE DE TERRACERIAS

SUB-BASE Y BASE

BAS-01 Meziado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % , utilizando material de banco y material pétreo (50% tepetate - 50% pétreo) m3 122.40

METAC-0002 Meziado tendido y compactación de la construcción de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material pétreo (40% tepetate - 60% pétreo) m3 81.60

IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE

GUARNICION - BANQUETA - CONCRETO

170701 Guarnicion de concreto $f'c=150$ kg/cm2 agregado de 20 mm cemento normal revenimiento 8 a 10 cm, sección Trapezoidal de 0.15 x 0.20 x 0.40 armada con dos varillas de 3/8" y grapas de alambros de 1/4 a cada 20 cm ,cimbra metálica a 20 usos, incluye: Pintura para tráfico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lbs. materiales, mano de obra, equipo y herramienta. m 85.00

170713 Banqueta de Concreto $f'c=150$ Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor. m2 79.60

030504 Pavimento de concreto $f'c=250$ Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor. m2 315.54



IMPORTE DE GUARNICION - BANQUETA - CONCRETO

IMPORTE DE REHABILITACION DE CALLE AUZA

REHABILITACION DE DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE AUZA

PRELIMINARES

010418 Trazo y nivelacion de terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 66.00 m

IMPORTE DE PRELIMINARES

TERRACERIAS

020249 Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I zona B en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de adique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 75.00 m3

AFL-01

04

010818

ACAR-02

OPERADO

FAISM (FIII)

EJERCICIO 2023

Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo I 37.50 m2

Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye: material, mano de obra y herramienta. 7.50 m3

Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terracería, carga con máquina. 7.50 m3

Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsiguientes se consideran (3 km). 22.50 m3/Km

IMPORTE DE TERRACERIAS

MATERIALES

080415 Tubo Pvc Hid. Rd-26- Tramo de 6 Mts. 2 1/2" incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecucion del p.u.o.t. 66.00 m

0057

AP-10	Valvula de Seccionamiento de fo.fo. diametro (2 1/2") Incluye: suministro, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	1.00
AP-12	Registro para Valvulas, incluye:marco c/tapa tipo MT-50 de PEAD o similar, contra marco, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00
AP-14	Extremidad campana de PVC 2 1/2" de diametro incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	1.00
AP-15	Extremidad espiga de PVC 2 1/2" de diametro incluye: suministro y colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación	pza	1.00

IMPORTE DE MATERIALES

RELLENOS

	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tapetate) compactado con pisón de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	22.50
	Relleno con material producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	45.00

(*DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 35/100 MXN*)

IMPORTE DE RELLENOS

TOMA DOMICILIARIA

	Suministro y colocación de medidor de agua potable, incluye: manguera de alta densidad (5 ml promedio), encamisado de poliducto naranja de 1", abarazadera omega de 2 1/2" con salida a 1/2", 1 llave de inserción, 1 valvula limitadora, niple galvanizado de 1/2", 1 niple cuerda corrida de 1/2", llave de paso de 1/2" de esfera, 1 niple galvanizado de 70 cm, registro para medidor de polietileno, medidor de chorro multiple de 1/2", conexiones a domicilio con tubo plus,mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	9.00
--	---	-----	------



0058

IMPORTE DE TOMA DOMICILIARIA

IMPORTE DE REHABILITACION DE DE LINEA DE AGUA
POTABLE CALLE AUZA

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO

IVA (16.00%)

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ING. DIEGO MERCADO QUEZADA
REPRESENTANTE LEGAL



0059



NOCHISTLAN
De Mejia
PUEBLO MÁGICO

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

C.JORGE ORTEGA LLAMAS.

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2023/22 CONSISTENTE; **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 320340010367, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS** EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PARA LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 A LAS 11:30 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL .

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.


ING.DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0060

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL MUNICIPIO: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE CALLE AUZA					
PRELIMINARES					
010705	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2, incluye: Topografo, cadenero y operador.	m2	315.54		
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperacion de material, incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.	m3	38.00		
TEMP*4-1	Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaieos	m2	130.20		
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria, carga con máquina.	m3	43.40		
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsiguientes se consideran (4 km).	m3/Km	54.00		
IMPORTE DE PRELIMINARES					
TERRACERIAS					
TEMP*3	Excavación en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo a proyecto.	m3	245.00		

TEMP*4-1
010818
ACAR-02

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0061

010818 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina. m3 245.00

ACAR-02 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsiguientes se consideran (3 km). m3/Km 735.00

IMPORTE DE TERRACERIAS

SUB-BASE Y BASE

BAS-01 Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % , utilizando material de banco y material pétreo (50% tepetate - 50% pétreo) m3 122.40

METAC-0002 Mezclado tendido y compactación de la construcción de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material pétreo (40% tepetate - 60% pétreo) m3 81.60



IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE
GUARNICION - BANQUETA - CONCRETO

170701 Guarnicion de concreto f'c=150 kg/cm2 agregado de 20 mm cemento normal revenimiento 8 a 10 cm, sección Trapezoidal de 0.15 x 0.20 x 0.40 armada con dos varillas de 3/8" y grapas de alambros de 1/4 a cada 20 cm ,cimbra metálica a 20 usos, incluye: Pintura para tráfico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta. m 85.00

170713 Banqueta de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor. m2 79.60

030504 Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor. m2 315.54

0062

IMPORTE DE GUARNICION - BANQUETA - CONCRETO

IMPORTE DE REHABILITACION DE CALLE AUZA

REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE AUZA

PRELIMINARES

010418	Trazo y nivelacion de terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	66.00
--------	---	----	-------

IMPORTE DE PRELIMINARES

TERRACERIAS

020249	Excavacion por medios mecanicos en terreno tipo I zona B en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	75.00
--------	--	----	-------

AP1-01

04

	Afina de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo I	m2	37.50
--	---	----	-------

	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberias, incluye: material, mano de obra y herramienta.	m3	7.50
--	--	----	------

010818

	Acarreo sobre camion de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria, carga con maquina.	m3	7.50
--	---	----	------


ACAR-02

	Acarreo sobre camion de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilometros subsecuentes se consideran (3 km).	m3/Km	22.50
--	--	-------	-------

IMPORTE DE TERRACERIAS

MATERIALES

080415	Tubo Pvc Hid. Rd-26- Tramo de 6 Mts. 2 1/2" incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecucion del p.u.o.t.	m	66.00
--------	---	---	-------



0063

AP-10	Valvula de Seccionamiento de fo.fo. diametro (2 1/2") Incluye: suministro, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	1.00
AP-12	Registro para Valvulas, incluye:marco c/tapa tipo MT-50 de PEAD o similar, contra marco, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00
AP-14	Extremidad campana de PVC 2 1/2" de diametro incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	1.00
AP-15	Extremidad espiga de PVC 2 1/2" de diametro Incluye: suministro y colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación	pza	1.00

IMPORTE DE MATERIALES

RELLENOS


	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pisón de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	22.50
	Relleno con material producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	45.00

(*DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 35/100 MXN*)

IMPORTE DE RELLENOS

TOMA DOMICILIARIA

	Suministro y colocación de medidor de agua potable, incluye: manguera de alta densidad (5 ml promedio), encamisado de poliducto naranja de 1", abarazadera omega de 2 1/2" con salida a 1/2", 1 llave de inserción, 1 valvula limitadora, niple galvanizado de 1/2", 1 niple cuerda cortida de 1/2", llave de paso de 1/2" de esfera, 1 niple galvanizado de 70 cm, registro para medidor de polietileno, medidor de chorro multiple de 1/2", conexiones a domicilio con tubo plus,mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	9.00
--	---	-----	------



0064

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2023/22 CONSISTENTE; **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 320340010367, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS** EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PARA LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 A LAS 11:30 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL .

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.



DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
ING. ~~DIEGO ALVARO~~ ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0066

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL MUNICIPIO: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE CALLE AUZA					
PRELIMINARES					
010705	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2, incluye: Topografo, cadenero y operador.	m2	315.54		
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperacion de material, incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.	m3	38.00		
	Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspalears	m2	130.20		
	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria, carga con máquina.	m3	43.40		
	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsiguientes se consideran (4 km).	m3/Km	54.00		
IMPORTE DE PRELIMINARES					
TERRACERIAS					
	Excavación en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo a proyecto.	m3	245.00		



0067

010818 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina. m3 245.00

ACAR-02 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsiguientes se consideraran (3 km). m3/Km 735.00

IMPORTE DE TERRACERIAS

SUB-BASE Y BASE

BAS-01 Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % , utilizando material de banco y material pétreo (50% tepetate - 50% pétreo) m3 122.40

METAC-0002 Mezclado tendido y compactación de la construcción de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material pétreo (40% tepetate - 60% pétreo) m3 81.60


IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE

GUARNICION - BANQUETA - CONCRETO

170701 Guarnición de concreto $f'c=150$ Kg/cm2 agregado de 20 mm cemento normal revenimiento 8 a 10 cm, sección Trapezoidal de 0.15 x 0.20 x 0.40 armada con dos varillas de 3/8" y grapas de alambros de 1/4 a cada 20 cm ,cimbra metálica a 20 usos, incluye: Pintura para tráfico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta. m 85.00

170713 Banqueta de Concreto $f'c=150$ Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor. m2 79.60

030504 Pavimento de concreto $f'c=250$ Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor. m2 315.54



IMPORTE DE GUARNICION - BANQUETA - CONCRETO

IMPORTE DE REHABILITACION DE CALLE AUZA

REHABILITACION DE DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE AUZA

PRELIMINARES

010418 Trazo y nivelacion de terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 66.00 ml

IMPORTE DE PRELIMINARES

TERRACERIAS

020249 Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I zona B en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 75.00 m3

AFI-01 Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo I 37.50 m2

04 Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye: material, mano de obra y herramienta. 7.50 m3


010818 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terracería, carga con máquina. 7.50 m3

ACAR-02 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsiguientes se consideran (3 km). 22.50 m3/Km

IMPORTE DE TERRACERIAS

MATERIALES

080415 Tubo Pvc Hld. Rd-26- Tramo de 6 Mts. 2 1/2" incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. 66.00 m



0069

AP-10	Valvula de Seccionamiento de fo.fo. diametro (2 1/2") Incluye: suministro, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza:	1.00
AP-12	Registro para Valvulas, incluye:marco c/tapa tipo MT-50 de PEAD o similar, contra marco, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza:	1.00
AP-14	Extremidad campana de PVC 2 1/2" de diametro incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza:	1.00
AP-15	Extremidad espiga de PVC 2 1/2" de diametro incluye: suministro y colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación	pza:	1.00

IMPORTE DE MATERIALES


RELLENOS

	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pisón de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	22.50
	Relleno con material producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	45.00

IMPORTE DE RELLENOS

TOMA DOMICILIARIA

	Suministro y colocación de medidor de agua potable, incluye: manguera de alta densidad (5 ml promedio), encamisado de poliducto naranja de 1", abarazadera omega de 2 1/2" con salida a 1/2", 1 llave de inserción, 1 valvula limitadora, niple galvanizado de 1/2", 1 niple cuerda corrida de 1/2", llave de paso de 1/2" de esfera, 1 niple galvanizado de 70 cm, registro para medidor de polietileno, medidor de chorro multiple de 1/2", conexiones a domicilio con tubo plus,mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza:	9.00
--	---	------	------



0070

IMPORTE DE TOMA DOMICILIARIA

IMPORTE DE REHABILITACION DE DE LINEA DE AGUA
POTABLE CALLE AUZA

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO

IVA (16.00%)

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ING. DIEGO MERCADO QUEZADA
REPRESENTANTE LEGAL



0071

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESENTE



NOCHISTLÁN DE MEJIA A 20 NOVIEMBRE DE 2023

Para nosotros como empresa nos sentimos muy agradecidos al recibir la invitación para participar en la adjudicación de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA ZACATECAS."** es por eso que con mucho gusto damos respuesta positiva a esta invitación iniciaremos a elaborar nuestro presupuesta para brindarles dicha información y así contribuir con lo que se nos pida.

Sin más por el momento me despido de usted, no antes deseare un bonito día, reciba un cordial saludos.

ATTENTAMENTE




ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ



0072

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESENTE



NOCHISTLÁN DE MEJIA A 20 NOVIEMBRE DE 2023

Se le hace saber que conocemos el lugar donde se llevará acabo el trabajo con nombre **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA ZACATECAS."**

Sin más por el momento me despido de usted, no antes desearle un bonito día, reciba un cordial saludos.

ATTENTAMENTE



ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ



0073



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA ZAC.

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.					
PRELIMINARES					
010705	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2, incluye: Topografo, cadenero y operador.	m2	315.54	13.18	4,158.82
(*TRECE PESOS 18/100 MXN*)					
(*CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 82/100 MXN*)					
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperacion de material, incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.	m3	38.00	69.35	2,635.30
(*SESENTA Y NUEVE PESOS 35/100 MXN*)					
(*DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 30/100 MXN*)					
TEMP*4-1	Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaleos	m2	130.20	70.34	9,158.27
(*SETENTA PESOS 34/100 MXN*)					
(*NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 27/100 MXN*)					
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria, carga con máquina.	m3	43.40	158.94	6,898.00
(*CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 94/100 MXN*)					
(*SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN*)					
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsucesivos se consideran (4 km).	m3/Km	54.00	18.72	1,010.88
(*DIECIOCHO PESOS 72/100 MXN*)					
(*UN MIL DIEZ PESOS 88/100 MXN*)					
IMPORTE DE PRELIMINARES					23,861.27
TERRACERIAS					
TEMP*3	Excavación en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo a proyecto.	m3	245.00	70.60	17,297.00
(*SETENTA PESOS 60/100 MXN*)					
(*DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN*)					
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria, carga con máquina.	m3	245.00	158.94	38,940.30

(*CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 94/100 MXN*)

(*TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 30/100 MXN*)

ATTE:
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ



0074



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA ZAC.

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsecuentes se consideran (3 km).	m3/Km	735.00	18.72	13,759.20
(*DIECIOCHO PESOS 72/100 MXN*)					
(*TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN*)					
IMPORTE DE TERRACERIAS					69,996.50
SUB-BASE Y BASE					
BAS-01	Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % , utilizando material de banco y material petreo (50% tepetate - 50% pétreo)	m3	122.40	499.87	61,184.09
(*CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 87/100 MXN*)					
(*SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 MXN*)					
METAC-0002	Mezclado tendido y compactación de la construcción de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material pétreo (40% tepetate - 60% pétreo)	m3	81.60	503.69	41,101.10
(*QUINIENTOS TRES PESOS 69/100 MXN*)					
(*CUARENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS 10/100 MXN*)					
IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE					102,285.19
GUARNICION - BANQUETA - CONCRETO					
170701	Guarnicion de concreto f'c=150 kg/cm2 agregado de 20 mm cemento normal revenimiento 8 a 10 cm, sección Trapezoidal de 0.15 x 0.20 x 0.40 armada con dos varillas de 3/8" y grapas de alambreon de 1/4 a cada 20 cm ,cimbra metalica a 20 usos, incluye: Pimtura para tráfico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	85.00	488.81	41,548.85
(*CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 81/100 MXN*)					
(*CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 85/100 MXN*)					
170713	Banqueta de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	79.60	461.40	36,727.44
(*CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 40/100 MXN*)					
(*TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 44/100 MXN*)					
030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. da espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	315.54	743.86	234,717.58
(*SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 86/100 MXN*)					
(*DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 58/100 MXN*)					

IMPORTE DE GUARNICION - BANQUETA - CONCRETO

ATTE:
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ



0075

312,993.87



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA ZAC.

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE AUZA					
PRELIMINARES					
010418	Trazo y nivelacion de terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	66.00	11.47	757.02
(*ONCE PESOS 47/100 MXN*)					
(*SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 02/100 MXN*)					
IMPORTE DE PRELIMINARES					757.02
TERRACERIAS					
020249	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I zona B en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	75.00	60.52	4,539.00
(*SESENTA PESOS 52/100 MXN*)					
(*CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN*)					
AFI-01	Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo I	m2	37.50	16.61	622.88
(*DIECISÉIS PESOS 61/100 MXN*)					
(*SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 88/100 MXN*)					
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye: material, mano de obra y herramienta.	m3	7.50	274.77	2,060.78
(*DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 77/100 MXN*)					
(*DOS MIL SESENTA PESOS 78/100 MXN*)					
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	m3	7.50	158.94	1,192.05
(*CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 94/100 MXN*)					
(*UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 05/100 MXN*)					
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsecuentes se consideran (3 km).	m3/Km	22.50	18.72	421.20
(*DIECIOCHO PESOS 72/100 MXN*)					
(*CUATROCIENTOS VEINTIÚNPESOS 20/100 MXN*)					
IMPORTE DE TERRACERIAS					8,835.91
MATERIALES					
060415	Tubo Pvc hid. Rd-26- Tramo de 6 Mts. 2 1/2" incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	66.00	126.36	8,339.76
(*CIENTO VEINTISÉIS PESOS 36/100 MXN*)					

[Firma manuscrita]

ATTE:

ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ



0076



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA ZAC.

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
(*OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 76/100 MXN*)					
AP-10	Valvula de Seccionamiento de fo.fo. diametro (2 1/2") Incluye: suministro, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	1.00	4,273.47	4,273.47
(*CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 47/100 MXN*)					
(*CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 47/100 MXN*)					
AP-12	Registro para Valvulas, incluye:marco c/tapa tipo MT-50 de PEAD o similar, contra marco, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	6,247.30	6,247.30
(*SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 30/100 MXN*)					
(*SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 30/100 MXN*)					
AP-14	Extremidad campana de PVC 2 1/2" de diametro incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	1.00	391.17	391.17
(*TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 17/100 MXN*)					
(*TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 17/100 MXN*)					
AP-15	Extremidad espiga de PVC 2 1/2" de diametro incluye: suministro y colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación	pza	1.00	358.12	358.12
(*TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 12/100 MXN*)					
(*TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 12/100 MXN*)					
IMPORTE DE MATERIALES					19,609.82
RELLENOS					
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pisón de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	22.50	271.89	6,117.53
(*DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 89/100 MXN*)					
(*SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 53/100 MXN*)					
030116	Relleno con material producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	45.00	50.09	2,254.05
(*CINCUENTA PESOS 09/100 MXN*)					
(*DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 05/100 MXN*)					
IMPORTE DE RELLENOS					8,371.58
TOMA DOMICILIARIA					

ATTE:
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ



0077



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA ZAC.

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

TOMD-01	Suministro y colocación de medidor de agua potable, incluye: manguera de alta densidad (5 ml promedio), encamisado de poliducto naranja de 1", abarazadera omega de 2 1/2" con salida a 1/2", 1 llave de inserción, 1 valvula limitadora, niple galvanizado de 1/2", 1 niple cuerda corrida de 1/2", llave de paso de 1/2" de esfera, 1 niple galvanizado de 70 cm, registro para medidor de polietileno, medidor de chorro multiple de 1/2", conexiones a domicilio con tubo plus, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	9.00	3,345.51	30,109.59
---------	--	-----	------	----------	-----------

(*TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 51/100 MXN*)

(*TREINTA MIL CIENTO NUEVE PESOS 59/100 MXN*)

IMPORTE DE TOMA DOMICILIARIA 30,109.59

IMPORTE DE REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE AUZA 67,683.92

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC. 576,820.75

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO 576,820.75

(*QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 75/100 MXN*)

IVA (16.00%) 92,291.32

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO 669,112.07

(*SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS 07/100 MXN*)

ATTE:
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ



0078

OFICIO DE RESPUESTA A INVITACION DE CONSTRUCCIÓN

Nochistlán de Mejía, Zac. A 21 de noviembre de 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PRESENTE

Reciba un cordial saludo

El motivo de la presente es brindar respuesta a la invitación a participar en la propuesta de construcción de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA ZACATECAS."** que con relación a ello debemos contestar que, con agrado participaremos en dicha petición, ya que contamos con la infraestructura y conocimiento necesario.

CONSTRUCCIONES ORTEGA

TRABAJAMOS PARA USTED

No siendo más, quedamos a su disposición y esperamos su pronta respuesta

ATTE:



C. JORGE ORTEGA LLAMAS

CONSTRUCCIONES ORTEGA



0079

OFICIO DE CONOCIMIENTO DE LUGAR DE OBRA

Nochistlán de Mejía, Zac. A 21 de noviembre de 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PRESENTE

Reciba un cordial saludo

Hago de su pleno conocimiento que, por medio del presente, conocemos perfectamente la ubicación de los trabajos de nominados **“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUZA DE LA ZONA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA ZACATECAS.”**

No siendo más, quedamos a su disposición y esperamos su pronta respuesta.

ATTE:



C. JORGE ORTEGA LLAMAS

CONSTRUCCIONES ORTEGA

TRABAJAMOS PARA USTED



0080
