

**Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
2024**

**Ejercicio 2024**

**No. de PROYECTO: 404004**

**proyecto:**

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO  
DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA,  
MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

**Localidad:**

Nochistlán de Mejía.

**no. de contrato:**

NOCHIS/FONDOIII/2024/06

**CONTRATISTA:**

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

**realización de obra pública:**

Adjudicación Directa

**MONTO:**

\$1,667,134.32

SUPERVISOR: ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO

**MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.**

**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**

**H. AYUNTAMIENTO 2021-2024**





**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**SECCIÓN: 3**  
**OFICIO: NO. 111**  
**EXPEDIENTE: ADMVO. 2021/2024**

**ASUNTO: SOLICITUD**

**DEPARTAMENTO DE PLANEACION**  
**PRESENTE**

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA ME DIRIJO A USTED CON LA FINALIDAD DE SOLICITARLE GIRE INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDE PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO DE OBRA: **PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMPO DEPORTIVO** SOLICITADO POR LA COMUNIDAD INTERESA HACIA MI CARGO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL.



Atentamente

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

*Jose Manuel Jimenez Fuentes*  
**C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES**

Presidente Municipal de Nochistlán de Mejía Zac.



0001

**C. AV. CAMPO DEPORTIVO, NOCHISTLAN, ZAC.**

- TOTAL VOLUMEN CORTE = 703.57m<sup>3</sup>
- TOTAL VOLUMEN DE SUBRASANTE = 362.44m<sup>3</sup>
- TOTAL VOLUMEN DE BASE = 241.63m<sup>3</sup>
- TOTAL VOLUMEN DE CONCRETO HIDRAULICO = 1208.13m<sup>2</sup>
- RETIRO DE EMPEDRADO = 153.00m<sup>3</sup>
- DEMOLICION DE BANQUETA = 143.14m<sup>2</sup>
- TOTAL VOLUMEN BASE DE BANQUETA = 35.20m<sup>3</sup>
- TOTAL CONSTRUCCION DE BANQUETA = 176.00m<sup>2</sup>.
- TOTAL CONSTRUCCION DE MACHUELO = 133.00m<sup>l</sup>.




PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUERTES  
 DE DEPARTAMENTO TECNICO / COCH  
 ING. DIEGO ALEJANDRO MIERADO QUEVEDA  
 PAVIMENTACION, CONCRETO  
 HIDRAULICO, AV. CAMPO DEPORTIVO,  
 NOCHISTLAN, ZAC.




NOCHISTLAN  
 EL AVANZAMIENTO DEL PAIS

CONTENIDO	PROYECTO PAVIMENTOS
UBICACION	ENTRE LAS CALLENS ENRIQUE Y EUCALIPTOS, NOCHISTLAN, ZACATECAS.
PROYECTO	UBICADA
UNIDAD DE PAVIMENTACION	S/E
UNIDAD DE PLANEACION	UNIDAD DE PLANEACION
FECHA	TOP - 1
FECHA DE DISEÑO	DICIEMBRE DEL 2023
PROYECTO / AREA	PROYECTO / AREA


**DETALLE JUNTAS EN CONCRETO**




**Guarnicion y Banqueta**



**SECCION TIPO**



**DETALLE DE PAVIMENTO ECOLOGICO**

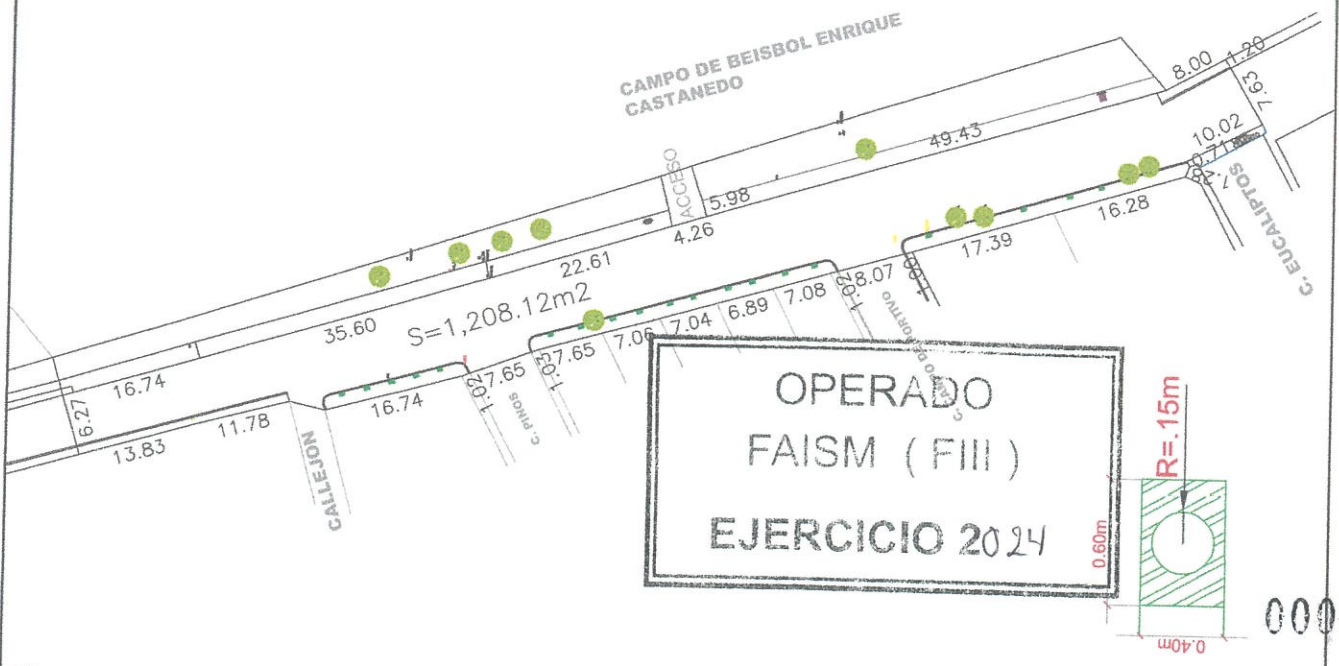





CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR PROYECTO
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
EJERCICIO 2024

I.- UBICACIÓN

Table with 3 columns: CLAVE, NOMBRE. Rows include REGIÓN (09), MUNICIPIO (034), LOCALIDAD (0001), BARRIO, COLONIA, RANCHERÍA, ETC., TIPO DE LOCALIDAD (CP(X) / PR( )).

II.- IDENTIFICACIÓN

Table with 4 columns: CLAVE, NOMBRE. Rows include No. DE OBRA (404004), PROGRAMA (404), SUBPROGRAMA (221), TIPO DE PROYECTO (6141), NOMBRE DE LA OBRA, DESCRIPCION DE LA OBRA, TIPO DE OBRA, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, INSTANCIA EJECUTORA.

III.-INVERSIONES

Table with 6 columns: CONCEPTO, TOTAL, FEDERAL, ESTATAL, F.I.S.M., BENEFICIARIOS. Rows show investment approved/valid and exercised.

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Table with 3 columns: UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD. Rows include METAS DEL PROYECTO, BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, LOCALIZACION.


V.-PERIODO DE EJECUCIÓN

FECHA DE: INICIO: 28/02/2024 TERMINO: 28/05/2024

ANOTAR SI BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS): UNA

LGDS Art. 28 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



0003



**PROGRAMA CALENDARIZADO ANUAL FÍSICO FINANCIERO**  
**PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)**


CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.		
NOMBRE DE LA OBRA		
FECHA DE:	INICIO: 28/02/2024	TERMINO: 28/05/2024

PROGRAMADO TODO EL AÑO		
FÍSICO	100%	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO ( PESOS)
LOTE	1.00	\$1,680,019.66

	FÍSICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO	50%	\$840,009.83
ABRIL		
MAYO	50%	\$840,009.83
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
<b>TOTAL:</b>		<b>\$1,680,019.66</b>

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente





0004



### CROQUIS DEL MUNICIPIO

#### MACROLOCALIZACION

**Zacatecas**  
División municipal

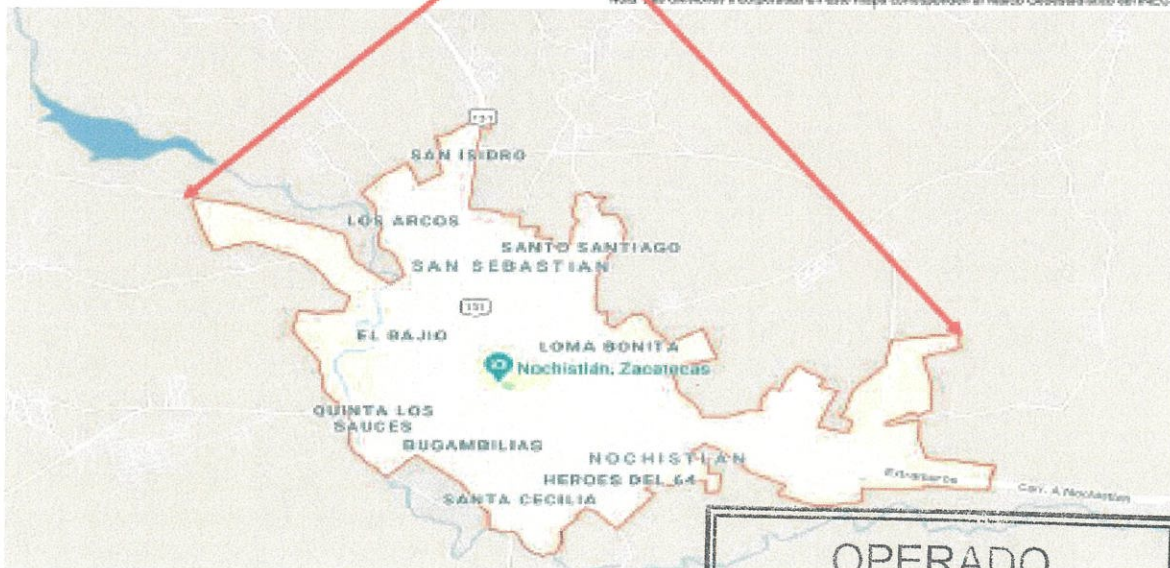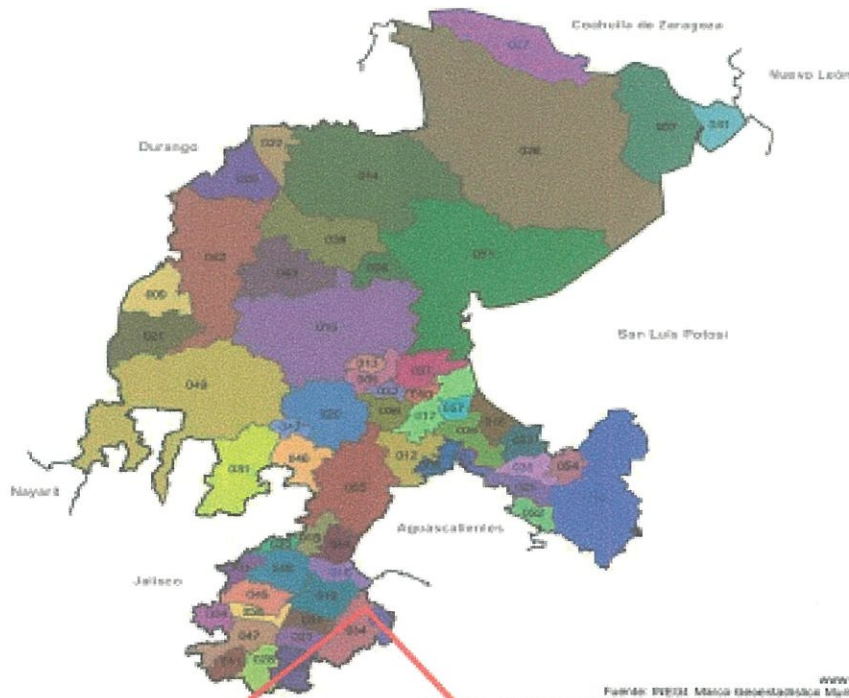

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2024



**PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)**

**CROQUIS DEL MUNICIPIO**

**MICROLOCALIZACION**



LGDS Mt. 28 "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante a autoridad competente

**OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2024**

006



H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS  
 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA ZONA ZAP 0371  
 CALLE CAMPO DEPORTIVO DE NOCHISTLAN ZACATECAS



Fecha: 15/feb./2024  
 Página: 1 de 2

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE EN PESOS	
010706	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano	m2	1,208.13	NUEVE PESOS 87/100 MXN	\$9.87	\$11,924.24
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperación de material incluye: almacenamiento a una distancia máxima de 20 mts.	m3	153.00	VEINTIDOS PESOS 36/100 MXN	\$22.36	\$3,421.08
P-03	Demolicion de concreto simple de 15 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspalears	m2	143.14	SESENTA Y CINCO PESOS 81/100 MXN	\$65.81	\$9,420.04
<b>IMPORTE DE PRELIMINARES</b>						<b>\$24,765.36</b>
<b>TERRACERIAS</b>						
TEMP*3	Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (mtoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes deacuerdo al proyecto	m3	703.57	NOVENTA Y DOS PESOS 79/100 MXN	\$92.79	\$65,284.26
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	703.57	CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 82/100 MXN	\$147.82	\$104,001.72
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable. kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	m3/km	1,407.14	QUINCE PESOS 90/100 MXN	\$15.90	\$22,373.53
<b>IMPORTE DE TERRACERIAS</b>						<b>\$191,659.51</b>
<b>SUB-BASE Y BASE</b>						
ME-TAC-0002	Mezclado tendido y compactacion de la construcion de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material petreo (40% material de banco - 60% material petreo).	m3	362.44	CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 MXN	\$434.01	\$157,302.58
ME-TAC-0002-1	Mezclado tendido y compactacion de la construcion de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petreo.(50% material de banco - 50% material petreo)	m3	240.71	CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 35/100 MXN	\$466.35	\$112,255.11
<b>IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE</b>						<b>\$269,557.69</b>
<b>GUARNICION - BANQUETA - CONCRETO</b>						
GURN-001	Guarnición de Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm. armada con 2.00 varillas del # 3 y Estribos del # 2.5 @ 0.30 mts , sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 20 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentacion de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	m	133.00	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 56/100 MXN	\$499.56	\$66,441.48
				Importe Parcial de esta Hoja :	\$552,424.04	
				Ing. Diego Alejandro Mercado Q.	Importe Acumulado :	
				Dir.Desarrollo Economico y Social	\$552,424.04	

1702024  
 0007

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS  
 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA ZONA ZAP 0371  
 CALLE CAMPO DEPORTIVO DE NOCHISTLAN ZACATECAS




Fecha: 15/feb./2024  
 Página: 2 de 2

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
BAS-BANQ-01	Mezclado tendido y compactación de la construcción de base para banquetas compactada con vibrocompactadora (bailarina) al 100% utilizando material de banco (tepetate)	m3	52.80		\$228.49
170715	Banqueta de Concreto f'c=f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	176.00		\$458.18
030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	1,208.13		\$664.80
<b>IMPORTE DE GUARNICION - BANQUETA - CONCRETO</b>					
				<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>\$1,448,292.81</b>
				<b>IVA(16%)</b>	<b>\$231,726.85</b>
				<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA</b>	<b>\$1,680,019.66</b>

(\* UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA MIL DIECINUEVE PESOS 66/100 MXN \*)



0008

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024		Importe Parcial de esta Hoja :	\$895,868.77
		Importe Acumulado :	\$1,448,292.81

Ing. Diego Alejandro Mercado Q.  
 Dir. Desarrollo Economico y Social





**PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)**

**CALENDARIO DE EJECUCIÓN**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
PRELIMINARES	28/02/2024-20/03/2024
TERRACERIAS	21/03/2024-19/04/2023
SUB-BASE Y BASE	22/04/2024-07/05/2024
CONCRETO	08/05/2024-28/05/2024

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2024

0009

*H. Valentín Garza*  
ARMANDO AGUAYO

Los Antonio Durán  
Jesús de Jesús

# ACTA DE CONSEJO DE PLANEACION MUNICIPAL

MUNICIPIO: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

*J. Batiz* ACTA NO. 1  
EJERCICIO 2024.

En la ciudad de Nochistlán de Mejía, Estado de Zacatecas, siendo las 11:00 horas del día 22 de FEBRERO de 2024, reunidos en el salón de Cabildos del Edificio de la Presidencia Municipal, estando presentes. los ciudadanos: C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, Presidente Municipal; LIC. ARMANDO AGUIRRE, Secretaria de Gobierno, LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ, Sindica Municipal, ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Director de Desarrollo económico y social, ING. ANA GABRIELA TACHIQUIN TORRES, Contralor Municipal, C. SERGIO HINOJOZA PEREZ, Director de Obras Públicas y Servicios Municipales, L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ, Encargada de Tesorería Municipal, representantes parlamentarios de los diferentes partidos PAN, PRI y Alianza en el municipio, así como representantes comunitarios, denominados también consejeros comunitarios, de las diferentes comunidades del municipio, integrantes del concejo municipal de planeación, organismo técnico auxiliar del ayuntamiento, constituido conforme lo dispone el art. 198 de la ley orgánica del municipio en vigor, con el propósito de llevar a cabo la presente reunión de trabajo a la que previamente se convocó y que se habrá de desarrollar Con el fin principal:


Bajo el siguiente orden del día:

1. BIENVENIDÁ A LOS ASISTENTES.
2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, QUORUM LEGAL, E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA
3. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2021-2024.
4. PROPUESTA PARA SU VALIDACION DE OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR CON RECURSOS DEL RAMO 33, EJERCICIO 2024, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
5. ASUNTOS GENERALES. Y /O ACLARACIONES
6. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

1. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.

Toma la palabra el presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL EL C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, da la bienvenida a todos los asistentes a esta reunión, consejeros, delegados, directores, Regidores y miembros del ayuntamiento, a esta reunión del Consejo de Planeación de esta Administración 2021-2024, primera del ejercicio 2024.

2. PUNTO 2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, QUORUM LEGAL, E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA



*Candido Muñoz*  
*Antonio Aguirre*  
*David Durán B.*  
*Armando Aguirre*  
*Mano Corona Jr.*  
*Glafira Perez*

*Jose Rosario Prieto*

*Heriberto Salazar P.*  
*Adriano Aguiro P.*

*Juan Solazar*  
*Araceli Pérez Jiras*  
*Ramón Quezada*  
*Juan García Rodríguez*  
*Gilberto Pedraza H*

*Ramón Quezada*  
*Alicia Flores Martínez*  
*Juan Muñoz*

0010





Valentín Salazar  
Luis Antonio Durán

Tanya de Jesus  
JB Attoz Perez

cada administración referente a este techo, de este mencionado fondo, tal como se detalla en el siguiente recuadro No. 1.

Recuadro 1.

TECHO FINANCIERO ANUAL					
EJERCICIO 2024					
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					
			LIBERACION MENSUAL	MONTO	ADMINISTRACION
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FII)	\$16,845,512	FEBRERO - SEPTIEMBRE	\$1'684,551.20	\$1'684,551.20	2021-2024
		OCTUBRE/NOVIEMBRE	\$1'684,551.20	\$1'684,551.20	2024-2027
TOTAL:			\$16,845,512		

Otro de los asuntos concernientes a este Fondo es como ya se les informo propone a los presentes lo de los programas Desarrollo Institucional e Indirectos. Según el Anexo # 1, ultimas dos filas.

ARMANDO AGUILO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
APROBACION DE PROPUESTA ANTE EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

TECHO FINANCIERO ANUAL  
EJERCICIO 2024

Se les pide a los presentes manifiesten de manera económica su aprobación anexo 1 y/o recuadros no. 1, 2, y 3. relativo a obras y acciones, así como de los programas de Desarrollo Institucional y Gastos Indirectos; Así mismo después de analizar el anexo con el global de obras a realizarse dentro del ejercicio 2023, con los montos de acuerdo a

techo financiero, con sus respectivos aumentos y disminuciones en el presupuesto, para lo cual se les pide manifiesten de manera económica, la aprobación y el secretario técnico informa que es la mayoría de votos a favor... Lo cual es APROBADO estos recursos para el ejercicio 2024.

El ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, toma la palabra y solicita al Consejo emitir y suscribir propuestas para acciones de obras a realizarse en caso de que existieran ahorros o modificaciones en las obras ya propuestas y aprobadas anteriormente, y que por alguna razón no se ejecutaran por cualquier situación de inconformidad, se tome en sustitución alguna de las mencionadas, propuestas nuevas cumpliendo los lineamientos de este fondo, obras que se suman a la ejecución en caso de existir recurso por programar, de

Ramon Quezada  
Juan Solazar  
Araceli Pérez Frías  
Juan García Rodríguez  
Hortencia Sigala G.

Jose Rosario Puycto  
M. Guadalupe Mendoza  
Antonio Aguirre  
Heriberto Solazar  
Adriana Aguilar  
Candido Muñoz  
IRMA PERIBRE  
Cristina...

Jose Rosario Puycto  
M. Guadalupe Mendoza  
Antonio Aguirre  
Heriberto Solazar  
Adriana Aguilar  
Candido Muñoz  
Yara...

Valentin Salazar W

J Balloz & Fria

Alejandro Aguayo

acuerdo a las necesidades que esta Asamblea señala, y con ello de ser posible realizarse con recursos del presente ejercicio o bien dentro del próximo ejercicio fiscal, cabe mencionar que por el momento se desconocen los montos de estos proyectos.

Respecto al resultado de desahogo de los puntos anteriores, se acuerda:

Primero: Tenemos por enterados y conformes, en nuestra calidad de integrantes del Consejo, respecto a la información a que se refiere el punto 3 del Orden del día.

Segundo: Tenemos por enterados y conformes y emitiendo nuestra aprobación, en nuestro carácter de miembros del Consejo, respecto a todas y cada una de las acciones de obra contenidas en el listado a que se refiere el punto 4 del orden del día.

Tercero: Tenemos de igual forma, en nuestra calidad de integrantes del Consejo, suscribiendo, en documento por separado, las peticiones o propuestas de acciones de obra que pudieran realizarse de ser posible en el presente ejercicio o bien en el próximo año fiscal, con recursos del fondo III Y/O mezcla de recursos derivadas de otras fuentes de financiamiento asunto este al que se hizo alusión en algún punto del orden del día.

6. ASUNTOS GENERALES. Y/O ACLARACIONES

Surgieron inquietudes por parte de los representantes comunitarios, de obras que se solicitaron en las reuniones comunitarias, así como de otros programas como dos por uno, aclarando el secretario del Consejo y Presidente Municipal, las dudas.

6. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

Para finalizar y tomando en cuenta que no hay otro asunto que tratar se da por clausurada la asamblea, en la forma propuesta en el punto 7 del orden del día, siendo las 12:00 horas del día de la fecha, firmando para constancia y para validez legal de lo descrito en este documento, los intervinientes. Damos fe.

Se adjuntan los anexos 1 y 2. (La lista de asistencia y la lista de obras)

Cristina Rosales

José de Jesús Heriberto

M. Guadalupe Mendocero


Luis Antonio Durán

Juan Salazar

Araceli Pérez Fria

Bonnie Quezada

Juan García Rodríguez



0013

Hortencia Sigala

Peccora Estrada  
David Durán B.  
Zarad D., J. P. S.

Antonio Tapia

Candido Muñoz

Leandro Abaera

Bonnie Quezada

Jose Rosario Piñero  
Rosa Maria Corona  
Rosa Maria Corona

Salazar 12

Rosa Maria Corona  
Alicia Flores Martinez



*Verónica Abanc* *Luz Antonio Duán* *HERNANDEZ AGUAYO*  
*J. Battalobos Pérez* *Javier de Jarama*  
 POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

PRESIDENTE DEL C.D.M.  
*Manuel Jimenez J*  
 C. JOSE MANUNUEL JIMENEZ FUENTES

SECRETARIO DE GOBIERNO  
*Armando Aguirre Gomez*  
 LIC. ARMANDO AGUIRRE GOMEZ.

ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL.  
*Rocio Roque Gomez*  
 L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ.

SÍNDICO MUNICIPAL  
*Liliana Roque Gomez*  
 LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ.

DIRECTOR DE OBRAS SERVICIOS PUBLICOS  
*Sergio Hinojoza Perez*  
 C. SERGIO HINOJOZA PEREZ.

CONTRALOR MUNICIPAL.  
*Ana Gabriela Tachiquin*  
 ING. ANA GABRIELA TACHIQUIN

SECRETARIO TECNICO DEL C.D.M.  
*Diego Alejandro Mercado Quezada*  
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

REPRESENTANTES PARLAMENTARIOS ANTE EL CONSEJO

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO  
 PAN - PRI - PRD  
*Reyna Villalobos Perez*  
 LIC. REYNA VILLALOBOS PEREZ

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO  
 MOVIMIENTO CIUDADANO  
*Beatriz Adriana Aguayo Rodriguez*  
 C. BEATRIZ ADRIANA AGUAYO RODRIGUEZ

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO  
 FUERZA POR MEXICO  
*Celini Amiadai Taquichin Becerra*  
 LIC. CELINI AMIADAI TAQUICHIN BECERRA

REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL  
*Rafael Cervantes Duran*  
 LIC. RAFAEL CERVANTES DURAN.

REGIDOR DE DESARROLLO ECONOMICO  
*Jorge Ortiz Ramirez*  
 PROF. JORGE ORTIZ RAMIREZ.

*Andrés Aguirre*  
*Romulo*  
*M. Guadalupe Mendoza*  
*Valentin Salazar*

*Jose Rosario Prieto*  
*Hortencia Sigala G.*  
*Juan Salazar*  
*Araceli Pérez Frías*  
*David Durán Bo*  
*Glafira*  
*Candido Muñoz*  
*Ramón*

Lic. Carmen Becerra Esparta  
 0014

# LISTA DE ASISTENCIA

LOCALIDAD	NOMBRE	FIRMA
ALTO DE LA PALMITA	Valentín Enrique Ruvalcaba	<i>Valentín Ruvalcaba</i>
ARROYO COLORADO	Silvestre Velasco Luis Antonio Duran Muñoz	<i>Luis Antonio Duran</i>
BARRANCA DE MORENO	Jose Jovani Gonzalez Corona	<i>Jose Jovani Gonzalez Corona</i>
CAPELLANIA	Antonio Mejia Quezada	<i>Antonio Mejia</i>
CAPULIN DE ABAJO	Ignacio Alvarez M.	
CAPULIN DE ARRIBA	Araceli Perez Frias	<i>Araceli Perez Frias</i>
CASAS GRANDES	Gilberto Lechuga Hernandez	<i>Gilberto Lechuga H</i>
CERRO DE SAN MIGUEL	Eliseo Muñoz Duran	
CERRO GRANDE	Efrain Robles Velazco	
COLONIA DE SAN MIGUEL	Oscar Jimenez Duran	
EL ALAMO	Josefina Duran Villalobos	
EL JAGUEY	Jose Rodriguez	
EL LLANO GRANDE	J. Ramon Quezada Ruvalcaba	<i>Ramon Quezada</i>
EL MOLINO	Jose Juan Mejia Perez	<i>Jose Juan Mejia Perez</i>
EL SITIO	Manuel Tenerio Cordero	
EL TUICHE	Jose Aguirre Lomeli	<i>Jose Aguirre Lomeli</i>
GABRIEL LOPEZ	Jose Perfecto Gonzalez	
LA CIENEGA DE LAS PILAS	Jose Duran Jaime	
LA COFRADIA	David Duran Bustos	<i>David Duran B.</i>
LA ESTANCIA	Jose Sandoval Gomez	
LA HUERTA	Evelia Ramirez Gomez	
LA JABONERA	Victor Manuel Villalobos Jauregui	
LA LABOR	Vicente Garcia Mercado <i>Vicente Garcia Mercado</i>	<i>Vicente Garcia Mercado</i>
LA MAJADA	Raul Gomez Andrade	<i>Raul Gomez Andrade</i>
LA VILLITA	Ruben Jimenez Quezada	<i>Ruben Jimenez Quezada</i>
LAS AMARILLAS	Martin Saldivar Esparza	
LAS ANIMAS	Jose Rosario Preto	<i>Jose Rosario Preto</i>

La Portella

Alicia Flores Martinez

Alicia Flores Martinez

Teresa de Jesus Sandoval

LAS HUERTAS	ANTONIO QUEZADA DIAZ	
LAS PILAS	ESPERANZA GOMEZ DURAN	<i>petra de Jesus J</i>
LAS PRESITAS	JUAN RAMON AGUSTIN SIGALA SAL.	<i>Cecilia Flores</i>
LAS TROJES	EDGAR IVAN GONZALEZ CORDOVA	<i>Heriberto Sigala S.</i>
LAS TUZAS	JOSE ARTURO ALVAREZ VILLEGAS	
LOS ADOBES	ROSARIO OROPEZA GARCIA	<i>Armando Aguirre</i>
LOS BORROELES	ERIKA LUIS GARCIA	<i>ARMANDO AGUIRRE</i>
LOS CARDOS	GEORGINA DANIELA RUIZ	
LOS SANDOVALES	MA. GUADALUPE MENDOZA FRIAS	<i>Guadalupe Mendoza</i>
MESA DE FRIAS	ABEL PEREZ FRIAS	
MESA DE LA PROVIDENCIAL	MARIO HERNANDEZ LECHUGA	
MOCTEZUMA	FELIPA PEREZ MEJIA	
MONTE DE YAÑEZ	SALVADOR AGUIRRE PEREZ	
OJO DE AGUA	JAVIER MARTINEZ QUEZADA	
PASO DE OROZCO	JOSE RUVALCABA RUVALCABA	
PLAN DEL SAUZ	SOFIA MUÑOZ VILLALOBOS	
PORVENIR DE ORINETE	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ DURAN	
PRIMERO DE MAYO	OMAR LOPEZ VELEZ	
RINCON DE TORRES	RUBEN GUZMAN LUNA	
SAN JOSE DEL SUR	MA. DEL CARMEN BECERRA ESPARZA	<i>Ma Carmen Becerra F.</i>
SAN MARTIN	JAJME VELEZ CAJERO	
SANTA GERTRUDIS	IRENE OLMOS SALDIVAR	
TLACHICHILA	JOSE VALLIN MUÑOZ	<i>Olimos Aguirre</i>
TOYAHUA ABAJO	HEIDA GONZALEZ	<i>[Signature]</i>
TOYAHUA DE ABAJO	ABELINO PEREZ GOMEZ	<i>Gloria Perez</i>
VALLECITOS	JUAN PABLO SALAZAR PEREZ	<i>Juan Salazar</i>
VELADORES	ROSA MARIA CORONA LARIS	<i>Heriberto Salazar</i>

Candido Muñoz

Luis Muñoz Durán

0016



Jose Mariano Trivic  
 Davis Durán B. Rosa Mario Coroná J.  
 M. Guadalupe mendoza

ARMANDO AGUIRRE  
 ARMANDO AGUIRRE

IRMA AGUIRRE

Manuel Jimenez  
 Manuel Jimenez

Graciela Perez

Juan Salazar

Subst

Montecima Sigala

Juan Garcia  
 Heriberto Salazar P.

No.	LOCALIDAD	OBRA O ACCION	MONTO	SUBCLASIFICACION	INCIDENCIA
1	NOCHISTLÁN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE PRIVADAD DE LIMÓN DE LA ZAP 033 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 1,302,131.30	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
2	LAS ANIMAS	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 376,933.83	ESPACIOS DEPORTIVOS	COMPLEMENTARIA
3	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZONA ZAP 0205 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 401,083.97	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
4	NOCHISTLÁN	CONSTRUCCION DE RED O DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLE MORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 245,287.43	AGUA POTABLE	DIRECTA
5	NOCHISTLÁN	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 185,781.45	RED DE DRENAJE	DIRECTA
6	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DE PORTIVO DE LA ZAP 0374 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 1,667,134.32	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
7	COL. LOMAS DEL REFUGIO	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS	\$ 1,264,695.09	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
8	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE LINEA O RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMPO DE PORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 81,404.16	AGUA POTABLE	DIRECTA
9	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PRIVADAD DE LIMÓN DE LA ZAP 033 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 168,312.13	RED DE DRENAJE	DIRECTA
10	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZONA ZAP 0205 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 79,834.34	RED DE DRENAJE	DIRECTA
11	COL. LOMAS DEL REFUGIO	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE JESUITAS DE LA COLONIA LOMAS DE REFUGIO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 143,180.38	RED DE DRENAJE	DIRECTA
12	LOS SANDOVALES	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 369,243.81	ESPACIOS DEPORTIVOS	COMPLEMENTARIA
13	LA JABONERA	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 1,213,589.41	ACCESO A COMUNIDAD	DIRECTA
14	VELADORES	AMPLIACION DE 954 ML DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VELADORES MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 1,321,612.99	RED DE DRENAJE	DIRECTA
15	TOYAHUA DE ABAJO	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TOYAHUA DE ABAJO MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 223,108.10	ALUMBRADO	DIRECTA
16	NOCHISTLÁN	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN LA CALLE RAFAEL CERVANTES Y LOPEZ VELARDE CON SUBESTACION 37.5 KVA EN NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS	\$ 246,182.73	ELECTRIFICACION	DIRECTA
17	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZONA ZAP 0205 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 67,316.67	AGUA POTABLE	DIRECTA
18	NOCHISTLÁN	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADAD DE LIMÓN DE LA ZAP 033 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 111,028.84	AGUA POTABLE	DIRECTA
19	COL. LOMAS DEL REFUGIO	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JESUITAS DE LA COLONIA LOMAS DE REFUGIO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 93,027.85	AGUA POTABLE	DIRECTA
20	NOCHISTLÁN	APORTACION MUNICIPAL PARA CONVENIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SEDUGOB	\$ 1,000,000.00	VIVIENDA	DIRECTA
21	NOCHISTLÁN	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD INTEGRAL DE SALUD Y REHABILITACION DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 250,000.00	SALUD	DIRECTA
22	NOCHISTLÁN	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN LA CALLE ARROYO BLANCO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 160,000.00	ELECTRIFICACION	DIRECTA
23	NOCHISTLÁN	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN LA LOCALIDAD TOYAHUA DE ABAJO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 250,000.00	ELECTRIFICACION	DIRECTA
24	NOCHISTLÁN	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN LA CALLE LOS ARCOS DE LA ZAP 0529 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	\$ 287,071.00	ELECTRIFICACION	DIRECTA

ANEXO 2  
 Cndid. Muraz  
 Antonio Duran  
 Ejercicio 2024  
 17

Pamela Durazada  
 Jose Aguilera  
 Heriberto Salazar P.

José Rosario Rivas  
David Durán B. Baso Mario Corona L.

ARMANDO AGUIRRE

ARMANDO AGUIRRE R

*(Signature)*

Glafría Pérez

~~ARMANDO AGUIRRE~~

Manuel Jiménez


José Aguirre & ~~Heriberto Salazar P.~~

Heriberto Salazar P. Juan Salazar

M. Guadalupe Mendoza Fias  
Ramón Pruzada  
Montecma Sigala

0018

22	LOS SANDOVALES	REHABILITACION DE RED O LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 300,000.00	AGUA POTABLE	DIRECTA
23	VELADORES	REHABILITACION DE CARRETERA VEADORES - NOCHISTLAN EN LA COMUNIDAD DE VEADORES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 450,000.00	CARRETERA	DIRECTA
24	LAS TUZAS	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN EL ARQUILLO DE LA COMUNIDAD DE LAS TUZAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 325,035.93	AGUA POTABLE	DIRECTA
25	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE AVUNTAMIENTO EN LA ZONA ZAP 0441 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 663,116.00	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
26	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AVUNTAMIENTO EN LA ZONA ZAP 0441 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 131,203.84	RED DE DRENAJE	DIRECTA
27	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE AVUNTAMIENTO EN LA ZONA ZAP 0441 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 66,707.20	AGUA POTABLE	DIRECTA
28	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE PROL. DE MEJIA EN LA ZONA ZAP 0335 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 502,000.00	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
29	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROL. DE MEJIA EN LA ZONA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 116,000.00	RED DE DRENAJE	DIRECTA
30	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. DE MEJIA EN LA ZONA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 89,000.00	AGUA POTABLE	DIRECTA
31	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE ROBLE EN LA ZONA ZAP 0367 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 1,334,458.20	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
32	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROBLE EN LA ZONA ZAP 0367 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 218,000.00	RED DE DRENAJE	DIRECTA
33	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLE EN LA ZONA ZAP 0367 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 115,000.00	AGUA POTABLE	DIRECTA
34	LOS TEPETATES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LOS TEPETATES MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 793,000.00	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
35	LOS TEPETATES	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOS TEPETATES MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 150,000.00	RED DE DRENAJE	DIRECTA
36	LOS TEPETATES	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LOS TEPETATES MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 100,000.00	AGUA POTABLE	DIRECTA
			\$ 16,781,180.97	TOTAL	
			\$ 16,845,512.00	MONTO FAHSHUN	
			\$ 64,331.03	DIFERENCIA	



Candido Muroz

**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**  
RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

**CONVENIO DE CONCERTACIÓN 2024**

**OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

Convenio de Concertación, que con objeto de llevar a cabo obras y/o acciones de beneficio social, celebran, por una parte, el H. Ayuntamiento de: Nochistlán, Zac. Representado por el C. Presidente Municipal quien a su vez es el Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal; y por otra el comité comunitario y/o por obra del municipio **MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA** los que en lo sucesivo se denominarán “AYUNTAMIENTO”, “CONSEJO” Y “COMITÉ” respectivamente.

**ANTECEDENTES**

1.- El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Desarrollo Social y de Contraloría y Desarrollo Administrativo: el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; y los Ayuntamientos de los 56 municipios del Estado, celebraron un anexo de ejecución del Convenio de Desarrollo Social 2023, el cual tiene por objeto operar el programa denominado “ Fondo ; mediante la transparencia de los recursos federales y estatales a los H. Ayuntamientos, y estos a su vez los operan conjuntamente con los Consejos de Desarrollo Municipal y los Comités del referido programa.


2.- El consejo de Desarrollo Municipal, correspondiente al municipio de NOCHISTLÁN, con domicilio en CALLE HIDALGO #1, se encuentra constituido según consta en el Acta levantada en Asamblea de consejeros de fecha **22 DE FEBRERO DE 2024** y tiene como principal objetivo efectuar la promoción de los objetivos, estrategias, programas y acciones del Fondo de Desarrollo Social Municipal ; y a la vez promover e impulsar la organización social y la participación de la población organizada.

El C. **JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES** en su carácter de Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal, tiene facultades para suscribir el presente convenio a nombre y representación de dicho Consejo.

3.- LA : **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** \_constituyó el **23 DE FEBRERO DE 2024** con el propósito de ejecutar, así como operar y conservar las obras y/o acciones que en su localidad se definieron como prioritarias.

El \_\_\_\_\_ en su carácter de Presidente del Comité, tiene facultades para suscribir el presente Convenio a nombre y representación de dicho Comité.

En razón de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos I fracc. II, 3,4,6,7,28,29,30,50,51 y 82 de la Ley de Adquisiciones de Obras Públicas; y en las disposiciones



Lidia Chavez M<sup>ca</sup> Alejandra Macias c.

0019



aplicables de la ley orgánica Municipal, las partes celebran el presente concentrado el tenor de las siguientes

## CLAUSULAS

**PRIMERA** ,- El H. "AYUNTAMIENTO", el "CONSEJO" y el "COMITÉ" , convienen en conjuntar esfuerzos y recursos para la realización de obras y/o acciones, en el marco del programa " Fondo para la Infraestructura Social Municipal".

**SEGUNDA**.- Las obras y/o acciones que se ejecutarán por el "Comité" serán las que a continuación se describen: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

Para la realización de las obras y/o acciones anteriormente señaladas, el "AYUNTAMIENTO" ministrará al "COMITÉ" \$1'667,134.32 (UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 32/100 MN)

**TERCERA**.- La ministración de los recursos a que se refiere la cláusula anterior estará a cargo del "AYUNTAMIENTO".


La ejecución de las obras, objeto del presente instrumento, estará bajo la responsabilidad directa del "CONSEJO" y la supervisión y vigilancia de la misma estará bajo la responsabilidad del "CONSEJO" y del "AYUNTAMIENTO".

**CUARTA**.- El "AYUNTAMIENTO" se compromete a:

- Ministrar los recursos al "COMITÉ", de acuerdo a los lineamientos que norman el programa
- Llevar un registro contable por separado, de los recursos designados a las obras y/o acciones a que se refiere este Convenio, independiente de la contabilidad de los ingresos del propio "AYUNTAMIENTO" y de otros programas.
- Solicitar informes con periodicidad que se requiera, conforme al tipo de obra y/o acción, al "CONSEJO" y al "COMITÉ" respecto de avance físico de las obras del presente Convenio; así como el ejercicio de los recursos que se otorguen.
- Proporcionar asesoría técnica al Comité en la ejecución de la obra, y apoyar a este con la ministración oportuna de los recursos.
- Informa al Ejecutivo Estatal del avance físico de las acciones u obras y del ejercicio del recurso, objeto del presente Convenio.

**QUINTA**.- El "COMITÉ" se compromete a:

- Realizar las obras y/o acciones objeto del presente Convenio, sujetándose a los lineamientos del programa a efecto de que se cumplan los principios de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia aplicables, en el ejercicio de los recursos que se aportan.
- Ejercer la totalidad de los recursos señalados en la cláusula segunda, destinándolos única y exclusivamente a las acciones u obras objeto del presente Convenio.



*Lidia Chavez M. Alejandra Macías C.*

*[Handwritten signature]*



- c) Proporcionar oportunamente los bancos de materiales que se requieran, así como la mano de obra necesaria en la realización de las obras que se comprometen en este Convenio.
- d) Informar al representante comunitario ante el Consejo, los avances físicos así como la aplicación de los recursos.
- e) Colaborar con el "CONSEJO" en la resolución de problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
- f) Informar mensualmente al "AYUNTAMIENTO", por escrito, del avance físico de las obras y/o acciones, así como de la aplicación de los recursos económicos.
- g) Atender al "CONSEJO" en la inspección de las instalaciones, a efecto de verificar el avance de las acciones u obras objeto del presente Convenio y colaborar con éste, cuando sea necesario.
- h) Llevar una contabilidad especial, de los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda, para la realización del objeto del presente Convenio.  
Así como entregar al Consejo los recibos de comprobantes, que amparen las erogaciones realizadas; permitir a las autoridades competentes, auditar dicha contabilidad, si así lo juzgan necesario.
- i) Dar aviso al "CONSEJO" sobre la terminación de las obras de que proceda a su verificación y preparación del informe y acta respectiva.
- j) Recibir las obras y responsabilizarse de su conservación, mantenimiento y operación.
- k) Denunciar ante el "AYUNTAMIENTO" o la Contraloría del Estado, la irregularidades que observen en la aplicación de los recursos financieros; tanto por parte de las autoridades, como de los particulares.

**SEXTA.** \_ El "CONSEJO" se compromete a:

- a) Gestionar y coordinar los diversos apoyos institucionales que requiera el "COMITÉ", para la realización de las obras y/o acciones derivadas del presente Convenio.
- b) Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la realización de las obras y/o acciones y el ejercicio de los recursos derivados del presente Convenio, de acuerdo con los lineamientos del programa
- c) Realizar visitas de inspección a las instalaciones donde se lleven a cabo las obras y/o acciones.
- d) Solicitar ante las autoridades competentes, los permisos o licencias de construcción que se requieran para la realización de las obras; o en su caso de las acciones, a que se refiere este documento, conforme las leyes aplicables.
- e) Llevar a cabo el seguimiento, registro, control y evaluación del ejercicio de los recursos financieros, así como del avance físico de las acciones u obras objeto del presente Convenio.

**SEPTIMA.**-El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el "CONSEJO" y el "COMITÉ", ya sea consecuencia de dolo, culpa o negligencia de los servidores públicos municipales o de los representantes del "CONSEJO" y/o "COMITÉ" dará lugar a la terminación anticipada del presente convenio. En tal caso se comprometen a reintegrar al "AYUNTAMIENTO" los recursos que se les hayan ministrado y estén por alguna causa sin ejercer en este momento.

OPERADO  
 TALLER (FIR)  
 Isela de Jesús Rodríguez García  
 EJERCICIO 2024

III

0021

M<sup>g</sup> Alejandra Macías C.

Lidia Choiciz

[Signature]

Quien tenga conocimiento de las irregularidades, que en este contexto tuvieren lugar, procederá de inmediato a comunicar los hechos a la Contraloría Estatal o Municipal, para que se determine la responsabilidad administrativa que pudiera derivar de tales hechos o circunstancias, la cuál será independiente de la del orden civil o penal que puedan configurarse.

**OCTAVA.-** En caso de suscitarse duda o controversia respecto a la interpretación y cumplimiento del presente instrumento jurídico, las partes convienen expresamente, someterse a corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

**NOVENA.** - El presente Convenio de concertación entrará en vigor el día de su firma y su vigencia será el **ejercicio fiscal 2024**, pudiéndose modificar o adicionar de común acuerdo por las partes; las modificaciones Y adicciones deberá constar por escrito y surtirán efectos a partir de su suscripción.

*Isela de Jesus Rodriguez Gana*

*M<sup>a</sup> Alejandra Macías C.*

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2024

0022



Dado que fue el presente Convenio de Concertación y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firma para constancia y validez en: **23 DE FEBRERO DE 2024**

**OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

FOR EL H. AYUNTAMIENTO  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL C.D.S.M.

Manuel Jimenez  
C. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ FUENTES

EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO

[Firma]  
L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO

[Firma]  
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

**POR EL COMITÉ DE OBRA**

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA

[Firma]  
NOMBRE: Anayely Paloma Rodriguez Rodriguez

SECRETARIO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA .

Lidia Chairez  
NOMBRE:

TESORERO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA


M<sup>o</sup> Alejandra Macias c.  
NOMBRE:

VOCAL DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA.

Isela de Jesús Domínguez García  
NOMBRE:

V



# ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ COMUNITARIO Y/O POR OBRA

404004

## EJERCICIO 2024

### RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


#### MARCO ESTRATÉGICO

Se promueve, la integralidad política institucional y de la sociedad para fortalecer el proceso de descentralización ampliando las capacidades de estados y municipios promoviendo la corresponsabilidad ciudadana y la participación social en la aplicación de los recursos públicos; sumando esfuerzos colectivos para alcanzar mejores condiciones de vida; cuidando que la obra a ejecutar se haga con transferencia y calidad. Es por ello y que en apego al Manual Único de Operación se formula la siguiente actuación:

En el municipio de NOCHISTLAN DE MEJIA y reunidos los habitantes del lugar que en forma anexa firman de asistencia en el lugar que ocupa LUGAR DE REUNION con la finalidad de concertar y conformar con la participación comunitaria y democrática el comité de obra comunitaria acordada por el Consejo de Desarrollo Municipal y autorizada y aprobada por la secretaría de Planeación y Finanzas en oficio No. respectivamente en la ejecución de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS. Siendo las 12:00 Horas del día 22 FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO y en asamblea general extraordinaria, legalmente constituida con la asistencia de la mayoría de los habitantes con derecho a participar y ante la presencia de las diversas representaciones de los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales y del representante del Consejo en esta comunidad se da por iniciada bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación de autoridades.
- 2.- Lista de presentes.
- 3.- Objetivos generales de constituir el comité de obra comunitario.
- 4.- Alcances y beneficios del programa de desarrollarse en esta población.
- 5.- Propuestas para la integración del comité.

Abordados y agotados los puntos del 1 al 4, se escucharon propuestas a candidatos para la integración del comité habiendo quedado por mayoría como se especifica al final de esta actuación firmando de conformidad los que en ésta aceptan los cargos y responsabilidades.



M<sup>a</sup> Alejandra Macías C

Lidia Chávez

Comité de Obra



## LOS BENEFICIARIOS SE COMPROMETEN A:

- 1.- Aportar: \$ 0. 00/100 MN que corresponde al 0% aproximadamente del costo total para el programa F.I.S.M. Para que la obra se realice en el menor tiempo posible y hasta la fecha programada para su ejecución final, así como otros trabajos donde se requiera su participación.
- 2.- Colaborar con las autoridades en la resolución de los problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
- 3.- Aplicar los recursos de conformidad con el Manual Único de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 y la ley de adquisiciones y obras públicas, contenidas en las siguientes:

## CLAUSULAS

**PRIMERA:** El comité se denominará: comité de CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS. personalidad jurídica y patrimonio propio.

**SEGUNDA:** El comité tendrá por objetivo contribuir a la construcción de la obra a que se hace referencia en el apartado anterior de éste documento apoyando y vigilando la operación y administración del programa, participará también en la organización de tareas comunitarias en las que se aporten materiales y/o mano de obra de los beneficiarios.

**TERCERA:** El domicilio legal del comité de obras se fijará en: **LUGAR DE LA OBRA** del municipio de Nochistlán de Mejía.


**CUARTA:** El comité se encargará de llevar a cabo tareas de promoción, difusión, organización construcción, vigilancia y mantenimiento de las obras que con motivo del programa se ejecuten.

**QUINTA:** El presidente del comité informará al representante comunitario del Consejo de Desarrollo Municipal de los avances físicos y financieros de la obra y comunicará a través del mismo al seno del consejo la problemática relacionada con la operación del programa. El presidente del comité tendrá la representación de la asamblea general ante toda clase de autoridades, organismos, personas físicas y morales siempre que sea necesario para el cumplimiento de los compromisos del comité.

**SEXTA:** El secretario tendrá a su cargo el archivo de la documentación correspondiente así como contestar y recibir toda clase de correspondencia.

**SEPTIMA:** El tesorero controlará los fondos y distribuirá los pagos que con motivo de la realización de las obras se eroguen en liquidación de mano de obra y/o materiales, teniendo especial cuidado de recabar la documentación comprobatoria de los gastos.

*Isela de Jesús Rodríguez García*



0025

*M<sup>a</sup> Alejandra Macías C.*

*Lidia Chavez*

*Isela de Jesús Rodríguez García*



**OCTAVA:** El Vocal de control y vigilancia informa y orienta al comité y a la comunidad acerca de los lineamientos de operación del fondo, trámites, recursos asignados y desarrollo de las obras y acciones. Así como la estricta vigilancia de las obras y la actuación de los servidores públicos.

**NOVENA:** En este acto el comité recibe por parte del "AYUNTAMIENTO" fotocopia del proyecto técnico de la obra a ejecutar para su consulta y conocimiento de las diversas representaciones involucradas en el programa que se los requiera como referencia.

Leída que fue la presente acta constitutiva y enterados los participantes de su contenido y alcance legal, la firman de conformidad para su constancia y validez los que en ella quedaron como comité; la presente se integra con la lista de asistencia en la comunidad de CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

**EL PRESIDENTE DEL COMITÉ**

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE: Anayely Paloma Rodriguez  
Rodriguez

**SECRETARIO DEL COMITÉ**

NOMBRE Y FIRMA.

NOMBRE:

**TESORERO DEL COMITÉ**

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE:


**VOCAL DE CONTROL**

NOMBRE Y FIRMA.

NOMBRE:

  
POR LA PRESIDENCIA MPAL.

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES.

  
**DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
**ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA**  
REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO.

0026

**LISTA DE ASISTENCIA**

Relación de participantes para la conformación del comité comunitario de la comunidad de:  
Nochistlán de Mejía municipio de Nochistlán de Mejía de la obra de  
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

Anaxety Paloma Rodriguez Rodriguez

Lidia Elena Chavez Lomeli

M<sup>a</sup> Alejandra Macias C.

Isela de Jesus Rodriguez Garcia

Fernando Rodriguez perez

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2024

0027



**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR



**FAIS**

FONDO DE APORTACIONES PARA  
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXOS PARA EL REPORTE DE LA  
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL FONDO PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE  
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL  
DISTRITO FEDERAL- FISMDF 2024

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



2022 **Ricardo Flores Magón**  
Año del Magón  
PRESENCIA DE LA FEDECO, COPLA, CENACSA

0028





## ANEXO 1

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

*Aviso de privacidad: Los datos personales que se recaban por la DGDR serán utilizados para los fines establecidos en los lineamientos del Fondo, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte.*

## RESPONSABLE DEL LLENADO: ENLACE FISDMF Y COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

## 1.1 Acta de Instalación del Comité de participación social


Siendo las 12:00 horas del día 23 del mes de Febrero del año 2024 en la localidad de Nochistlan, del municipio Nochistlan, de la entidad Zacatecas, se encuentran reunidos el/la C. Am. Diego Merced Acosta, designado (a) como enlace FISDMF, quien ostenta el cargo de Enlace en calidad de representante de la instancia ejecutora, el/la C. Annyeli Palomo Rivas, el/la C. Lidia Chavez, el/la C. Ma Alejandra Macias, el/la C. Isela de Jesus Rivas, y el/la C. \_\_\_\_\_ para celebrar la instalación del Comité de participación social, que dará seguimiento y verificación de la obra: Constr. de Pav. en la calle campo deportivo de la Zap 0271 de la loc. de a realizarse con los recursos del FAIS, componente FISDMF, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

## CONSIDERANDO

Que el artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal, establece la obligación que tendrán municipios y demarcaciones territoriales de promover la participación de las comunidades beneficiarias en la planeación, ejecución, control, vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras y acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Que los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigentes, publicados el en Diario Oficial de la Federación, en su numeral 3.1.2, fracciones XV y XVI, los gobiernos locales tendrán como responsabilidades: 1.- Promover la participación social en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través de los comités de participación social o de las formas de organización con las que cuente el municipio o demarcación territorial. 2.- Los municipios y demarcaciones territoriales deberán reportar los formatos de la integración y operación de los comités de participación social en el Módulo de Participación Social de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social-MIDS.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



**ANEXO 1**

Que la Guía de Participación define al comité de participación social-CPS, como un órgano de participación social y representación de una comunidad, ya sea urbana, rural, indígena, o afromexicana, electos de manera democrática que dan seguimiento a la ejecución de las obras o acciones que se programan a través del FISMD, así como cualquier otra forma de organización con la que cuente el municipio o alcaldía, mismo que deberá conformarse en cada obra del FISMD. Este acto deberá formalizarse mediante la elaboración del acta respectiva.

Que el comité de participación social (CPS) deberá estar compuesto por cuatro personas como mínimo, que sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, que ocuparán los cargos de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo será el participar en la planeación, ejecución, control, vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras y acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México.


El comité de participación social deberá cumplir con las siguientes actividades:

1. Dar seguimiento al avance y conclusión de las obras o acciones a realizar con recursos del FISMD, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos se realice bajo los principios de transparencia, eficacia, legalidad y honradez.
2. Realizar visitas a las obras e informar de los avances, así como de y la conclusión de las mismas a sus comunidades y a la Secretaría de Bienestar, a través de llenado de los Anexos (1, 2, 3 y 4) de participación social.
3. Participar en la capacitación que brindará el Gobierno Municipal, sobre las tareas y responsabilidades de supervisión de las obras que vigilará.
4. Participar en los procesos de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades municipales, siempre y cuando los proyectos sugeridos se apeguen a los lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos.

En tal contexto, tomando en consideración las atribuciones que se contienen en los ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente:

**ACUERDO ÚNICO.-** Se declara formalmente INSTALADO el comité de participación social en la localidad de Nochistlan del municipio de Nochistlan, de la entidad Zacatecas, que dará seguimiento y verificación de la obra Const. de Pav. en la calle campo deportivo de la Zap 0371 de la localidad de Nochistlan de Mejia, municipio de Nochistlan de Mejia Zac.

Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los/as intervinientes e integrantes del comité de participación social, para los efectos conducentes.



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."







## ANEXO 1

## INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

Nombre completo	Datos de contacto (Domicilio, teléfono y correo electrónico)	Cargo	¿Se considera usted integrante de pueblos indígenas o afromexicanos? Si/No ¿A Cuál (especifique)?	Firma
Ancely Patloma Rodríguez Rodríguez	3781023965	Presidente (a)	NO	
M <sup>ra</sup> Alejandra Macías Cervantes	346 100 91 55	Secretario (a)	NO	M <sup>ra</sup> Alejandra Macías C.
Isela de Jesús Rodríguez García	346 700 99 93	Vocal	NO	Isela de Jesús Rodríguez García
		Vocal		
		Vocal		

## TESTIGO

Nombre completo	Datos de contacto (Domicilio, teléfono y correo electrónico)	Cargo	Firma
M <sup>r</sup> . Diego Alejandro Morales Quezada		Enlace FISDMF de la instancia ejecutora	

OPERADO  
FAISM (FIII)  
EJERCICIO 2024

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



2022 Flores  
Año de Magón  
PRELUDIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

0031





**ANEXO 1**

**1.2. REPORTE DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF.**

**INFORMACIÓN GENERAL**

Nombre de la obra:	Construcción de pav. en la calle campo deportivo de la zona 0371 de la localidad de Nochistlan de Mejia, Mpio de Nochistlan de Mejia.			
Folio del proyecto:	404 004			
Municipio	Nochistlan de Mejia			
Localidad	Nochistlan			
Entidad	Zacatecas			
Fecha y hora de la capacitación	23 Feb. 2024			
Lugar de la capacitación	Lugar de los tambres			
Nombre del facilitador/a	Ing. Diego Alejandro Mercado Arceola			
Temas	Pavimentación			
Número de asistentes	Mujeres	4	Hombres	1

**LISTA DE ASISTENCIA**

Nombre	Datos de contacto (Domicilio, teléfono y correo electrónico)	Cargo	Recibió los materiales informativos del FAIS (Sí o No)	Firma
Ancely Paloma Rodriguez Rodriguez	378 102 39 65	Presidenta	Si	
Lidia Elena Chavez Lomeli	346 113 78 33	Secretaria	Si	Lidia Chavez
M <sup>a</sup> Alejandra Macias Cervantes	346 100 91 55	Tesorera	Si	Ma Alejandra Macias C.
Isela de Jesus Rodriguez Garcia	346 700 99 93	vocal	Si	Isela Rodriguez Garcia

OPERADO  
FAISM (FII)

EJERCICIO 2024 0032

2022 Flores  
Año de Magón




"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 1

FOTOGRAFÍAS DE LA CAPACITACIÓN

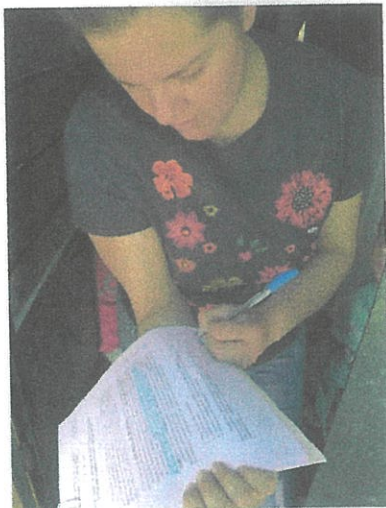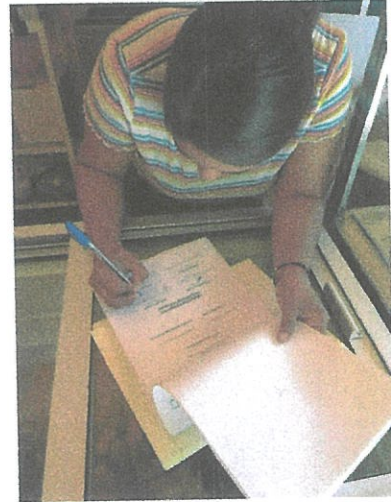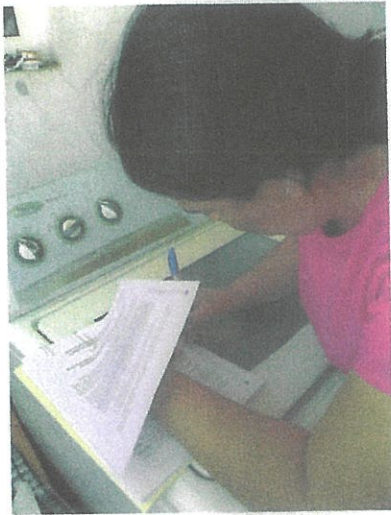

OPERADO  
FAISM (FII)  
EJERCICIO 2024

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



2022 Ricardo Flores  
Año de Magón

0033






## ANEXO 2

## ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

## RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

Fecha: (dd/mm/aaaa)

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	Pav. de pav. en la calle campo dep. de la zap 0371 de la oc. de Nochistlan de Nujin Mpio de Nochistlan Zacatecas		
Folio del proyecto	404004		
Municipio	Nochistlan		
Localidad	Nochistlan		
Entidad	Zacatecas		
Monto invertido	\$ 1'667,134.32		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa)	
	28/02/24	28/05/24	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ( )	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No (X)
2. Descripción de la obra	Describa aquí en qué consiste la obra: Pavimentación con concreto en calle campo deportivo		
3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)	No ( )	



0034

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





**ANEXO 2**

4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad	Mejora en las de comunicación	
6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una <b>X</b> las opciones que considere. Seleccione máximo 3. a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). ( ) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. ( ) d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) f) Otra, indique cuál:	

**OPERADO**  
**FAISM ( FIII )**  
**EJERCICIO 2024**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

0035

9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	a) 1-3 ( )	b) 4-6 ( )	c) +6 ( <input checked="" type="checkbox"/> )
--	------------	------------	---

**FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

  
Anaxely Paloma Rodriguez Rodriguez  
**Presidente(a) del Comité de Participación Social**  
 (Nombre completo y firma)


Lidia Chavez  
**Secretario(a) del Comité de Participación Social**  
 (Nombre completo y firma)

Isela de Jesus Rodriguez Garcia  
**Vocal del Comité de Participación Social**  
 (Nombre completo y firma)

\_\_\_\_\_  
**Vocal del Comité de Participación Social**  
 (Nombre completo y firma)

\_\_\_\_\_  
**Vocal del Comité de Participación Social**  
 (Nombre completo y firma)

  
 \_\_\_\_\_  
**Enlace FISMDF**  
 (Nombre completo y firma)



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 3

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra		
Folio de la obra		
Municipio		
Localidad		
Entidad		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa)
¿Se registraron quejas o denuncias) ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( )	No ( )
Seleccione el tipo de registro ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Queja ( ) En caso de contestar <b>queja</b> , pase a la pregunta 1.	Denuncia ( ) En caso de contestar <b>denuncia</b> , pase a la pregunta 2
1. ¿Cuál es el motivo de la queja?	Describa la queja a continuación:	
2. ¿Cuál es el motivo de la denuncia?	Describa la denuncia a continuación:	
3. ¿Entregó y/o presentó la queja o denuncia ante alguna autoridad? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
	No ( )	
4. ¿La queja o denuncia fue atendida de manera satisfactoria? ( Marque con una <b>X</b> la	Sí ( )	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>OPERADO FAISM ( FIII )  EJERCICIO 2024</p> </div>

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."








**ANEXO 3**

opción correspondiente).	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
5. Escriba el nombre de la(s) instancia(s) ante la cual presentó la queja o denuncia (Puede ser el folio de seguimiento, número de expediente o algún otro dato, como número telefónico, correo electrónico, etcétera.)		

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE PROMUEVE LA QUEJA O DENUNCIA**

Anónimo	( ) ( Marque con una <b>X</b> en caso de denuncia anónima)		
En caso de que quiera identificarse, complete la información que se solicita a continuación:.			
Nombre completo			
Sexo M ( ) F ( )	Edad		Escolaridad
Ocupación			
Datos de contacto (teléfono y correo electrónico)			
<b>ACUSE DE RECIBIDO EN EL CPS</b>	<b>Presidente(a) del Comité de participación social</b> (Nombre completo y firma)		
<b>ACUSE DE RECIBIDO MUNICIPIO</b>	<b>Persona Funcionaria Pública</b> (Nombre completo y firma)		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



2022 Ricardo Flores Magón  
Año de Magón

0038

## ANEXO 4

**ANEXO 4. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.**
**RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF**
**DATOS DE LA OBRA**

Nombre de la obra	Const. de pav. en la calle campo dep. de la zap 0371 de la localidad de Nochistlan de Mexico en Nochistlan de Mexico Zac.	
Folio del proyecto	404 004	
Dirección o ubicación	Calle campo deportivo	
Municipio	Nochistlan	
Localidad	Nochistlan	
Entidad	Zacatecas	
Monto invertido	\$ 1'667,134.32	
1. ¿La obra concluyó conforme el periodo de ejecución? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué  (favor de pasar a la pregunta 9)
2. Desde su punto de vista, ¿la obra se concluyó satisfactoriamente? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.
3. Indicar la fecha de inauguración o entrega de la obra:	(dd/mm/aaaa) 28 / Mayo / 2024	
4. ¿El comité estuvo presente en la inauguración o entrega de la obra? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



## ANEXO 4

5. ¿El comité colocó la placa de conclusión de la obra? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( <input type="checkbox"/> )	En caso de contestar que no, indique por qué.
6. ¿Recibieron por parte del municipio el acta entrega-recepción de la obra? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( <input type="checkbox"/> )	En caso de contestar que no, indique por qué.
7. Mencione dos resultados o beneficios obtenidos en su comunidad con el trabajo realizado por el CPS de FISMDF	<i>Mejora en participación de las jóvenes Supervisión</i>	
8. ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de haber participado en el CPS de FISMDF? ( Marque con una <b>X</b> la opción correspondiente).	Sí ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	No ( <input type="checkbox"/> )	En caso de contestar que no, indique por qué.
9.-En caso de no haberse concluido la obra, colocar la posible fecha de término.		

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2024

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

0040





FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

  
Ancyely Paloma Rodriguez Rodriguez  
**Presidente(a) del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

Lidia Chavez  
**Secretario(a) del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

Isabelle Jesus Rodriguez Garza  
**Vocal del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

\_\_\_\_\_  
**Vocal del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

\_\_\_\_\_  
**Vocal del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

  
\_\_\_\_\_  
**Enlace FISMD**  
(Nombre completo y firma)

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2024

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0041

ANEXO 4

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

RESPONSABLE DEL LLENADO: MUNICIPIO Y COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)


Siendo las 2:00 horas del día 28 del mes de Mayo del año 24 en la localidad de Nochistlan, del municipio Nochistlan, de la entidad Zacatecas, se encuentran reunidos el/la C. Arg. Diego Carlos Avila Ramirez, quien ostenta el cargo de Brace PDU en calidad de la instancia ejecutora, así como el Comité de participación social integrado por el/la C. Anayeli Paloma Redique, el/la C. Lidia Chavez, el/la C. Alyndra Macias, el/la C. Uela de Jesus Rodriguez, y el/la C. \_\_\_\_\_ para celebrar la entrega-recepción de la obra: \_\_\_\_\_, conforme a lo acordado en sus especificaciones técnicas y legales, que se describen a continuación.

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	<u>Comité para en la calle campo deportivo de la zap 0371 de la localidad de Nochistlan de Hija, Mpio de Nochistlan de Hija Zac</u>	
Número de folio	<u>404004</u>	
Dirección o ubicación	<u>Calle Campo deportivo</u>	
Municipio	<u>Nochistlan</u>	
Localidad	<u>Nochistlan</u>	
Entidad	<u>Zacatecas</u>	
Monto invertido	<u>\$ 1 667, 134.32</u>	
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) <u>28 Feb 2024</u>	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa) <u>07 Mayo 2024</u>

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y los y las integrantes del Comité de participación social responsables, y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra queda terminada conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.

No habiendo otro asunto a tratar, se da por terminada la entrega-recepción, siendo las 5:00 horas del día 28 Mayo citado, levantando para evidencia de este acuerdo presente, donde firman de conformidad las partes.



0042

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





**ENTREGAN POR PARTE DEL MUNICIPIO (Nombre del municipio)**

**Persona Funcionaria Pública**  
(Nombre completo, cargo y firma)

**RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

**Presidente(a) del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

Lidia Chavez


**Secretario(a) del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

Isela de Jesús Rodríguez García

**Vocal del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

**Vocal del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)

**Vocal del Comité de  
Participación Social**  
(Nombre completo y firma)



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

0043





"2024, Año de la paz en Zacatecas"

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
NO. OFICIO	77
ASUNTO:	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

**C. MAGDALENA MARTÍNEZ MELENDREZ**  
 DOMICILIO: LA CIENEGUITA NO.3  
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

En virtud de haber cumplido adecuadamente las disposiciones legales y vigentes contenidos en el Artículo 64, de la Ley de Ingresos Municipales para el año 2024, esta Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, a mi cargo, le autoriza: **"PERMISO DE CONSTRUCCIÓN" DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS;** según contrato con el H. Ayuntamiento de este municipio.

Es facultad de esta dependencia conforme a lo establecido en la Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas y Municipios en el artículo 36 fracción II art. 103, 104, 105, 106 y las Normas de Seguridad para la Población Laboral emitidas por STPS ejecutar dichas acciones.

Así mismo se le notifica que:

- ◆ Está prohibido conectar las aguas pluviales a la línea de drenaje.
- ◆ No deberá dejar escombros o material obstruyendo la vía pública.


**Nota:** deberá de sujetarse a la construcción del proyecto que ampara su contrato NO. NOCHIS/FONDOIII/2024/06 con el H. Ayuntamiento, además tiene la obligación de notificar la terminación de la obra.

Se extiende la presente a solicitud del interesado para los usos y fines legales que al mismo convengan, en la ciudad de **Nochistlán de Mejía, Estado de Zacatecas, a 22 de marzo de 2024.**

ATENTAMENTE  
 ENCARGADO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MPALES.



**C. SERGIO HINOJOSA PÉREZ**



c.c.p. LIC. ROCIO ROQUE GÓMEZ, Tesorera Municipal Presidencia Municipal. - Para su conocimiento y fines de pago.  
 c.c.p. ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA. - Director de Desarrollo Económico y Social. - para su conocimiento.  
 c.c.p. El Archivo.

0044



## ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA COMUNIDAD

FECHA: 23-feb-24

COMUNIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJIA DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACIÓN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: \_\_\_\_\_

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS


POR LA ENTIDAD EJECUTORA

*Anayely Paloma Rodriguez Rodriguez*  
Anayely Paloma Rodriguez Rodriguez

*Manuel Jimenez Fuentes*  
C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



0045



## VALIDACIÓN O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCIÓN, COMPROMETIÉNDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS POSIBILIDADES

POR LA DEPENDENCIA O  
NORMATIVA



**DESARROLLO**  
**ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA**  
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

POR LA DEPENDENCIA  
O ENTIDAD EJECUTORA



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES**  
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.  
PRESIDENTE MPAL.


LUGAR: NOCHISTLAN ,ZAC.

FECHA: 23/02/2024

INFORMACIÓN ADICIONAL: \_\_\_\_\_

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



0046





**NOCHISTLÁN**  
**De Mejía**  
**PUEBLO MÁGICO**

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 23 DE FEBRERO DEL 2024  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

C.ANGELICA RUANO AVILA.  
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2024/06 CONSISTENTE; PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PARA LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 28 DE FEBRERO DEL 2023 A LAS 15:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL .

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.



DESARROLLO  
ECONOMICO Y SOCIAL  
NOCHISTLÁN DE MEJIA ZAC.  
2024-2024  
ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0047

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

Ubicación: , NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS,

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
-------	-------------	--------	----------

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

**PREELIMINARES**

010706	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano	m2	1,208.13
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperacion de material incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.	m3	153.00
P-03	Demolicion de concreto simple de 15 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaleos	m2	143.14

**IMPORTE DE PREELIMINARES**

**TERRACERIAS**

TEMP*3	Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (mtoniveladora) conciderando afine de la superficie y dejando pendientes deacuerdo al proyecto	m3	703.57
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	703.57
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	m3/km	1,407.14

**IMPORTE DE TERRACERIAS**

**SUB-BASE Y BASE**

METAC-0002	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y materal petro (40% material de banco - 60% material petreo).	m3	362.44
METAC-0002-1	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base compactada al 100 % utilizando material de banco y materal petro (50% material de banco - 50% material petreo)	m3	240.71

**IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE**

**GUARNICION - BANQUETA - CONCRETO**

GURN-001	Guarnición de Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. armada con 2.00 varillas del # 3 y Estribos del # 2.5 @ 0.30 mts , sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 20 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentacion de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	133.00
BAS-BANQ-01	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base para banquetas compactada con vibrocompactadora (ballarina) al 100% utilizando material de banco (tepetate)	m3	52.80
170715	Banqueta de Concreto f'c=f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66 -1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	176.00

**OPERADO**  
 FALSAMENTE  
**EJERCICIO 2024**

0048

Ing. Diego Alejandro Mercado Quezada  
 Dir. Desarrollo Ecoomico y Social





**NOCHISTLÁN**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.



Ubicación: , NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS,

Página: 2/2


**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	1,208.13

**IMPORTE DE GUARNICION - BANQUETA - CONCRETO**

**IMPORTE DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO**



0049





**NOCHISTLÁN**  
 De Mejía  
PUEBLO MÁGICO

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 23 DE FEBRERO DEL 2024  
 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2024/06 CONSISTENTE; PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PARA LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 28 DE FEBRERO DEL 2023 A LAS 15:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL .

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.



DESARROLLO  
 ECONOMICO Y SOCIAL  
 ANDRÉS MERCADO QUEZADA  
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.  
 DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.

OPERADO  
 FAISM ( FIII )  
 EJERCICIO 2024

0050



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.



Ubicación: , NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS,

Página: 1/2

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
-------	-------------	--------	----------

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

**PRELIMINARES**

010706	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano	m2	1,208.13
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperacion de material incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.	m3	153.00
P-03	Demolicion de concreto simple de 15 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaleos	m2	143.14

**IMPORTE DE PRELIMINARES**

**TERRACERIAS**

TEMP*3	Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (mtoniveladora) conciderando afine de la superficie y dejando pendientes deacuerdo al proyecto	m3	703.57
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	703.57
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	m3/km	1,407.14

**IMPORTE DE TERRACERIAS**

**SUB-BASE Y BASE**

METAC-0002	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y materal petro (40% material de banco - 60% material petreo).	m3	362.44
METAC-0002-1	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base compactada al 100 % utilizando material de banco y materal petro (50% material de banco - 50% material petreo)	m3	240.71

**IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE**

**GUARNICION - BANQUETA - CONCRETO**

GURN-001	Guarnición de Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. armada con 2.00 varillas del # 3 y Estribos del # 2.5 @ 0.30 mts , sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 20 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentacion de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	133.00
BAS-BANQ-01	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base para banquetas compactada con vibrocompactadora (bailarina) al 100% utilizando material de banco (tepetate)	m3	52.80
170715	Banqueta de Concreto f'c=f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66 -1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	176.00



0051





DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.



Ubicación: , NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS,

Página: 2/2


**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	1,208.13

**IMPORTE DE GUARNICION - BANQUETA - CONCRETO**

**IMPORTE DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO**



0052

Ing. Diego Alejandro Mercado Quezada  
Dir. Desarrollo Economico y Social





**NOCHISTLÁN**  
De Mejía  
PUEBLO MÁGICO

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 23 DE FEBRERO DEL 2024  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

C.MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2024/06 CONSISTENTE; PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PARA LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 28 DE FEBRERO DEL 2023 A LAS 15:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL .

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.



DESARROLLO  
ECONOMICO Y SOCIAL  
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA  
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.  
2021 - 2024

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0053



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.



Ubicación: , NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS,

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
-------	-------------	--------	----------

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

**PREELIMINARES**

010706	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano	m2	1,208.13
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperacion de material incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.	m3	153.00
P-03	Demolicion de concreto simple de 15 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaleos	m2	143.14

**IMPORTE DE PREELIMINARES**

**TERRACERIAS**

TEMP*3	Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (mtoniveladora) conciderando afine de la superficie y dejando pendientes deacuerdo al proyecto	m3	703.57
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	703.57
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	m3/km	1,407.14

**IMPORTE DE TERRACERIAS**


**SUB-BASE Y BASE**

METAC-0002	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y materal petro (40% material de banco - 60% material petreo).	m3	362.44
METAC-0002-1	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base compactada al 100 % utilizando material de banco y materal petro (50% material de banco - 50% material petreo)	m3	240.71

**IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE**

**GUARNICION - BANQUETA - CONCRETO**

GURN-001	Guarnición de Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. armada con 2.00 varillas del # 3 y Estribos del # 2.5 @ 0.30 mts , sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 20 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentacion de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	133.00
BAS-BANQ-01	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base para banquetas compactada con vibrocompactadora (bailarina) al 100% utilizando material de banco (tepetate)	m3	52.80
170715	Banqueta de Concreto f'c=f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66 -1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	176.00



Ing. Diego Alejandro Mercado Quezada  
Dir. Desarrollo Económico y Social





DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.



Ubicación: , NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS,

Página: 2/2

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	1,208.13

**IMPORTE DE GUARNICION - BANQUETA - CONCRETO**

**IMPORTE DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO**



0055

Ing. Diego Alejandro Mercado Quezada  
Dir. Desarrollo Económico y Social



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
PRESENTE

ACEPTACION A PARTICIPAR

POR MEDIO DEL PRESENTE Y DERIVADO DE LA INVITACION A PARTICIPAR EN LA OBRA:  
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371  
DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE  
MEJIA, ZACATECAS" LA REPRESENTADA CONYMAG SA DE CV POR LO QUE SUSCRIBE EL C. JOSE  
RODRIGO GARCIA GUTIERREZ Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

"ACEPTO PARTICIPAR EN LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO  
DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS, DEL  
MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS"

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL Y RESPETUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE



C. ANGELICA RUANO AVILA



0056

27 DE FEBRERO DEL 2024 NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.  
Angelica Ruano Avila

 **RJAA880710506**  
16 de Septiembre 166  
Centro Localidad Daniel Camarena  
Nochistlán de Mejía, Zac.  
México C.P.99914

 CEL. 346 101 2142

 @j\_melendrez@hotmail.com

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
PRESENTE

CONOCIMIENTO DEL SITIO

POR MEDIO DEL PRESENTE Y DERIVADO DE LA INVITACION A PARTICIPAR EN LA OBRA:  
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371  
DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE  
MEJIA, ZACATECAS" LA REPRESENTADA CONY MAG SA DE CV POR LO QUE SUSCRIBE EL C. JOSE  
RODRIGO GARCIA GUTIERREZ Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

"CONOZCO EL LUGAR DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS DE DICHA OBRA, ASI COMO  
SUS CONDICIONES TOPOGRAFICAS, DE SUELOS Y MEDIO AMBIENTE"


SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL Y RESPETUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE



C. ANGELICA RUANO AVILA

27 DE FEBRERO DEL 2024 NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.



0057



Angélica Ruano Avila

RUA880710506

16 de Septiembre 166  
Centro Localidad Daniel Camarena  
Nochistlán de Mejía, Zac.  
México C.P.99914



CEL. 346 101 2142




j\_melendrez@hotmail.com



**PRESUPUESTO DE OBRA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
010706	Trazo y nivelación con aparatos topograficos en terreno plano. (*DIEZ PESOS 27/100 MXN*)	m2	1,208.13	10.27	12,407.50
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperacion de material, incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts. (*VEINTITRÉS PESOS 78/100 MXN*)	m3	153.00	23.78	3,638.34
P-03	Demolicion de concreto simple de 15 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaleos. (*SESENTA Y SIETE PESOS 99/100 MXN*)	m2	143.14	67.99	9,732.09
<b>IMPORTE DE PRELIMINARES</b>					<b>25,777.93</b>
<b>TERRACERIAS</b>					
TEMP*3	Excavación en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo a proyecto. (*NOVENTA Y CUATRO PESOS 11/100 MXN*)	m3	703.57	94.11	66,212.97
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terracería, carga con máquina. (*CIENTO CINCUENTA PESOS 01/100 MXN*)	m3	703.57	150.01	105,542.54
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsecuentes se consideran (2 km). (*QUINCE PESOS 17/100 MXN*)	m3/Km	1,407.14	15.17	21,346.31
<b>IMPORTE DE TERRACERIAS</b>					<b>193,101.82</b>
<b>SUB-BASE Y BASE</b>					
METAC-0002	Mezclado tendido y compactación de la construcción de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material pétreo (40% tepetate - 60% cascajo) (*CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 12/100 MXN*)	m3	362.44	481.12	174,377.13
METAC-0002-1	Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % , utilizando material de banco y material petreo (60% tepetate - 40% cascajo)	m3	241.69	462.03	111,640.31

C. ANGELICA RUANO AVILA  
REPRESENTANTE LEGAL



**Angélica Ruano Avila**  
RURR880710506  
16 de Septiembre 166  
Centro Localidad Daniel Camarena  
Nochistlán de Mejía, Zac.  
México C.P.99914

CEL. 346 101 2142

@ j.melendrez@hotmail.com



**PRESUPUESTO DE OBRA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

(\*CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 03/100 MXN\*)

**IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE**

**286,017.44**

**GUARNICIÓN-BANQUETAS- CONCRETO**

170701	Guarnicion de concreto f'c=150 kg/cm2 agregado de 20 mm cemento normal revenimiento 8 a 10 cm, sección Trapezoidal de 0.15 x 0.20 x 0.40 armada con dos varillas de 3/8" y grapas de alambreon de 1/4 a cada 30 cm ,cimbra comun a 20 usos, incluye: Pintura para tráfico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	133.00	508.28	67,601.24
--------	--	---	--------	--------	-----------

(\*QUINIENTOS OCHO PESOS 28/100 MXN\*)

BAS-BANQ-01	Mezclado tendido y compactación de la construccion de base para banquetas compactada con bailarina al 95 % utilizando material de banco (tepetate)	m3	52.80	263.03	13,887.98
-------------	--	----	-------	--------	-----------

(\*DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 03/100 MXN\*)

170715	Banqueta de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts. Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	176.00	470.47	82,802.72
--------	---	----	--------	--------	-----------

(\*CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 47/100 MXN\*)

030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	1,208.13	689.77	833,331.83
--------	---	----	----------	--------	------------

(\*SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 77/100 MXN\*)

**IMPORTE DE GUARNICIÓN-BANQUETAS- CONCRETO**

**997,623.77**

**IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.**

**1,502,520.96**

**SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO**


**1,502,520.96**

(\*UN MILLÓN QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 96/100 MXN\*)

**IVA (16.00%)**

**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO**

(\*UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 31/100 MXN\*)



C. ANGELICA RUANO AVILA  
REPRESENTANTE LEGAL

**Angélica Ruano Avila**  
RURAB80710506  
16 de Septiembre 166  
Centro Localidad Daniel Camarena  
Nochistlán de Mejía, Zac.  
México C.P.99914

0059  
CEL. 346 101 2142  
@ j.melendrez@hotmail.com

ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA




ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
PRESENTE

ACEPTACION A PARTICIPAR

POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE EL CONTRATISTA DENOMINADO ING. ELIAS MACIAS LEDESMA, ACEPTA PARTICIPAR EN LA ADJUDICACION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS" POR LO QUE PRESENTAMOS NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA.


SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL Y RESPETUOSO SALUDO.



ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.  
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"

27 DE FEBRERO DEL 2024 NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

c.c.p. PARA ARCHIVO.



0060

ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA


**MACMAR**  
ING. ENGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA  
C.F. 346-100-8045 "MACIAS - MARTINEZ"  
CORREO: ing\_maciasledesma@live.com  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PRESENTE

CONOCIMIENTO DEL SITIO

POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE EL CONTRATISTA DENOMINADO ING. ELIAS MACIAS LEDESMA, CONOCE PLENAMENTE EL SITIO DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS" POR LO QUE SE ACEPTAN LOS ALCANCES Y LIMITACIONES GEOGRAFICAS DEL LUGAR.


SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL Y RESPETUOSO SALUDO.



ING.ELIAS MACIAS LEDESMA.  
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"

27 DE FEBRERO DEL 2024 NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

c.c.p. PARA ARCHIVO.



0061



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.  
 LOCALIDAD: NOCHISTLÁN  
 MUNICIPIO: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.



**PRESUPUESTO DE OBRA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
010706	Trazo y nivelación con aparatos topograficos en terreno plano.	m2	1,208.13	10.01	12,093.38
(*DIEZ PESOS 01/100 MXN*)					
(*DOCE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 38/100 MXN*)					
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperacion de material, incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.	m3	153.00	23.17	3,545.01
(*VEINTITRÉS PESOS 17/100 MXN*)					
(*TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 01/100 MXN*)					
P-03	Demolicion de concreto simple de 15 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaleos.	m2	143.14	66.23	9,480.16
(*SESENTA Y SEIS PESOS 23/100 MXN*)					
(*NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 16/100 MXN*)					
<b>IMPORTE DE PRELIMINARES</b>					<b>25,118.55</b>
<b>TERRACERIAS</b>					
TEMP*3	Excavación en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo a proyecto.	m3	703.57	91.64	64,475.15
(*NOVENTA Y UN PESOS 64/100 MXN*)					
(*SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 15/100 MXN*)					
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	m3	703.57	146.08	102,777.51
(*CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 08/100 MXN*)					
(*CIENTO DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 51/100 MXN*)					
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsecuentes se consideran (2 km).	m3/Km	1,407.14	14.77	20,783.46
(*CATORCE PESOS 77/100 MXN*)					
(*VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 46/100 MXN*)					
<b>IMPORTE DE TERRACERIAS</b>					<b>188,036.12</b>
<b>SUB-BASE Y BASE</b>					
METAC-0002	Mezclado tendido y compactación de la construcción de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material pétreo (40% tepetate - 60% cascajo)	m3	362.44	468.57	169,828.51

*[Firma]*  
 ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA  
 REPRESENTANTE LEGAL

**OPERADO**  
 FAISM (FIII)  
 EJERCICIO 2024  
 0062


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.  
 LOCALIDAD: NOCHISTLÁN  
 MUNICIPIO: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.



**PRESUPUESTO DE OBRA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
(*CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 57/100 MXN*)					
(*CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 51/100 MXN*)					
METAC-0002-1	Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % , utilizando material de banco y material petreo (60% tepetate - 40% cascajo)	m3	241.63	449.97	108,726.25
(*CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 97/100 MXN*)					
(*CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 25/100 MXN*)					
<b>IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE</b>					<b>278,554.76</b>
<b>GUARNICIÓN-BANQUETAS- CONCRETO</b>					
170701	Guarnicion de concreto f'c=150 kg/cm2 agregado de 20 mm cemento normal revenimiento 8 a 10 cm, sección Trapezoidal de 0.15 x 0.20 x 0.40 armada con dos varillas de 3/8" y grapas de alambreon de 1/4 a cada 30 cm ,cimbra comun a 20 usos, incluye: Pintura para tráfico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	133.00	495.02	65,837.66
(*CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN*)					
(*SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 66/100 MXN*)					
BAS-BANQ-01	Mezclado tendido y compactación de la construccion de base para banquetas compactada con bailarina al 95 % utilizando material de banco (tepetate)	m3	52.80	256.18	13,526.30
(*DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 18/100 MXN*)					
(*TRECE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS 30/100 MXN*)					
170715	Banqueta de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	176.00	458.22	80,646.72
(*CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 22/100 MXN*)					
(*OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 72/100 MXN*)					
030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	1,208.13	671.78	811,597.57
(*SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 78/100 MXN*)					
(*OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 57/100 MXN*)					
<b>IMPORTE DE GUARNICIÓN-BANQUETAS- CONCRETO</b>					<b>71,608.25</b>
<b>IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.</b>					<b>1,463,317.68</b>

ING. ELIAS MACÍAS LEDESMA  
 REPRESENTANTE LEGAL



0063

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.  
LOCALIDAD: NOCHISTLÁN  
MUNICIPIO: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.



**PRESUPUESTO DE OBRA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>1,463,317.68</b>
(*UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 68/100 MXN*)					
	<b>IVA (16.00%)</b>				<b>234,130.83</b>
	<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>				<b>1,697,448.51</b>
(*UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 51/100 MXN*)					



  
ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.  
REPRESENTANTE LEGAL





**NOCHISTLÁN**  
De Mejía  
PUEBLO MÁGICO

# ACUERDO DE MODALIDAD DE EJECUCION.

**MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA.**

**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.**

**CONTRATO # NOCHIS/FONDOIII/2024/06**

PARA DAR ATENCION AL ARTICULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y DE ACUERDO A LOS MONTOS SEÑALADOS ESPECIFICAMENTE EN EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS , EL PRESENTE CONTRATO CONSISTENTE EN; PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS CONTRATO BAJO EL ESQUEMA DE ADJUDICACION DIRECTA A LA C.MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ, SIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA MAS FACTIBLE PARA EL MUNICIPIO Y LOS INTERESSES DEL MISMO.

SE EXTIENDE LAS PRESENTE DE LA PARTE NORMATIVA PARA LOS USOS Y FINES LEGALES , EN LA CIUDAD DE NOCHISTLAN ZACATECAS 28 DE FEBRERO DEL 2024.



**DESARROLLO  
ECONOMICO Y SOCIAL**

**ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA**  
2021 - 2024

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0055

# CONTRATO

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

CTO.  
NO.NOCHIS/FONDOIII/2024/06  
R.F.C.MNM850101AC3

*Manuel Jimenez*

## DECLARACIONES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. A TRAVES DE EL PRESIDENTE MUNICIPAL; EL SINDICO; EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; A TRAVES DE SUS TITULARES LOS C.JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL;C.LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ, SINDICO MUNICIPAL ;ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO , Y POR LA OTRA: LA C.MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ, A QUIEN SE DENOMINARA EL CONTRATISTA, SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

### PRIMERA.- EL MUNICIPIO DECLARA:

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUBRIRAN CON RECURSOS DEL FONDO III.

1.2.-QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO # 1 ZONA CENTRO DE , NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.


1.3.- QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ POR: ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

### SEGUNDA.- LA CONTRATISTA DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

II.1 QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS NECESARIAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DENTRO DE SUS OBJETIVOS COMPRENDE: LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

II.2- QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

*Magdalena Martinez Melendez*



0066



II.3.- QUE HA VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO EN QUE HABRÁN DE EJECUTARSE LAS OBRAS, PARA OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

II.4.- QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE 48 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. EL REGLAMENTO DE LA LEY DE QUE SE INVOCA, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, QUE SE SEGUIRÁN APLICANDO, EN TODO LO QUE NO SE OPGA A LA LEY QUE SE INVOCA Y SU REGLAMENTO Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA DEL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS. LOS ANEXOS, (PROYECTO, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O PARTICULARES EN LA CONSTRUCCIÓN, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES), QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y LAS DEMÁS NORMAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LOS TRABAJOS.

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: **CALLE LA CIENEGUITA #3 NOCHISTLAN DE MEJIA C.P 99900.**, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.6.- SER UNA EMPRESA MEXICANA LO CUAL ACREDITA CON RFC: **MAMM880814NIA.**

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.-** "EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.. Y ESTA SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SEÑALAN EN ESTE CONTRATO, ASÍ COMO DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" DISPONDRÁ DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO III .

**SEGUNDA: TIPO DE ADJUDICACIÓN.-** CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 EN RELACIÓN EL 46 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.", LA ASIGNACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" A "EL CONTRATISTA" FUE MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA.

**TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.-** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL MONTO QUE SE CUBRIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, POR LA CANTIDAD DE \$1,667,134.32 (UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 32/100), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MONTO QUE SOLO PODRÁ SER MODIFICADO CUANDO EXISTAN RAZONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLÍCITAS, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS

EJERCICIO 2024

0067

*Mamm 880814NIA*

*Seley*

*Agdalena Martinez Zapateca*



SEÑALADOS POR EL ARTICULO 128 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.


**CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN.-** "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2024, PARA CONCLUIRLA EN SU TOTALIDAD EL DÍA 28 DE MAYO DE 2024, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA EN EL SUPUESTO DE RETRASO SE ESTARÁ A LO QUE SE ESTABLECE SI EL CONTRATISTA ADVIERTE QUE NO ES POSIBLE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A ÉL, DEBERÁ NOTIFICARLO, MEDIANTE LA BITÁCORA, AL ENTE PÚBLICO EJECUTOR, PRESENTANDO SU SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL PLAZO Y LA DOCUMENTACIÓN QUE LO JUSTIFIQUE. EL ENTE PÚBLICO DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, EMITIRÁ EL DICTAMEN DE RESOLUCIÓN, DE NO HACERLO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR NO ACEPTADA. EL CONVENIO, EN SU CASO, DEBERÁ FORMALIZARSE DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A UNO U OTRO SUCESO SEÑALADO EN EL ARTICULO 130 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

**QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-** "EL MUNICIPIO" SE OBLIGA DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS., A ENTREGAR AL CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CON OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA; EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", PRORROGARÁ EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SITUACIÓN QUE QUEDARÁ DE MANIFIESTO EN UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN.

**SEXTA: ANTICIPOS.-** SIN ANTICIPO

**SEPTIMA.-** "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASÍ MISMO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO" EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SU REPRESENTANTE LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA QUE PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA.

**OCTAVA: FORMA DE PAGO.-** LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARQUEN COMO MÁXIMO PERIODOS MENSUALES, ESTIMACIONES QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ÉSTAS, LAS QUE SERÁN QUINCE Y ÚLTIMO DE CADA MES, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EL LUGAR DE PAGO SERÁ EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.





"EL CONTRATISTA" SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE "EL MUNICIPIO" TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.


CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN, EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARÁ EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA, A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERÁ APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE "EL MUNICIPIO", INDEPENDIEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.4 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE "EL MUNICIPIO", ÉSTE PODRÁ ORDENAR SU DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO EN ESTE CASO, "EL MUNICIPIO", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, "EL MUNICIPIO", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA".



Margarita Quintana

C

Silvia

Margdalena Martinez Melendrez



TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTA DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO".

**NOVENA: GARANTIAS.-** "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS., Y SU REGLAMENTO VIGENTE, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO ASÍ MISMO AL CONTRATISTA AL MOMENTO DE LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA ENTREGARÁ A "EL MUNICIPIO" UNA PÓLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE INCURRA, LO ANTERIOR CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TÉRMINOS LEGALES DEL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

**DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-** LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. SU REGLAMENTO VIGENTE, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE "EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA" EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. "EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

**DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.-** "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER EN TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL MUNICIPIO" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO. POR LO ANTERIOR EXPUESTO, PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS LA EMPRESA CONTRATISTA SE COMPROMETE Y OBLIGA QUE TODO EL PERSONAL QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN LA OBRA DEBERÁ CONTAR CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE CONSISTIRÁ EN UNIFORMES, BOTAS, GUANTES CASCO DE PROTECCIÓN, Y TODOS AQUELLOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU SEGURIDAD, TODO ELLO EN APEGO A LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS QUE SE DESARROLLAN, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE, ASÍ COMO LO ORDENA LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-113 STPS-2009, SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN DE PERSONAL CALZADO DE PROTECCIÓN -CLASIFICACIÓN ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.

**DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA.-** "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN EN SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGOS DE LOS EFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR NOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS. IGUALMENTE SE OBLIGA

EJERCICIO 2024

*Manuel Jimenez*

*C*

*Zelux*

*Magdalena Markinez Melendrez*  
0070



AL CONTRATISTA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS Ó MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO" EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

**DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.-** "EL MUNICIPIO" TENDRÁN LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS ESTÁN SIENDO EJECUTADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA. "EL MUNICIPIO" APLICARÁ COMO SANCIÓN EL 5 % DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBÍA DE EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA AL TÉRMINO DE LA OBRA, APLICÁNDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL MUNICIPIO" COMO PENA CONVENCIONAL.

**DECIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-** "EL MUNICIPIO" PODRÁN SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LA CUAL HARÁ LA COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.


**DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-** "EL MUNICIPIO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS., SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL MUNICIPIO" ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO.

**DECIMAM SEXTA.-** LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

**DECIMA SEPTIMA.-** PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN DE LA CIUDAD DE ZACATECAS POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE NOCHISTLAN, ZAC. EN ORIGINAL EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2023.



*Munifajing*

*C*

*Silva*

*Magdalena Martinez Melendez*

0071

"EL CONTRATISTA"

Magdalena Martinez  
Melendrez

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.

"EL MUNICIPIO"

POR SINDICATURA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ



C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.



0072





# MELENDREZ CONSTRUCCIONES



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
PRESENTE


26 DE FEBRERO DEL 2024

POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA EXPRESAR MI INTERES DE PARTICIPAR EN EL EJERCICIO DE ADJUDICACION PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS"  
POR LO QUE ANEXO MI PRESUPUESTO.

ATENTAMENTE


*Magdalena Martinez  
Melendrez*

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.



0073

CALLE LA CIENEGUITA #3 A , VELADORES, C.P. 99900, NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS, MX



# MELENDREZ CONSTRUCCIONES

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
PRESENTE

26 DE FEBRERO DEL 2024

POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA INFORMARLE QUE CONOZCO EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS"

ATENTAMENTE


*Magdalena Martinez  
Melendrez*

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

OPERADO  
FAISM (FIII)  
EJERCICIO 2024

0074

CALLE LA CIENEGUITA #3 A , VELADORES, C.P. 99900, NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS, MX.





OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

**MELENDREZ CONSTRUCCIONES**



**PRESUPUESTO DE OBRA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.**

**PRELIMINARES**

010706	Trazo y nivelación con aparatos topograficos en terreno plano.	m2	1,208.13	9.83	11,875.92
--------	--	----	----------	------	-----------

(\*NUEVE PESOS 83/100 MXN\*)

(\*ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 92/100 MXN\*)

RETA-01	Retiro de empedrado con recuperacion de material, incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.	m3	153.00	22.75	3,480.75
---------	---	----	--------	-------	----------

(\*VEINTIDOS PESOS 75/100 MXN\*)

(\*TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 75/100 MXN\*)

P-03	Demolicion de concreto simple de 15 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaleos.	m2	143.14	65.04	9,309.83
------	--	----	--------	-------	----------

(\*SESENTA Y CINCO PESOS 04/100 MXN\*)

(\*NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 83/100 MXN\*)

**IMPORTE DE PRELIMINARES**

**24,666.50**

**TERRACERIAS**

TEMP*3	Excavación en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo a proyecto.	m3	703.57	90.01	63,328.34
--------	--	----	--------	-------	-----------

(\*NOVENTA PESOS 01/100 MXN\*)

(\*SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 34/100 MXN\*)

010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	m3	703.57	143.48	100,948.22
--------	---	----	--------	--------	------------

(\*CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 48/100 MXN\*)

(\*CIEN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 22/100 MXN\*)

ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsecuentes se consideran (2 km).	m3/Km	1,407.14	14.51	20,417.60
---------	--	-------	----------	-------	-----------

(\*CATORCE PESOS 51/100 MXN\*)

(\*VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 MXN\*)

**IMPORTE DE TERRACERIAS**

**184,694.16**

**SUB-BASE Y BASE**

METAC-0002	Mezclado tendido y compactación de la construcción de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material pétreo (40% tepetate - 60% cascajo)	m3	362.44	460.21	166,798.51
------------	--	----	--------	--------	------------

(\*CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 21/100 MXN\*)

(\*CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 51/100 MXN\*)

**OPERADO**

362.44      460.21      166,798.51

**FAISM (FIII)**

**EJERCICIO 2024**

*Magdalena Martinez Melendrez*

0075

**C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.  
REPRESENTANTE LEGAL**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  
EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA  
ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN,  
MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,  
ZACATECAS.

**MELENDREZ CONSTRUCCIONES**



**PRESUPUESTO DE OBRA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
METAC-0002-1	Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % , utilizando material de banco y material petreo (60% tepetate - 40% cascajo)	m3	241.63	441.94	106,785.96
(*CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 94/100 MXN*)					
(*CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 96/100 MXN*)					

**IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE 273,584.47**

**GUARNICIÓN-BANQUETAS- CONCRETO**

170701	Guarnicion de concreto f'c=150 kg/cm2 agregado de 20 mm cemento normal revenimiento 8 a 10 cm, sección Trapezoidal de 0.15 x 0.20 x 0.40 armada con dos varillas de 3/8" y grapas de alambreon de 1/4 a cada 30 cm ,cimbra comun a 20 usos, incluye: Pintura para tráfico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	133.00	486.18	64,661.94
--------	--	---	--------	--------	-----------

(\*CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 18/100 MXN\*)  
(\*SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 94/100 MXN\*)

BAS-BANQ-01	Mezclado tendido y compactación de la construcción de base para banquetas compactada con bailarina al 95 % utilizando material de banco (tepetate)	m3	52.80	251.60	13,284.48
-------------	--	----	-------	--------	-----------

(\*DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 60/100 MXN\*)  
(\*TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 48/100 MXN\*)

170715	Banqueta de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	176.00	450.03	79,205.28
--------	---	----	--------	--------	-----------

(\*CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 03/100 MXN\*)  
(\*SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 28/100 MXN\*)

030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	1,208.13	659.77	797,087.93
--------	---	----	----------	--------	------------

(\*SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 77/100 MXN\*)  
(\*SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 MXN\*)

**IMPORTE DE GUARNICIÓN-BANQUETAS- CONCRETO 954,239.63**


**IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS. 1,437,184.76**

**SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO 1,437,184.76**

(\*UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 76/100 MXN\*)

**IVA (16.00%)**

0076  
229,949.56



Magdalena Martinez  
Melendrez  
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.  
REPRESENTANTE LEGAL



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  
EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA  
ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN,  
MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,  
ZACATECAS.


**MELENDREZ CONSTRUCCIONES**



**PRESUPUESTO DE OBRA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>1,667,134.32</b>

(\*UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 32/100 MXN\*)



*Magdalena Martinez Melendrez*  
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.  
REPRESENTANTE LEGAL

0077



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  
EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA  
ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN,  
MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,  
ZACATECAS.

**MELENDREZ CONSTRUCCIONES**



**Análisis de precios unitarios**

Clave: 010706

Unidad: m2

Trazo y nivelación con aparatos topograficos en terreno plano.

Cantidad: 1,208.13

Precio unitario: 9.83

Total 11,875.92

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
<b>Materiales</b>						
	MAG-008	Calhidra (en la compra mínima de 5 ton).	ton	0.000500	3,600.00	1.80
	ACCH-002	Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 ( 3/8") fyp = 4200 kg/cm2 marca Hylsa	kg	0.050000	24.00	1.20
	MAG-011	Hilo cáñamo o de plástico presentación en rollo de 300 mts.	pza	0.003333	31.25	0.10
<b>Total de Materiales</b>						<b>3.10</b>
<b>Mano de Obra</b>						
	+ MOCU-020	Cuadrilla No 20 (1 Topografo + 1 Cadenero)	jor	0.003333	1,411.86	4.71
<b>Total de Mano de Obra</b>						<b>4.71</b>
<b>Herramienta</b>						
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	4.71	0.14
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	4.71	0.09
<b>Total de Herramienta</b>						<b>0.23</b>
<b>Equipo</b>						
	H AMAPE-328	Transito eléctrico marca Leica Wild, modelo T-1000. Incluye topografo y estadalero.	hora	0.020000	3.83	0.08
<b>Total de Equipo</b>						<b>0.08</b>
<b>Costo directo</b>						<b>8.12</b>
<b>Indirectos de oficina</b>					<b>5.0000%</b>	<b>0.41</b>
<b>Indirectos de campo</b>					<b>5.0000%</b>	<b>0.41</b>
<b>Subtotal</b>						<b>8.94</b>
<b>Financiamiento</b>					<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal</b>						<b>8.94</b>
<b>Utilidad</b>					<b>10.0000%</b>	<b>0.89</b>
<b>Subtotal</b>						<b>9.83</b>
<b>Cargos adicionales</b>					<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal</b>						<b>9.83</b>
<b>Otro porcentaje</b>					<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>
<b>Precio unitario</b>						<b>9.83</b>
<b>IVA (16.00%)</b>						<b>1.57</b>
<b>Total</b>						<b>11.40</b>

(\* ONCE PESOS 40/100 MXN \*)

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2024

Magdalena Martinez 0078  
Melendrez

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.  
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  
 EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA  
 ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN,  
 MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,  
 ZACATECAS.

**MELENDREZ CONSTRUCCIONES**



**Análisis de precios unitarios**

Clave: RETA-01

Unidad: m3

Retiro de empedrado con recuperacion de material, incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.

Cantidad: 153.00

Precio unitario: 22.75

Total 3,480.75

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
<b>Mano de Obra</b>						
	MOCA-002	Ayudante general	jor	0.016667	387.48	6.46
<b>Total de Mano de Obra</b>						<b>6.46</b>
<b>Herramienta</b>						
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	6.46	0.13
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	6.46	0.19
<b>Total de Herramienta</b>						<b>0.32</b>
<b>Equipo</b>						
H	AMAPE-034	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 450 E 124 H.P	hora	0.022222	540.89	12.02
<b>Total de Equipo</b>						<b>12.02</b>
<b>Costo directo</b>						<b>18.80</b>
<b>Indirectos de oficina</b>					<b>5.0000%</b>	<b>0.94</b>
<b>Indirectos de campo</b>					<b>5.0000%</b>	<b>0.94</b>
<b>Subtotal</b>						<b>20.68</b>
<b>Financiamiento</b>					<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal</b>						<b>20.68</b>
<b>Utilidad</b>					<b>10.0000%</b>	<b>2.07</b>
<b>Subtotal</b>						<b>22.75</b>
<b>Cargos adicionales</b>					<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal</b>						<b>22.75</b>
<b>Otro porcentaje</b>					<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>
<b>Precio unitario</b>						<b>22.75</b>
<b>IVA (16.00%)</b>						<b>3.64</b>
<b>Total</b>						<b>26.39</b>

(\* VEINTISÉIS PESOS 39/100 MXN \*)



Magdalena Martinez  
 Melendrez  
 0079  
 C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.  
 REPRESENTANTE LEGAL



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  
 EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA  
 ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN,  
 MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,  
 ZACATECAS.

**MELENDREZ CONSTRUCCIONES**



**Análisis de precios unitarios**

Clave: P-03

Unidad: m2

Demolición de concreto simple de 15 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaleos.

Cantidad: 143.14

Precio unitario: 65.04

Total 9,309.83

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

**Mano de Obra**

+	MOCU-002	Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón)	jor	0.001673	1,329.07	2.22
---	----------	-------------------------------------	-----	----------	----------	------

**Total de Mano de Obra**

**2.22**

**Herramienta**

	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	2.22	0.07
--	---------	-------------------	-------	----------	------	------

	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	2.22	0.04
--	-----------	-----------------------------------	-------	----------	------	------

**Total de Herramienta**

**0.11**

**Equipo**

H	AMAPE-103	Martillo para retroexcavadora	hora	0.077220	113.67	8.78
---	-----------	-------------------------------	------	----------	--------	------

H	AMAPE-382	Retroexcavadora Case 580N, de 79 H.P., profundidad de excavación 4.5 m, cucharón de 0.96 m3	hora	0.086290	494.17	42.64
---	-----------	---	------	----------	--------	-------

**Total de Equipo**

**51.42**

**Costo directo**

**53.75**

**Indirectos de oficina**

**5.0000%** **2.69**

**Indirectos de campo**

**5.0000%** **2.69**

**Subtotal**

**59.13**

**Financiamiento**

**0.0000%** **0.00**

**Subtotal**

**59.13**

**Utilidad**

**10.0000%** **5.91**

**Subtotal**

**65.04**

**Cargos adicionales**

**0.0000%** **0.00**

**Subtotal**

**65.04**

**Otro porcentaje**

**0.0000%** **0.00**

**Precio unitario**

**65.04**


**IVA (16.00%)**

**10.41**

**Total**

**75.45**

(\* SETENTA Y CINCO PESOS 45/100 MXN \*)



*Magdalena Martinez 0080 Melendrez*

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.  
 REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  
EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA  
ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN,  
MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,  
ZACATECAS.

**MELENDREZ CONSTRUCCIONES**




**Análisis de precios unitarios**

Clave: TEMP\*3 Unidad: m3  
Excavación en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) Cantidad: 703.57  
considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo a proyecto. Precio unitario: 90.01  
Total 63,328.34

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
<b>Mano de Obra</b>						
+	MOCU-002	Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón)	jor	0.011111	1,329.07	14.77
<b>Total de Mano de Obra</b>						<b>14.77</b>
<b>Herramienta</b>						
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	14.77	0.30
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	14.77	0.44
<b>Total de Herramienta</b>						<b>0.74</b>
<b>Equipo</b>						
H	MAQMAR-04	Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion	hora	0.041667	1,413.12	58.88
<b>Total de Equipo</b>						<b>58.88</b>
<b>Costo directo</b>						<b>74.39</b>
<b>Indirectos de oficina</b>					<b>5.0000%</b>	<b>3.72</b>
<b>Indirectos de campo</b>					<b>5.0000%</b>	<b>3.72</b>
<b>Subtotal</b>						<b>81.83</b>
<b>Financiamiento</b>					<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal</b>						<b>81.83</b>
<b>Utilidad</b>					<b>10.0000%</b>	<b>8.18</b>
<b>Subtotal</b>						<b>90.01</b>
<b>Cargos adicionales</b>					<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal</b>						<b>90.01</b>
<b>Otro porcentaje</b>					<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>
<b>Precio unitario</b>						<b>90.01</b>
<b>IVA (16.00%)</b>						<b>14.40</b>
<b>Total</b>						<b>104.41</b>

(\* CIENTO CUATRO PESOS 41/100 MXN \*)



Magdalena Martinez 0081  
Melendrez  
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.  
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  
 EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA  
 ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN,  
 MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,  
 ZACATECAS.

**MELENDREZ CONSTRUCCIONES**



**Análisis de precios unitarios**

Clave: 010818

Unidad: m3

Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terracería, carga con máquina.

Cantidad: 703.58

Precio unitario: 143.48

Total 100,949.66

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
<b>Equipo</b>						
	RETROCAT-32	Retroexcavadora 320D caterpillar de 93 hp de potencia	hr	0.068966	750.00	51.72
<b>Total de Equipo</b>						<b>51.72</b>
<b>Fletes</b>						
	VOLTEO-006	Camion de volteo ford F-600 de 6m3 de capacidad	flete	0.167149	400.00	66.86
<b>Total de Fletes</b>						<b>66.86</b>
<b>Costo directo</b>						<b>118.58</b>
<b>Indirectos de oficina</b>					<b>5.0000%</b>	<b>5.93</b>
<b>Indirectos de campo</b>					<b>5.0000%</b>	<b>5.93</b>
<b>Subtotal</b>						<b>130.44</b>
<b>Financiamiento</b>					<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal</b>						<b>130.44</b>
<b>Utilidad</b>					<b>10.0000%</b>	<b>13.04</b>
<b>Subtotal</b>						<b>143.48</b>
<b>Cargos adicionales</b>					<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal</b>						<b>143.48</b>
<b>Otro porcentaje</b>					<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>
<b>Precio unitario</b>						<b>143.48</b>
<b>IVA (16.00%)</b>						<b>22.96</b>
<b>Total</b>						<b>166.44</b>

(\* CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 44/100 MXN \*)



*Magdalena Martinez Melendrez* 0082

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.  
 REPRESENTANTE LEGAL



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  
 EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA  
 ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN,  
 MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,  
 ZACATECAS.

**MELENDREZ CONSTRUCCIONES**



**Análisis de precios unitarios**

Clave: ACAR-02

Unidad: m3/Km

Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsecuentes se consideran (2 km).

Cantidad: 1,407.14

Precio unitario: 14.51

Total 20,417.60

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

**Equipo**

H	MAQMAR-06	Camión de volteo marca Ford F-600 de 6 m3 de capacidad.	hora	0.027778	431.50	11.99
---	-----------	---	------	----------	--------	-------

**Total de Equipo**

**11.99**

**Costo directo**

**11.99**

**Indirectos de oficina**

**5.0000%**

**0.60**

**Indirectos de campo**

**5.0000%**

**0.60**

**Subtotal**

**13.19**

**Financiamiento**

**0.0000%**

**0.00**

**Subtotal**

**13.19**

**Utilidad**

**10.0000%**

**1.32**

**Subtotal**

**14.51**

**Cargos adicionales**

**0.0000%**

**0.00**

**Subtotal**

**14.51**

**Otro porcentaje**

**0.0000%**

**0.00**

**Precio unitario**

**14.51**

**IVA (16.00%)**

**2.32**

**Total**

**16.83**

(\* DIECISÉIS PESOS 83/100 MXN \*)



Magdalena Martínez Melendrez 0083  
 C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.  
 REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  
EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA  
ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN,  
MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,  
ZACATECAS.

**MELENDREZ CONSTRUCCIONES**



**Análisis de precios unitarios**

Clave: METAC-0002

Unidad: m3

Mezclado tendido y compactación de la construcción de la sub rasante base compactada al 98 %  
utilizando material de banco y material pétreo (40% tepetate - 60% cascajo)

Cantidad: 362.44

Precio unitario: 460.21

Total 166,798.51

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

**Materiales**

	MAG-020	Camion de cascajo de 6 m3	Camión	0.137361	1,350.00	185.44
	AGRE-016	Agua potable	m3	0.137361	100.00	13.74
	MAG-018	Tepetate camión de 6 m3.	camión	0.091574	1,000.00	91.57

**Total de Materiales**

**290.75**

**Mano de Obra**

+	MOCU-002	Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón)	jor	0.010000	1,329.07	13.29
---	----------	-------------------------------------	-----	----------	----------	-------

**Total de Mano de Obra**

**13.29**

**Herramienta**

	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	13.29	0.40
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	13.29	0.27

**Total de Herramienta**

**0.67**

**Equipo**

H	AMAPE-010	Compactador CP 563D, de 153 hp, 11.3 ton, ancho de tambor 2.13 m	hora	0.010000	822.00	8.22
H	AMAPE-173	Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion	hora	0.047694	1,413.12	67.40

**Total de Equipo**

**75.62**

**Costo directo**

**380.33**

**Indirectos de oficina**

**5.0000% 19.02**

**Indirectos de campo**

**5.0000% 19.02**

**Subtotal**

**418.37**

**Financiamiento**

**0.0000% 0.00**

**Subtotal**

**418.37**

**Utilidad**

**10.0000% 41.84**

**Subtotal**

**460.21**

**Cargos adicionales**

**0.0000% 0.00**

**Subtotal**

**460.21**

**Otro porcentaje**

**0.0000% 0.00**

**Precio unitario**

**460.21**


**IVA (16.00%)**

**73.63**

**Total**

**533.84**

(\* QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 84/100 M.M.N. )



Magdalena Martinez Melendrez  
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.  
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

**MELENDREZ CONSTRUCCIONES**



**Análisis de precios unitarios**

Clave: METAC-0002-1 Unidad: m3  
 Cantidad: 241.63  
 Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % , utilizando material de banco y material petreo (60% tepetate - 40% cascajo) Precio unitario: 441.94  
 Total 106,785.96

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
<b>Materiales</b>						
	MAG-020	Camion de cascajo de 6 m3	Camión	0.112145	1,350.00	151.40
	MAG-019	Agua en pipa de 10,000 litros	m3	0.134594	100.00	13.46
	MAG-018	Tepetate camión de 6 m3.	camión	0.112162	1,000.00	112.16
<b>Total de Materiales</b>						<b>277.02</b>
<b>Mano de Obra</b>						
	+ MOCU-002	Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón)	jor	0.010000	1,329.07	13.29
<b>Total de Mano de Obra</b>						<b>13.29</b>
<b>Herramienta</b>						
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	13.29	0.40
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	13.29	0.27
<b>Total de Herramienta</b>						<b>0.67</b>
<b>Equipo</b>						
	H AMAPE-010	Compactador CP 563D, de 153 hp, 11.3 ton, ancho de tambor 2.13 m	hora	0.010000	822.00	8.22
	H MAQMAR-04	Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion	hora	0.046734	1,413.12	66.04
<b>Total de Equipo</b>						<b>74.26</b>
<b>Costo directo</b>						<b>365.24</b>
<b>Indirectos de oficina</b>					<b>5.0000%</b>	<b>18.26</b>
<b>Indirectos de campo</b>					<b>5.0000%</b>	<b>18.26</b>
<b>Subtotal</b>						<b>401.76</b>
<b>Financiamiento</b>					<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal</b>						<b>401.76</b>
<b>Utilidad</b>					<b>10.0000%</b>	<b>40.18</b>
<b>Subtotal</b>						<b>441.94</b>
<b>Cargos adicionales</b>					<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal</b>						<b>441.94</b>
<b>Otro porcentaje</b>					<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>
<b>Precio unitario</b>						<b>441.94</b>
<b>IVA (16.00%)</b>						<b>70.71</b>
<b>Total</b>						<b>512.65</b>

(\* QUINIENTOS DOCE PESOS 65/100 MXN.)

OPERADO  
 FAISM (FIIL)  
 EJERCICIO 2024

Magdalena Martinez Melendrez  
 C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.  
 REPRESENTANTE LEGAL

0085



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  
EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA  
ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN,  
MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,  
ZACATECAS.

**MELENDREZ CONSTRUCCIONES**



**Análisis de precios unitarios**

Clave: 170701

Unidad: m

Guarnición de concreto f'c=150 kg/cm2 agregado de 20 mm cemento normal revenimiento 8 a 10 cm, sección Trapezoidal de 0.15 x 0.20 x 0.40 armada con dos varillas de 3/8" y grapas de alambros de 1/4 a cada 30 cm ,cimbra comun a 20 usos, incluye: Pintura para tráfico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Cantidad: 133.00

Precio unitario: 486.18

Total 64,661.94

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

**Materiales**

PIES-412		Pintura para tráfico amarilla o blanco en cubeta de 19 lt	cb	0.006520	2,761.23	18.00
RECU-057		Thinner tipo americano presentación de 1 lts marca Comex	lt	0.049036	35.00	1.72
RECU-066		Estopa blanca	kg	0.049553	69.46	3.44
ACCH-002		Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 ( 3/8") fyp = 4200 kg/cm2 marca Hylsa	kg	1.253622	24.00	30.09
ACCH-015		Alambros	kg	1.002897	33.00	33.10

**Total de Materiales**

**86.35**

**Mano de Obra**

+	MOCU-027	Cuadrilla No 27 (1 Albañil + 5 Peones)	jor	0.055556	3,112.97	172.94
---	----------	--	-----	----------	----------	--------

**Total de Mano de Obra**

**172.94**

**Herramienta**

FACHEME		Herramienta menor	(%)mo	0.030000	172.94	5.19
HESEG-001		Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	172.94	3.46

**Total de Herramienta**

**8.65**

**Auxiliares**

+	PCON-005	Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm.	m3	0.083333	1,606.35	133.86
---	----------	---	----	----------	----------	--------

**Total de Auxiliares**

**133.86**

**Costo directo**

**401.80**

**Indirectos de oficina**

**5.0000% 20.09**

**Indirectos de campo**

**5.0000% 20.09**

**Subtotal**

**441.98**

**Financiamiento**

**0.0000% 0.00**

**Subtotal**

**441.98**

**Utilidad**

**10.0000% 44.20**

**Subtotal**

**486.18**

**Cargos adicionales**

**0.0000% 0.00**

**Subtotal**

**486.18**

**Otro porcentaje**


**0.0000% 0.00**

**Precio unitario**

**486.18**

**IVA (16.00%)**

**77.79**



*Magdalena Martinez Melendrez* 0086

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.  
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  
EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA  
ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN,  
MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,  
ZACATECAS.

**MELENDREZ CONSTRUCCIONES**



**Análisis de precios unitarios**

**Total**

**563.97**

(\* QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 97/100 MXN \*)



0087

*Magdalena Martinez  
Melendrez*  
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.  
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  
 EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA  
 ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN,  
 MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,  
 ZACATECAS.

**MELENDREZ CONSTRUCCIONES**




**Análisis de precios unitarios**

Clave: **BAS-BANQ-01** Unidad: **m3**  
 Mezclado tendido y compactación de la construcción de base para banquetas compactada con bailarina  
 al 95 % utilizando material de banco (tepetate) Cantidad: **52.80**  
 Precio unitario: **251.60**  
 Total **13,284.48**

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
<b>Materiales</b>						
	AGRE-016	Agua potable	m3	0.120482	100.00	12.05
	MAG-018	Tepetate camión de 6 m3.	camión	0.167144	1,000.00	167.14
<b>Total de Materiales</b>						<b>179.19</b>
<b>Mano de Obra</b>						
+	MOCU-002	Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón)	jor	0.020590	1,329.07	27.37
<b>Total de Mano de Obra</b>						<b>27.37</b>
<b>Herramienta</b>						
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	27.37	0.82
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	27.37	0.55
<b>Total de Herramienta</b>						<b>1.37</b>
<b>Costo directo</b>						<b>207.93</b>
<b>Indirectos de oficina</b>					<b>5.0000%</b>	<b>10.40</b>
<b>Indirectos de campo</b>					<b>5.0000%</b>	<b>10.40</b>
<b>Subtotal</b>						<b>228.73</b>
<b>Financiamiento</b>					<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal</b>						<b>228.73</b>
<b>Utilidad</b>					<b>10.0000%</b>	<b>22.87</b>
<b>Subtotal</b>						<b>251.60</b>
<b>Cargos adicionales</b>					<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal</b>						<b>251.60</b>
<b>Otro porcentaje</b>					<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>
<b>Precio unitario</b>						<b>251.60</b>
<b>IVA (16.00%)</b>						<b>40.26</b>
<b>Total</b>						<b>291.86</b>

(\* DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 86/100 MXN \*)



*Magdalena Martinez Melendrez*

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.  
 REPRESENTANTE LEGAL



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  
 EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA  
 ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN,  
 MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,  
 ZACATECAS.

**MELENDREZ CONSTRUCCIONES**



**Análisis de precios unitarios**

Clave: 170715

Unidad: m2

Banqueta de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.

Cantidad: 176.00

Precio unitario: 450.03

Total 79,205.28

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

**Materiales**

MACMAR-016	Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts	roll	0.012213	1,900.00	23.20
------------	---	------	----------	----------	-------

**Total de Materiales**

**23.20**

**Mano de Obra**

+ MOCU-027	Cuadrilla No 27 (1 Albañil + 5 Peones)	jor	0.040000	3,112.97	124.52
------------	--	-----	----------	----------	--------

**Total de Mano de Obra**

**124.52**

**Herramienta**

FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	124.52	3.74
---------	-------------------	-------	----------	--------	------

HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	124.52	2.49
-----------	-----------------------------------	-------	----------	--------	------

**Total de Herramienta**

**6.23**

**Auxiliares**

+ PHCO-003	Elaboración de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revoladora, 1saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias.	m3	0.112045	1,945.38	217.97
------------	---	----	----------	----------	--------

**Total de Auxiliares**

**217.97**

**Costo directo**

**371.92**

**Indirectos de oficina**

**5.0000% 18.60**

**Indirectos de campo**

**5.0000% 18.60**

**Subtotal**

**409.12**

**Financiamiento**

**0.0000% 0.00**

**Subtotal**

**409.12**

**Utilidad**

**10.0000% 40.91**

**Subtotal**

**450.03**

**Cargos adicionales**

**0.0000% 0.00**

**Subtotal**

**450.03**

**Otro porcentaje**

**0.0000% 0.00**

**Precio unitario**

**450.03**


**IVA (16.00%)**

**72.00**

**Total**

**522.03**

(\* QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 03/100 MXN \*)



*Magdalena Martinez Melendrez*

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.  
 REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  
EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA  
ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN,  
MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,  
ZACATECAS.

**MELENDREZ CONSTRUCCIONES**



**Análisis de precios unitarios**

Clave: 030504

Unidad: m2

Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.

Cantidad: 1,208.13

Precio unitario: 659.77

Total 797,087.93

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

**Materiales**

	MACMAR-016	Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts	roll	0.010000	1,900.00	19.00
	AGRE-016	Agua potable	m3	0.239808	100.00	23.98
	AGRE-001	Arena en camión de 6 m3.	m3	0.098392	550.00	54.12
	AGLU-002	Cemento gris normal Cruz azul, presentación en saco de 50 kg.	ton	0.062500	4,400.00	275.00
	AGRE-002	Grava de 3/4" (19 mm) en camión de 6 m3.	m3	0.115756	550.00	63.67

**Total de Materiales**

**435.77**

**Mano de Obra**

+	MOCU-027	Cuadrilla No 27 (1 Albañil + 5 Peones)	jor	0.030303	3,112.97	94.33
---	----------	--	-----	----------	----------	-------

**Total de Mano de Obra**

**94.33**

**Herramienta**

	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	94.33	2.83
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	94.33	1.89

**Total de Herramienta**

**4.72**

**Equipo**

H	MAQMAR-12	Revolvedora para concreto marca Cipsa modelo R10 de un saco tipo trompo, cap. 5 m3/hr, motor a gasolina marca Kohler de 8 HP, con reductor, montada sobre ruedas tipo B78X-13, peso de la máquina con motor 363 kg.	hora	0.115607	90.43	10.45
---	-----------	---	------	----------	-------	-------

**Total de Equipo**

**10.45**

**Costo directo 545.27**

**Indirectos de oficina 5.0000% 27.26**

**Indirectos de campo 5.0000% 27.26**

**Subtotal 599.79**

**Financiamiento 0.0000% 0.00**

**Subtotal 599.79**

**Utilidad 10.0000% 59.98**

**Subtotal 659.77**

**Cargos adicionales 0.0000% 0.00**

**Subtotal 659.77**

**Otro porcentaje 0.0000% 0.00**

**Precio unitario 659.77**

**IVA (16.00%) 105.56**



*Magdalena Martinez Melendrez*  
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ,  
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  
EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA  
ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN,  
MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,  
ZACATECAS.

**MELENDREZ CONSTRUCCIONES**



**Análisis de precios unitarios**

**Total**

**765.33**

**(\* SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 33/100 MXN \*)**

OPERADO  
FAISM ( FIII )  
EJERCICIO 2024

0091

Magdalena Martinez  
Melendrez  
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.  
REPRESENTANTE LEGAL




OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  
EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA  
ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN,  
MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,  
ZACATECAS.

## MELENDREZ CONSTRUCCIONES



### Cálculo de indirectos

Descripción	Importe por periodo para oficina central	Porcentaje de participación	Importe de participación por periodo para oficina central	Total para oficina central	Porcentaje de oficina central	Importe por periodo para oficina obra	Importe total oficina obra	Porcentaje de oficina de obra
<b>Honorarios, sueldos y prestaciones</b>								
<b>Personal directivo</b>								
Director general	24,333.33	30.000000	7,300.00	21,840.00	1.8388	0.00	0.00	0.0000
<b>Importe de Personal directivo</b>				<b>21,840.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>Personal técnico</b>								
Residente de obra local	18,250.00	30.000000	5,475.00	16,380.00	1.3791	0.00	0.00	0.0000
<b>Importe de Personal técnico</b>				<b>16,380.00</b>			<b>0.00</b>	
Cuotas patronales IMSS e INFONAVIT del personal	0.00	0.000000	0.00	13,013.67	1.0957	0.00	0.00	0.0000
Prestaciones LFT para el personal	0.00	0.000000	0.00	1,885.01	0.1587	0.00	0.00	0.0000
Pasajes y viáticos del personal	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo del personal	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
<b>Importe de Honorarios, sueldos y prestaciones</b>				<b>53,118.68</b>			<b>0.00</b>	
<b>Depreciación, mantenimiento y rentas</b>								
Edificios y locales	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Locales de mantenimiento y guarda	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Instalaciones generales	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Bodegas	5,000.00	30.000000	1,500.00	4,485.00	0.3776	0.00	0.00	0.0000
Muebles y enseres	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Depreciación o renta y operación de vehículos	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Campamentos	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
<b>Importe de Depreciación, mantenimiento y rentas</b>				<b>4,485.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>Fletes y acarreos</b>								
De campamentos	1,989.00	30.000000	596.70	1,784.13	0.1502	0.00	0.00	0.0000
De equipo de construcción	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	5,000.00	14,950.00	1.2587
De plantas y elementos para instalaciones	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
De mobiliario	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
<b>Importe de Fletes y acarreos</b>				<b>1,784.13</b>			<b>14,950.00</b>	
<b>Gastos de oficina</b>								
Papelería y útiles de escritorio	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Correos, teléfonos, telégrafos, radio	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Situación de fondos	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Copias y duplicados	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Luz, gas y otros consumos	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Gastos de concursos	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
<b>Importe de Gastos de oficina</b>				<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>Servicios</b>								
Consultores, asesores, servicios y laboratorios	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	4,000.00	11,960.00	1.0069
Estudio e investigación	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	4,500.00	13,455.00	1.1328
<b>Importe de Servicios</b>				<b>0.00</b>			<b>25,415.00</b>	
<b>Trabajos previos auxiliares</b>								
Construcción y conservación de caminos de acceso	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Montajes y desmantelamiento de equipo	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
<b>Importe de Trabajos previos auxiliares</b>				<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>Seguros y fianzas</b>								
Primas por seguros	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000



0092

Magdalena Martínez  
Melendrez  
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.  
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  
 EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA  
 ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN,  
 MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA,  
 ZACATECAS.

**MELENDREZ CONSTRUCCIONES**



**Cálculo de indirectos**

Descripción	Importe por periodo para oficina central	Porcentaje de participación	Importe de participación por periodo para oficina central	Total para oficina central	Porcentaje de oficina central	Importe por periodo para oficina obra	Importe total oficina obra	Porcentaje de oficina de obra
Primas por fianzas	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	6,362.00	19,022.38	1.6015
<b>Importe de Seguros y fianzas</b>				<b>0.00</b>			<b>19,022.38</b>	

- A) Costo directo de la obra **1,187,752.53**
- B) Gastos de oficina central para la obra **59,387.81**
- C) Indirectos de la oficina en obra **59,387.38**
- D) % Indirectos de oficina central = (B/A)100 **5.0000%**
- E) % Indirectos de oficina en obra = (C/A)100 **5.0000%**
- % Indirectos = D + E **10.0000%**

OPERADO  
 FAISM ( FIII )  
 EJERCICIO 2024

0093  
 C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.  
 REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

**MELENDREZ CONSTRUCCIONES**



**Programa de obra**


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Requisimiento	Unidades ejecutorias	Fecha de inicio	Fecha de término	Bien calendarizado	25/feb/2024 03/mar/2024	10/mar/2024 16/mar/2024	17/mar/2024 23/mar/2024	24/mar/2024 30/mar/2024	31/mar/2024 06/abr/2024	07/abr/2024 13/abr/2024	14/abr/2024 20/abr/2024	21/abr/2024 27/abr/2024	28/abr/2024 04/may/2024	05/may/2024 11/may/2024	12/may/2024 18/may/2024	19/may/2024 25/may/2024	26/may/2024 31/may/2024	Total	
<p><b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.</b></p>																							
<p><b>PRELIMINARES</b></p>																							
010706	Tirzo y nivelación con apalatos topográficos en terreno plano.	m2	1,208.13	400.000000	1.000000	29/03/2024	23/03/2024	24.00	604.06	604.07												1,208.13	
RETA-01	Retiro de empadme con recuperación de material, incluye: almacenamiento a una distancia máxima de 20 mts.	m3	153.00	360.000000	1.000000	29/03/2024	05/03/2024	6.00	\$5,979.91	85.00	68.00											153.00	
P-03	Demolición de concreto simple de 15 cm de espesor promedio, con medios mecánicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traslados.	m2	143.14	103.600000	1.000000	04/03/2024	14/03/2024	11.00	\$1,913.75	\$1,577.00												\$1,480.75	
<p><b>TERMINACIONES</b></p>																							
TEMP-3	Excavación en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecánicos (motorveladora) considerando aline de la superficie y dejando pendientes de acuerdo al proyecto.	m3	703.57	90.000000	1.000000	08/03/2024	26/03/2024	19.00	\$4,871.34	270.60	270.60	108.25											703.57
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 (material tipo II), primer recorrido, sobre camino de tierra, carga con máquina.	m3	703.57	0.000000	1.000000	11/03/2024	09/04/2024	30.00		159.90	159.90	63.97											703.57
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 (material tipo II) utilizado en la obra, incluye subsecuente se considere (2 km).	m3/Km	1,407.14	288.000000	1.000000	11/03/2024	09/04/2024	30.00		319.80	319.80	127.94											1,407.14
<p><b>SUB-BASE Y BASE</b></p>																							
METAC-00	Mecado tendido y compactación de la subrasante con 98% utilizado material de banco y material pétrico (40% topacete - 60% casajo)	m3	362.44	100.000000	1.000000	18/03/2024	05/04/2024	19.00	\$5,297.97	120.81	120.81	270.82											362.44
METAC-00	Mecado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100% , utilizando material de banco y material pétrico (60% topacete - 40% casajo)	m3	241.63	100.000000	1.000000	25/03/2024	12/04/2024	19.00		80.54	80.54	80.55											241.63
<p><b>GUARNICIÓN-BANQUETAS-CONCRETO</b></p>																							
170701	Guarnición de concreto F'c=150 kg/cm2 agregado de 20 mm cemento normal revestimiento 8 a 10 cm, sección de 10 cm, con 10% de arena, armada con dos varillas de 3/8" y grapas de alambren de 1/4 a cada 30 cm, cimbra común a 20 usos, incluye: Fimtura para tráfico amarilla o blanco en presentación de 66-100 rollo de 100 mts., Incluye: cinta de 19 lbs, materiales: mano de obra, equipo y herramienta.	m	133.00	18.000000	1.000000	08/04/2024	29/05/2024	24.00															133.00
BAS-BAQ	Mecado tendido y compactación de la subrasante con 98% utilizado material de banco y material pétrico (40% topacete - 60% casajo)	m3	52.80	48.566338	1.000000	17/04/2024	06/05/2024	25.00															52.80
170715	Banqueta de Concreto F'c=150 kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm, de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-100 rollo de 100 mts., Incluye: cinta de 19 lbs, materiales: mano de obra, herramienta menor.	m2	176.00	25.000000	1.000000	19/04/2024	14/05/2024	26.00															176.00
030504	Revestimiento de concreto F'c=150 kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm, de 15 cm de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-100 rollo de 100 mts., Incluye: cinta de 19 lbs, materiales: mano de obra y herramienta menor.	m2	1,208.13	69.200000	1.000000	25/04/2024	29/05/2024	35.00															1,208.13

OPERADO  
FAISM (FIII)  
EJERCICIO 2024

0094

Magdalena Martinez  
MELENDREZ  
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.  
REPRESENTANTE LEGAL





# MELENDREZ CONSTRUCCIONES



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
PRESENTE


ASUNTO: RENUNCIA DE ANTICIPO  
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 29 DE FEBRERO DEL 2024

POR MEDIO DEL PRESENTE Y DERIVADO DE LA INVITACION A PARTICIPAR EN LA OBRA:  
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371  
DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE  
MEJIA, ZACATECAS" Y REPRESENTADA POR LA C. MAGDALENA MELENDREZ MARTINEZ. Y BAJO  
PROTESTA ES DECIR VERDAD QUE RENUNCIO AL ANTICIPO DE LA OBRA ANTES MENSIONADA,

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN  
AFECTUOSO SALUDO, DESEANDOLE ÉXITO Y PROSPERIDAD.

*Magdalena Martinez  
Melendrez*

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ



0095

