

**Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
2024**

Ejercicio 2024

No. de PROYECTO: 402002

proyecto:

**REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE
LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

Localidad:

Nochistlán de Mejía.

no. de contrato:

NOCHIS/FONDOIII/2024/09

CONTRATISTA:

ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

realización de obra pública:

Adjudicación Directa

MONTO:

\$168,312.13

SUPERVISOR: ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

DATOS DE LA OBRA		EXPEDIENTE TÉCNICO		ADJUDICACIÓN		EJECUCIÓN	
NO. DE OBRA	NO. DE PROYECTO						
		PROYECTO EJECUTIVO (DIGITAL E IMPRESO)					
		CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA					
		PRESUPUESTO BASE					
		PROGRAMA DE OBRA					
		OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS, AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CABILDO					
		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O TERCEROS					
		ESTUDIOS DE LA OBRA					
		PERMISOS DE LA OBRA (PERFORACIÓN, CRUCE CARRETERO, OTROS)					
		IMPACTO AMBIENTAL					
		FACTIBILIDAD Y/O VALIDACIÓN DE LA OBRA					
		ACREDITACIÓN LEGAL DE LA TENENCIA DE LA TIERRA					
		CONVOCATORIA U OFICIOS DE INVITACIÓN					
		BASES DE LICITACIÓN / INVITACIÓN					
		DOCUMENTO DE PUBLICACIÓN EN COMPRANET (OBRAS FEDERALES)					
		DOCUMENTO DE PUBLICACIÓN-PERIÓDICO OFICIAL (OBRAS ESTATALES)					
		PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICAS DE PARTICIPANTES (DIGITAL) NO GANADORES					
		ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES					
		ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS					
		DICTAMEN Y FALLO					
		CONTRATO					
		CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTRATADO					
		TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS					
		ANÁLISIS DE INDIRECTOS					
		GARANTÍA Y/O FIANZA DE ANTECIPADO					
		GARANTÍA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO					
		DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN (FUNDADO Y MOTIVADO)					
		CÉDULA DE REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA)					
		CÉDULA DE REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS (CONTRALORÍA MUNICIPAL)					
		DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE					
		NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LOS TRABAJOS					
		SOLICITUD, DICTAMEN Y CONVENIO DE MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN					
		SOLICITUD, DICTAMEN Y CONVENIO DE MODIFICACIÓN DEL MONTO Y/O AMPLIACIÓN DE CONTRATO					
		NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO					
		NOMBRAMIENTO DEL SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA					
		AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROYECTO					
		BITÁCORA DE OBRA (BEOP O CONVENCIONAL)					
		ESTIMACIONES					
		NÚMEROS GENERADORES					
		ACUMULADO DE ESTIMACIONES (DIGITAL E IMPRESO (Mx))					
		SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATÁLOGO					
		REPORTES DE SUPERVISIÓN					
		REPORTE FOTOGRÁFICO					
		PRUEBAS DE LABORATORIO (RESISTENCIA DE CONCRETO, CALIDAD DEL AGUA, OTROS)					
		DOCUMENTO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO					
		NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LA OBRA (CONTRATISTA)					
		GARANTÍA Y/O FIANZA DE VICIOS OCULTOS					
		ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN					
		FINIQUITO					
		ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES					

CONCLUSIONES / OBSERVACIONES:

1 EXISTE EL DOCUMENTO
 2 EXISTE EL DOCUMENTO (INCOMPLETO Y/O SIN FIRMA)
 X NO EXISTE EL DOCUMENTO
 N/A NO APLICA

SIMBOLOGÍA

EN EL CASO DEL PROYECTO EJECUTIVO ESTE DEBERÁ CONTENER LO ESTABLECIDO TAMBO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE CARÁCTER GENERAL Y/O ESPECIAL, SEGÚN CORRESPONDA.

TEORÍA DE CÁLCULO, MECÁNICA DE SUELOS, Y DEMÁS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PLANIFICACIÓN.

EN EL CASO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS DEBERÁ INTEGRAR ADEMAS DEL DICTAMEN DE LA JUSTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN: ANOTACIÓN EN BITÁCORA ACTA CIRCUNSTANCIADA

EN EL CASO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROYECTO DEBERÁ INCLUIR ADEMAS: JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL ÁREA CORRESPONDIENTE POR EL CAMBIO DE PROYECTOS O METAS

LA PROPUESTA DEBERÁ DE CONTENER LOS FORMULARIOS (REQUISITOS) COMPLETOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LO CITADO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO APLICABLE

Fecha de Autorización: 7/12/2021



NOCHISTLÁN
De Mejía
PUEBLO MÁGICO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: 3
OFICIO: NO. 145
EXPEDIENTE: ADMVO. 2021/2024

ASUNTO: SOLICITUD

**DEPARTAMENTO DE PLANEACION
PRESENTE**

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA ME DIRIJO A USTED CON LA FINALIDAD DE SOLICITARLE GIRE INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDE PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO DE OBRA: **DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON** SOLICITADO POR LA COMUNIDAD INTERESA HACIA MI CARGO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL.



Atentamente


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2021 - 2024

PROF. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR

Presidente Municipal de Nochistlán de Mejía Zac.

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0001



U N I D A D DE PLANEACIÓN
 J. ALFONSO GARCÍA GARCÍA, INGENIERO EN PLANEACIÓN URBANA


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

DIRECTOR DE UNIDAD DE PLANEACIÓN
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO OUEZADA

REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO CALLE PRIV. DELIMON

PLANTA TOPOGRAFICA
 ENTRE CALLE LIMON, NOCHISTLANZAC.
 S/E

UNIDAD DE PLANEACION
 DICIEMBRE DEL 2020



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TRABAJO DE TIPO COMÚN	100	M ²	1.50	150.00
2	TRABAJO DE TIPO COMÚN	100	M ²	1.50	150.00
3	TRABAJO DE TIPO COMÚN	100	M ²	1.50	150.00
4	TRABAJO DE TIPO COMÚN	100	M ²	1.50	150.00
5	TRABAJO DE TIPO COMÚN	100	M ²	1.50	150.00
6	TRABAJO DE TIPO COMÚN	100	M ²	1.50	150.00
7	TRABAJO DE TIPO COMÚN	100	M ²	1.50	150.00
8	TRABAJO DE TIPO COMÚN	100	M ²	1.50	150.00
9	TRABAJO DE TIPO COMÚN	100	M ²	1.50	150.00
10	TRABAJO DE TIPO COMÚN	100	M ²	1.50	150.00

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	TRABAJO DE TIPO COMÚN	100	M ²	1.50	150.00
12	TRABAJO DE TIPO COMÚN	100	M ²	1.50	150.00
13	TRABAJO DE TIPO COMÚN	100	M ²	1.50	150.00
14	TRABAJO DE TIPO COMÚN	100	M ²	1.50	150.00
15	TRABAJO DE TIPO COMÚN	100	M ²	1.50	150.00
16	TRABAJO DE TIPO COMÚN	100	M ²	1.50	150.00
17	TRABAJO DE TIPO COMÚN	100	M ²	1.50	150.00
18	TRABAJO DE TIPO COMÚN	100	M ²	1.50	150.00
19	TRABAJO DE TIPO COMÚN	100	M ²	1.50	150.00
20	TRABAJO DE TIPO COMÚN	100	M ²	1.50	150.00




DETALLE DE ZANJA

ANCHO DE ZANJAS

DIAMETRO INTERIOR (CM)	PROF. (M/CM)
50	1.30
60	1.30
70	1.30
80	1.30



DETALLE DE POZO DE VISITA COMUN
 TODAS LAS DIMENSIONES SON EN METROS (DETALLES SIN ESCALA)



ESPECIFICACIONES

1. BROSAL Y TAPA CIEGA
2. ANILLO DE CONCRETO SIMPLE F=210 kg/cm²
3. ANILLO DE CONCRETO SIMPLE F=210 kg/cm² CON REFORZAMIENTO DE BARRAS DE ACERO EN LA TUBERIA EXTERIOR, DE 200 CM DE DIAMETRO Y ANILLO DE CONCRETO SIMPLE F=210 kg/cm² CON REFORZAMIENTO DE BARRAS DE ACERO EN LA TUBERIA INTERNA
4. CANTONERA DE CONCRETO SIMPLE CON IMPERMEABILIZANTE ELÉCTrico
5. ATARAJAS
6. MEZA DURA A BASE DE CONCRETO SIMPLE F=210 kg/cm² HASTA EL TUBO DE LA TUBERIA EXTERIOR
7. ANILLO DE CONCRETO SIMPLE F=210 kg/cm² DE 610 M. DE DIAMETRO
8. REFORZAMIENTO DE BARRAS DE ACERO EN LA TUBERIA EXTERIOR Y ANILLO DE CONCRETO SIMPLE F=210 kg/cm² CON REFORZAMIENTO DE BARRAS DE ACERO EN LA TUBERIA INTERNA
9. LOS CONCRETOS Y MORELOS DEBERAN SER CLASIFICADOS COMO TIPO I

DATOS DE PROYECTO

NO. DE LOTES: 20 LOTES

POBLACION PROYECTO: 100 HAB.

POTACION: 200 LITS/HAB/DIA

APORTACION AL SISTEMA BDE: 160 LITS/HAB/DIA

SISTEMA: SEPARADO AGUAS NEGRAS

FORMULAS: GRABADO

VERTIDO: HERRON Y MANNING

RED MUNICIPAL

COEFICIENTE DE VARIACION: 1.2

VELOCIDADES

MINIMA: 0.5 M/S

MAXIMA: 3.0 M/S

GASTOS

MEDIO: 0.09 lbs/seg

MAX. INSTANTANEO: 0.19 lbs/seg

MAX. EXTREMADO: 0.70 lbs/seg

COEFICIENTE DE VARIACION: 0.84 lbs/seg

ESTRUCTURAS CONEXAS

POZOS DE VISITA COMUN: 1 pieza

DE 1.30 MTS DE PROFUNDIDAD: 2 piezas

DESCARGOS DOMICILIARIOS: 19 piezas

CANTIDADES DE TUBERIA

TUBERIA DE PVC DE 203MM (8" OMA) DE LA SERIE 25: 106.00 mts

DESCARGADORAS (OVAL) DE LA SERIE 25: 114.00 mts

SALETA (DE 70" Ø) DE PVC: 19.00 piezas

COORO DE PVC DE (8" OMA): 19.00 piezas

COORO DE PVC DE (6" OMA): 36.00 piezas

COORO DE PVC DE (4" OMA): 36.00 piezas

CAJA CIEGA PARA UNIDAD DE TUBERIA E.V.C. Y AGOSTO: 100 piezas

VOLUMEN DE EXCAVACION

EXCAVACION: 10.06 m³

PLANTILLA: 742 m³

ACOSTILLADO: 26.06 m³

RELLENO MATERIAL DE BANCO: 62.76 m³


VOLUMEN DE EXC. DESCARGAS

EXCAVACION: 4.10 m³

PLANTILLA: 5.70 m³

ACOSTILLADO: 17.10 m³

RELLENO MATERIAL DE BANCO: 51.30 m³

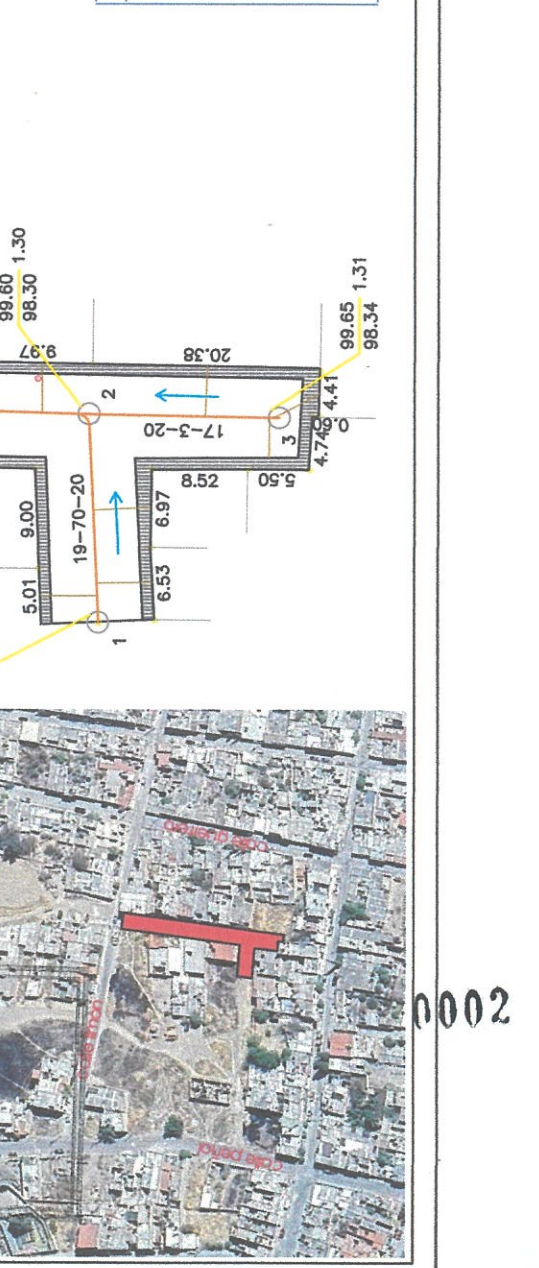



CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR PROYECTO
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
EJERCICIO 2024

I.- UBICACIÓN

	CLAVE	NOMBRE
REGIÓN	09	CAÑON DE JUCHIPILA
MUNICIPIO	034	NOCHISTLÁN DE MEJIA
LOCALIDAD	0001	NOCHISTLÁN DE MEJIA
BARRIO, COLONIA, RANCHERÍA, ETC.		
TIPO DE LOCALIDAD	CP(X)	PR()

II.- IDENTIFICACIÓN

No. DE OBRA	CLAVE	NOMBRE
	402002	
PROGRAMA	404	DRENAJES Y LETRINAS
SUBPROGRAMA	213	ORD. AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
TIPO DE PROYECTO	6141	DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION
NOMBRE DE LA OBRA	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	
DESCRIPCION DE LA OBRA	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333	
TIPO DE OBRA	NUEVA(X)	AMPLIACIÓN() REHABILITACIÓN() PROCESO()
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	C(X)	AM() AD() AC()
INSTANCIA EJECUTORA	M() PRESIDENCIA MUNICIPAL	

III.-INVERSIONES

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	F.I.S.M.	BENEFICIARIOS
INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2024	\$177,084.44			\$177,084.44	
INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DIC. DE 2024					

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS DEL PROYECTO	LOTE	1
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	PERSONAS	MUJERES (50) - HOMBRES(50)
LOCALIZACION	COORDENADAS	21.363012 N, -102.838033 O


V.-PERIODO DE EJECUCIÓN

FECHA DE: INICIO: 03/06/2024 TERMINO: 03/07/2024

ANOTAR SI BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS):

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente.



0003



PROGRAMA CALENDARIZADO ANUAL FÍSICO FINANCIERO
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)


NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.		
FECHA DE:	INICIO: 03/06/2024	TERMINO: 03/07/2024

PROGRAMADO TODO EL AÑO		
FÍSICO	100%	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO (PESOS)
LOTE	1.00	\$177,084.44

	FÍSICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO	100%	\$177,084.44
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL:		\$177,084.44

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente.





0004



CROQUIS DEL MUNICIPIO

MACROLOCALIZACION

Zacatecas
División municipal

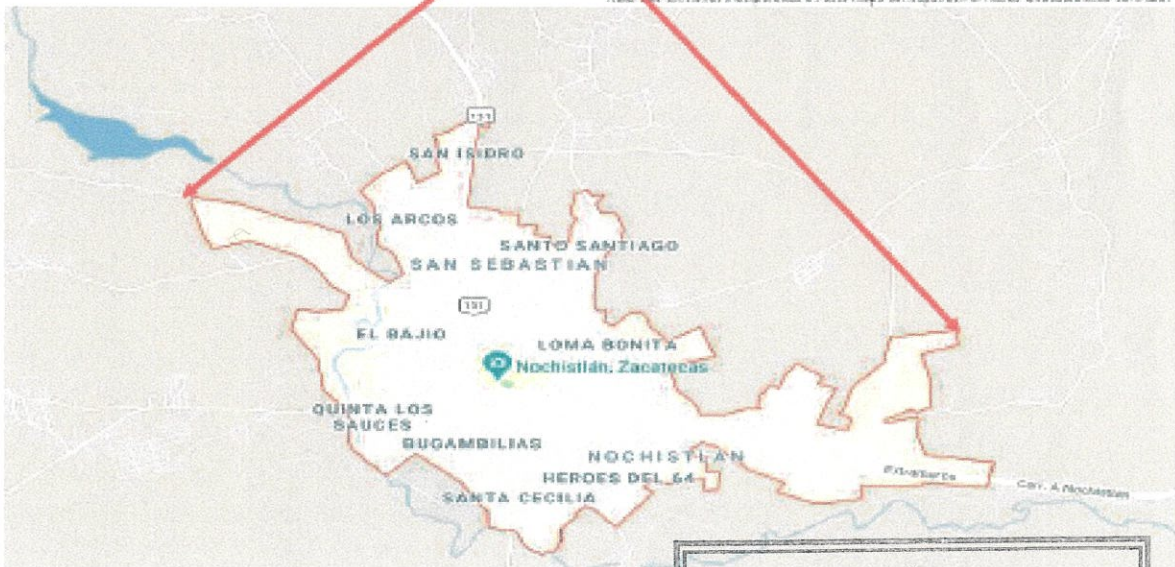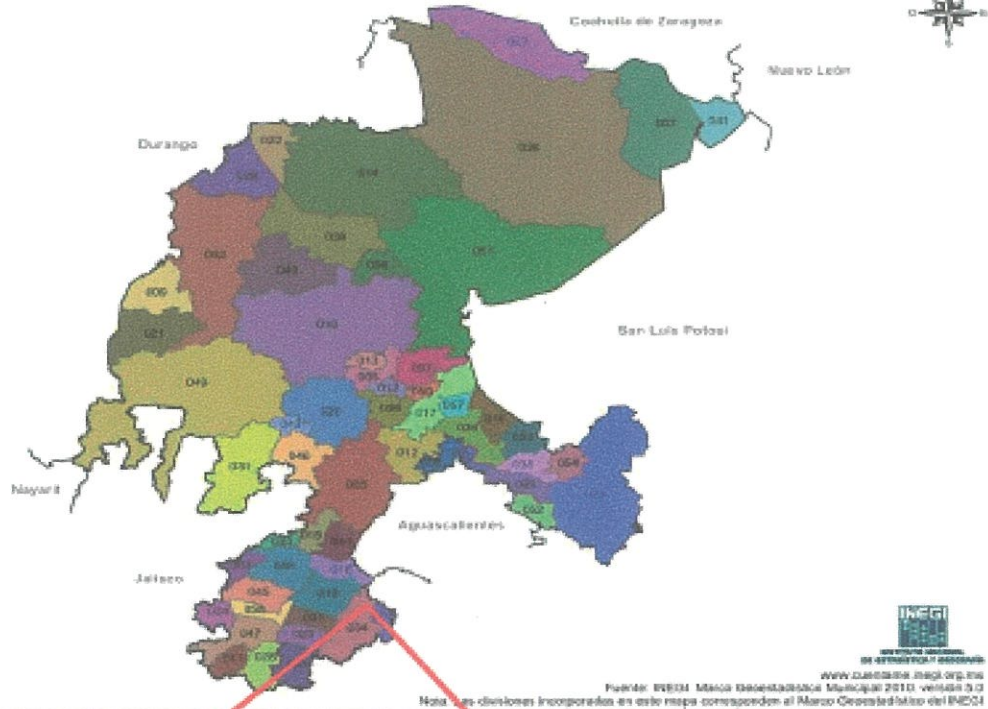

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

CROQUIS DEL MUNICIPIO

MICROLOCALIZACION



**REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
 CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE
 LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL
 MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA,
 ZACATECAS.
 CORDENANDAS DE UBICACION**

LGDS Art. 28: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente


OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

0006

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Fecha: 01/jul./2024
Página: 1 de 3



Obra: LINEA DE DRENAJE CALLE PRIVADA DE LIMON


CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
01-RSD	Trazo y nivelación de ejes para líneas de drenaje con equipo topográfico, incluye: equipo necesario, señalización del banco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requieran en la nivelación con pintura y renivelaciones necesarias	m	106.00	DIECINUEVE PESOS 21/100 MXN	\$19.21	\$2,036.26
IMPORTE DE PREELIMINARES						
020251	Excavación por medios mecánicos de terreno en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	103.88	SESENTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN	\$69.26	\$7,194.73
AFL-01	Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno	m2	74.20	DIECISIETE PESOS 72/100 MXN	\$17.72	\$1,314.82
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	7.42	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 81/100 MXN	\$278.81	\$2,068.77
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavación, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	37.10	OCHENTA Y SEIS PESOS 34/100 MXN	\$86.34	\$3,203.21
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	m3/km	74.20	NUEVE PESOS 65/100 MXN	\$9.65	\$716.03
IMPORTE DE TERRACERIAS						
070206F1	Tubo pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	106.00	TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 81/100 MXN	\$371.81	\$39,411.86
070214	Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	114.00	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 05/100 MXN	\$253.05	\$28,847.70
071005	Codo #5 pvc sanitario cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	19.00	CIENTO VEINTINUEVE PESOS 40/100 MXN	\$129.40	\$2,458.60
071011	Codo #90 pvc sanitario cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	38.00	CIENTO DIECIOCHO PESOS 70/100 MXN	\$118.70	\$4,510.60
SILL-01	Suministro y colocación de silleta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye: material, mano de obra	pza	19.00	TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 88/100 MXN	\$350.88	\$6,666.72
				Importe Parcial de esta Hoja :		\$88,429.30
				Dir. Desarrollo Economico y Social	Importe Acumulado :	\$88,429.30

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Fecha: 01/jul./2024
Página: 2 de 3


Obra: LINEA DE DRENAJE CALLE PRIVADA DE LIMON

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
071305	Tapón hembra pvc sanitario cementar (h) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	3.00	CIENTO CUATRO PESOS 16/100 MXN	\$104.16	\$312.48
IMPORTE DE MATERIALES						
10	RELLENOS Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla 30 mts de distancia.	m3	29.68	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 60/100 MXN	\$254.60	\$7,556.53
030116	Relleno con material producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	66.78	NOVENTA Y SEIS PESOS 89/100 MXN	\$96.89	\$6,470.31
D-11	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., junteado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, sobre base de plantilla de concreto de 5 y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye:excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 48/100 MXN	\$2,054.48	\$2,054.48
IMPORTE DE RELLENOS						
170401	OBRAS CONEXAS Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.2 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizon desplantado sobre firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 junteado y aplantado interior con mortero 1:4, sin excavación.	pza	2.00	NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 88/100 MXN	\$9,185.88	\$18,371.76
IMPORTE DE OBRAS CONEXAS						
IMPORTE DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV TOMAS DOMICILIARIA						
020251	TERRACERIAS Excavación por medios mecánicos de terreno en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	74.10	SESENTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN	\$69.26	\$5,132.17
AFI-01	Alineo de taludes y fondo de cepa a mano en terreno	m2	57.00	DIECISIETE PESOS 72/100 MXN	\$17.72	\$1,010.04
04	Camal de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tubos, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	5.70	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 81/100 MXN	\$278.81	\$1,589.22
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavación, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina	m3	22.80	OCHENTA Y SEIS PESOS 34/100 MXN	\$86.34	\$1,968.55
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	m3/km	45.60	NUEVE PESOS 65/100 MXN	\$9.65	\$440.04
				Importe Parcial de esta Hoja :		\$44,905.58
				Dir. Desarrollo Economico y Social		\$143,334.88
				Importe Acumulado :		

EXERCICIO 2024

0008

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Fecha: 01/jul./2024
 Página: 3 de 3

Obra: LINEA DE DRENAJE CALLE PRIVADA DE LIMON

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
				\$143,334.88	IMPORTE EN PESOS
				\$10,140.02	

IMPORTE DE TERRACERIAS					
RELLENOS					
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla 30 mts de distancia.	m3	17.10	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 60/100 MXN	\$254.60
030116	Relleno con material producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	51.30	NOVENTA Y SEIS PESOS 89/100 MXN	\$96.89
				IMPORTE DE RELLENOS	\$9,324.12
				IMPORTE DE TOMAS DOMICILIARIA	\$19,464.14

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO \$152,659.00
 IVA(16%) \$24,425.44
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA \$177,084.44

(* CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 44/100 MXN *)

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

Dir: Desarrollo Economico y Social	Importe Parcial de esta Hoja : \$9,324.12
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024	Importe Acumulado : \$152,659.00

0009



PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
<i>PRELIMINARES</i>	03/06/2024-06/06/2024
<i>EXCAVACION Y RELLENOS</i>	07/06/2024-02/07/2024
<i>TUBERIA Y POZOS DE VISITA</i>	10/06/2024-14/06/2024
<i>TOMAS DOMICILIARIAS</i>	17/06/2024-21/06/2024
<i>OBRAS CONEXAS</i>	24/06/2024-03/07/2024

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0010

Candido Muñoz
Antonio Flores
David Durán B.
Armando Aguirre

Valentín Gabriel
Armando Aguayo

Los Antonio Durán
Jesús de Jesús

ACTA DE CONSEJO DE PLANEACION MUNICIPAL

MUNICIPIO: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

ACTA NO. 1
EJERCICIO 2024.

En la ciudad de Nochistlán de Mejía, Estado de Zacatecas, siendo las 11:00 horas del día 22 de FEBRERO de 2024, reunidos en el salón de Cabildos del Edificio de la Presidencia Municipal, estando presentes. los ciudadanos: C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, Presidente Municipal; LIC. ARMANDO AGUIRRE, Secretaria de Gobierno, LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ, Sindica Municipal, ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Director de Desarrollo económico y social, ING. ANA GABRIELA TACHIQUIN TORRES, Contralor Municipal, C. SERGIO HINOJOZA PEREZ, Director de Obras Públicas y Servicios Municipales, L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ, Encargada de Tesorería Municipal, representantes parlamentarios de los diferentes partidos PAN, PRI y Alianza en el municipio, así como representantes comunitarios, denominados también consejeros comunitarios, de las diferentes comunidades del municipio, integrantes del concejo municipal de planeación, organismo técnico auxiliar del ayuntamiento, constituido conforme lo dispone el art. 198 de la ley orgánica del municipio en vigor, con el propósito de llevar a cabo la presente reunión de trabajo a la que previamente se convocó y que se habrá de desarrollar Con el fin principal:

Bajo el siguiente orden del día:

1. BIENVENIDÁ A LOS ASISTENTES.
2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, QUORUM LEGAL, E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA
3. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2021-2024.
4. PROPUESTA PARA SU VALIDACION DE OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR CON RECURSOS DEL RAMO 33, EJERCICIO 2024, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
5. ASUNTOS GENERALES. Y /O ACLARACIONES
6. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

1. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.
Toma la palabra el presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL EL C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, da la bienvenida a todos los asistentes a esta reunión, consejeros, delegados, directores, Regidores y miembros del ayuntamiento, a esta reunión del Consejo de Planeación de esta Administración 2021-2024, primera del ejercicio 2024.

2. PUNTO 2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, QUORUM LEGAL, E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA

001
JUAN SOLAZAR
EJERCICIO 2024
Araceli Pérez Jias

Ramón Quezada
Juan García Rodríguez
Gilberto Rodríguez H

Jose Rosario Prieto
Heriberto Salazar P.
Adriana Aguirre P.
Alicia Flores Martínez
Jesús de Jesús

Valentín Salazar N. Teresa de Jesus
Luis Antonio Durán y Battal y Pérez

Acto siguiente, se le otorga la palabra al ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Secretario técnico del Consejo de Planeación Municipal para proceder con el siguiente punto del orden del día, el cual es el Pase de lista, una vez realizado, informa al presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL que se cuenta con la presencia de _____consejeros de un total de _____ que integran el CONSEJO de desarrollo municipal, así como se cuenta con la presencia de los Delegados Municipales o en su caso suplentes de la mayoría de las comunidades, una Asamblea muy concurrida, lo que permite al Presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Que se cuenta con quórum legal para continuar con la asamblea el C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, presidente del consejo, declara la instalación legal de la asamblea y apertura de los trabajos y por lo tanto, validos los acuerdos que de ella misma emanen.

FRANCO AGUAYO

3. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2021-2024.

El siguiente punto, se otorga el uso de la palabra al ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Secretario técnico del Concejo de Planeación Municipal para proceder con el siguiente punto del orden del día, el cual es la capacitación al Concejo de Desarrollo Municipal, otorgándoles a cada concejero las obligaciones y funciones de acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio, y se da a conocer el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PUBLICADO EL 14 DE FEBRERO DE 2014 Y SUS MODIFICATORIOS EL 13 DE MAYO DE 2014, EL 12 DE MARZO DE 2015 Y EL 31 DE MARZO DE 2016, publicados por la Secretaria de Desarrollo social para el presente ejercicio. Haciendo hincapié en lo siguiente: Da lectura del extracto de los lineamientos de operación, que en el direccionamiento de los recursos, los gobiernos locales y de las entidades federativas podrán planear hasta un 100% de sus recursos del FAIS en obras de incidencia directa, para el caso de incidencia complementaria podrán planear hasta el 60% de sus recursos del FAIS; el resto de los recursos se invertirá en demarcaciones territoriales con alto y muy alto grado de rezago, que para la identificación de la población en pobreza extrema los gobiernos locales deberán hacer uso de los Criterios de Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema.

4. PROPUESTA PARA SU VALIDACION DE OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR CON RECURSOS DEL RAMO 33, EJERCICIO 2023, DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

5. Continuando con el orden del día, acto seguido, se le otorga la palabra a el ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Secretario técnico del Consejo de Planeación Municipal para proceder con la reunión de trabajo, e informar a los presentes que el techo financiero del fondo para la infraestructura Social Municipal, dado a conocer a los miembros del consejo lo que corresponde a las liberaciones de


vertical
Candido Muñoz
David Durán B. Rosa Maria Corona L.
Antonio Aguirre
Brenda Aguayo R.
Cristal Aguayo

Gloria Perez
Jose Rosario Prieto

Salazar
Heriberto

Ramona Flores
Alicia Flores Martinez

Luis Muñoz P. Juan Salazar Hortencia S. Salazar
Araceli Pérez Frias 2024
Juan García Rodríguez Gilberto Salgado H



Valentín Salazar
 Luis Antonio Durán

Tarea de Javier
 JB Altoz

cada administración referente a este techo, de este mencionado fondo, tal como se detalla en el siguiente recuadro No. 1.
 Recuadro 1.

TECHO FINANCIERO ANUAL					
EJERCICIO 2024					
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					
			LIBERACION MENSUAL	MONTO	ADMINISTRACION
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$16,845,512	FEBRERO - SEPTIEMBRE	\$1'684,551.20	\$1'684,551.20	2021-2024
		OCTUBRE/NOVIEMBRE	\$1'684,551.20	\$1'684,551.20	2024-2027
			TOTAL:	\$16,845,512	

Otro de los asuntos concernientes a este Fondo es como ya se les informo propone a los presentes lo de los programas Desarrollo Institucional e Indirectos. Según el Anexo # 1, ultimas dos filas.

ARMANDO AGUILO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 APROBACION DE PROPUESTA ANTE EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

TECHO FINANCIERO ANUAL
 EJERCICIO 2024

Se les pide a los presentes manifiesten de manera económica su aprobación anexo 1 y/o recuadros no. 1, 2, y 3. relativo a obras y acciones, así como de los programas de Desarrollo Institucional y Gastos Indirectos; Así mismo después de analizar el anexo con el global de obras a realizarse dentro del ejercicio 2023, con los montos de acuerdo a

techo financiero, con sus respetivos aumentos y disminuciones en el presupuesto, para lo cual se les pide manifiesten de manera económica, la aprobación y el secretario técnico informa que es la mayoría de votos a favor... Lo cual es APROBADO estos recursos para el ejercicio 2024.

El ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, toma la palabra y solicita al Consejo emitir y suscribir propuestas para acciones de obras a realizarse en caso de que existieran ahorros o modificaciones en las obras ya propuestas y aprobadas anteriormente, y que por alguna razón no se ejecutaran por cualquier situación de inconformidad, se tome en sustitución alguna de las mencionadas, propuestas nuevas cumpliendo los lineamientos de este fondo, obras que se suman a la ejecución en caso de existir recurso por programar, de

Ramon Quezada

Juan Salazar
 Araceli Perez

Juan Garcia Rodriguez

Horrenda Sigala

Vertical text on the left side of the page, including names like 'Candido Muñoz' and 'IRINA AGUILO'.

Vertical text on the right side of the page, including names like 'Jose Rosario Puyco', 'M. Guadalupe mendoza', and 'Heriberto Salazar'.

Valentín Salazar W

J. Balboa Pérez

Alejandro Aguayo

acuerdo a las necesidades que esta Asamblea señala, y con ello de ser posible realizarse con recursos del presente ejercicio o bien dentro del próximo ejercicio fiscal, cabe mencionar que por el momento se desconocen los montos de estos proyectos.

Respecto al resultado de desahogo de los puntos anteriores, se acuerda:

Primero: Tenemos por enterados y conformes, en nuestra calidad de integrantes del Consejo, respecto a la información a que se refiere el punto 3 del Orden del día.

Segundo: Tenemos por enterados y conformes y emitiendo nuestra aprobación, en nuestro carácter de miembros del Consejo, respecto a todas y cada una de las acciones de obra contenidas en el listado a que se refiere el punto 4 del orden del día.

Tercero: Tenemos de igual forma, en nuestra calidad de integrantes del Consejo, suscribiendo, en documento por separado, las peticiones o propuestas de acciones de obra que pudieran realizarse de ser posible en el presente ejercicio o bien en el próximo año fiscal, con recursos del fondo III Y/O mezcla de recursos derivadas de otras fuentes de financiamiento asunto este al que se hizo alusión en algún punto del orden del día.

6. ASUNTOS GENERALES. Y/O ACLARACIONES

Surgieron inquietudes por parte de los representantes comunitarios, de obras que se solicitaron en las reuniones comunitarias, así como de otros programas como dos por uno, aclarando el secretario del Consejo y Presidente Municipal, las dudas.

6. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

Para finalizar y tomando en cuenta que no hay otro asunto que tratar se da por clausurada la asamblea, en la forma propuesta en el punto 7 del orden del día, siendo las 12:00 horas del día de la fecha, firmando para constancia y para validez legal de lo descrito en este documento, los intervinientes. Damos fe.

Se adjuntan los anexos 1 y 2. (La lista de asistencia y la lista de obras)

Cristina Rosales

Jaime de Jauri Heriberto

M. Guadalupe Mendocza

Luz Muriel Durán

Juan Salazar

Araceli Pérez Frías

Pamela Quezada

Juan García Rodríguez

Hortencia Sigala

0014

B. Adriana Aguayo R.
Candido Muñoz
Antonio López
David Durán B.
Zayed D. J. P. D.

Jose Rosario Piñero
Rosa María Caranca D.
Rosa

Salazar 12

Román Chaves
Alicia Flores Martínez

Armando Aguayo
J. Battalobos Perez
POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

PRESIDENTE DEL C.D.M.
Manuel Jimenez
C. JOSE MANUNUEL JIMENEZ FUENTES

SECRETARIO DE GOBIERNO
Armando Aguirre Gomez
LIC. ARMANDO AGUIRRE GOMEZ.

ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL.
Rocio Roque Gomez
L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ.

SÍNDICO MUNICIPAL
Liliana Roque Gomez
Lic. LILIANA ROQUE GOMEZ.

DIRECTOR DE OBRAS SERVICIOS PUBLICOS
Sergio Hinojoza Perez
C. SERGIO HINOJOZA PEREZ.

CONTRALOR MUNICIPAL
Ana Gabriela Tachiquin
ING. ANA GABRIELA TACHIQUIN

SECRETARIO TECNICO DEL C.D.M.
Diego Alejandro Mercado Quezada
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

REPRESENTANTES PARLAMENTARIOS ANTE EL CONSEJO.

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO
PAN - PRI - PRD
Reyna Villalobos Perez
LIC. REYNA VILLALOBOS PEREZ
EJERCICIO 2024

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO
MOVIMIENTO CIUDADANO
Beatriz Adriana Aguayo Rodriguez
C. BEATRIZ ADRIANA AGUAYO RODRIGUEZ

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO
FUERZA POR MEXICO
Celini Amadai Taquichin Becerra
LIC. CELINI AMIADAI TAQUICHIN BECERRA

REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL
Rafael Cervantes Duran
LIC. RAFAEL CERVANTES DURAN.

REGIDOR DE DESARROLLO ECONOMICO
Prof. Jorge Ortiz Ramirez
PROF. JORGE ORTIZ RAMIREZ.

Armando Aguayo
J. Battalobos Perez
M. Guadalupe Mendez
Valentin Salazar

Jose Rosario Prieto
Horcencia Sigala G.
Juan Salazar
Araceli Perez Frias
David Duran Bo
Gloria Pira
Candido Buitoz
Juan

Ma Carmen Becerra Esparza

LISTA DE ASISTENCIA

LOCALIDAD	NOMBRE	FIRMA
ALTO DE LA PALMITA	Valentin Enrique Ruvalcaba	<i>Valentin Enrique Ruvalcaba</i>
ARROYO COLORADO	Silvia Velazquez LUIS ANTONIO DURAN MUÑOZ	<i>Luis Antonio Duran</i>
BARRANCA DE MORENO	JOSE JOVANI GONZALEZ CORONA	
CAPELLANIA	ANTONIO MEJIA QUEZADA	<i>Antonio Mejia</i>
CAPULIN DE ABAJO	IGNACIO ALVAREZ M.	
CAPULIN DE ARRIBA	ARACELI PEREZ FRIAS	<i>Araceli Perez Frias</i>
CASAS GRANDES	GILBERTO LECHUGA HERNANDEZ	<i>Gilberto Lechuga H</i>
CERRO DE SAN MIGUEL	ELISEO MUÑOZ DURAN	
CERRO GRANDE	EFRAIN ROBLES VELAZCO	
COLONIA DE SAN MIGUEL	OSCAR JIMENEZ DURAN	
EL ALAMO	JOSEFINA DURAN VILLALOBOS	
EL JAGUEY	JOSE RODRIGUEZ	
EL LLANO GRANDE	J. RAMON QUEZADA RUVALCABA	<i>Ramon Quezada</i>
EL MOLINO	JOSE JUAN MEJIA PEREZ	<i>Jose Juan Mejia Perez</i>
EL SITIO	MANUEL TENERIO CORDERO	
EL TUICHE	JOSE AGUIRRE LOMELI	<i>Jose Aguirre Lomeli</i>
GABRIEL LOPEZ	JOSE PERFECTO GONZALEZ	
LA CIENEGA DE LAS PILAS	JOSE DURAN JAIME	
LA COFRADIA	DAVID DURAN BUSTOS	<i>David Duran B.</i>
LA ESTANCIA	JOSE SANDOVAL GOMEZ	
LA HUERTA	EVELIA RAMIREZ GOMEZ	
LA JABONERA	VICTOR MANUEL VILLALOBOS JAUREGUI	
LA LABOR	VICENTE GARCIA MERCADO <i>Vicente Garcia Rodriguez</i>	<i>Vicente Garcia Rodriguez</i>
LA MAJADA	RAUL GOMEZ ANDRADE	<i>Juan Garcia Rodriguez</i>
LA VILLITA	RUBEN JIMENEZ QUEZADA	
LAS AMARILLAS	MARTIN SALDIVAR ESPARZA	
LAS ANIMAS	JOSE ROSARIO PRETO	<i>Jose Rosario Preto</i>

La Portella 2016

Alicia Flores Martinez

Alicia Flores Martinez

Teresa de Jesus Saragual

LAS HUERTAS	ANTONIO QUEZADA DIAZ	
LAS PILAS	ESPERANZA GOMEZ DURAN	^{Deseada} Flora de Jauriz I
LAS PRESITAS	JUAN RAMON AGUSTIN SIGALA SAL.	Cecilia ^{de Jauriz} de Jauriz
LAS TROJES	EDGAR IVAN GONZALEZ CORDOVA	Hortencia Sigala Hartencia Sigala S.
LAS TUZAS	JOSE ARTURO ALVAREZ VILLEGAS	
LOS ADOBES	ROSARIO OROPEZA GARCIA	^{Angelo} Alejandro ^{delegado} A. A. C.
LOS BORROELES	ERIKA LUIS GARCIA	
LOS CARDOS	GEORGINA DANIELA RUIZ	
LOS SANDOVALES	MA. GUADALUPE MENDOZA FRIAS	Guadalupe Mendoza
MESA DE FRIAS	ABEL PEREZ FRIAS	
MESA DE LA PROVIDENCIAL	MARIO HERNANDEZ LECHUGA	
MOCTEZUMA	FELIPA PEREZ MEJIA	
MONTE DE YAÑEZ	SALVADOR AGUIRRE PEREZ	
OJO DE AGUA	JAVIER MARTINEZ QUEZADA	
PASO DE OROZCO	JOSE RUVALCABA RUVALCABA	
PLAN DEL SAUZ	SOFIA MUÑOZ VILLALOBOS	
PORVENIR DE ORINETE	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ DURAN	
PRIMERO DE MAYO	OMAR LOPEZ VELEZ	
RINCON DE TORRES	RUBEN GUZMAN LUNA	
SAN JOSE DEL SUR	MA. DEL CARMEN BECERRA ESPARZA	Ma Carmen Becerra E.
SAN MARTIN	JAIMIE VELEZ CAJERO	
SANTA GERTRUDIS	IRENE OLMOS SALDIVAR	
TLACHICHILA	JOSE VALLIN MUÑOZ	^{Olmos} Antonio Aguido
TOYAHUA ABAJO	HILDA GONZALEZ	
TOYAHUA DE ABAJO	ABELINO PEREZ GOMEZ	G. G. F. y a perez ^{Heriberto} Salazar
VALLECITOS	JUAN PABLO SALAZAR PEREZ	Juan Salazar ^{Heriberto} Salazar E.
VELADORES	ROSA MARIA CORONA LARIS	Rosa Maria Corona S.

Candido Muñoz Candido Muñoz

Luis Muñoz Durán Luis Muñoz

Jocoyole 2017
Delicias

Jose Rosario Prieto
David Durán B. Rosa Maria Coronel J.

M. Guadalupe Mendez Loza
ARMANDO Aguayo

Cnd. de Mendez

IRMA AGUIRE R

~~Manuel Jimenez~~
~~Manuel Jimenez~~

Glafira Perez

Juan Salazar

~~Subst~~

Hortencia Sigala C

Juan Garcia

Heriberto Salazar P.

ANEXO 2					
Nº.	LOCALIDAD	OBRA O ACCION	MONTO	SUBCLASIFICACION	INCIDENCIA
1	NOCHISTLÁN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE PRIVADAD DE LIMÓN DE LA ZAP 033 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 1,302,131.30	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
2	LAS ANIMAS	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 376,933.83	ESPACIOS DEPORTIVOS	COMPLEMENTARIA
3	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZONA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 401,083.97	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
4	NOCHISTLÁN	CONSTRUCCION DE RED O DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLE NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 145,287.43	AGUA POTABLE	DIRECTA
5	NOCHISTLÁN	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 185,781.45	RED DE DRENAJE	DIRECTA
6	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 1,657,134.32	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
7	COLL. LOMAS DEL REFUGIO	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS	\$ 1,264,695.09	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
8	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE LINEA O RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 81,404.16	AGUA POTABLE	DIRECTA
9	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PRIVADAD DE LIMÓN DE LA ZAP 033 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 168,312.13	RED DE DRENAJE	DIRECTA
10	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZONA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 79,534.34	RED DE DRENAJE	DIRECTA
11	COLL. LOMAS DEL REFUGIO	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE JESUITAS DE LA COLONIA LOMAS DE REFUGIO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 143,180.38	RED DE DRENAJE	DIRECTA
12	LOS SANDOVALES	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 359,243.81	ESPACIOS DEPORTIVOS	COMPLEMENTARIA
13	LA JABONERA	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 1,213,568.41	ACCESO A COMUNIDAD	DIRECTA
14	VELADORES	AMPLIACION DE 954 ML DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VELADORES MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 1,821,612.99	RED DE DRENAJE	DIRECTA
15	TOYAHUA DE ABAJO	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TOYAHUA DE ABAJO MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 223,106.10	ALUMBRADO	DIRECTA
16	NOCHISTLÁN	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE RAFAEL CERVANTES Y LOPEZ VELARDE CON SUBESTACION 37.5 KVA EN NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS	\$ 246,182.73	ELECTRIFICACION	DIRECTA
17	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZONA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 67,316.67	AGUA POTABLE	DIRECTA
18	NOCHISTLÁN	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADAD DE LIMÓN DE LA ZAP 033 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 111,028.84	AGUA POTABLE	DIRECTA
19	COLL. LOMAS DEL REFUGIO	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JESUITAS DE LA COLONIA LOMAS DE REFUGIO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 93,027.85	AGUA POTABLE	DIRECTA
20	NOCHISTLÁN	APORTACION MUNICIPAL PARA CONVENIO DE MEORAMIENTO DE VIVIENDA CON SEDUGOB	\$ 1,000,000.00	VIVIENDA	DIRECTA
18	NOCHISTLÁN	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD INTEGRAL DE SALUD Y REHABILITACION DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 250,000.00	SALUD	DIRECTA
19	NOCHISTLÁN	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ARROYO BLANCO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 180,000.00	ELECTRIFICACION	DIRECTA
20	TOYAHUA DE ABAJO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD TOYAHUA DE ABAJO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 250,000.00	ELECTRIFICACION	DIRECTA
21	NOCHISTLÁN	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LOS ARCOS DE LA ZAP 0329 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	\$ 287,071.00	ELECTRIFICACION	DIRECTA

0018

Patricia Durán

José Aguirre S

Jose Kasario Kviclo
David Durán B. Bosa Mario Caruán L.

ARMANDO Aguayo

IRMA AGUIRRE R

Glaíra Perez


Manuel Jiménez
Juan García Rodríguez

Juan Salazar

Montuena Sigala
Ramon Pineda

22	LOS SANDOVALES	REHABILITACION DE RED O LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC	\$	300,000.00	AGUA POTABLE	DIRECTA
23	VELADORES	REHABILITACION DE CARRETERA VELADORES - NOCHISTLÁN EN LA COMUNIDAD DE VELADORES, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.	\$	450,000.00	CARRETERA	DIRECTA
24	LAS TUZAS	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN EL ARQUILLO DE LA COMUNIDAD DE LAS TUZAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.	\$	325,033.93	AGUA POTABLE	DIRECTA
25	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE AVANTAMIENTO EN LA ZONA ZAP 0443 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC	\$	663,116.00	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
26	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AVANTAMIENTO EN LA ZONA ZAP 0441 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC	\$	131,203.84	RED DE DRENAJE	DIRECTA
27	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE AVANTAMIENTO EN LA ZONA ZAP 0441 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC	\$	66,707.20	AGUA POTABLE	DIRECTA
28	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE PROL. DE MEJÍA EN LA ZONA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC	\$	502,000.00	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
29	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROL. DE MEJÍA EN LA ZONA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC	\$	116,000.00	RED DE DRENAJE	DIRECTA
30	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. DE MEJÍA EN LA ZONA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC	\$	89,000.00	AGUA POTABLE	DIRECTA
31	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE ROBLE EN LA ZONA ZAP 0367 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC	\$	1,334,458.20	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
32	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROBLE EN LA ZONA ZAP 0367 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC	\$	218,000.00	RED DE DRENAJE	DIRECTA
33	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLE EN LA ZONA ZAP 0367 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC	\$	115,000.00	AGUA POTABLE	DIRECTA
34	LOS TEPETATES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LOS TEPETATES MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC	\$	793,000.00	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
35	LOS TEPETATES	COSNTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOS TEPETATES MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC	\$	150,000.00	RED DE DRENAJE	DIRECTA
36	LOS TEPETATES	COSNTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LOS TEPETATES MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC	\$	100,000.00	AGUA POTABLE	DIRECTA
			TOTAL	\$ 16,781,180.97		
			MONTO FAISNUM	\$ 16,845,512.00		
			DIFERENCIA	\$ 64,331.03		

Candido Muroz



Ros Arriaga Durán

José Aguirre S. J. J. J.

Heriberto Salazar P.

0019

M. Guadalupe Mendocéfias

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

CONVENIO DE CONCERTACIÓN 2024

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

Convenio de Concertación, que con objeto de llevar a cabo obras y/o acciones de beneficio social, celebran, por una parte, el H. Ayuntamiento de: Nochistlán, Zac. Representado por el C. Presidente Municipal quien a su vez es el Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal; y por otra el comité comunitario y/o por obra del municipio **MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA** los que en lo sucesivo se denominarán “AYUNTAMIENTO”, “CONSEJO” Y “COMITÉ” respectivamente.

Luis Enrique Jimenez H.

Ara Karen L. G.

ANTECEDENTES

1.- El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Desarrollo Social y de Contraloría y Desarrollo Administrativo: el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; y los Ayuntamientos de los 56 municipios del Estado, celebraron un anexo de ejecución del Convenio de Desarrollo Social 2023, el cual tiene por objeto operar el programa denominado “ Fondo ; mediante la transparencia de los recursos federales y estatales a los H. Ayuntamientos, y estos a su vez los operan conjuntamente con los Consejos de Desarrollo Municipal y los Comités del referido programa.

2.- El consejo de Desarrollo Municipal, correspondiente al municipio de NOCHISTLÁN, con domicilio en CALLE HIDALGO #1, se encuentra constituido según consta en el Acta levantada en Asamblea de consejeros de fecha **22 DE FEBRERO DE 2024** y tiene como principal objetivo efectuar la promoción de los objetivos, estrategias, programas y acciones del Fondo de Desarrollo Social Municipal ; y a la vez promover e impulsar la organización social y la participación de la población organizada.

El C. **JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES** en su carácter de Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal, tiene facultades para suscribir el presente convenio a nombre y representación de dicho Consejo.

3.- LA : **REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** _constituyó el **03 DE JUNIO DE 2024** con el propósito de ejecutar, así como operar y conservar las obras y/o acciones que en su localidad se definieron como prioritarias.


El _____ en su carácter de Presidente del Comité, tiene facultades para suscribir el presente Convenio a nombre y representación de dicho Comité.

Elizabeth H.

Muñoz A.

Yolanda Gómez A.

En razón de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1 fracc. II, 3,4,6,7,28,29,30,50,51 y 82 de la Ley de Adquisiciones de Obras Públicas; y en las disposiciones



0020

aplicables de la ley orgánica Municipal, las partes celebran el presente concentrado el tenor de las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA ,- El H. "AYUNTAMIENTO", el "CONSEJO" y el "COMITÉ" , convienen en conjuntar esfuerzos y recursos para la realización de obras y/o acciones, en el marco del programa " Fondo para la Infraestructura Social Municipal".

SEGUNDA.- Las obras y/o acciones que se ejecutarán por el "Comité" serán las que a continuación se describen : **REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

Para la realización de las obras y/o acciones anteriormente señaladas, el "AYUNTAMIENTO" ministrará al "COMITÉ" **\$168,312.13 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS DOCE PESOS 13/100 MN)**

TERCERA.- La ministración de los recursos a que se refiere la cláusula anterior estará a cargo del "AYUNTAMIENTO".

La ejecución de las obras, objeto del presente instrumento, estará bajo la responsabilidad directa del "CONSEJO" y la supervisión y vigilancia de la misma estará bajo la responsabilidad del "CONSEJO" y del "AYUNTAMIENTO".


CUARTA.- El "AYUNTAMIENTO" se compromete a:

- Ministrar los recursos al "COMITÉ", de acuerdo a los lineamientos que norman el programa
- Llevar un registro contable por separado, de los recursos designados a las obras y/o acciones a que se refiere este Convenio, independiente de la contabilidad de los ingresos del propio "AYUNTAMIENTO" y de otros programas.
- Solicitar informes con periodicidad que se requiera, conforme al tipo de obra y/o acción, al "CONSEJO" y al "COMITÉ" respecto de avance físico de las obras del presente Convenio; así como el ejercicio de los recursos que se otorguen.
- Proporcionar asesoría técnica al Comité en la ejecución de la obra, y apoyar a este con la ministración oportuna de los recursos.
- Informa al Ejecutivo Estatal del avance físico de las acciones u obras y del ejercicio del recurso, objeto del presente Convenio.

QUINTA.- El "COMITÉ" se compromete a:

- Realizar las obras y/o acciones objeto del presente Convenio, sujetándose a los lineamientos del programa a efecto de que se cumplan los principios de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia aplicables, en el ejercicio de los recursos que se aportan.

- Ejercer la totalidad de los recursos señalados en la cláusula segunda, destinándolos única y exclusivamente a las acciones u obras objeto del presente Convenio.



Luis Enrique Jimenez h.

Elizabeth Muñoz A.

Ana Karen L.G.

Yolanda Gómez A.

- c) Proporcionar oportunamente los bancos de materiales que se requieran, así como la mano de obra necesaria en la realización de las obras que se comprometen en este Convenio.
- d) Informar al representante comunitario ante el Consejo, los avances físicos así como la aplicación de los recursos.
- e) Colaborar con el "CONSEJO" en la resolución de problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
- f) Informar mensualmente al "AYUNTAMIENTO", por escrito, del avance físico de las obras y/o acciones, así como de la aplicación de los recursos económicos.
- g) Atender al "CONSEJO" en la inspección de las instalaciones, a efecto de verificar el avance de las acciones u obras objeto del presente Convenio y colaborar con éste, cuando sea necesario.
- h) Llevar una contabilidad especial, de los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda, para la realización del objeto del presente Convenio.
Así como entregar al Consejo los recibos de comprobantes, que amparen las erogaciones realizadas; permitir a las autoridades competentes, auditar dicha contabilidad, si así lo juzgan necesario.
- i) Dar aviso al "CONSEJO" sobre la terminación de las obras de que proceda a su verificación y preparación del informe y acta respectiva.
- j) Recibir las obras y responsabilizarse de su conservación, mantenimiento y operación.
- k) Denunciar ante el "AYUNTAMIENTO" o la Contraloría del Estado, la irregularidades que observen en la aplicación de los recursos financieros; tanto por parte de las autoridades, como de los particulares.

Luis Enrique Jimenez

Ana Karen L.C.

SEXTA. El "CONSEJO" se compromete a:


- a) Gestionar y coordinar los diversos apoyos institucionales que requiera el "COMITÉ", para la realización de las obras y/o acciones derivadas del presente Convenio.
- b) Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la realización de las obras y/o acciones y el ejercicio de los recursos derivados del presente Convenio, de acuerdo con los lineamientos del programa
- c) Realizar visitas de inspección a las instalaciones donde se lleven a cabo las obras y/o acciones.
- d) Solicitar ante las autoridades competentes, los permisos o licencias de construcción que se requieran para la realización de las obras; o en su caso de las acciones, a que se refiere este documento, conforme las leyes aplicables.
- e) Llevar a cabo el seguimiento, registro, control y evaluación del ejercicio de los recursos financieros, así como del avance físico de las acciones u obras objeto del presente Convenio.

Elizabeth Muñoz A.

Yolanda Gómez A.

SEPTIMA.-El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el "CONSEJO" y el "COMITÉ", ya sea consecuencia de dolo, culpa o negligencia de los servidores públicos municipales o de los representantes del "CONSEJO" y/o "COMITÉ" dará lugar a la terminación anticipada del presente convenio. En tal caso se comprometen a reintegrar al "AYUNTAMIENTO" los recursos que se les hayan ministrado y estén por alguna causa sin ejercer en este momento.

0022



Quien tenga conocimiento de las irregularidades, que en este contexto tuvieren lugar, procederá de inmediato a comunicar los hechos a la Contraloría Estatal o Municipal, para que se determine la responsabilidad administrativa que pudiera derivar de tales hechos o circunstancias, la cuál será independiente de la del orden civil o penal que puedan configurarse.

Luis Enrique Jimenez R.

OCTAVA.- En caso de suscitarse duda o controversia respecto a la interpretación y cumplimiento del presente instrumento jurídico, las partes convienen expresamente, someterse a corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

NOVENA. - El presente Convenio de concertación entrará en vigor el día de su firma y su vigencia será el **ejercicio fiscal 2024**, pudiéndose modificar o adicionar de común acuerdo por las partes; las modificaciones Y adiciones deberá constar por escrito y surtirán efectos a partir de su suscripción.

Elizabeth Muñoz A.

Ang Karen L.G.
Yolanda Gomez A.

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0023

Dado que fue el presente Convenio de Concertación y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firma para constancia y validez en: **03 DE JUNIO DE 2024**

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

FOR EL H. AYUNTAMIENTO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL C.D.S.M.



PROF. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR

EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO



L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO




ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

POR EL COMITÉ DE OBRA

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA



Elizabeth Muñoz A.

NOMBRE:

SECRETARIO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA .



Luis Enrique Jimenez L.

NOMBRE:

TESORERO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA



Ana Karen L. G.

NOMBRE:

VOCAL DE CONTROL


NOMBRE Y FIRMA.



Yolanda Gomez A.

NOMBRE

0024


OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

V

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ COMUNITARIO Y/O POR OBRA

402002

EJERCICIO 2024

RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

MARCO ESTRATÉGICO

Se promueve, la integralidad política institucional y de la sociedad para fortalecer el proceso de descentralización ampliando las capacidades de estados y municipios promoviendo la corresponsabilidad ciudadana y la participación social en la aplicación de los recursos públicos; sumando esfuerzos colectivos para alcanzar mejores condiciones de vida; cuidando que la obra a ejecutar se haga con transferencia y calidad. Es por ello y que en apego al Manual Único de Operación se formula la siguiente actuación:

En el municipio de NOCHISTLAN DE MEJIA y reunidos los habitantes del lugar que en forma anexa firman de asistencia en el lugar que ocupa LUGAR DE REUNION con la finalidad de concertar y conformar con la participación comunitaria y democrática el comité de obra comunitaria acordada por el Consejo de Desarrollo Municipal y autorizada y aprobada por la secretaría de Planeación y Finanzas en oficio No. respectivamente en la ejecución de la obra: **REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** Siendo las **12:00** Horas del día **22 FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO** y en asamblea general extraordinaria, legalmente constituida con la asistencia de la mayoría de los habitantes con derecho a participar y ante la presencia de las diversas representaciones de los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales y del representante del Consejo en esta comunidad se da por iniciada bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación de autoridades.
- 2.- Lista de presentes.
- 3.- Objetivos generales de constituir el comité de obra comunitario.
- 4.- Alcances y beneficios del programa de desarrollarse en esta población.
- 5.- Propuestas para la integración del comité.

Abordados y agotados los puntos del 1 al 4, se escucharon propuestas a candidatos para la integración del comité habiendo quedado por mayoría como se especifica al final de esta actuación firmando de conformidad los que en ésta aceptan los cargos y responsabilidades.



LOUIS

Enrique

Jimenez

L.

Xolanda Gómez A.

Munoz A.

Elizabeth

Karen L.

0025

LOS BENEFICIARIOS SE COMPROMETEN A:

- 1.- Aportar: \$ 0. 00/100 MN que corresponde al 0% aproximadamente del costo total para el programa F.I.S.M. Para que la obra se realice en el menor tiempo posible y hasta la fecha programada para su ejecución final, así como otros trabajos donde se requiera su participación.
- 2.- Colaborar con las autoridades en la resolución de los problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
- 3.- Aplicar los recursos de conformidad con el Manual Único de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 y la ley de adquisiciones y obras públicas, contenidas en las siguientes:

Luis Enrique

Elizabeth Muñoz A.

C L A U S U L A S

PRIMERA: El comité se denominará: comité de **REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** personalidad jurídica y patrimonio propio.

SEGUNDA: El comité tendrá por objetivo contribuir a la construcción de la obra a que se hace referencia en el apartado anterior de éste documento apoyando y vigilando la operación y administración del programa, participará también en la organización de tareas comunitarias en las que se aporten materiales y/o mano de obra de los beneficiarios.

TERCERA: El domicilio legal del comité de obras se fijará en: **LUGAR DE LA OBRA** del municipio de **Nochistlán de Mejía.**

CUARTA: El comité se encargará de llevar a cabo tareas de promoción, difusión, organización construcción, vigilancia y mantenimiento de las obras que con motivo del programa se ejecuten.

QUINTA: El presidente del comité informará al representante comunitario del Consejo de Desarrollo Municipal de los avances físicos y financieros de la obra y comunicará a través del mismo al seno del consejo la problemática relacionada con la operación del programa. El presidente del comité tendrá la representación de la asamblea general ante toda clase de autoridades, organismos, personas físicas y morales siempre que sea necesario para el cumplimiento de los compromisos del comité.

SEXTA: El secretario tendrá a su cargo el archivo de la documentación correspondiente así como contestar y recibir toda clase de correspondencia.


SEPTIMA: El tesorero controlará los fondos y distribuirá los pagos que con motivo de la realización de las obras se eroguen en liquidación de mano de obra y/o materiales, teniendo especial cuidado de recabar la documentación comprobatoria de los gastos.

Jimenez

Yolanda Gómez A.

Karen L.G

0026



OCTAVA: El Vocal de control y vigilancia informa y orienta al comité y a la comunidad acerca de los lineamientos de operación del fondo, trámites, recursos asignados y desarrollo de las obras y acciones. Así como la estricta vigilancia de las obras y la actuación de los servidores públicos.

NOVENA: En este acto el comité recibe por parte del "AYUNTAMIENTO" fotocopia del proyecto técnico de la obra a ejecutar para su consulta y conocimiento de las diversas representaciones involucradas en el programa que se los requiera como referencia.

Leída que fue la presente acta constitutiva y enterados los participantes de su contenido y alcance legal, la firman de conformidad para su constancia y validez los que en ella quedaron como comité; la presente se integra con la lista de asistencia en la comunidad de **REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA

Elizabeth Muñoz A.

NOMBRE:

SECRETARIO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA.

Luis Enrique Jimenez L.

NOMBRE:

TESORERO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA

Arca Karen L.C.

NOMBRE:

VOCAL DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA.

Yolanda Gómez A.

NOMBRE:


POR LA PRESIDENCIA MPAL.

PROF. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR


ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO.

0027

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXOS PARA EL REPORTE DE LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL- FISMDF 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL

0029

OPERADO
FAISM (FIII)

EJERCICIO 2024

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 1

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

Aviso de privacidad: Los datos personales que se recaban por la DGDR serán utilizados para los fines establecidos en los lineamientos del Fondo, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte.

RESPONSABLE DEL LLENADO: ENLACE FISDMF Y COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

1.1 Acta de Instalación del Comité de participación social

Siendo las 11 horas del día 03 del mes de 06 del año 2024 en la localidad de NOCHISTLAN, del municipio NOCHISTLAN, de la entidad ZACATEACAS, se encuentran reunidos el/la C. ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ, designado (a) como enlace FISDMF, quien ostenta el cargo de ENCARGADO en calidad de representante de la instancia ejecutora, el/la C. Elizabeth Muñoz Aguino, el/la C. Luis Enrique Jimenez, el/la C. Ana Karen L.G., el/la C. EDUARDO GÓMEZ, y el/la C. Yolanda Gómez A. para celebrar la instalación del Comité de participación social, que dará seguimiento y verificación de la obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS. a realizarse con los recursos del FAIS, componente FISDMF, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.


CONSIDERANDO

Que el artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal, establece la obligación que tendrán municipios y demarcaciones territoriales de promover la participación de las comunidades beneficiarias en la planeación, ejecución, control, vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras y acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Que los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigentes, publicados el en Diario Oficial de la Federación, en su numeral 3.1.2, fracciones XV y XVI, los gobiernos locales tendrán como responsabilidades:

- 1.- Promover la participación social en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través de los comités de participación social o de las formas de organización con las que cuente el municipio o demarcación territorial.
- 2.- Los municipios y demarcaciones territoriales deberán reportar los formatos de la integración y operación de los comités de participación social en el Módulo de Participación Social de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social-MIDS.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO I

Que la Guía de Participación define al comité de participación social-CPS, como un órgano de participación social y representación de una comunidad, ya sea urbana, rural, indígena, o afromexicana, electos de manera democrática que dan seguimiento a la ejecución de las obras o acciones que se programan a través del FISMD, así como cualquier otra forma de organización con la que cuente el municipio o alcaldía, mismo que deberá conformarse en cada obra del FISMD. Este acto deberá formalizarse mediante la elaboración del acta respectiva.

Que el comité de participación social (CPS) deberá estar compuesto por cuatro personas como mínimo, que sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, que ocuparán los cargos de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo será el participar en la planeación, ejecución, control, vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras y acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

El comité de participación social deberá cumplir con las siguientes actividades:

1. Dar seguimiento al avance y conclusión de las obras o acciones a realizar con recursos del FISMD, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos se realice bajo los principios de transparencia, eficacia, legalidad y honradez.
2. Realizar visitas a las obras e informar de los avances, así como de y la conclusión de las mismas a sus comunidades y a la Secretaría de Bienestar, a través de llenado de los Anexos (1, 2, 3 y 4) de participación social.
3. Participar en la capacitación que brindará el Gobierno Municipal, sobre las tareas y responsabilidades de supervisión de las obras que vigilará.
4. Participar en los procesos de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades municipales, siempre y cuando los proyectos sugeridos se apeguen a los lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos.

En tal contexto, tomando en consideración las atribuciones que se contienen en los ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente:

ACUERDO ÚNICO.- Se declara formalmente **INSTALADO** el comité de participación social en la localidad de Nocnistlán de Mejía del municipio de Nocnistlán, de la entidad _____, que dará seguimiento y verificación de la obra Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Privada de Limón LA zona ZUP 0333 en LA localidad NOCNISTLÁN.

Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los/as intervinientes e integrantes del comité de participación social, para los efectos conducentes.

0031



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 1

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Nombre completo	Datos de contacto (Domicilio, teléfono y correo electrónico)	Cargo	¿Se considera usted integrante de pueblos indígenas o afroamericanos? Si/No ¿A Cuál (especifique)?	Firma
Elizabeth Muñoz A.	346 700 05 27 7 Privada de limon #	Presidente (a)	NO	Elizabeth Muñoz A.
Luis Enrique Jimenez L.	Priv. de limon # 346 700 92 84 3	Secretario (a)	NO	Luis Enrique Jimenez L.
Ana Karen Hectasma García	Guerrero #109 a 346 102 22 84	Vocal	NO	Ana Karen L.G.
Yolanda Gómez	Priv. Limon	Vocal	NO	yolanda Gómez A
EDUARDO GÓMEZ	Priv. Limon	Vocal	NO	EDUARDO GÓMEZ

TESTIGO

Nombre completo	Datos de contacto (Domicilio, teléfono y correo electrónico)	Cargo	Firma
Juan Carlos Avelar Ramírez	Calle Arcos 75 #18 346-113-1755	Enlace FISMDF de la instancia ejecutora	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



2022 Flores
Año de Maón
PRESENCIA EN LA RED. SER. SOCIAL

0032

OPERADO
FAISM (FIII)

EJERCICIO 2024



ANEXO 1

1.2. REPORTE DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la obra:	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS			
Folio del proyecto:	402002			
Municipio	NOCHISTLAN			
Localidad	NOCHISTLAN			
Entidad	ZACATECAS			
Fecha y hora de la capacitación	11:00 03/06/2024			
Lugar de la capacitación	LUGAR DE COSTUMBRE			
Nombre del facilitador/a	ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ			
Temas	DRENAJE SANITARIO			
Número de asistentes	Mujeres	05	Hombres	05

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre	Datos de contacto (Domicilio, teléfono y correo electrónico)	Cargo	Recibió los materiales informativos del FAIS (Sí o No)	Firma
Elizabeth Muñoz Apurto	Privada de limón #7 346 700 03 27	PRESIDENTE	si	Elizabeth Muñoz A.
Luis Enrique Jimenez L.	privada de limon #13 346 700 92 89	SECRETARIO	si	Luis Enrique Jimenez L.
Ana Karen Ledesma Garcia	Guerrevo #109 a 346 1022284	TESORERO	si	Ana Karen L.G.
Yolanda Gómez A	Priv. limon	VOCAL	si	yolanda Gómez A. 0033
EDUARDO GÓMEZ	Priv. Limon	VOCAL	si	EDUARDO GÓMEZ

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

FAISM (FIII)





ANEXO 1

FOTOGRAFÍAS DE LA CAPACITACIÓN



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

0034

OPERADO
FAISM (FIII)

EJERCICIO 2024



2022 Flores
Año de Magón



ANEXO 2

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Fecha: (dd/mm/aaaa)

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS		
Folio del proyecto	402002		
Municipio	NOCHISTLAN		
Localidad	NOCHISTLAN		
Entidad	ZACATECAS		
Monto invertido	\$ 168,312.13		
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) 03/06/2024	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa) 03/07/2024	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No (X)
2. Descripción de la obra	Describa aquí en qué consiste la obra: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO		
3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)	No ()	

0035



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 2

4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad	SERVICIO BASICO	
6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3. a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (<input checked="" type="checkbox"/>) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). (<input type="checkbox"/>) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. (<input checked="" type="checkbox"/>) d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (<input type="checkbox"/>) e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. (<input checked="" type="checkbox"/>) f) Otra, indique cual: _____	

0036

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 2

9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	a) 1-3 ()	b) 4-6 ()	c) +6 (X)
--	------------	------------	--------------------

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Elizabeth Muñoz Aguino.

Elizabeth Muñoz A.

Presidente(a) del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

Luis Enrique Jimenez L.

Secretario(a) del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

Ana Karen L.G.

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

EDUARDO GÓMEZ

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

Yolanda Gómez A.

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

0037

[Firma]

Enlace FISMDF
(Nombre completo y firma)



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 3


ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra		
Folio de la obra		
Municipio		
Localidad		
Entidad		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa)
¿Se registraron quejas o denuncias) (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	No ()
Seleccione el tipo de registro (Marque con una X la opción correspondiente).	Queja () En caso de contestar queja , pase a la pregunta 1.	Denuncia () En caso de contestar denuncia , pase a la pregunta 2
1. ¿Cuál es el motivo de la queja?	Describa la queja a continuación:	
2. ¿Cuál es el motivo de la denuncia?	Describa la denuncia a continuación:	
3. ¿Entregó y/o presentó la queja o denuncia ante alguna autoridad? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
	No ()	
4. ¿La queja o denuncia fue atendida de manera satisfactoria? (Marque con una X la	Sí ()	

0038



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 3


opción correspondiente).	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
5. Escriba el nombre de la(s) instancia(s) ante la cual presentó la queja o denuncia (Puede ser el folio de seguimiento, número de expediente o algún otro dato, como número telefónico, correo electrónico, etcétera.)		

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE PROMUEVE LA QUEJA O DENUNCIA

Anónimo	() (Marque con una X en caso de denuncia anónima)		
En caso de que quiera identificarse, complete la información que se solicita a continuación:			
Nombre completo			
Sexo M () F ()	Edad		Escolaridad
Ocupación			
Datos de contacto (teléfono y correo electrónico)			
ACUSE DE RECIBIDO EN EL CPS	Presidente(a) del Comité de participación social (Nombre completo y firma)		
ACUSE DE RECIBIDO MUNICIPIO	Persona Funcionaria Pública (Nombre completo y firma)		

0039

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 4

ANEXO 4. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS	
Folio del proyecto	402002	
Dirección o ubicación	PRIVADA DE LIMON	
Municipio	NOCHISTLAN	
Localidad	NOCHISTLAN	
Entidad	ZACATECAS	
Monto invertido	\$168,312.13	
1. ¿La obra concluyó conforme el periodo de ejecución? (Marque con una X la opción correspondiente).	SÍ (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué (favor de pasar a la pregunta 9)
2. Desde su punto de vista, ¿la obra se concluyó satisfactoriamente? (Marque con una X la opción correspondiente).	SÍ (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
3. Indicar la fecha de inauguración o entrega de la obra:	(dd/mm/aaaa) 03/07/2024	
4. ¿El comité estuvo presente en la inauguración o entrega de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	SÍ (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué. 0040

OPERADO
FAISM (FIII)

EJERCICIO 2024

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 4

5. ¿El comité colocó la placa de conclusión de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
6. ¿Recibieron por parte del municipio el acta entrega-recepción de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
7. Mencione dos resultados o beneficios obtenidos en su comunidad con el trabajo realizado por el CPS de FISMDF	PARTICIPACION DE LOS VECINOS SUPERVISION POR PARTE DE LOS VECINOS	
8. ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de haber participado en el CPS de FISMDF? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
9.-En caso de no haberse concluido la obra, colocar la posible fecha de término.		

0041



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Elizabeth Muñoz Aguino

Elizabeth Muñoz A.

**Presidente(a) del Comité de
Participación Social**

(Nombre completo y firma)

Luis Enrique Jimenez L.

**Secretario(a) del Comité de
Participación Social**

(Nombre completo y firma)

Ana Karen L.G.

**Vocal del Comité de
Participación Social**

(Nombre completo y firma)

EDUARDO GÓMEZ

**Vocal del Comité de
Participación Social**

(Nombre completo y firma)

yolanda Gómez A.

**Vocal del Comité de
Participación Social**

(Nombre completo y firma)

[Signature]

Enlace FISDMF

(Nombre completo y firma)

0042



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 4

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

RESPONSABLE DEL LLENADO: MUNICIPIO Y COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISDMF)

Siendo las 6 horas del día 03 del mes de 07 del año 2024 en la localidad de NOCHISTLAN, del municipio NOCHISTLAN, de la entidad ZACATECAS, se encuentran reunidos el/la C. ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, quien ostenta el cargo de ENLASE FAIS en calidad de la instancia ejecutora, así como el Comité de participación social integrado por el/la C. Elizabeth Muñoz Aguino, el/la C. Yolanda Gómez A., el/la C. Luis Enrique Jimenez L., el/la C. EDUARDO GÓMEZ, y el/la C. ANA KAREN L.G. para celebrar la entrega-recepción de la obra: _____, conforme a lo acordado en sus especificaciones técnicas y legales, que se describen a continuación.

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS	
Número de folio	402002	
Dirección o ubicación	PRIVADA DE LIMON	
Municipio	NOCHISTLAN	
Localidad	NOCHISTLAN	
Entidad	ZACATECAS	
Monto invertido	\$168,312.13	
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) 03/06/2024	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa) 03/07/2024

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y los y las integrantes del Comité de participación social responsables, y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra queda terminada conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta **0043**

No habiendo otro asunto a tratar, se da por terminada la entrega-recepción, siendo las 6:40 horas del día 03/07/2024 citado, levantando para evidencia de este acuerdo la presente, donde firman de conformidad las partes.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ENTREGAN POR PARTE DEL MUNICIPIO (Nombre del municipio)



Persona Funcionaria Pública
(Nombre completo, cargo y firma)

RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Elizabeth Muñoz Aguino.

Elizabeth Muñoz A.

**Presidente(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

Luis Enrique Jimenez L.

**Secretario(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

Ana Karen L.G.

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

EDUARDO GÓMEZ


**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

Yolanda Gómez A.

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

0044

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





NOCHISTLÁN
De Mejía
PUEBLO MÁGICO

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
NO. OFICIO	148
ASUNTO:	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTÍNEZ
CALLE CUAUHTEMOC NO.1, TLACHICHILA
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS

En virtud de haber cumplido adecuadamente las disposiciones legales y vigentes contenidos en el Artículo 64, de la Ley de Ingresos Municipales para el año 2024, esta Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, a mi cargo, le autoriza: **"PERMISO DE CONSTRUCCIÓN" DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMÓN DE LA ZAP 0333 EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS;** según contrato con el H. Ayuntamiento de este municipio.

Es facultad de esta dependencia conforme a lo establecido en la Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas y Municipios en el artículo 36 fracción II art. 103, 104, 105, 106 y las Normas de Seguridad para la Población Laboral emitidas por STPS ejecutar dichas acciones.

Así mismo se le notifica que:

- ◆ Está prohibido conectar las aguas pluviales a la línea de drenaje.
- ◆ No deberá dejar escombros o material obstruyendo la vía pública.

Nota: deberá de sujetarse a la construcción del proyecto que ampara su contrato NO. NOCHIS/FONDOIII/2024/09 con el H. Ayuntamiento, además tiene la obligación de notificar la terminación de la obra.

Se extiende la presente a solicitud del interesado para los usos y fines legales que al mismo convengan, en la ciudad de **Nochistlán de Mejía, Estado de Zacatecas, a 01 de julio de 2024.**

ATENTAMENTE
ENCARGADO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MPALES.




OBRAS PÚBLICAS
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2021 - 2024

C. SERGIO HINOJOSA PÉREZ

0045

c.c.p. LIC. ROCIO ROQUE GÓMEZ, Tesorera Municipal Presidencia Municipal. - Para su conocimiento y fines de pago.
c.c.p. El Archivo.



VALIDACIÓN O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

**REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP
0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA
NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCIÓN, COMPROMETIÉNDOSE LA MISMA A
PROPORCIONAR LA SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO
CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS POSIBILIDADES

POR LA DEPENDENCIA O
NORMATIVA



**DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL**
ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2021 - 2024
ENCARGADO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

POR LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD EJECUTORA



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2021 - 2024
PROF. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR
PRESIDENTE MPAL.

LUGAR: NOCHISTLAN ,ZAC.


FECHA: 03/06/2024

INFORMACIÓN ADICIONAL: _____

0046

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente





ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA COMUNIDAD

FECHA: 03-jun-24

COMUNIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACIÓN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO

REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: _____

REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.


POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS

Elizabeth Muñoz A

POR LA ENTIDAD EJECUTORA



PROF RAFAEL AGUAYO SALDIVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



0047



NOCHISTLÁN
De Mejía
PUEBLO MÁGICO

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 21 DE JUNIO DEL 2024

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ.

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2024/09 CONSISTENTE : REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA DE LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS. EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PARA LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 05 DE JULIO DEL 2024 A LAS 12:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL .

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.



DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0048



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: LINEA DE DRENAJE CALLE PRIVADA DE LIMON




Ubicación: , NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS,

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS			
PREELIMINARES			
01-RSD	Trazo y nivelacion de ejes para lineas de drenaje con equipo topografico, incluye: equipo necesario, señalizacion del banco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requieran en la nivelacion con pintura y renivelaciones necesarias	m	106.00
IMPORTE DE PREELIMINARES			
TERRACERIAS			
020251	Excavación por medios mecánicos de terreno en cepa, hasta una profundidad de 0 a - 2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	103.88
AFI-01	Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno	m2	74.20
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberias, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	7.42
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavacion, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	37.10
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	m3/km	74.20
IMPORTE DE TERRACERIAS			
MATERIALES			
070206-1	Tubo pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	106.00
070211	Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	114.00
071005	Codo 45 pvc sanitario cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	19.00
071011	Codo 90° pvc sanitario cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	38.00
SILL-01	Suministro y colocacion de silleta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye: material, mano de obra	pza	19.00
071305	Tapón hembra pvc sanitario cementar (h) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	3.00

IMPORTE DE MATERIALES

RELLENOS





DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: LINEA DE DRENAJE CALLE PRIVADA DE LIMON



Ubicación: , NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS,

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	29.68
030116	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	66.78
D-11	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., juntado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, sobre base de plantilla de concreto de 5 y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00

IMPORTE DE RELLENOS

OBRAS CONEXAS

170401	Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.2 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizón desplantado sobre firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 juntado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.	pza	2.00
--------	--	-----	------

IMPORTE DE OBRAS CONEXAS

IMPORTE DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

TOMAS DOMICILIARIA

TERRACERIAS


020251	Excavación por medios mecánicos de terreno en cepa, hasta una profundidad de 0 a - 2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	74.10
AFI-01	Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno	m2	57.00
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	5.70
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavación, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con máquina.	m3	22.80
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se consideran (2 km)	m3/km	45.60

IMPORTE DE TERRACERIAS

RELLENOS

10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	17.10
030116	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	51.30

IMPORTE DE RELLENOS



0050



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: LINEA DE DRENAJE CALLE PRIVADA DE LIMON



Ubicación: , NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS,

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
-------	-------------	--------	----------

IMPORTE DE TOMAS DOMICILIARIA

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0051



NOCHISTLÁN
De Mejía
PUEBLO MÁGICO

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 21 DE JUNIO DEL 2024

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING.CARLOS ANTONIO GUERRERO MUÑOZ

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2024/09 CONSISTENTE : REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA DE LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS. EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PARA LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 05 DE JULIO DEL 2024 A LAS 12:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL .

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.



DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
ING. DIÉGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0052



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: LINEA DE DRENAJE CALLE PRIVADA DE LIMON




Ubicación: , NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS,

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS			
PREELIMINARES			
01-RSD	Trazo y nivelacion de ejes para lineas de drenaje con equipo topografico, incluye: equipo necesario, señalizacion del banco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requieran en la nivelacion con pintura y renivelaciones necesarias	m	106.00
IMPORTE DE PREELIMINARES			
TERRACERIAS			
020251	Excavación por medios mecánicos de terreno en cepa, hasta una profundidad de 0 a - 2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	103.88
AFI-01	Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno	m2	74.20
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	7.42
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavacion, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	37.10
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	m3/km	74.20
IMPORTE DE TERRACERIAS			
MATERIALES			
070206-1	Tubo pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	106.00
070211	Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	114.00
071005	Codo 45 pvc sanitario cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	19.00
071011	Codo 90° pvc sanitario cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	38.00
SILL-01	Suministro y colocacion de silleta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye: material, mano de obra	pza	19.00
071305	Tapón hembra pvc sanitario cementar (h) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	3.00

IMPORTE DE MATERIALES

RELLENOS



0053



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: LINEA DE DRENAJE CALLE PRIVADA DE LIMON



Ubicación: , NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS,

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	29.68
030116	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	66.78
D-11	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., juntado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, sobre base de plantilla de concreto de 5 y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00

IMPORTE DE RELLENOS

OBRAS CONEXAS

170401	Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.2 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizón desplantado sobre firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 juntado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.	pza	2.00
--------	--	-----	------

IMPORTE DE OBRAS CONEXAS

IMPORTE DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

TOMAS DOMICILIARIA

TERRACERIAS


020251	Excavación por medios mecánicos de terreno en cepa, hasta una profundidad de 0 a - 2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	74.10
AFI-01	Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno	m2	57.00
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	5.70
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavación, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con máquina.	m3	22.80
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se consideraran (2 km)	m3/km	45.60

IMPORTE DE TERRACERIAS

RELLENOS

10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	17.10
030116	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	51.30

IMPORTE DE RELLENOS



0054



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: LINEA DE DRENAJE CALLE PRIVADA DE LIMON




Ubicación: , NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS,

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
IMPORTE DE TOMAS DOMICILIARIA			

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO



0055



NOCHISTLÁN
De Mejía
PUEBLO MÁGICO

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 21 DE JUNIO DEL 2024

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

C. ANGELICA RUANO AVILA

PRESENTE.


POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2024/09 CONSISTENTE : REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA DE LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PARA LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 05 DE JULIO DEL 2024 A LAS 12:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL .

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.



DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0056



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: LINEA DE DRENAJE CALLE PRIVADA DE LIMON




Ubicación: , NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS,

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS			
PREELIMINARES			
01-RSD	Trazo y nivelacion de ejes para lineas de drenaje con equipo topografico, incluye: equipo necesario, señalizacion del banco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requieran en la nivelacion con pintura y renivelaciones necesarias	m	106.00
IMPORTE DE PREELIMINARES			
TERRACERIAS			
020251	Excavación por medios mecánicos de terreno en cepa, hasta una profundidad de 0 a - 2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	103.88
AFI-01	Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno	m2	74.20
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	7.42
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavacion, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	37.10
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	m3/km	74.20
IMPORTE DE TERRACERIAS			
MATERIALES			
070206-1	Tubo pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	106.00
070211	Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	114.00
071005	Codo 45 pvc sanitario cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	19.00
071011	Codo 90° pvc sanitario cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	38.00
SILL-01	Suministro y colocacion de silleta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye: material, mano de obra	pza	19.00
071305	Tapón hembra pvc sanitario cementar (h) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	3.00

IMPORTE DE MATERIALES

RELLENOS





DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: LINEA DE DRENAJE CALLE PRIVADA DE LIMON



Ubicación: , NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS,

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	29.68
030116	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	66.78
D-11	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., juntado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, sobre base de plantilla de concreto de 5 y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00

IMPORTE DE RELLENOS

OBRAS CONEXAS

170401	Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.2 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizón desplantado doble firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 juntado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.	pza	2.00
--------	--	-----	------

IMPORTE DE OBRAS CONEXAS

IMPORTE DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS

TOMAS DOMICILIARIA

TERRACERIAS

020251	Excavación por medios mecánicos de terreno en cepa, hasta una profundidad de 0 a - 2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	74.10
AFI-01	Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno	m2	57.00
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	5.70
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavación, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con máquina.	m3	22.80
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	m3/km	45.60

IMPORTE DE TERRACERIAS

RELLENOS

10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	17.10
030116	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	51.30

IMPORTE DE RELLENOS

OPERADO

FAISM (FII)

EJERCICIO 2024

0058



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: LINEA DE DRENAJE CALLE PRIVADA DE LIMON

Ubicación: , NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS,



Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
IMPORTE DE TOMAS DOMICILIARIA			

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO



0059

SERVICIOS MELENDREZ

ANGELICA RUANO AVILA
RUAA880710SQ6
16 DE SEPTIEMBRE 166
CENTRO LOCALIDAD DANIEL CAMARENA
NOCHISTLÁN DE MEJIA,ZACATECAS
México C.P. 99914
j_melendrez@hotmail.com
CEL. 346-101-2142

ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ.

ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL MPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA ZAC.
NOCHISTLÁN, ZAC., 21 DE MAYO 2024

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA EXPRESAR MI INTERES
EN PARTICIPAR EN EL EJERCICIO DE ADJUDICACIÓN PARA LA OBRA
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE
LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE
MEJIA , ZACATECAS

POR LO QUE ANEXO MI PRESUPUESTO.

ATENTAMENTE



ANGELICA RUANO AVILA

CONTRATISTA



0060

SERVICIOS MELENDREZ

ANGELICA RUANO AVILA
RUAA880710SQ6
16 DE SEPTIEMBRE 166
CENTRO LOCALIDAD DANIEL CAMARENA
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS
México C.P. 99914
j_melendrez@hotmail.com
CEL. 346-101-2142

ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ.

ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL MPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA ZAC.
NOCHISTLÁN, ZAC., 21 DE MAYO 2024

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE CONOZCO EL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS PARA LA OBRA: **REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA , ZACATECAS**

ATENTAMENTE



ANGELICA RUANO AVILA

CONTRATISTA



0061

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	P.Unitario	Subtotal
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS. PRELIMINAES					
01-RSD	Trazo y nivelacion de ejes para lineas de drenaje con equipotopografico, incluye: equipo necesario, señalizacion del banco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requieran en la nivelacion con pintura y renivelaciones necesarias	106.00	m	\$10.26	\$1,087.56
IMPORTE DE PRELIMINAES					\$1,087.56
TERRACERIAS					
020249	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	103.88	m3	\$132.21	\$13,733.97
AFI-01	Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno	74.20	m2	\$21.63	\$1,604.95
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	7.42	m3	\$218.21	\$1,619.12
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	37.10	m3	\$110.25	\$4,090.28
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	74.20	m3/km	\$18.10	\$1,343.02
IMPORTE DE TERRACERIAS					\$22,391.33

ANGELICA RUANO AVILA


CONTRATISTA




0062

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	P.Unitario	Subtotal
MATERIALES					
362	Tubo de pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye materiales, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para su correcta ejecucion del P.U.O.T.	106.00	m	\$381.54	\$40,443.24
070211	Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	114.00	m	\$154.20	\$17,578.80
071005	Codo 45 pvc sanitario cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	19.00	pza	\$131.45	\$2,497.55
0710111	Codo 90° pvc sanitario cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	38.00	pza	\$165.20	\$6,277.60
213700	Suministro y colocacion de silleta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye:material, mano de obra	19.00	pza	\$272.65	\$5,180.35
256	Tapón hembra pvc sanitario cementar (h) 6" incluye: materiales,mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución delp.u.o.t.	3.00	pza	\$121.36	\$364.08
IMPORTE DE MATERIALES					\$72,341.62
RELLENOS					
21257	Relleno para acostillado de tubería con material de banco(tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo dematerial en carretillaa 30 mts de distancia.	29.68	m3	\$255.63	\$7,587.10
030106	Relleno con material producto de la excavación, compactado amaquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano deobra, equipo y herramienta.	66.78	m3	\$85.45	\$5,706.35
D25	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 6x 12 x 24 cms., junteado con mezcla cemento arena 1:5 acabadopulido en el interior,sobre base de plantilla de concreto de 5 ycadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2agregado de 20 mm, cemento normal, incluye:excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	1.00	pza	\$2,999.30	\$2,999.30
IMPORTE DE RELLENOS					\$16,292.75

ANGELICA RUANO AVILA



 CONTRATISTA

0063

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

SERVICIOS MELENDREZ


ANGELICA RUANO AVILA
RUAA880710SQ6
16 DE SEPTIEMBRE 166
CENTRO LOCALIDAD DANIEL CAMARENA
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS
 México C.P. 99914
 j_melendrez@hotmail.com
 CEL. 346-101-2142

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	P.Unitario	Subtotal
OBRAS CONEXAS					
170401	Pozos de visita para brocal de 0.90 x 2.00 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizón desplantado doble firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 junteado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.	2.00	pza	\$9,365.00	\$18,730.00
IMPORTE DE OBRAS CONEXAS					\$18,730.00
TOMA DOMICILIARIA					
TERRACERIAS					
020249	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	74.10	m3	\$132.21	\$9,796.76
AFI-01	Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno	57.00	m2	\$21.63	\$1,232.91
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	5.70	m3	\$218.21	\$1,243.80
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	22.80	m3	\$110.25	\$2,513.70
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	45.60	m3/km	\$18.10	\$825.36
IMPORTE DE TERRACERIAS					\$15,612.53
RELLENOS					
21257	Relleno para acostillado de tubería con material de banco(tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo dematerial en carretillaa 30 mts de distancia.	17.10	m3	\$255.41	\$4,174.79
030106	Relleno con material producto de la excavación, compactado amaquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano deobra, equipo y herramienta.	51.30	m3	\$85.64	\$4,310.23
IMPORTE DE RELLENOS					\$8,485.02
IMPORTE DE TOMA DOMICILIARIA					\$24,097.55
IMPORTE DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE					\$154,940.81
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					\$154,940.81
IVA(16%)					\$24,790.53
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA					\$179,731.34

ANGELICA RUANO AVILA



CONTRATISTA

(* CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 34/100 MXN *)



0064

ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ.
ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZAC.
21/ MAYO /2024

PRESENTE:


POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DIRIJO A USTED, PARA EXPRESAR MI INTERES EN PARTICIPAR EN EL EJERCICIO DE ADJUDICION DIRECTA PARA LA OBRA: **REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA , ZACATECAS**

POR LO QUE ADJUNTO MI PRESUPUESTO Y SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIANDOLE UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

Atentamente



ING. CARLOS ANTONIO GUERRERO MUÑOZ
CONTRATISTA



0065

ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ.
ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZAC.
21/ MAYO /2024

PRESENTE:


POR MEDIO DE LA PRESENTE DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DIRIJO A USTED PARA MANIFESTARLE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOZCO EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS Y CONDICIONES AMBIENTALES, ASI COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LA OBRA: **REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA , ZACATECAS**

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIANDOLE UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

Atentamente



ING. CARLOS ANTONIO GUERRERO MUÑOZ
CONTRATISTA



ING. CARLOS ANTONIO GUERRERO MUÑOZ
 C. VICENTE GUERERO #1
 LA ESCONDIDA JALPA ZAC.
 RFC: GUMC9205062A
 TE.L. 4921065251

H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA
 ZACATECAS
 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL




PRESUPUESTO

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

CLAVE	ENUNCIADO DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
				NÚMERO	PRECIO UNITARIO (SIN I.V.A.) CON LETRA
	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS. PRELIMINAES				\$0.00
01-RSD	Trazo y nivelación de ejes para líneas de drenaje con equipotografías, incluye: equipo necesario, señalización del banco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requieran en la nivelación con pintura y renivelaciones necesarias	m	106.00	\$4.71	CUATRO PESOS 71/100 MXN
					IMPORTE DE PRELIMINAES
020249	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	103.88	\$128.46	CIENTO VEINTIOCHO PESOS 46/100 MXN
AFI-01	Afrite de taludes y fondo de cepa a mano en terreno	m2	74.20	\$22.30	VEINTIDOS PESOS 30/100 MXN
04	Carra de tepales de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	7.42	\$231.00	DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	37.10	\$78.90	SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 MXN
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	m3/km	74.20	\$17.07	DIECISIETE PESOS 07/100 MXN
					IMPORTE DE TERRACERIAS
					\$20,906.88
					TOTAL EN PESOS
					\$21,406.14

Concursante: ING. CARLOS ANTONIO GUERRO MUÑOZ		Importe Parcial de esta Hoja :	\$21,406.14
C. VICENTE GUERERO #1 LA ESCONDIDA JALPA ZAC.		Importe Acumulado :	\$21,406.14

0067



ING. CARLOS ANTONIO GUERRERO MUÑOZ
 C. VICENTE GUERERO #1
 LA ESCONDIDA JALPA ZAC.
 RFC: GUMC9205062A
 TEL. 4921065251

H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA
 ZACATECAS
 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



PRESUPUESTO

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

CLAVE	ENUNCIADO DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
				NÚMERO	PRECIO UNITARIO (SIN I.V.A.) CON LETRA
					\$21,406.14
					TOTAL EN PESOS
362	Tubo de pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye materiales, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para su correcta ejecución del P.U.O.T.	m	106.00	\$374.16	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 16/100 MXN
070211	Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	114.00	\$144.63	CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 63/100 MXN
071005	Codo 45 pvc sanitario cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	19.00	\$132.50	CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 50/100 MXN
071011	Codo 90° pvc sanitario cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	38.00	\$157.42	CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 42/100 MXN
213700	Suministro y colocación de sileta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye material, mano de obra	pza	19.00	\$288.76	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 76/100 MXN
256	Tapón hembra pvc sanitario cementar (h) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	3.00	\$125.27	CIENTO VEINTICINCO PESOS 27/100 MXN
					IMPORTE DE MATERIALES
					\$70,510.49
21257	Relleno para acopiado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo dematerial en carretilla 30 mts de distancia.	m3	29.68	\$254.20	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MXN

Concursante: ING. CARLOS ANTONIO GUERRO MUÑOZ C. VICENTE GUERERO #1 LA ESCONDIDA JALPA ZAC. 0068	 CONTRATISTA	Importe Parcial de esta Hoja :	\$78,055.15
		Importe Acumulado :	\$99,461.29

ING. CARLOS ANTONIO GUERRERO MUÑOZ
 C. VICENTE GUERERO #1
 LA ESCONDIDA JALPA ZAC.
 RFC: GUMC9205062A
 TEL. 4921065251


H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA
 ZACATECAS
 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



PRESUPUESTO

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

CLAVE	ENUNCIADO DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		
				PRECIO UNITARIO (SIN I.V.A.) CON LETRA	TOTAL EN PESOS	
030106	Relleno con material producto de la excavación, compactado amaquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano deobra, equipo y herramienta.	m3	66.78	\$87.48	OCHENTA Y SIETE PESOS 48/100 MXN	\$5,841.91
D25	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 6x 12 x 24 cms., junteado con mezcla cemento arena 1:5 acabadopulido en el interior, sobre base de planilla de concreto de 5 ycadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye:excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$3,077.68	TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 MXN	\$3,077.68
170401	OBRAS CONEXAS Pozos de visita para brocal de 0.90 x 2.00 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a lizón desplazado doble firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 junteado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.	pza	2.00	\$9,585.69	NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 69/100 MXN	\$19,171.38
020249	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	74.10	\$128.46	CIENTO VEINTIOCHO PESOS 46/100 MXN	\$9,518.89
AFI-01	Afline de taludes y fondo de cepa a mano en terreno	m2	57.00	\$22.30	VEINTIDOS PESOS 30/100 MXN	\$1,271.10
				IMPORTE DE RELLENOS		\$16,464.25
				IMPORTE DE OBRAS CONEXAS		\$19,171.38

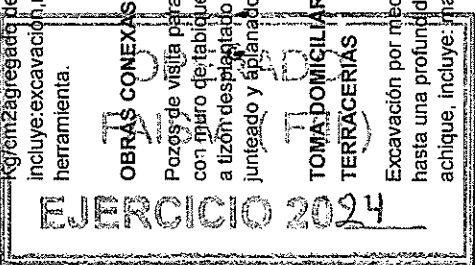

Concursante: ING. CARLOS ANTONIO GUERRO MUÑOZ C. VICENTE GUERERO #1 LA ESCONDIDA JALPA ZAC.	 CONTRATISTA	Importe Parcial de esta Hoja :	\$38,880.96
		Importe Acumulado :	\$138,342.25

0069

ING. CARLOS ANTONIO GUERRERO MUÑOZ
 C. VICENTE GUERO #1
 LA ESCONDIDA JALPA ZAC.
 RFC: GUMC9205062A
 TEL. 4921065251


H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA
 ZACATECAS
 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


BLOCK CCR

PRESUPUESTO

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

CLAVE	ENUNCIADO DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
				NÚMERO	PRECIO UNITARIO (SIN I.V.A.) CON LETRA
04	Camia de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	5.70	\$231.00	DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	22.80	\$78.90	SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 MXN
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizables en kilómetros subsecuentes, se consideraran (2 km)	m3/km	45.60	\$17.07	DIECISIETE PESOS 07/100 MXN
	RELLENOS				IMPORTE DE TERRACERIAS
21257	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepalcate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla 30 mts de distancia.	m3	17.10	\$254.20	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MXN
030106	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	51.30	\$87.48	OCHENTA Y SIETE PESOS 48/100 MXN
					IMPORTE DE RELLENOS
					IMPORTE DE TOMA DOMICILIARIA
					IMPORTE DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE
					IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO
					IVA(16%)
					IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA
					(* CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 13/100 MXN *)
					\$138,342.25
					TOTAL EN PESOS

0070	Concurante: ING. CARLOS ANTONIO GUERRERO MUÑOZ	 CONTRATISTA	Importe Parcial de esta Hoja :	\$12,728.55
	C. VICENTE GUERO #1 LA ESCONDIDA JALPA ZAC.		Importe Acumulado :	\$151,070.80

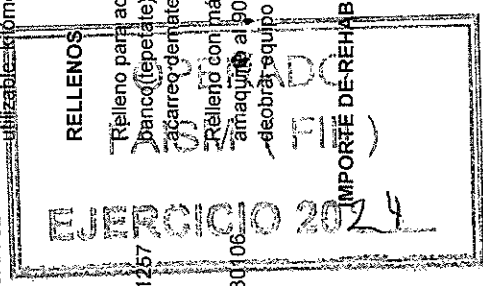



ACUERDO DE MODALIDAD DE EJECUCION.

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.

CONTRATO # NOCHIS/FONDOIII/2024/09

PARA DAR ATENCION AL ARTICULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y DE ACUERDO A LOS MONTOS SEÑALADOS ESPECIFICAMENTE EN EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS , EL PRESENTE CONTRATO CONSISTENTE EN: REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA DE LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS CONTRATO BAJO EL ESQUEMA DE ADJUDICACION DIRECTA A EL ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ, SIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA MAS FACTIBLE PARA EL MUNICIPIO Y LOS INTERESES DEL MISMO.

SE EXTIENDE LAS PRESENTE DE LA PARTE NORMATIVA PARA LOS USOS Y FINES LEGALES , EN LA CIUDAD DE NOCHISTLAN ZACATECAS 05 DE JULIO DEL 2024.



DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2021 - 2024

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0071

CONTRATO

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

CTO.
NO.NOCHIS/FONDOIII/2024/09
R.F.C.MNM850101AC3

DECLARACIONES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. A TRAVES DE EL PRESIDENTE MUNICIPAL; EL SINDICO MUNICIPAL; ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; , A TRAVES DE SUS TITULARES LOS C.PROF. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR, PRESIDENTE MUNICIPAL;C. LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ , SINDICO MUNICIPAL ;ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO , Y POR LA OTRA: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ, A QUIEN SE DENOMINARA EL CONTRATISTA, SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

PRIMERA.- EL MUNICIPIO DECLARA:

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUBRIRAN CON RECURSOS DEL FONDO III.


1.2.-QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO # 1 ZONA CENTRO DE , NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.3.- QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ POR: ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

SEGUNDA.- LA CONTRATISTA DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

II.1 QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS NECESARIAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DENTRO DE SUS OBJETIVOS COMPRENDE: LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

II.2- QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.



0072

II.3.- QUE HA VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO EN QUE HABRÁN DE EJECUTARSE LAS OBRAS, PARA OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

II.4.- QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE 48 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. EL REGLAMENTO DE LA LEY DE QUE SE INVOCA, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, QUE SE SEGUIRÁN APLICANDO, EN TODO LO QUE NO SE OPOGA A LA LEY QUE SE INVOCA Y SU REGLAMENTO Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA DEL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS. LOS ANEXOS, (PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O PARTICULARES EN LA CONSTRUCCIÓN, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES), QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y LAS DEMÁS NORMAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LOS TRABAJOS.

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE CUAUHEMOC #1 TLACHICHILA NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS C.P. 99918, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.6.- SER UNA EMPRESA MEXICANA LO CUAL ACREDITA CON RFC: OAMJ810410FE8.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS, CONSISTENTES EN: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS. Y ESTA SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SEÑALAN EN ESTE CONTRATO, ASÍ COMO DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" DISPONDRÁ DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO III.

SEGUNDA: TIPO DE ADJUDICACIÓN.- CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 EN RELACIÓN EL 46 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.", LA ASIGNACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" A "EL CONTRATISTA" FUE MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.- LAS PARTES ACUERDAN QUE EL MONTO QUE SE CUBRIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, POR LA CANTIDAD DE \$168,312.13 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 13/100), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MONTO QUE SOLO PODRÁ SER MODIFICADO CUANDO EXISTAN RAZONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLÍCITAS, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL

FAISM (FII)

24

0073

ARTICULO 128 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.


CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN,- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO EL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024, PARA CONCLUIRLA EN SU TOTALIDAD EL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA EN EL SUPUESTO DE RETRASO SE ESTARÁ A LO QUE SE ESTABLECE SI EL CONTRATISTA ADVIERTE QUE NO ES POSIBLE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A ÉL, DEBERÁ NOTIFICARLO, MEDIANTE LA BITÁCORA, AL ENTE PÚBLICO EJECUTOR, PRESENTANDO SU SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL PLAZO Y LA DOCUMENTACIÓN QUE LO JUSTIFIQUE. EL ENTE PÚBLICO DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, EMITIRÁ EL DICTAMEN DE RESOLUCIÓN, DE NO HACERLO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR NO ACEPTADA. EL CONVENIO, EN SU CASO, DEBERÁ FORMALIZARSE DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A UNO U OTRO SUCESO SEÑALADO EN EL ARTICULO 130 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS., A ENTREGAR AL CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CON OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA; EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, PRORROGARÁ EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SITUACIÓN QUE QUEDARÁ DE MANIFIESTO EN UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN.

SEXTA: ANTICIPOS.- SIN ANTICIPO

SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASÍ MISMO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE “EL MUNICIPIO” EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SU REPRESENTANTE LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA QUE PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA.

OCTAVA: FORMA DE PAGO.- LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARQUEN COMO MÁXIMO PERIODOS MENSUALES, ESTIMACIONES QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ÉSTAS, LAS QUE SERÁN QUINCE Y ÚLTIMO DE CADA MES, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EL LUGAR DE PAGO SERÁ EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.



0074

"EL CONTRATISTA" SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE "EL MUNICIPIO" TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.




CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN, EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARÁ EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA, A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERÁ APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE "EL MUNICIPIO", INDEPENDIEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.4 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE "EL MUNICIPIO", ÉSTE PODRÁ ORDENAR SU DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO EN ESTE CASO, "EL MUNICIPIO", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, "EL MUNICIPIO", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA".

0075
FAISM (FII)
EJERCICIO 20 24




TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTA DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO".

NOVENA: GARANTIAS: "EL CONTRATISTA" PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO , SE OBLIGA A PRESENTAR EN LA BREVEDAD POSIBLE, LAS POLIZAS DE FIANZAS POR EL 10% DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS , INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VALOR AGREGADO , A FAVOR DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA , ZACATECAS , SEGÚN EL ARTICULO 48 Y 66 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. SU REGLAMENTO VIGENTE, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE "EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA" EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. "EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER EN TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL MUNICIPIO" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO. POR LO ANTERIOR EXPUESTO, PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS LA EMPRESA CONTRATISTA SE COMPROMETE Y OBLIGA QUE TODO EL PERSONAL QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN LA OBRA DEBERÁ CONTAR CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE CONSISTIRÁ EN UNIFORMES, BOTAS, GUANTES CASCO DE PROTECCIÓN, Y TODOS AQUELLOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU SEGURIDAD, TODO ELLO EN APEGO A LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS QUE SE DESARROLLAN, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE, ASÍ COMO LO ORDENA LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-113 STPS-2009, SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN DE PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN -CLASIFICACIÓN ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN EN SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGOS DE LOS EFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS. IGUALMENTE SE OBLIGA AL CONTRATISTA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS Ó MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO

EJERCICIO 2024
MAY 11 2024

0076

AL CONTRATISTA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS Ó MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO" EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.- "EL MUNICIPIO" TENDRÁN LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS ESTÁN SIENDO EJECUTADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA. "EL MUNICIPIO" APLICARÁ COMO SANCIÓN EL 5 % DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBÍA DE EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA AL TÉRMINO DE LA OBRA, APLICÁNDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL MUNICIPIO" COMO PENA CONVENCIONAL.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" PODRÁN SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LA CUAL HARÁ LA COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS., SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL MUNICIPIO" ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO.

DECIMAM SEXTA.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DECIMA SEPTIMA.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN DE LA CIUDAD DE ZACATECAS POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE NOCHISTLAN, ZAC. EN ORIGINAL EL 03 DÍA DEL MES DE JULIO DEL 2024.



0077

"EL CONTRATISTA"



ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ.

"EL MUNICIPIO"

POR SINDICATURA



LIC LILIANA ROQUE GOMEZ

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



PROF. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR.

ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ



0078



NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC., A DE 20 MAYO DEL 2024

ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA ZAC.

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DIRIJO A USTED, PARA
EXPRESAR MI INTERES EN PARTICIPAR EN LA OBRA:

**REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE
PRIVADA DE LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN,
MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS**

SIN MAS POR EL MOMENTO, ANEXO MI PRESUPUESTO Y ME DESPIDO ENVIANDOLE UN CORDIAL Y
AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE

ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

CONTRATISTA



0079



CONSTRUCCION, DISEÑO, INOVACION.

NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC., A 20 DE MAYO DEL 2024

ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA ZAC.

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DIJERO A USTED PARA INFORMARLE QUE CONOZCO EL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS PARA LA OBRA:

**REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE
PRIVADA DE LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN,
MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS**

ATENTAMENTE

ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

CONTRATISTA



0080

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Documento:
 Concurso N°:
 Fecha: 01/jun/2024
 Página: 1 de 4

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
01-RSD	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS. PRELIMINAES Trazo y nivelación de ejes para líneas de drenaje con equipotografico, incluye: equipo necesario, señalización del banco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requirieran en la nivelación con pintura y renivelaciones necesarias	m	106.00	CUATRO PESOS 54/100 MXN	\$4.54	\$481.24
IMPORTE DE PRELIMINAES						
TERRACERIAS						
020249	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts. no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	103.88	CIENTO VEINTITRÉS PESOS 39/100 MXN	\$123.39	\$12,817.75
AFI-01	Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno	m2	74.20	VEINTIÚN PESOS 43/100 MXN	\$21.43	\$1,590.11
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	7.42	DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 87/100 MXN	\$221.87	\$1,646.28
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	37.10	SETENTA Y CINCO PESOS 79/100 MXN	\$75.79	\$2,811.81
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	m3/km	74.20	DIECISÉIS PESOS 38/100 MXN	\$16.38	\$1,215.40
IMPORTE DE TERRACERIAS MATERIALES						
362	Tubo de pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye materiales, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para su correcta ejecución del P.U.O.T.	m	106.00	TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 34/100 MXN	\$359.34	\$38,090.04
						\$20,081.35
						\$58,652.63
						\$58,652.63

CONCURSO
FASMA (FII)
EXERCICIO 2024

0081

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Importe Parcial de esta Hoja :
 Importe Acumulado :

Firma Representante Legal

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
070211	Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	114.00	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 91/100 MXN	\$138.91
071005	Codo 45 pvc sanitario cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	19.00	CIENTO VEINTISIETE PESOS 26/100 MXN	\$127.26
0710111	Codo 90° pvc sanitario cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	38.00	CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 MXN	\$151.20
213700	Suministro y colocacion de silleta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye:material, mano de obra	pza	19.00	DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN	\$277.32
256	Tapón hembra pvc sanitario cementar (h) 6" incluye: materiales,mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	3.00	CIENTO VEINTE PESOS 32/100 MXN	\$120.32

IMPORTE DE MATERIALES

RELLENOS

21257	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla 30 mts de distancia.	m3	29.68	DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 14/100 MXN	\$244.14
030106	Relleno con material producto de la excavación, compactado amañado al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	66.78	OCHENTA Y CUATRO PESOS 02/100 MXN	\$84.02
025708	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 6x12 x24 cms., junteado con mezcla cemento arena 1:5 acabadopulido en el interior,sobre base de plantilla de concreto de 5 cms de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye:excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 86/100 MXN	\$2,955.86

IMPORTE DE RELLENOS		OBRAS CONEXAS		IMPORTE EN PESOS	
				\$138.91	\$58,652.63
				\$127.26	\$2,417.94
				\$151.20	\$5,745.60
				\$277.32	\$5,269.08
				\$120.32	\$360.96
					\$67,719.36
				\$244.14	\$7,246.08
				\$84.02	\$5,610.86
				\$2,955.86	\$2,955.86
					\$15,812.80

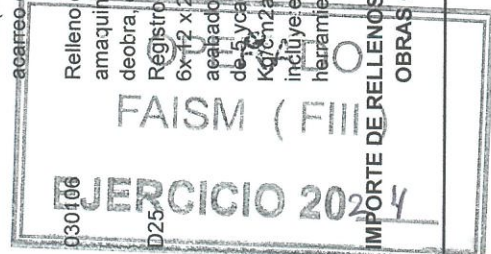

Conкурсante: **ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ**

[Firma]
 Firma Representante Legal

Importe Parcial de esta Hoja : \$45,442.12
 Importe Acumulado : \$104,094.75

008

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
170401	Pozos de visita para brocal de 0.90 x 2.00 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizón desplantado sobre firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 juntado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.	pza	2.00	NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 29/100 MXN	\$9,206.29
IMPORTE DE OBRAS CONEXAS					
TOMA DOMICILIARIA					
TERRACERIAS					
020249	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	74.10	CIENTO VEINTITRÉS PESOS 39/100 MXN	\$123.39
AFI-01	Afíne de taludes y fondo de cepa a mano en terreno	m2	57.00	VEINTIÚN PESOS 43/100 MXN	\$21.43
04	Carra de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	5.70	DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 87/100 MXN	\$221.87
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	22.80	SETENTA Y CINCO PESOS 79/100 MXN	\$75.79
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizáble, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	m3/km	45.60	DIECISÉIS PESOS 38/100 MXN	\$16.38
IMPORTE DE TERRACERIAS					
RELLENOS					
21257	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla 30 mts de distancia.	m3	17.10	DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 14/100 MXN	\$244.14
030106	Relleno con material producto de la excavación, compactado amañquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano deobra, equipo y herramienta.	m3	51.30	OCHENTA Y CUATRO PESOS 02/100 MXN	\$84.02
IMPORTE DE RELLENOS					
IMPORTE DE TOMA DOMICILIARIA					
IMPORTE DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE					
				Importe Parcial de esta Hoja :	\$41,001.91
				Importe Acumulado :	\$145,096.66

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
 H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
 DIR.DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
 CALLE CUAUHTEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Documento:
 Concurso N°:
 Fecha: 01/jun/2024
 Página: 4 de 4


Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.


CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO \$145,096.66
 IVA(16%) \$23,215.47
 IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA \$168,312.13

(* CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 13/100 MXN *)



0084	Concurante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ	 Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	\$0.00
			Importe Acumulado :	\$145,096.66



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
 H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA
 DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
 CALLE CUAUHTEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA

Documento:
 Concurso N°:
 Fecha: 01/jun/2024
 Página: 1 de 23

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

01-RSD Trazo y nivelacion de ejes para lineas de drenaje con equipotopografico, incluye: equipo necesario, señalizacion del banco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requieran en lanivelacion con pintura y renivelaciones necesarias m

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
CMC-41160	Calhidra (en la compra mínima de 5 ton).	ton	0.000200	\$2,758.62	\$0.55
ACCH-002	Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 (3/8") fyp = 4200 kg/cm2 marca Hylsa	kg	0.024584	\$18.60	\$0.46
INME-159	Hilo cáñamo o de plástico presentación en rollo de 300 mts.	pza	0.001177	\$35.00	\$0.04
Total de Materiales					\$1.05
Mano de Obra					
MOCU-020	Cuadrilla No 20 (1 Topografo + 1 Cadenero)	jor	0.000719	\$1,757.33	\$1.26
Total de Mano de Obra					\$1.26
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$1.26	\$0.04
HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	\$1.26	\$0.03
Total de Herramienta					\$0.07
Equipo					
AMAPE-328	Transito eléctrico marca Leica Wild, modelo T-1000. Incluye topografo y estadalero.	hora	0.124493	\$3.87	\$0.48
AMAPE-316	Sistema Cad, Incluye operador.	hora	0.007553	\$87.36	\$0.66
AMAPE-317	Ploter designjet 1050C con disco duro, marca hewlett Packard, modelo 1050.	hora	0.000581	\$101.47	\$0.06
Total de Equipo					\$1.20
Costo Directo					\$3.58
Indirectos de oficina			0.5637%		\$0.02
Indirectos de campo			12.7934%		\$0.46
Subtotal					\$4.06
Financiamiento			1.6509%		\$0.07
Subtotal					\$4.13
Utilidad			8.9286%		\$0.37
Subtotal					\$4.50
Cargos adicionales			0.8723%		\$0.04
Subtotal					\$4.54
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$4.54

(* CUATRO PESOS 54/100 MXN *)



0085

Concurante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
 H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA
 DIR.DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
 CALLE CUAUHTEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA

Documento:
 Concurso N°:
 Fecha: **01/jun/2024**
 Página: 2 de 23

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

020249 Excavación por medios mecánicos en terreno tipo en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. m3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Mano de Obra					
MOCU-001	Cuadrilla No 1 (1 Peón)	jor	0.025994	\$558.15	\$14.51
Total de Mano de Obra					\$14.51
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$14.51	\$0.44
Total de Herramienta					\$0.44
Equipo					
CTMAQ	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 450E 124	hr	0.100000	\$825.00	\$82.50
Total de Equipo					\$82.50
Costo Directo					\$97.45
	Indirectos de oficina		0.5637%		\$0.55
	Indirectos de campo		12.7934%		\$12.47
	Subtotal				\$110.47
	Financiamiento		1.6509%		\$1.82
	Subtotal				\$112.29
	Utilidad		8.9286%		\$10.03
	Subtotal				\$122.32
	Cargos adicionales		0.8723%		\$1.07
	Subtotal				\$123.39
	Otro porcentaje		0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$123.39

(* CIENTO VEINTITRÉS PESOS 39/100 MXN *)



0086

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
 H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA
 DIR.DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
 CALLE CUAUHTEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA

Documento:
 Concurso N°:
 Fecha: **01/jun/2024**
 Página: **3 de 23**

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
AFI-01	Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno				m2
Mano de Obra					
MOCU-001	Cuadrilla No 1 (1 Peón)	jor	0.028882	\$558.15	\$16.12
Total de Mano de Obra					\$16.12
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$16.12	\$0.48
HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	\$16.12	\$0.32
Total de Herramienta					\$0.80
Costo Directo					
			Indirectos de oficina	0.5637%	\$0.10
			Indirectos de campo	12.7934%	\$2.16
			Subtotal		\$19.18
			Financiamiento	1.6509%	\$0.32
			Subtotal		\$19.50
			Utilidad	8.9286%	\$1.74
			Subtotal		\$21.24
			Cargos adicionales	0.8723%	\$0.19
			Subtotal		\$21.43
			Otro porcentaje	0.0000%	\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$21.43
(* VEINTIÚN PESOS 43/100 MXN *)					



0087

Concurante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ	 Firma Representante Legal
--	-------------------------------



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
 H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA
 DIR.DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
 CALLE CUAUHTEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA

Documento:
 Concurso N°:
 Fecha: **01/jun/2024**
 Página: **4 de 23**

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

04 Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta. m3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
AGAS-019	Material de banco tepetate, puesto en obra	m3	0.953123	\$155.00	\$147.73
AGRE-016	Agua potable	m3	0.129971	\$19.91	\$2.59
Total de Materiales					\$150.32
Mano de Obra					
MOCU-001	Cuadrilla No 1 (1 Peón)	jor	0.043324	\$558.15	\$24.18
Total de Mano de Obra					\$24.18
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$24.18	\$0.73
Total de Herramienta					\$0.73
Costo Directo					\$175.23
	Indirectos de oficina		0.5637%		\$0.99
	Indirectos de campo		12.7934%		\$22.42
	Subtotal				\$198.64
	Financiamiento		1.6509%		\$3.28
	Subtotal				\$201.92
	Utilidad		8.9286%		\$18.03
	Subtotal				\$219.95
	Cargos adicionales		0.8723%		\$1.92
	Subtotal				\$221.87
	Otro porcentaje		0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$221.87

(* DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 87/100 MXN *)



0088

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
 H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA
 DIR.DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
 CALLE CUAUHTEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA

Documento:
 Concurso N°:
 Fecha: **01/jun/2024**
 Página: **5 de 23**

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

010818 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con máquina. m3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Equipo					
AMAPE-039	Camión de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad.	hora	0.051989	\$447.82	\$23.28
AMAPE-015	Cargador sobre neumático marca Caterpillar modelo 966G, de 235 hp, 22.9 ton, 4.7m3 de capacidad de cucharón.	hora	0.034659	\$1,055.14	\$36.57
Total de Equipo					\$59.85
Costo Directo					\$59.85
	Indirectos de oficina		0.5637%		\$0.34
	Indirectos de campo		12.7934%		\$7.66
	Subtotal				\$67.85
	Financiamiento		1.6509%		\$1.12
	Subtotal				\$68.97
	Utilidad		8.9286%		\$6.16
	Subtotal				\$75.13
	Cargos adicionales		0.8723%		\$0.66
	Subtotal				\$75.79
	Otro porcentaje		0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$75.79

(* SETENTA Y CINCO PESOS 79/100 MXN *)



0089

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

[Firma]
 Firma Representante Legal



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
 H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA
 DIR.DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
 CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA

Documento:
 Concurso N°:
 Fecha: **01/jun/2024**
 Página: **6 de 23**

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

ACAR-02 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 m3/km km)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Equipo					
AMAPE-039	Camión de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad.	hora	0.028906	\$447.82	\$12.94
Total de Equipo					\$12.94
Costo Directo					
	Indirectos de oficina		0.5637%		\$0.07
	Indirectos de campo		12.7934%		\$1.66
	Subtotal				\$14.67
	Financiamiento		1.6509%		\$0.24
	Subtotal				\$14.91
	Utilidad		8.9286%		\$1.33
	Subtotal				\$16.24
	Cargos adicionales		0.8723%		\$0.14
	Subtotal				\$16.38
	Otro porcentaje		0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$16.38
(* DIECISÉIS PESOS 38/100 MXN *)					



0090

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ 
Firma Representante Legal



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
 H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA
 DIR.DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
 CALLE CUAUHTEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA

Documento:
 Concurso N°:
 Fecha: **01/jun/2024**
 Página: **7 de 23**

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

362 Tubo de pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye materiales, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para su correcta ejecucion del P.U.O.T. m

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
TB S-25 8	Tubería sanitaria de 8" serie 25	pza	0.166600	\$1,425.63	\$237.51
LVB-PVC	Lubricante para tubería de pvc cubeta de 4 kg	cubeta	0.025994	\$358.00	\$9.31
103247-1085	Estopa blanca	kg	0.017330	\$135.00	\$2.34
Total de Materiales					\$249.16
Mano de Obra					
MOCU-031	Cuadrilla No. 31 (1 Oficial tubero + 1 Ayudante general)	jor	0.015000	\$2,242.45	\$33.64
Total de Mano de Obra					\$33.64
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$33.64	\$1.01
Total de Herramienta					\$1.01
Costo Directo					\$283.81
	Indirectos de oficina		0.5637%		\$1.60
	Indirectos de campo		12.7934%		\$36.31
	Subtotal				\$321.72
	Financiamiento		1.6509%		\$5.31
	Subtotal				\$327.03
	Utilidad		8.9286%		\$29.20
	Subtotal				\$356.23
	Cargos adicionales		0.8723%		\$3.11
	Subtotal				\$359.34
	Otro porcentaje		0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$359.34

(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 34/100 MXN *)



0091

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

[Firma]
 Firma Representante Legal



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
 H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA
 DIR.DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
 CALLE CUAUHTEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA

Documento:
 Concurso N°:
 Fecha: **01/jun/2024**
 Página: **8 de 23**

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

070211 Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. m

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
LVB-PVC	Lubricante para tubería de pvc cubeta de 4 kg	cubeta	0.025994	\$358.00	\$9.31
TB-6"S25	Tubería de alcantarillado de 6" serie 25	pza	0.166600	\$450.00	\$74.97
103247-1085	Estopa blanca	kg	0.017330	\$135.00	\$2.34
Total de Materiales					\$86.62
Mano de Obra					
MOCU-031	Cuadrilla No. 31 (1 Oficial tubero + 1 Ayudante general)	jor	0.010000	\$2,242.45	\$22.42
Total de Mano de Obra					\$22.42
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$22.42	\$0.67
Total de Herramienta					\$0.67
Costo Directo					\$109.71
Indirectos de oficina			0.5637%		\$0.62
Indirectos de campo			12.7934%		\$14.04
Subtotal					\$124.37
Financiamiento			1.6509%		\$2.05
Subtotal					\$126.42
Utilidad			8.9286%		\$11.29
Subtotal					\$137.71
Cargos adicionales			0.8723%		\$1.20
Subtotal					\$138.91
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$138.91

(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 91/100 MXN *)



0092

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ


 Firma Representante Legal



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
 H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA
 DIR.DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
 CALLE CUAUHTEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA

Documento:
 Concurso N°:
 Fecha: **01/jun/2024**
 Página: **9 de 23**

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

071005 Codo 45 pvc sanitario cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. pza

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
CA0694	Codo pvc alcantarillado 45"x6" serie 25	pza	1.000000	\$79.57	\$79.57
LVB-PVC	Lubricante para tubería de pvc cubeta de 4 kg	cubeta	0.002600	\$358.00	\$0.93
Total de Materiales					\$80.50
Mano de Obra					
MOCU-031	Cuadrilla No. 31 (1 Oficial tubero + 1 Ayudante general)	jor	0.008665	\$2,242.45	\$19.43
Total de Mano de Obra					\$19.43
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$19.43	\$0.58
Total de Herramienta					\$0.58
Costo Directo					\$100.51
	Indirectos de oficina		0.5637%		\$0.57
	Indirectos de campo		12.7934%		\$12.86
	Subtotal				\$113.94
	Financiamiento		1.6509%		\$1.88
	Subtotal				\$115.82
	Utilidad		8.9286%		\$10.34
	Subtotal				\$126.16
	Cargos adicionales		0.8723%		\$1.10
	Subtotal				\$127.26
	Otro porcentaje		0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$127.26

(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 26/100 MXN *)



0093

Concurante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

[Signature]
 Firma Representante Legal



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
 H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA
 DIR.DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
 CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA

Documento:
 Concurso N°:
 Fecha: **01/jun/2024**
 Página: **10 de 23**

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

0710111 Codo 90° pvc sanitario cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. pza

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
DC	Codo pvc sanitario de cementar 90° 6"	pza	1.000000	\$99.41	\$99.41
Total de Materiales					\$99.41
Mano de Obra					
MOCU-031	Cuadrilla No. 31 (1 Oficial tubero + 1 Ayudante general)	jor	0.008665	\$2,242.45	\$19.43
Total de Mano de Obra					\$19.43
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$19.43	\$0.58
Total de Herramienta					\$0.58
Costo Directo					\$119.42
	Indirectos de oficina		0.5637%		\$0.67
	Indirectos de campo		12.7934%		\$15.28
	Subtotal				\$135.37
	Financiamiento		1.6509%		\$2.23
	Subtotal				\$137.60
	Utilidad		8.9286%		\$12.29
	Subtotal				\$149.89
	Cargos adicionales		0.8723%		\$1.31
	Subtotal				\$151.20
	Otro porcentaje		0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$151.20

(* CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 MXN *)



0094

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
 H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA
 DIR.DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
 CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA


Documento:
 Concurso N°:
 Fecha: 01/jun/2024
 Página: 11 de 23

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
213700	Suministro y colocacion de silleta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye:material, mano de obra				pza
Materiales					
CA0716	Silleta pvc alcantarillado 8"X6"	pza	1.000000	\$187.85	\$187.85
103247-1085	Estopa blanca	kg	0.008665	\$135.00	\$1.17
Total de Materiales					\$189.02
Mano de Obra					
MOCU-031	Cuadrilla No. 31 (1 Oficial tubero + 1 Ayudante general)	jor	0.012997	\$2,242.45	\$29.15
Total de Mano de Obra					\$29.15
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$29.15	\$0.87
Total de Herramienta					\$0.87
Costo Directo					\$219.04
			Indirectos de oficina	0.5637%	\$1.23
			Indirectos de campo	12.7934%	\$28.02
			Subtotal		\$248.29
			Financiamiento	1.6509%	\$4.10
			Subtotal		\$252.39
			Utilidad	8.9286%	\$22.53
			Subtotal		\$274.92
			Cargos adicionales	0.8723%	\$2.40
			Subtotal		\$277.32
			Otro porcentaje	0.0000%	\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$277.32

(* DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN *)



0095

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

[Signature]
 Firma Representante Legal



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
 H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA
 DIR.DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
 CALLE CUAUHTEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA

Documento:
 Concurso N°:
 Fecha: **01/jun/2024**
 Página: **12 de 23**

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
256	Tapón hembra pvc sanitario cementar (h) 6" incluye: materiales,mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución delp.u.o.t.	pza			
HEM	Materiales tapon hembra de 6"	pza	1.000000	\$65.00	\$65.00
	Total de Materiales				\$65.00
MOCU-031	Mano de Obra Cuadrilla No. 31 (1 Oficial tubero + 1 Ayudante general)	jor	0.012997	\$2,242.45	\$29.15
	Total de Mano de Obra				\$29.15
FACHEME	Herramienta Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$29.15	\$0.87
	Total de Herramienta				\$0.87
	Costo Directo				\$95.02
	Indirectos de oficina		0.5637%		\$0.54
	Indirectos de campo		12.7934%		\$12.16
	Subtotal				\$107.72
	Financiamiento		1.6509%		\$1.78
	Subtotal				\$109.50
	Utilidad		8.9286%		\$9.78
	Subtotal				\$119.28
	Cargos adicionales		0.8723%		\$1.04
	Subtotal				\$120.32
	Otro porcentaje		0.0000%		\$0.00
	PRECIO UNITARIO				\$120.32

(* CIENTO VEINTE PESOS 32/100 MXN *)



0096

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

[Firma]
 Firma Representante Legal



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
 H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA
 DIR.DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
 CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA

Documento:
 Concurso N°:
 Fecha: **01/jun/2024**
 Página: **13 de 23**

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

21257 Relleno para acostillado de tubería con material de banco(tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo dematerial en carretillaa 30 mts de distancia. m3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
103200-1090	material de banco (tepetate)	m3	0.953123	\$163.00	\$155.36
AGRE-016	Agua potable	m3	0.129971	\$19.91	\$2.59
Total de Materiales					\$157.95
Mano de Obra					
MOCU-001	Cuadrilla No 1 (1 Peón)	jor	0.060654	\$558.15	\$33.85
Total de Mano de Obra					\$33.85
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$33.85	\$1.02
Total de Herramienta					\$1.02
Costo Directo					\$192.82
	Indirectos de oficina		0.5637%		\$1.09
	Indirectos de campo		12.7934%		\$24.67
	Subtotal				\$218.58
	Financiamiento		1.6509%		\$3.61
	Subtotal				\$222.19
	Utilidad		8.9286%		\$19.84
	Subtotal				\$242.03
	Cargos adicionales		0.8723%		\$2.11
	Subtotal				\$244.14
	Otro porcentaje		0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$244.14

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 14/100 MXN *)



0097

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA
 DIR.DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
 CALLE CUAUHTEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA

Documento:
 Concurso N°:
 Fecha: **01/jun/2024**
 Página: **14 de 23**

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

030106 Relleno con material producto de la excavación, compactado amaquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano deobra, equipo y herramienta. m3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Mano de Obra					
MOCU-006	Cuadrilla No 6 (1 Operador equipo menor + 2.00 Peones)	jor	0.019062	\$1,941.85	\$37.02
Total de Mano de Obra					\$37.02
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$37.02	\$1.11
HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	\$37.02	\$0.74
Total de Herramienta					\$1.85
Equipo					
AMALI-014	Bailarina neumática marca Wacker modelo BS 502i de gasolinaxde 700g/m y penetracion de hasta 51 cm con zapata de 28 x 33 cms	hora	0.282073	\$97.46	\$27.49
Total de Equipo					\$27.49
Costo Directo					
			Indirectos de oficina	0.5637%	\$0.37
			Indirectos de campo	12.7934%	\$8.49
			Subtotal		\$75.22
			Financiamiento	1.6509%	\$1.24
			Subtotal		\$76.46
			Utilidad	8.9286%	\$6.83
			Subtotal		\$83.29
			Cargos adicionales	0.8723%	\$0.73
			Subtotal		\$84.02
			Otro porcentaje	0.0000%	\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$84.02

(* OCHENTA Y CUATRO PESOS 02/100 MXN *)



0098

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA
 DIR.DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
 CALLE CUAUHTEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA

Documento:
 Concurso N°:
 Fecha: **01/jun/2024**
 Página: **15 de 23**

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMÓN DE LA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZACATECAS.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

D25 Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocado 6x 12 x 24 cms., juntoado con mezcla cemento arena 1:5 acabadopulido en el interior,sobre base de plantilla de concreto de 5 ycadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2agregado de 20 mm, cemento normal, incluye:excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramienta. pza

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
ARMS	Armex para castillo de acero electro soldado 6 m	pza	0.866475	\$172.41	\$149.39
TBQ	Tabique rojo recocado de 7 x 14 x 36 cms incluye: flete	pza	38.991391	\$11.00	\$428.91
Total de Materiales					\$578.30
Mano de Obra					
MOCU-005	Cuadrilla No 5 (1 Albañil + 1 Ayudante general)	jor	1.000000	\$1,370.23	\$1,370.23
Total de Mano de Obra					\$1,370.23
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$1,370.23	\$41.11
Total de Herramienta					\$41.11
Auxiliares					
PMEZ-028	Mezcla cemento arena 1:3	m3	0.051989	\$2,631.58	\$136.81
PCON-002	Concreto 100 Kg/cm2 agregado de 38 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm.	m3	0.025994	\$1,672.65	\$43.48
PCON-005	Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm.	m3	0.086648	\$1,900.34	\$164.66
Total de Auxiliares					\$344.95
Costo Directo					\$2,334.59
Indirectos de oficina			0.5637%		\$13.16
Indirectos de campo			12.7934%		\$298.67
Subtotal					\$2,646.42
Financiamiento			1.6509%		\$43.69
Subtotal					\$2,690.11
Utilidad			8.9286%		\$240.19
Subtotal					\$2,930.30
Cargos adicionales			0.8723%		\$25.56
Subtotal					\$2,955.86
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$2,955.86

(* DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 86/100 MXN *)



0099

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal
